

渠務署  
工程合約編號 DC/2011/04  
重建、改善及修復一段由黃大仙警署至東頭二邨的啓德河  
黃大仙區工程進度報告

## 目的

本報告的主要目的是向小組成員匯報上述工程至今的進度。

## 工程進度

### 水管改道工程：

2. 親仁街、沙田坳道及大成街一帶的水管改道工程進度理想。另外，橫過彩虹道的無坑挖掘水管改道工程亦已展開，預計於 2014 年年中完成。

### 河道改善工程：

3. 雖然現時正值雨季，但河道牆身鞏固工程(鋼管樁柱)仍可在河道的工作平台上進行，進度如下：

河道位置	總結施工進度
東頭(二)邨	進展順利
摩士公園	完成
黃大仙下邨	大部份完成
城寨社區會堂	預計 2013 年 10 月展開

### 箱形暗渠建造工程：

4. 打樁工程正在彩虹道進行，進度如下：

箱形暗渠位置	總結施工進度
黃大仙下邨	進展順利
啓德花園	完成前期工程
摩士公園	預計 2013 年 11 月展開

5. 在較早前黃大仙區議會及相關委員會會議所通過的臨時交通安排將陸續實施，時間表如下：

(i) 彩虹道近新蒲崗大廈之行車線遷移(見附件一)，預計將於今年 9 月下旬實施；

(ii) 彩虹道南行車線不能左轉入爵祿街(見附件二)，預計將於今年 11 月實施。有關臨時交通安排將維持約 30 個月；

(iii) 彩虹道北行車線不能左轉入沙田坳道(見附件三)，預計將於今年 12 月實施。有關臨時交通安排將維持約 12 個月；


(iv) 彩虹道北行行人路預計將於今年 11 月遷移至基德小學對出(見附件四)。

6. 在臨時交通安排實施期間，我們會繼續聯同運輸署及香港警務處密切監察受影響道路的交通情況，並會向委員會匯報工程進度。

### 文件提交


7. 本文件將提交政府及公用機構工程計劃工作小組 2013 年 9 月 24 日會議，請委員備悉以上安排。

渠務署  
2013 年 9 月

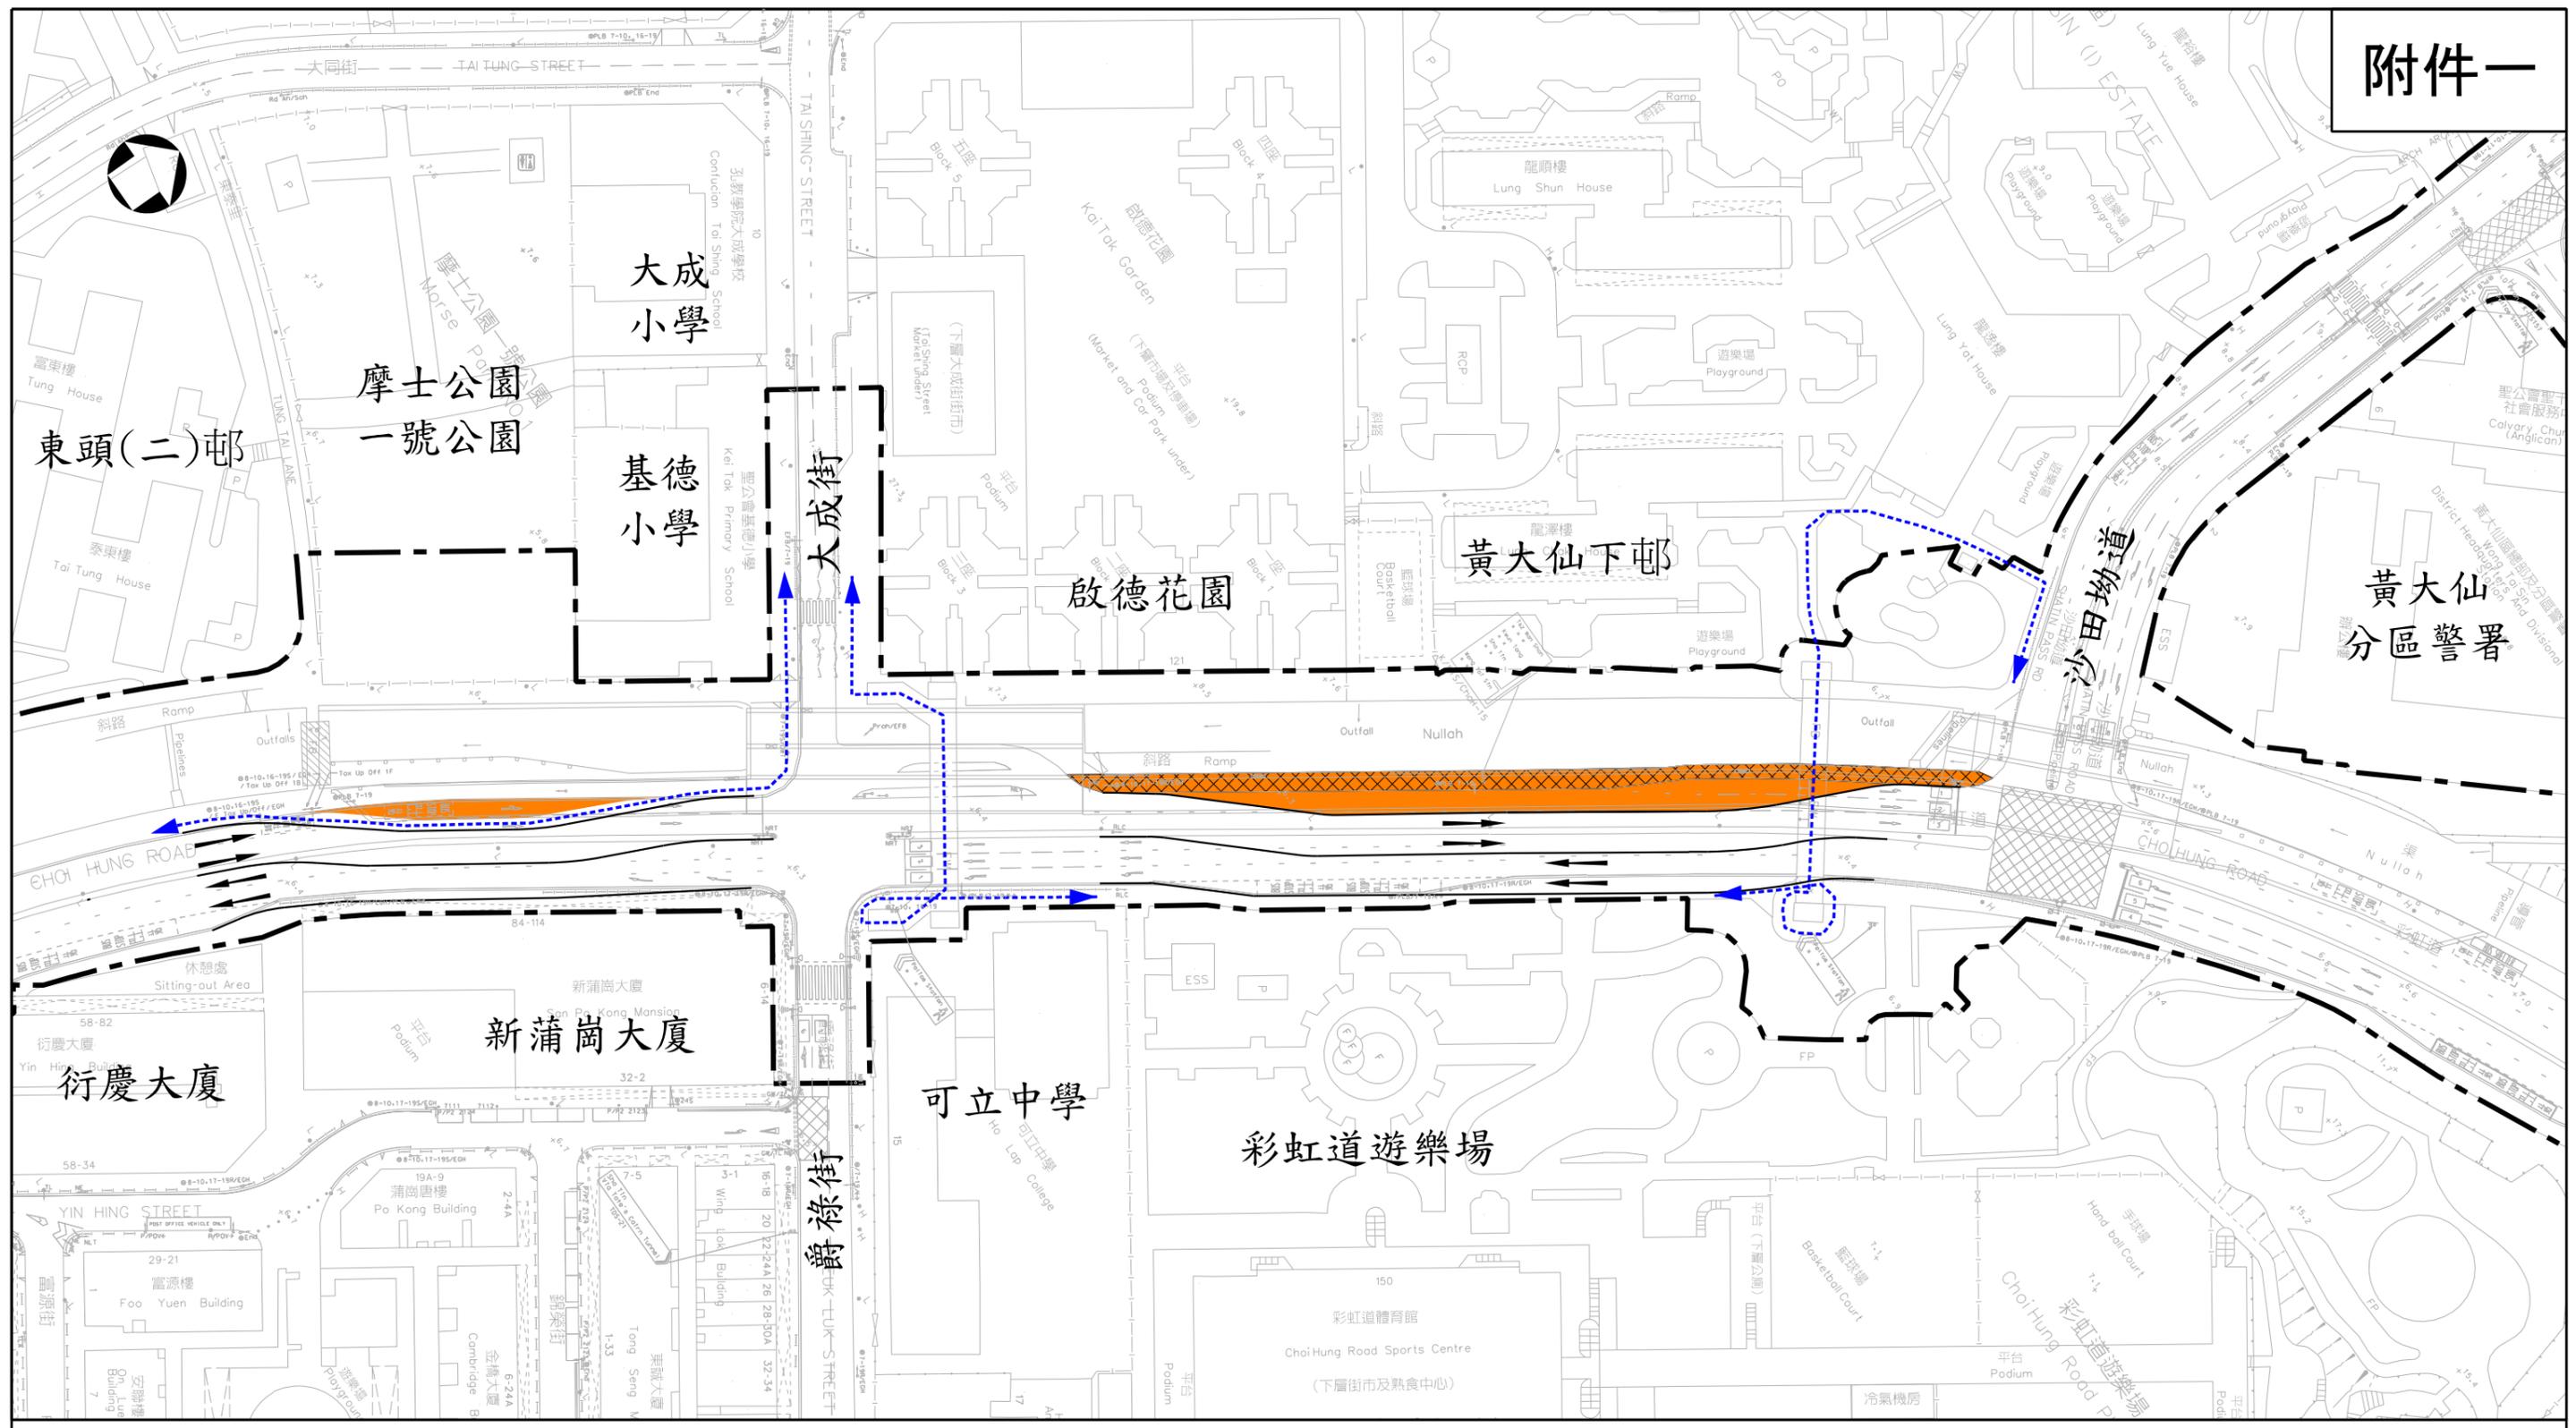

彩虹道近新蒲崗大廈交通改道安排


圖例：  
 工地範圍

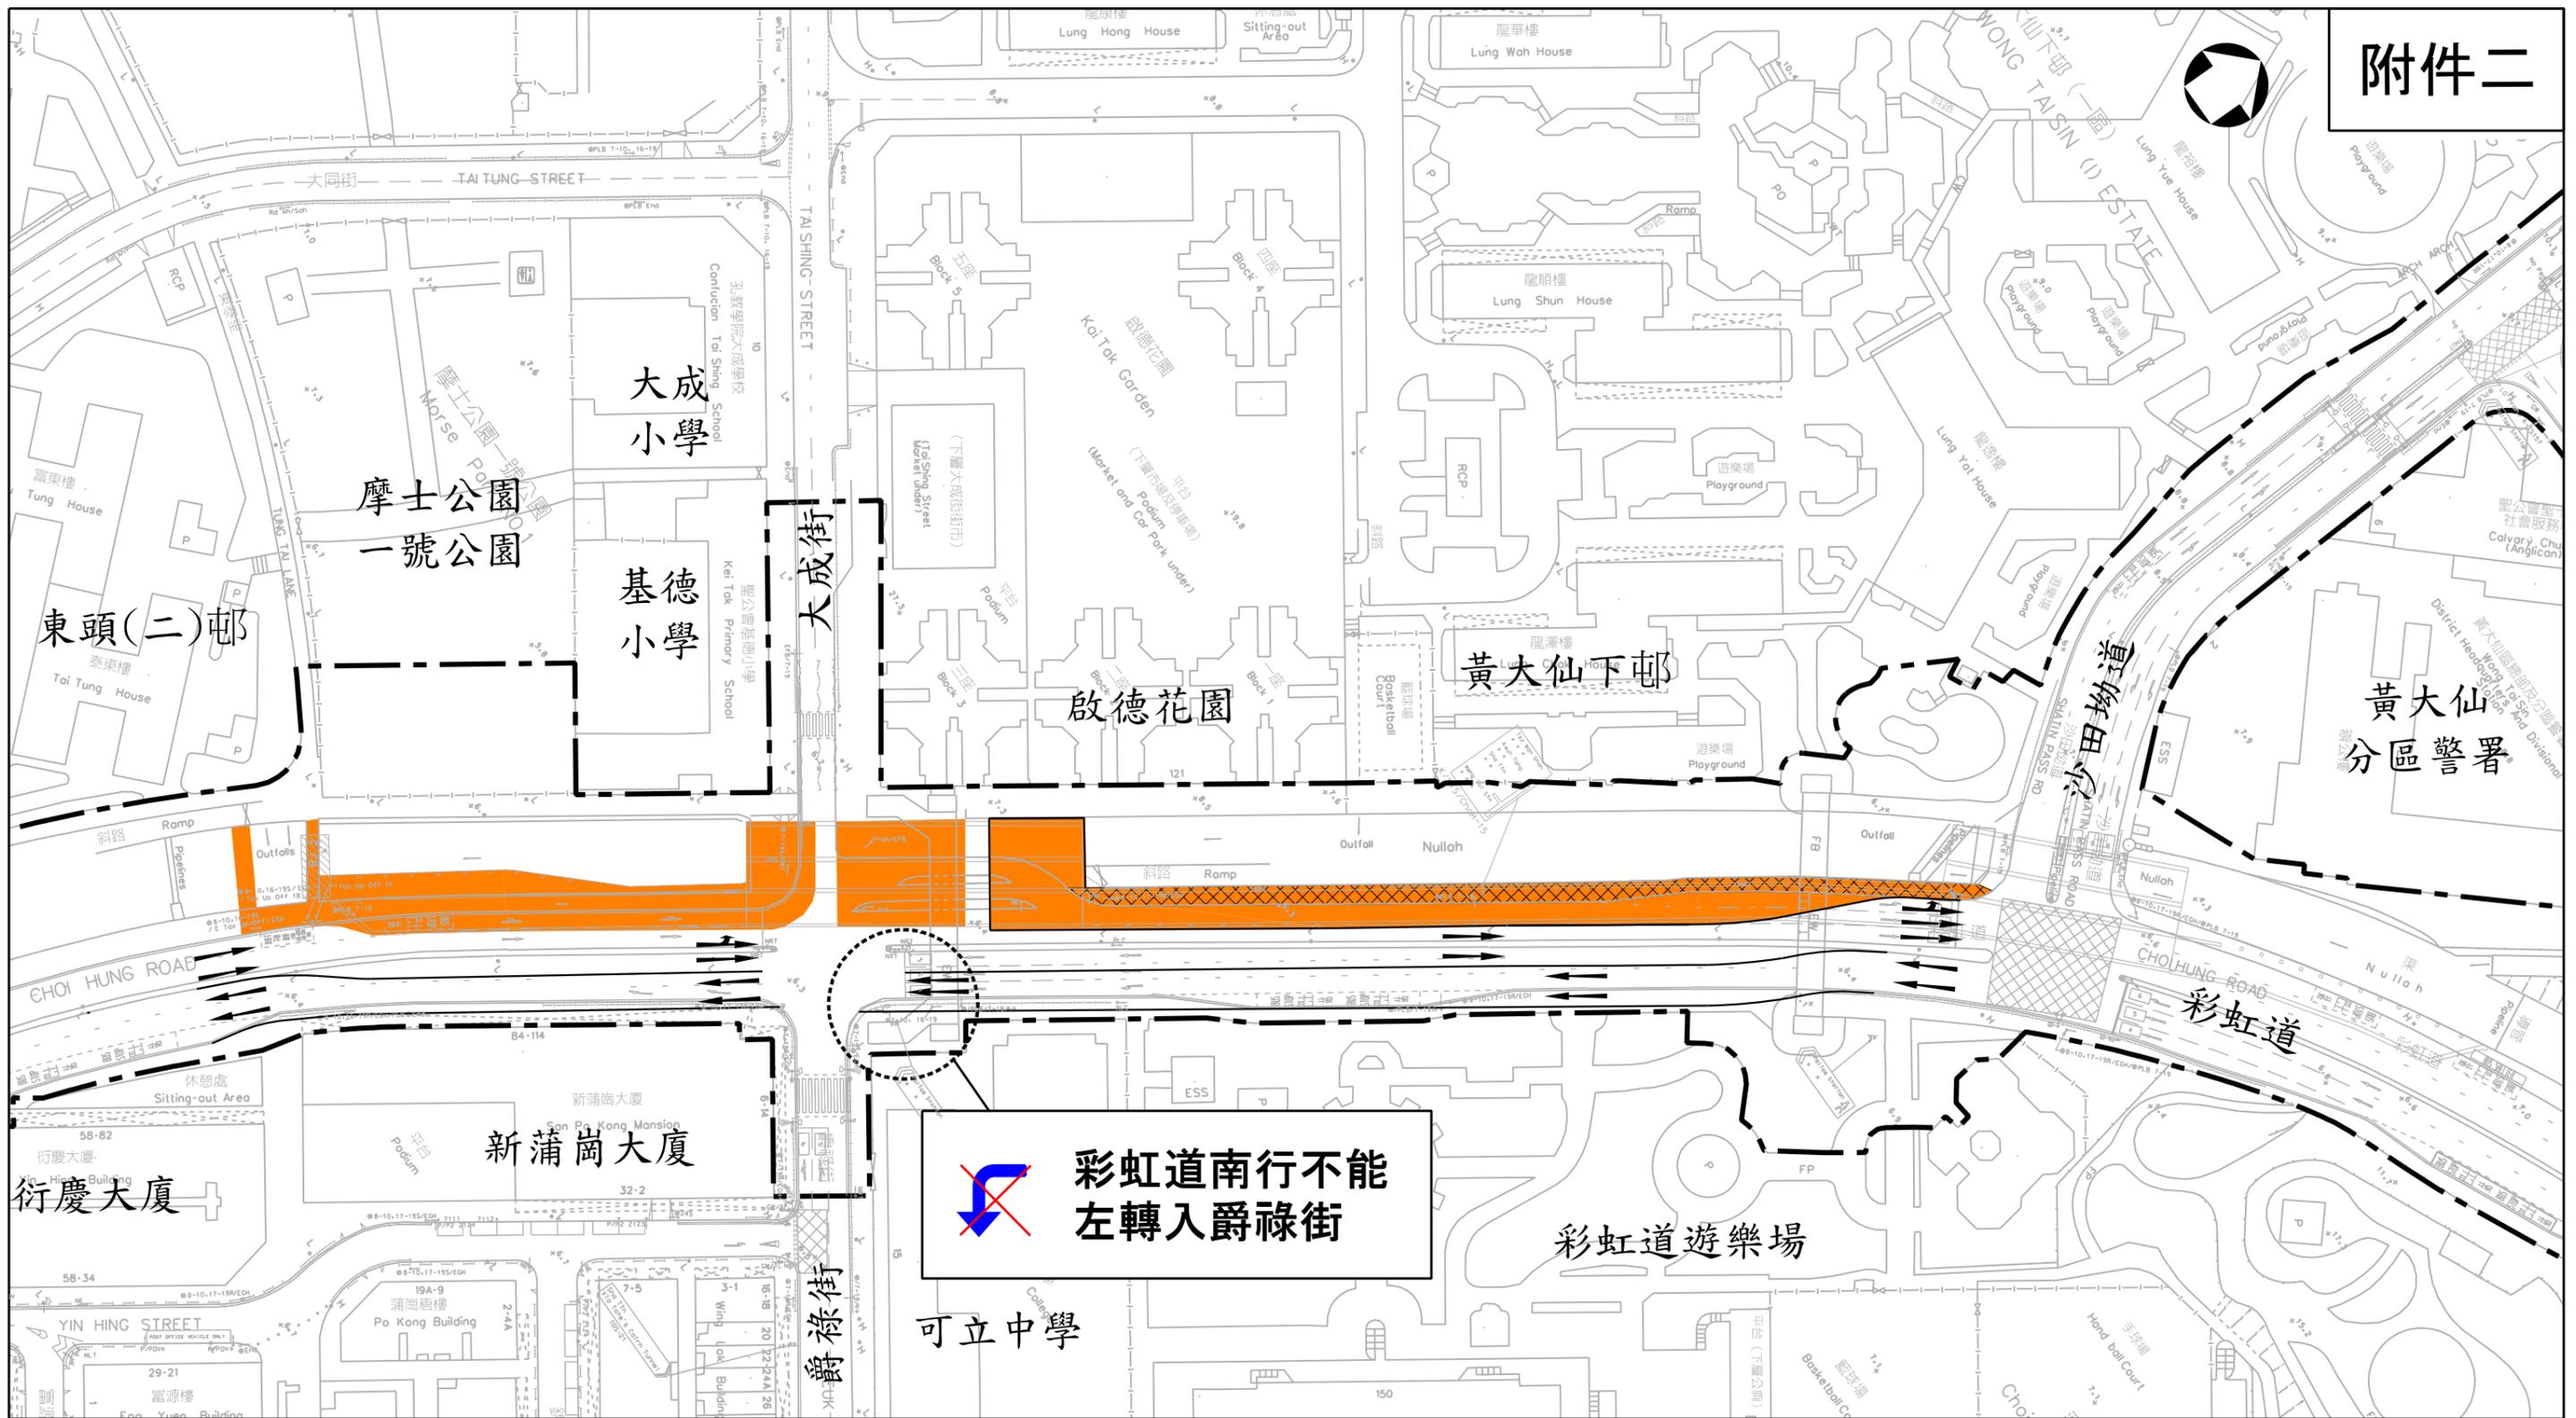

 彩虹道南行不能左轉入爵祿街


彩虹道南行不能左轉入爵祿街

圖例：  
 工地範圍

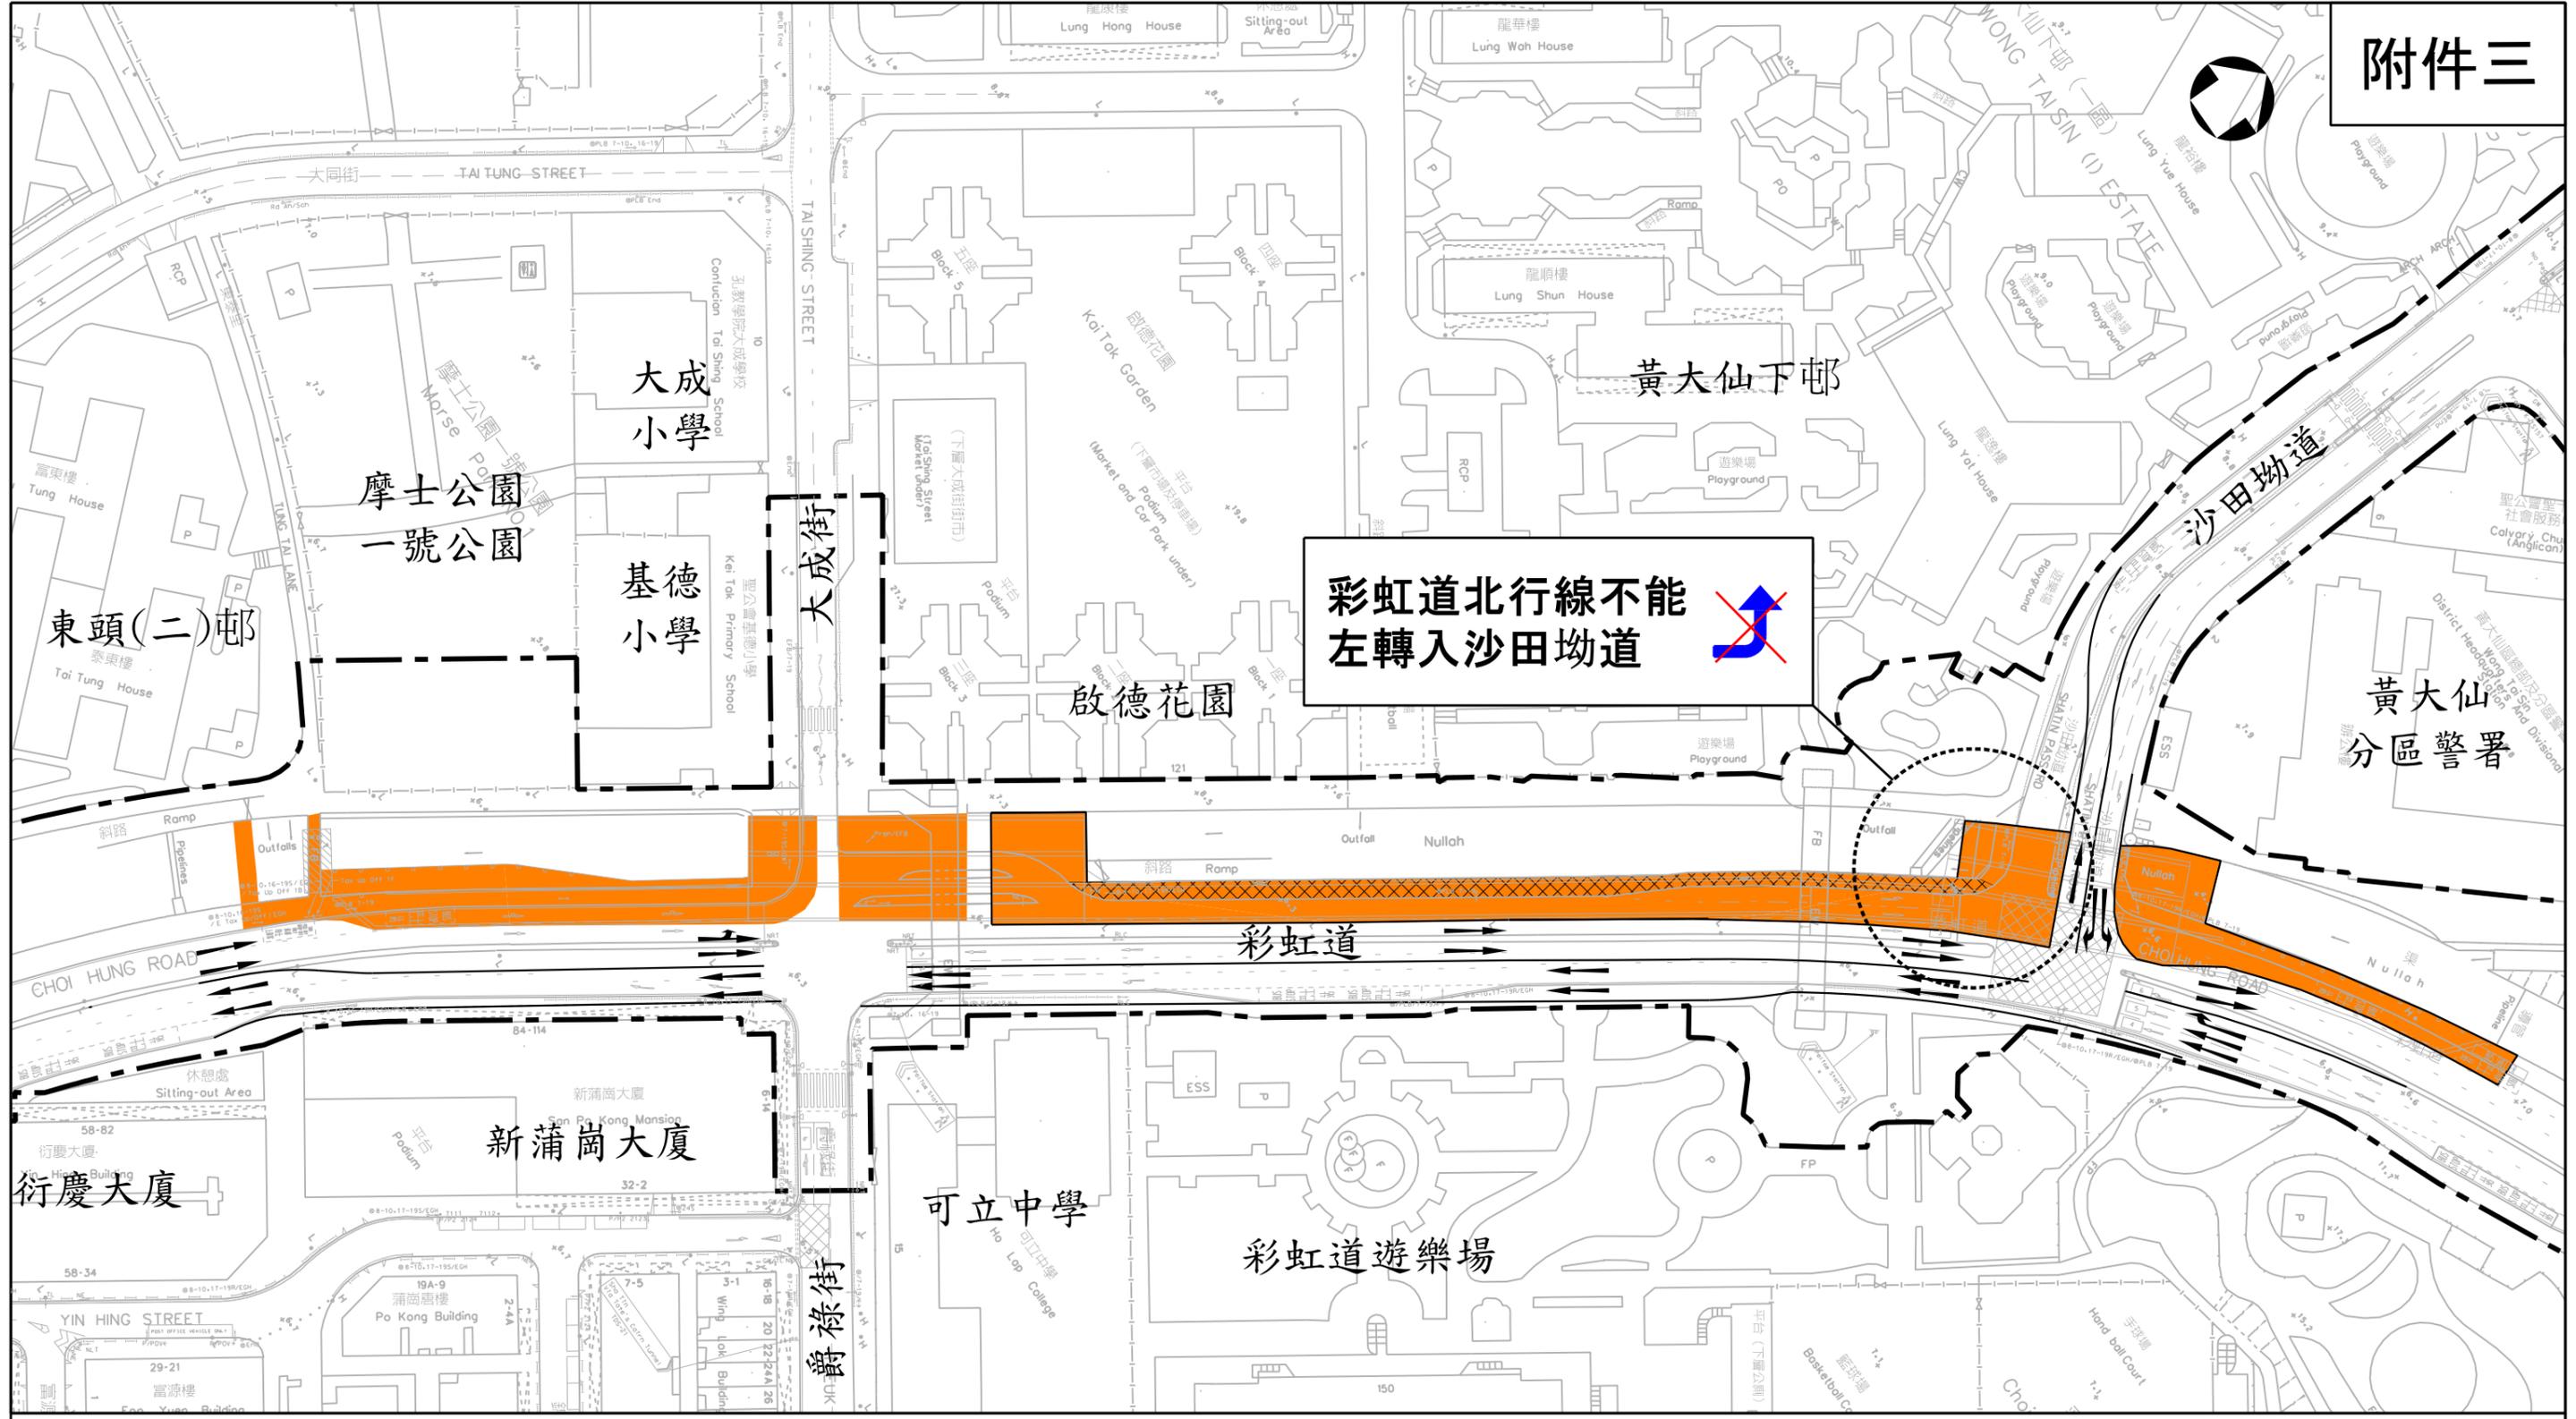

### 彩虹道北行不能左轉入沙田坳道

圖例：  
 工地範圍

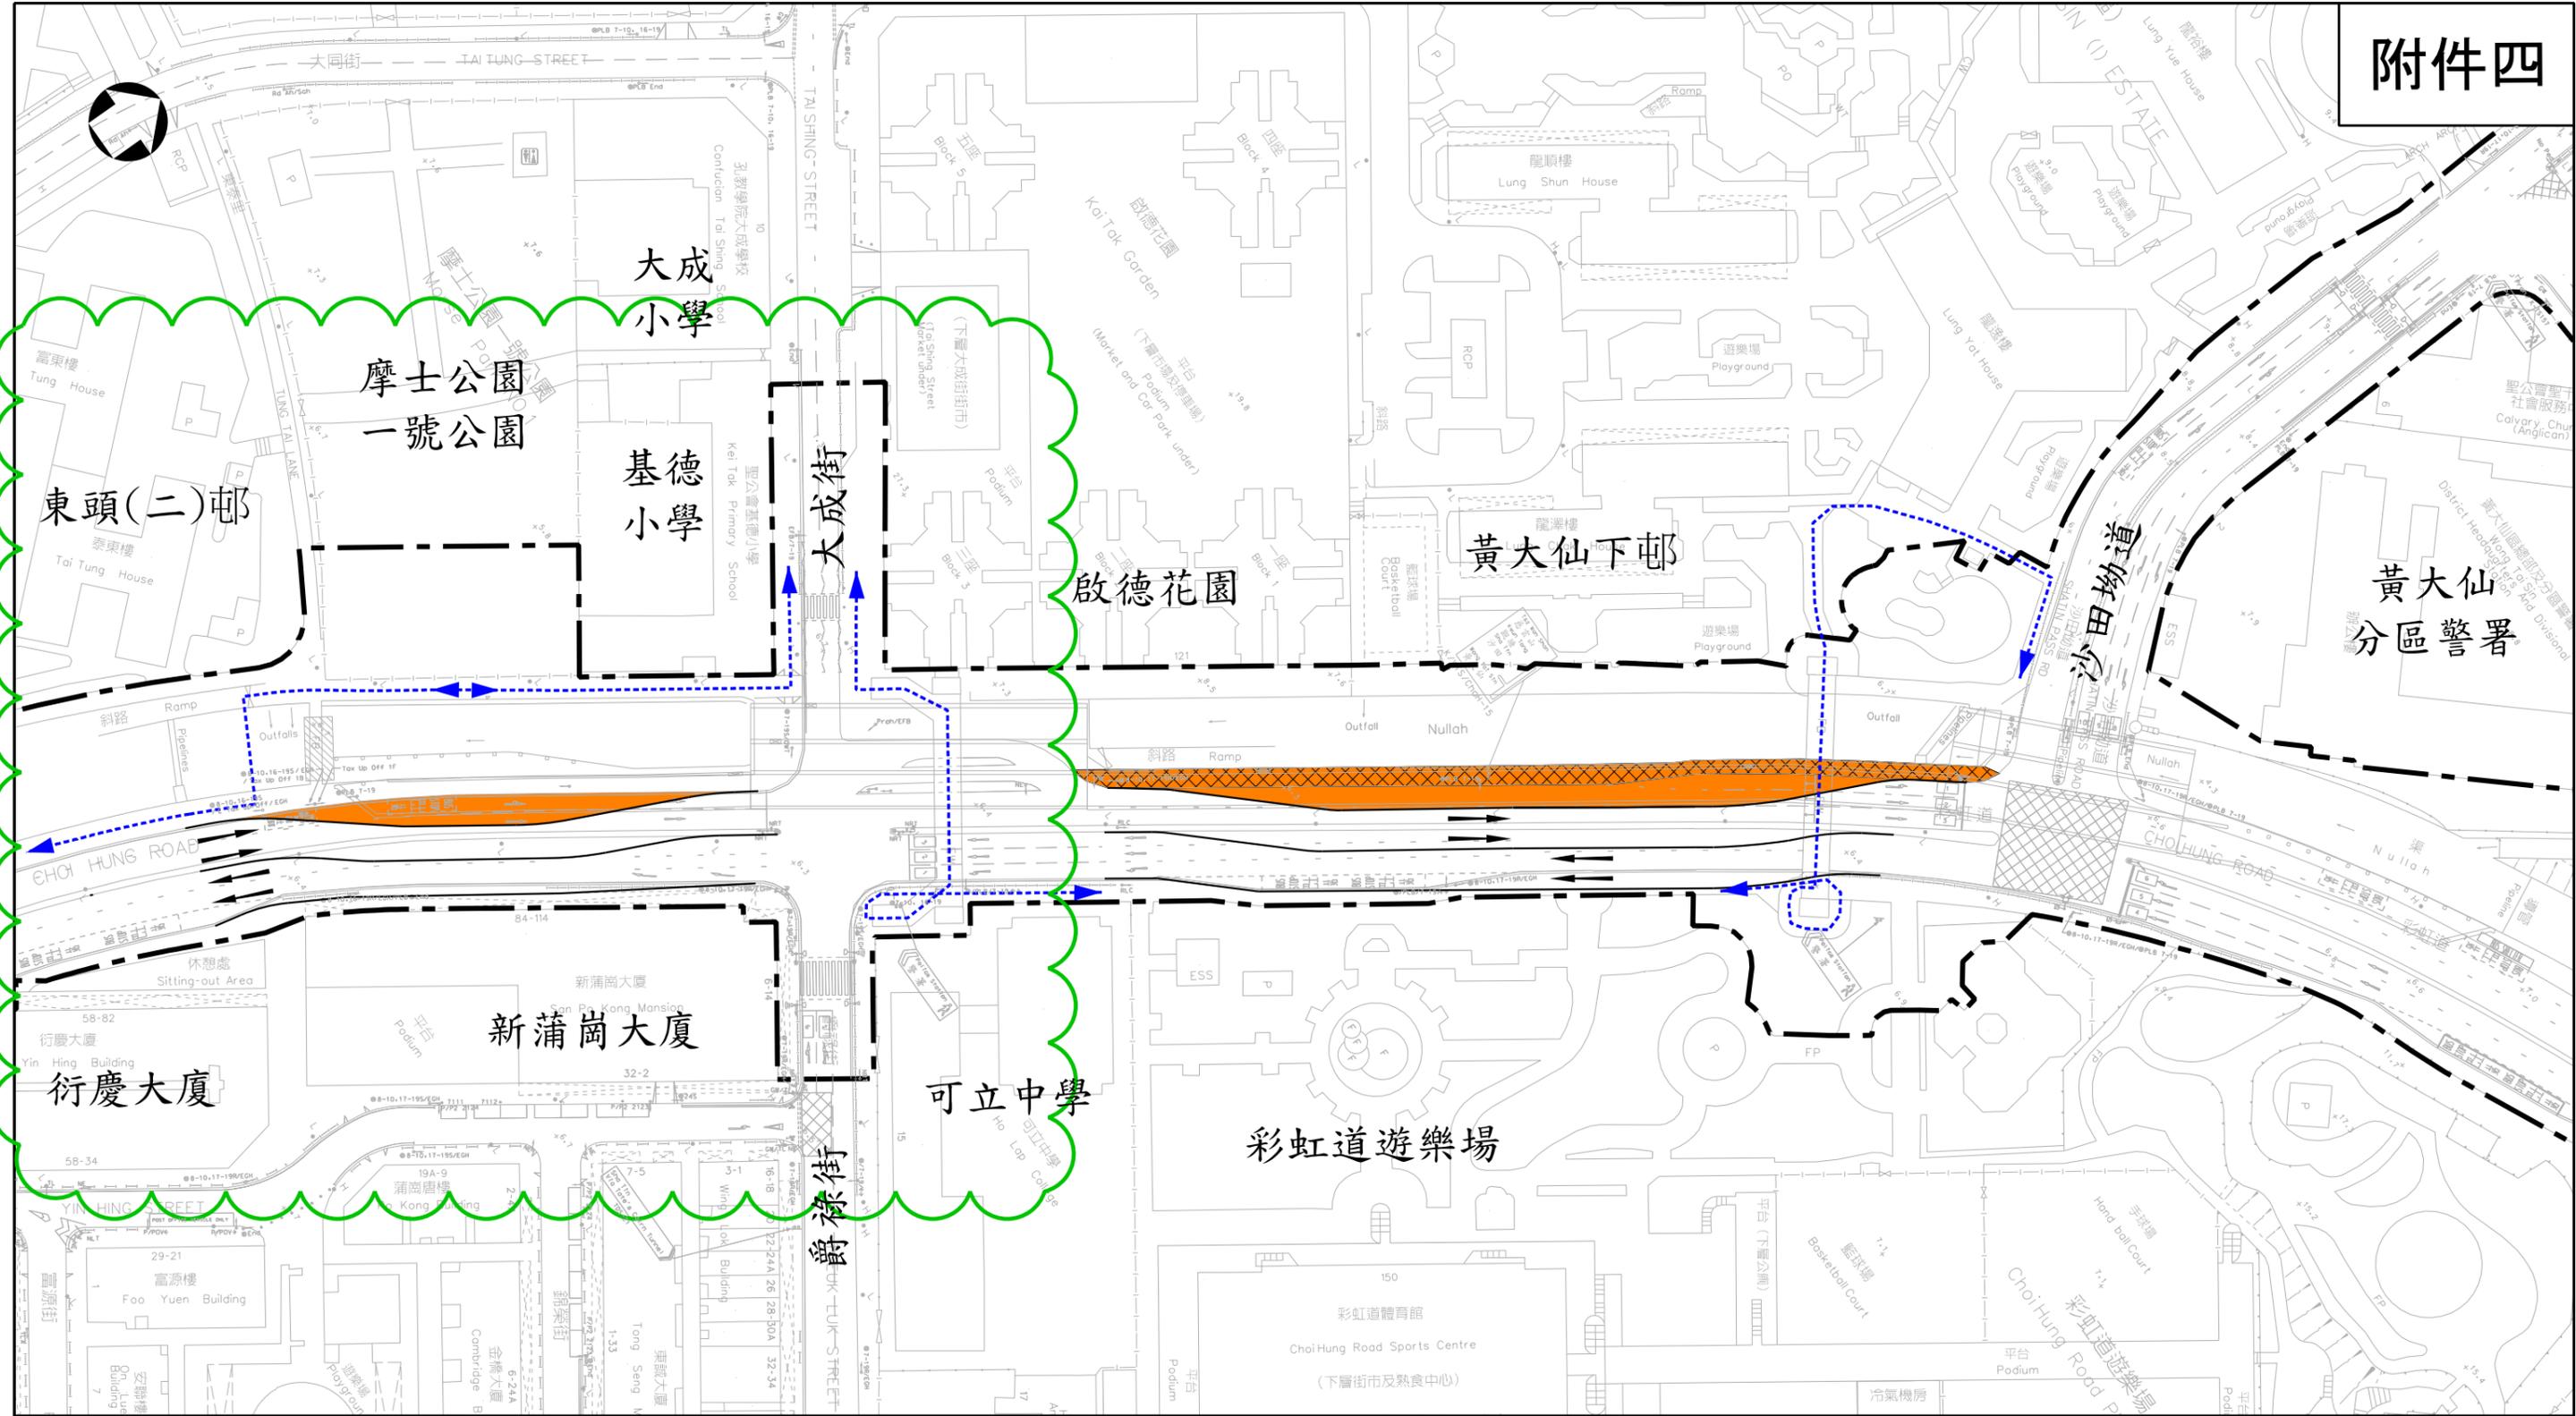

彩虹道近新蒲崗大廈交通改道安排

圖例:

工地範圍
