

渠務署  
工程合約編號 DC/2010/03  
太子道東啓德明渠改善工程進度報告

## 目的

1. 本報告旨在向黃大仙區議會轄下的政府及公共機構工程計劃工作小組成員匯報上述工程的進度。

## 工程進度

### 太子道東箱型暗渠工程

2. 本工程位於柏立基健康院對出的太子道東東西行線的第 5 階段暗渠工程現已完成，目前正進行太子道東西行線的最後階段（階段 6）工程部分（見圖一）。渠務署一直與運輸署及警務處交通部保持緊密聯絡，並就以上部門所提供的意見，檢視並修改有關臨時交通安排的設計，以保持太子道東的交通流量及保障道路交通安全。顧問工程師及承建商亦與其他於太子道東一帶施工的工程隊伍定時溝通，確保各方的臨時交通安排能互相配合，減低相關工程對道路使用者的影響。

3. 在完成箱型暗渠工程後，承建商會於明年初開始逐步分階段還原現有太子道東東西行線的路面。渠務署會諮詢運輸署及警務處交通部的意見，實施有關的臨時交通安排，以確保太子道東的交通安全。

4. 由於今年雨季的連場暴雨對箱型暗渠的工程進度帶來一定程度的影響。儘管如此，承建商已採取有效措施，務求盡快完成工程。渠務署將繼續密切監察承建商的工程進度，以期工程能夠盡快完成。

### 連接上下游之其他啓德河工程

5. 連接暗渠下游的另一期啓德河工程（由土木工程拓展署負

責)已於二零一三年一月動工。至於連接本地盤上游的啓德河中游工程(由渠務署工程管理部負責)預計於今年年底開始動工。在啓德河工程早期的設計及現時的施工階段,渠務署與土木工程拓展署一直保持緊密的溝通,以配合該工程的最新設計及施工安排。

## 總結

6. 我們會繼續就區內的工程向工作小組匯報,希望各工作小組成員可將是項工程的最新進展轉告附近居民及商戶,讓我們能更有效地與他們溝通及聯繫,進一步協調工程期間的施工安排。我們亦已開放熱線電話(電話號碼:5362 3389),以便市民查詢及收集公眾對本工程的意見。

## 文件提交

7. 本文件將提交政府及公用機構工程計劃工作小組二零一三年十二月十日會議,請委員備悉以上安排。

渠務署

二零一三年十一月

圖一

- 已完成的部分
- 建造中的部分

箱形暗渠  
分段建造的  
完成次序

- ① 第一階段
- ② 第二階段
- ③ 第三階段
- ④ 第四階段
- ⑤ 第五階段
- ⑥ 第六階段


| Rev. | Date | Description | Drawn | Checked |
|------|------|-------------|-------|---------|
| 修訂   | 日期   | 內容摘要        | 繪圖    | 校核      |

CONTRACT NO. DC/2010/03  
KAI TAK NULLAH  
IMPROVEMENT WORKS  
AT PRINCE EDWARD ROAD EAST

太子道東明渠改善工程  
工程進度  
二零一三年十一月

|                     |                   |               |                          |  |
|---------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|
| Drawing No.<br>圖則編號 | DC/2010/03/SK176N |               |                          |  |
| Designed<br>設計      | Drawn<br>繪圖       | Checked<br>校核 | Scale<br>比例 1 : 700 (A4) |  |
| Approved<br>批准      | Date<br>日期        | Status<br>狀況  |                          |  |
|                     | 22/11/13          |               |                          |  |

**URS** URS Hong Kong Ltd

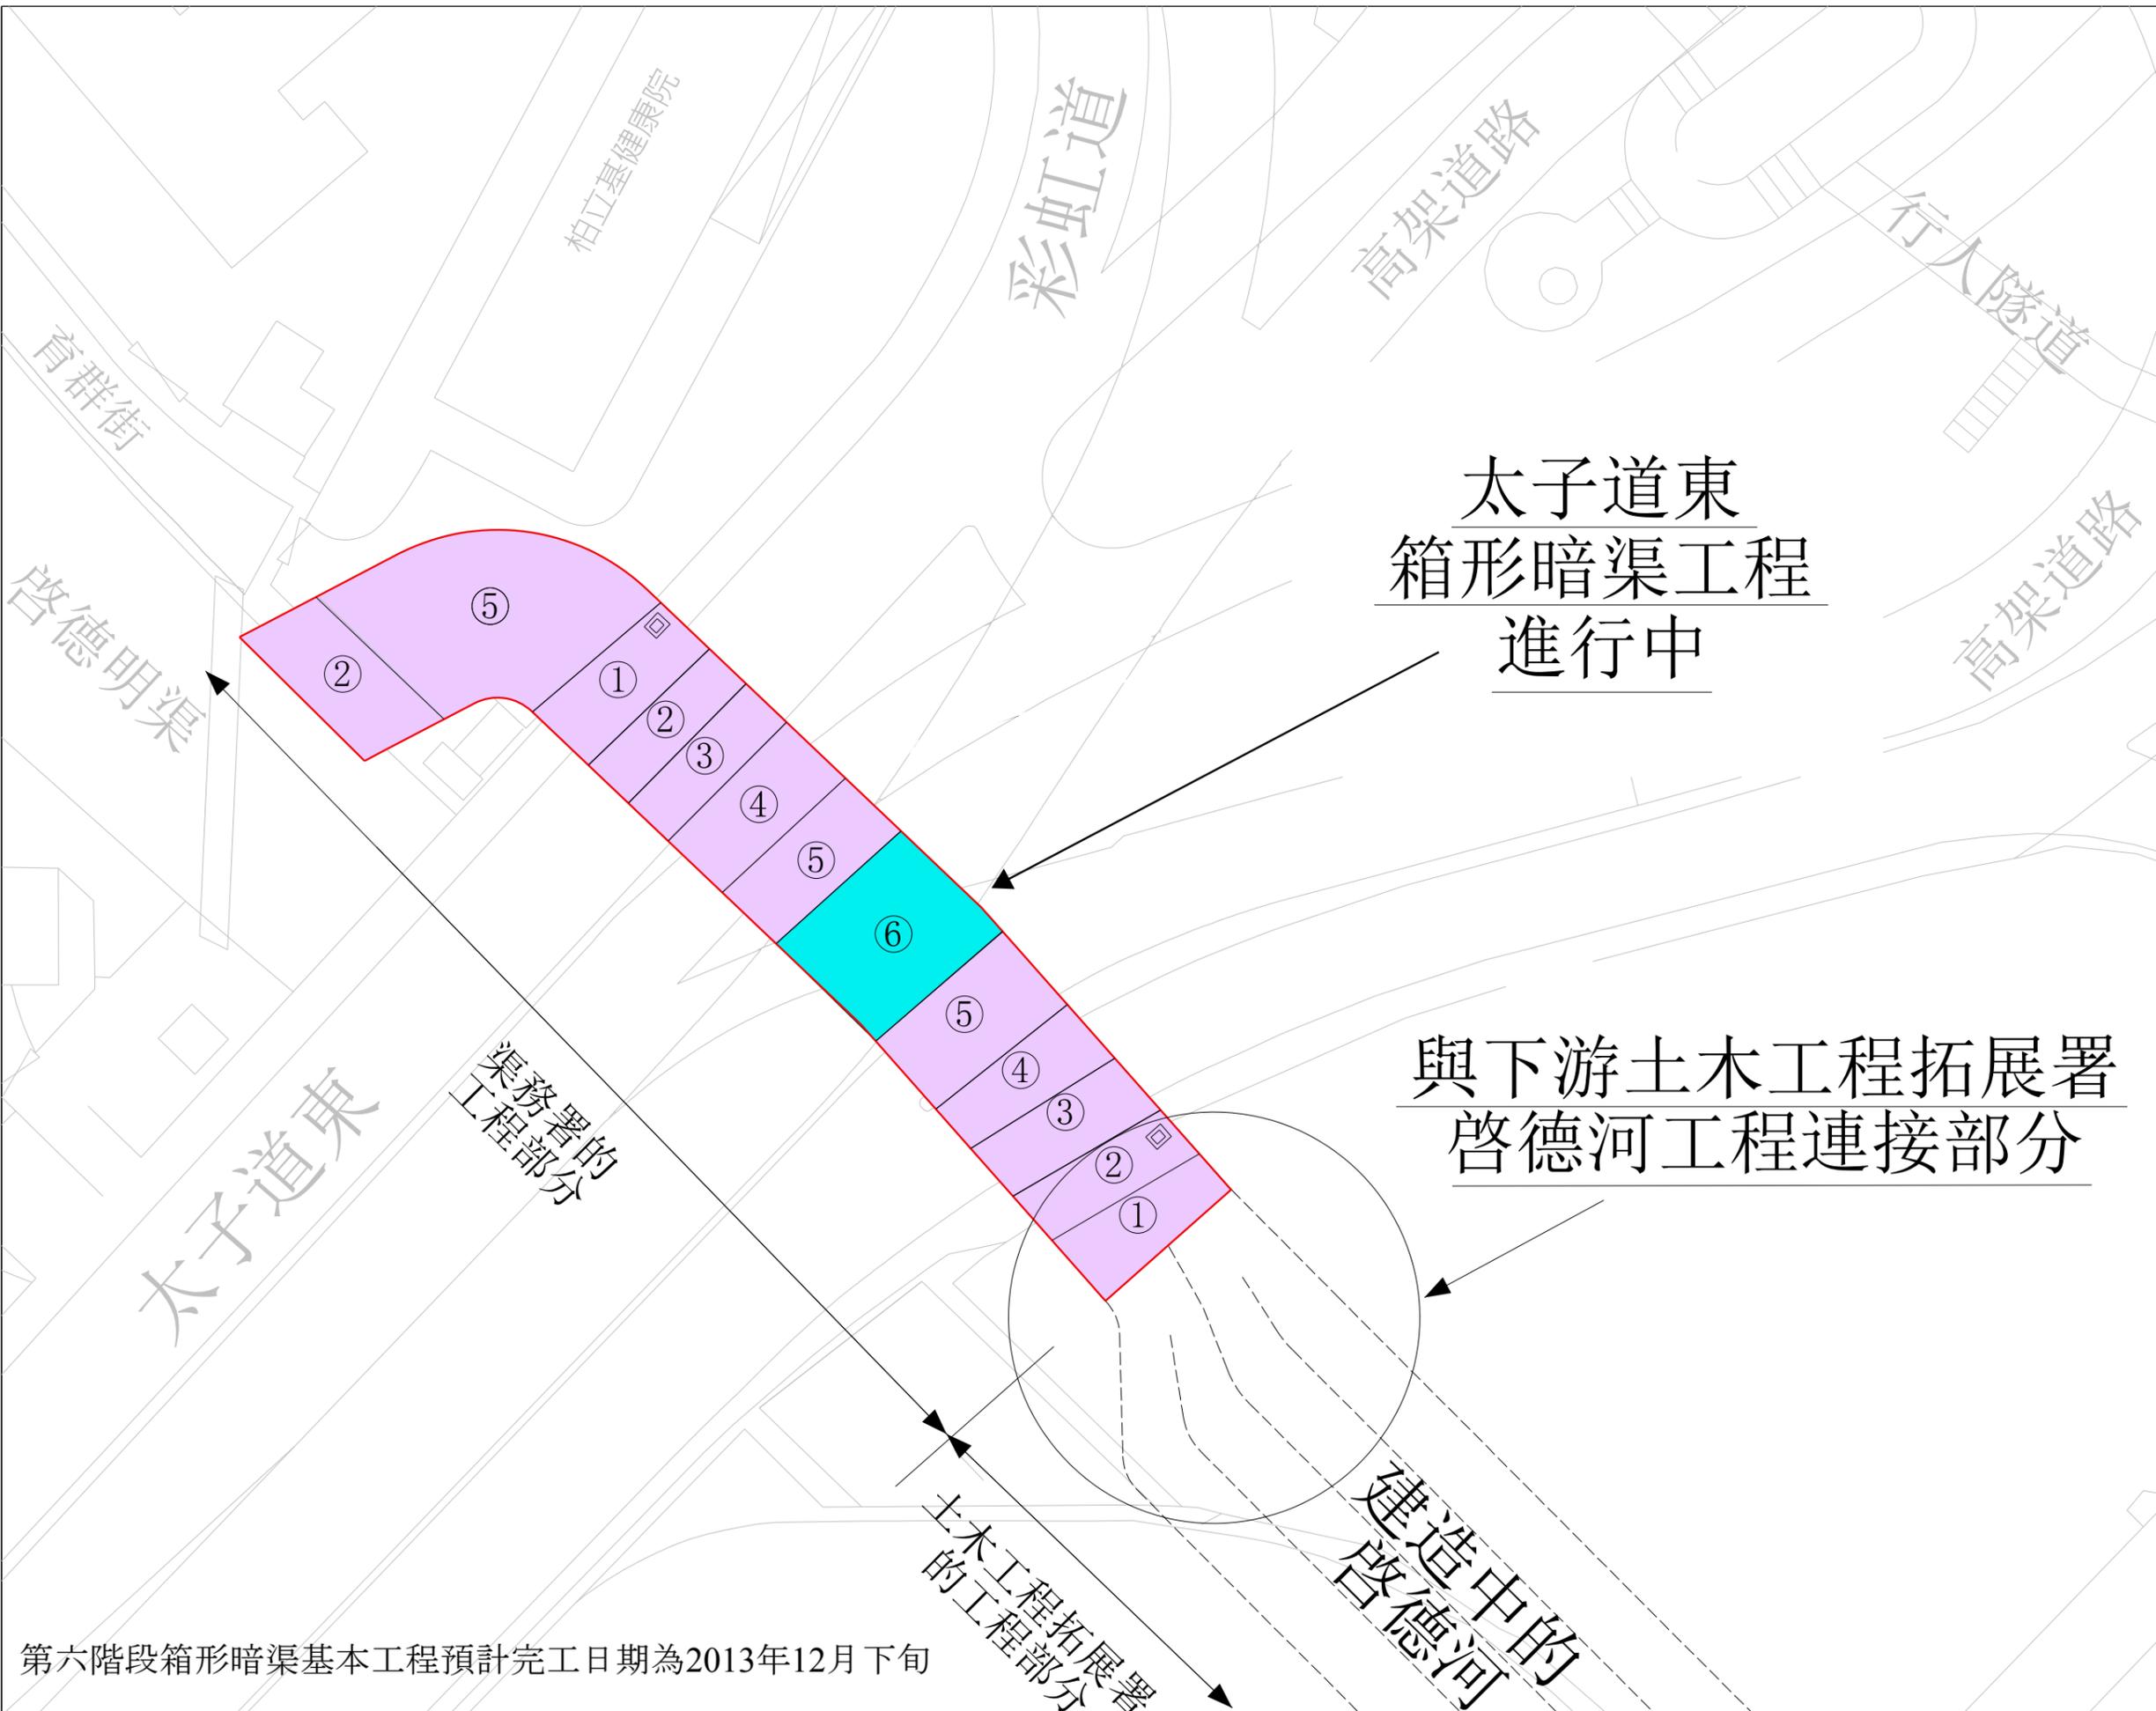

太子道東  
箱形暗渠工程  
進行中

與下游土木工程拓展署  
啓德河工程連接部分

建造中的  
啓德河

土木工程拓展署  
的工程部分

第六階段箱形暗渠基本工程預計完工日期為2013年12月下旬
