

黃大仙區議會轄下

政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 3/2014 號(18.3.2014)

渠務署

工程合約編號 DC/2010/03

太子道東啓德明渠改善工程進度報告

目的

1. 本報告旨在向黃大仙區議會轄下的政府及公共機構工程計劃工作小組成員匯報上述工程的進度。

工程進度

太子道東箱型暗渠工程

2. 本工程位於太子道東柏立基健康院對出的最後一段箱型暗渠結構（圖中顯示第六階段）現已建造完成（見圖一）。在完成箱型暗渠建造後，承建商會逐步分階段還原現有太子道東東西行線的路面及交通設施。在此階段實施有關的臨時交通安排時，渠務署會諮詢運輸署及警務處交通部的意見，並就以上部門所提供的意見，檢視並修改有關臨時交通安排的設計，以確保太子道東的交通不受影響。

連接上下游之其他啓德河工程

3. 連接暗渠下游的另一期啓德河工程（由土木工程拓展署負責）已於二零一三年一月動工。至於連接本地盤上游的啓德河中游工程（由渠務署工程管理部負責）已於二零一三年年底動工。在啓德河工程早期的設計及現時的施工階段，渠務署與土木工程拓展署一直保持緊密的溝通，以配合該工程的最新設計及施工安排。

總結

4. 我們會繼續就區內的工程向工作小組匯報，希望各工作小組成員可將是項工程的最新進展轉告附近居民及商戶，讓我們能更有效地與他們溝通及聯繫，進一步協調工程期間的施工安排。我們亦已開放熱線電話（電話號碼：2382 7223），以便市民查詢及收集公眾對本工程的意見。

文件提交

5. 本文件將提交政府及公用機構工程計劃工作小組二零一四年三月十八日會議，請委員備悉以上安排。

渠務署

二零一四年三月

圖一

已完成的
暗渠結構部分

箱形暗渠
分段建造的
完成次序


- ① 第一階段
- ② 第二階段
- ③ 第三階段
- ④ 第四階段
- ⑤ 第五階段
- ⑥ 第六階段

Rev.	Date	Description	Drawn	Checked
修訂	日期	內容摘要	繪圖	審核

CONTRACT NO. DC/2010/03
KAI TAK NULLAH
IMPROVEMENT WORKS
AT PRINCE EDWARD ROAD EAST

太子道東明渠改善工程
工程進度
二零一四年三月

Drawing No.	DC/2010/03/SK176P			
設計	Drawn	Checked	Scale	
	KC		1 : 700 (A4)	
Approved	Date	Status		
	27/2/14	覆覓		

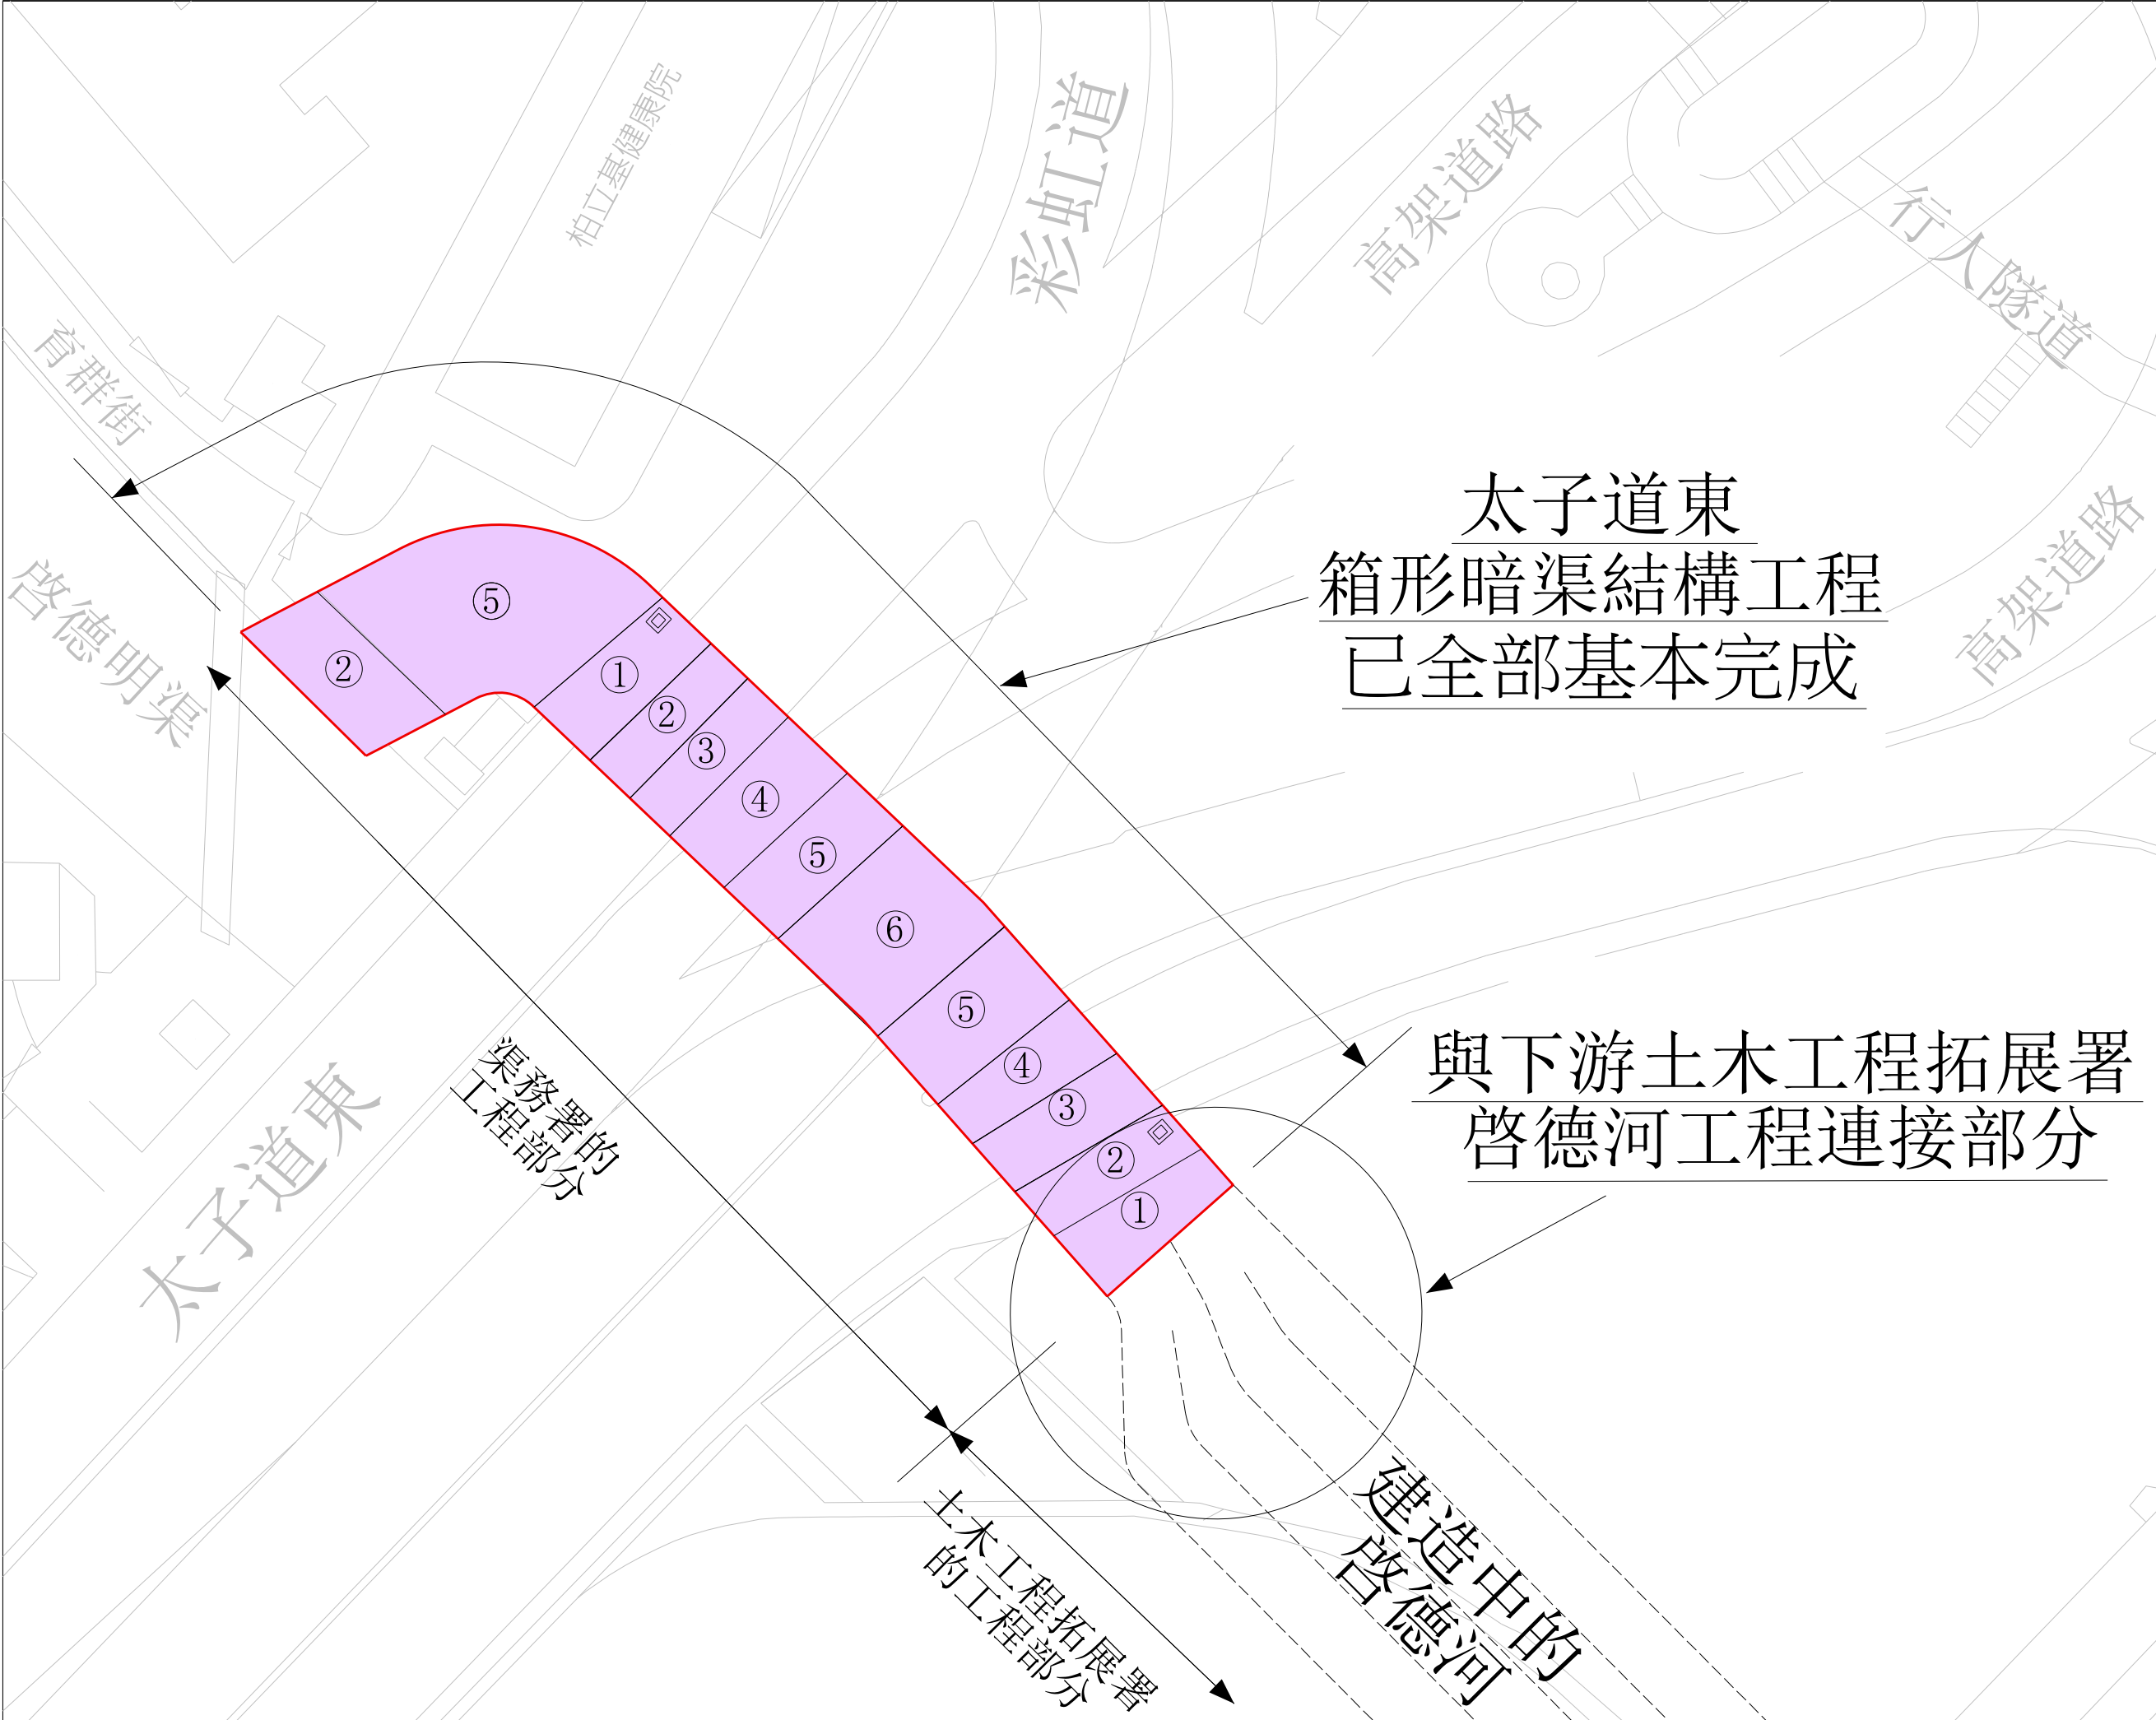

太子道東
箱形暗渠結構工程
已全部基本完成

與下游土木工程拓展署
啓德河工程連接部分

渠務署的
工程部分

土木工程拓展署
的工程部分

建造中的
啓德河
