

黃大仙區議會轄下

政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 10 / 2014 號 (17.6.2014)

渠務署

工程合約編號 DC/2010/06

九龍中部及東部污水收集系統改善工程(第 2 期)進度報告

目的

這份文件的主要目的，是向黃大仙區議會轄下政府及公用機構工程計劃工作小組各成員，匯報本工程位於黃大仙區內的進度。

工程計劃

牛池灣富池徑及龍翔道(行人路)更換污水渠工程 (請參閱附圖)

2. 位於龍翔道行人路的探坑工程，已於本年 4 月展開，現已大致完成。由於地下公用設施眾多，現正檢討更換污水渠工程的施工方式，預計工程於本年 6 月展開，並於本年下旬完成。

3. 至於富池徑商戶對出行人路的污水渠工程，在得悉及考慮過商戶、地區人士及當區區議員的意見後，本署現正計劃由原來採用明坑開掘之方式，改為無坑挖掘方法更換該段的污水渠，以減低對附近商戶及居民的影響。而無坑挖掘的其他工程亦包括於新建渠道的兩端(富池徑行人路醫生診所對出位置及龍翔道行人路近樓梯位置)建造豎井。

4. 承建商計劃於本年 6 月先於診所對出位置進行探坑工程，工期約 1 星期，工程進行期間，富池徑行人路會預留 1.5 米供市民使用。探坑工程完成後，承建商會先回填並重開路面。接著承建商會於富池徑行人路地底挖掘隧道以更換污水渠，於工程進行期間，富池徑行人路路面將不受影響。隨後，承建商需於診所對出位置開挖路面和進行沙井建造工程。預計富池徑內整段的渠務工程可於本年下旬完成。

工程計劃的諮詢進度

5. 渠務署已於本年 4 月下旬繼續就最新工程計劃，特別是工程挖掘方式方面，進一步向受影響的商戶進行諮詢。同時亦於本年 4 月下旬，就工程的最新計劃詳情及進度，向當區區議員滙報。另外，於工程進行期間，本署會繼續向當區區議員作緊密接觸及滙報工程進度。

總結

6. 我們會繼續與當區區議員、地區人士、附近居民和商戶及持份者保持溝通，並盡量配合他們的需要，以減低工程對他們造成的影響。而我們亦已設立了二十四小時熱線（電話號碼：8203 8850），以便市民查詢和收集意見，冀望工程能得以順利開展及儘早完成。

文件提交


7. 本文件將提交政府及公用機構工程計劃工作小組二零一四年六月十七日會議，請委員備悉以上安排。

渠務署

二零一四年六月



附圖

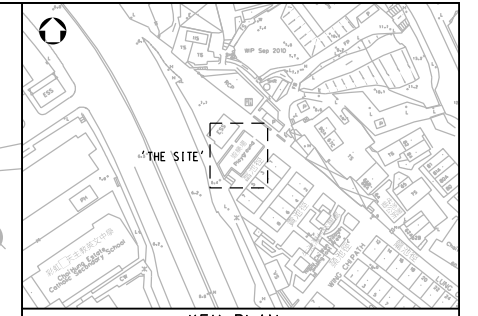

KEY PLAN SCALE: N.T.S.

LEGEND:

- 原有污水渠走線
- 建議的污水渠走線

建議的污水渠走線
(以無坑挖掘方式更換)

(明坑挖掘)

-	SITE SKETCH	SL	11/13	JC	HFC
REV	DESCRIPTION	BY	DATE	CHKD	AUTH

渠務署
Drainage Services Department

顧問工程管理部
Consultants Management Division

ATKINS 阿特金斯顧問有限公司
Atkins China Ltd

CONTRACT
九龍中部及東部
污水收集系統改善工程 - 第2期

CONTRACT No. DC/2010/06

TITLE
黃大仙區工程項目位置 (附圖)

SCALE AT A3	DESIGN SL	DRAWN BW	CHECKED JC	AUTHORISED HFC
AS SHOWN	DATE FEB 14	DATE FEB 14	DATE FEB 14	DATE FEB 14

DRAWING No. DC/2010/06/SK/828



LAYOUT PLAN
SCALE: 1:250

