

中西區區議會食物環境衛生及工務委員會第六次會議 (2011年1月13日)

中西區區內下游地區的渠務改善工程進度滙報

I. 自上次滙報後完成的工程 (2010年10月1日至2010年12月31日)：

項目	位置	動工日期	預計完工日期	實際完工日期	備註
C240-1B*	北街(南段)近石山街	01.2010	10.2010	10.2010	

II. 進行中的渠務工程，其位置如下並在圖則 DC0719/2 標出：

項目	位置	動工日期	預計施工期(月)	預計完工日期	施工模式	有無臨時交通管理安排	備註
CD-1*	加多近街及域多利道	06.2009	19	02.2011	無坑及開坑挖掘	有	因工地附近持續發現有水管滲漏的情況，經水務署要求，本署須移除所有地盤設施，讓出工地予水務署進行緊急維修，至十二月才重新開始工程，前後影響共三個月，故工程需順延至2011年2月完成。
C10-3*	戲院里	09.2009-02.2010	14	05.2011	無坑及開坑挖掘	有	無坑挖掘部份：已完成挖掘頂管井，現正安排進行頂管工序。 開坑挖掘部份：配合陸海通大廈及永安人壽大廈重建工程，並一系列相配合的地下設施重鋪工程，本署及承建商應運輸署及警方要求，負責與各公用設施機構協調，以避免重複開挖路面，並減少對公眾的滋擾。工程如期進行中。
		08.2010					
S4*	皇后大道西(近日富里段)	07.2009-06.2010	15	04.2011	開坑挖掘	有	因水務署於進行喉管接駁工程期間，發現水管出現滲漏情況，需要進行維修，水務工程較原先預計延遲兩個月至2010年12月才完成，並交還工地予本署繼續工程，至約2011年4月完成。
		12.2010					
AD-1*	皇后大道西(東邊街至正街段)	08.2009	19	03.2011	開坑挖掘	有	與水務署的輸水管利用共同坑道一併鋪設，以減低對公眾之影響。工程如期進行中。
D2*	德輔道西(東邊街至正街)	09.2009-04.2010	12	03.2011	開坑挖掘	有	與水務署的輸水管利用共同坑道一併鋪設，工程現正進行中。
		10.2010					
CD-4*	德輔道西(水街至朝光街)	10.2009	15	01.2011	開坑挖掘	有	因電車公司需要進行緊急路軌維修工程，故本工程需讓出工地，進度受阻約兩星期。工程將順延至2011年1月完成。
AD-5*	租庇利街(干諾道中至德輔道中段)	12.2009	19	07.2011	開坑挖掘	有	工程進行中。
D11*	北街近堅尼地城新海旁	11.2010	4	03.2011	開坑挖掘	有	北街渠務工程(北段)亦大致完成，現祇餘下橫過堅尼地城新海旁一段，預計於2011年3月完成。
AD-3*	皇后街(干諾道西至德輔道西)(上游部份)	02.2010	15	05.2011	無坑挖掘	有	頂管工程已完成，現正安排維修沙井建造工程。
C3-1B*	德輔道西近山道	02.2010	14	04.2011	無坑及開坑挖掘	有	工程進行中。
C3-2*	皇后大道西(山道至屈地街)	03.2010	12	03.2011	無坑及開坑挖掘	有	由於發現大量地下公共設施，現正研究將餘下工程的其中一部份改為無坑挖掘，避免因等候地下設施改道而影響工程進度。由於工程階段一及二已完成，原本改動的臨時巴士站亦已改回原位。

S5*	東邊街	06.2010	11	05.2011	無坑挖掘	有	因受運輸署及警方的最新交通管制措施安排所限制，原先工序內同步建造頂管井及接管井的安排需要分開進行；影響了整項工程的進度，工程最新預計需於 2011 年 5 月完成。
C3-1A*	德輔道西(無坑部份)	05.2010	15	08.2011	無坑挖掘	有	現正建造頂管井。
S2A*	卑路乍街近山市街	07.2010	7	02.2011	開坑挖掘	有	工程第一階段已完成。因應運輸署要求，現正就第二階段工程安排試路，測試交通流量後才展開該段工程。
C10-3A*	德輔道中(德忌利士街至戲院里)	07.2010	11	06.2011	開坑挖掘(夜工)	有	爲了減輕對交通的影響，工程於晚間及假日早上進行，工程現正進行中。
E3*	干諾道中(近信德中心)	08.2010	12	08.2011	開坑挖掘	有	工程主要在行人路上進行，因發現大量地下公共設施，現正挖掘勘察井，尋找適合的位置安裝渠管。
AD-2A*及AD-2B*	正街(中段及南段)	12.2010	12	12.2011	無坑及開坑挖掘	有	現正研究將正街中段及南段的工程合併改爲無坑挖掘的可行性，以進一步減少對公眾的影響。建造頂管井工程將於公共設施及污水渠管改道後展開。

III. 預計在六個月內動工的渠務工程，其位置如下並在圖則 DC0719/2 標出：

項目	位置	動工日期	預計施工期(月)	預計完工日期	施工模式	有無臨時交通管理安排	備註
E2*	德輔道中與禧利街交界	02.2011	4	06.2011	開坑挖掘(夜工)	需要	工程將安排於晚上及假日早上進行，以減低對交通的影響。由於附近有其他工程正在進行，並有臨時交通改道安排，與負責部門協調後，本工程需延至 2011 年 2 月動工。
AS1*	卑路乍街(士美菲路至北街)	02.2011	8	10.2011	渠管內壁更新(無坑、夜工)	需要	爲避免影響日間繁忙的交通，工程將安排在晚間及假日早上進行。應運輸署要求，工程展開前將進行試路，測試交通流量，現正整理有關資料及預計施工期，再與當區區議員商討有關安排。
D9*	干諾道中近畢打街	02.2011	18	08.2012	開坑挖掘(夜工)	需要	由於附近正進行水務工程，爲免對交通造成影響，經協調後，工程將延至水務工程於 2011 年初完成後才展開。
AD-5A*	租庇利街(德輔道中至皇后大道中)	02.2011	12	02.2012	開坑挖掘	需要	現正與附近受影響大廈商討工程安排。
C38-1*	加惠民道	02.2011	16	06.2012	開坑挖掘	需要	早前已就工程安排與當區區議員、居民及附近的學校商討，現正根據所收集的意見及資料審視施工安排、可行的工作時段、以及工程的設計等，再作諮詢。
S11	夏慤道近添華道	02.2011	4	06.2011	開坑挖掘	需要	工程主要在行人路上進行。
AS2	干諾道西近東邊街	02.2011	11	01.2012	渠管內壁更新(無坑挖掘)	需要	工程展開前將安排試路，測試交通流量。
C42-1	德輔道西近修打蘭街	04.2011	6	10.2011	開坑挖掘	需要	工程展開前將安排試路，測試交通流量。
CD-5A	高陞街	04.2011	6	10.2011	開坑挖掘	需要	工地附近正進行水務工程，協調後預計於 2011 年 4 月展開工程。

* 已於上次會議滙報

渠務署工程管理部
2010 年 12 月 31 日


圖例

LEGEND:

- 已完成的渠務工程
DRAINAGE WORKS COMPLETED
- 進行中的渠務工程
DRAINAGE WORKS IN PROGRESS
- 預計在六個月內動工的渠務工程
DRAINAGE WORKS ANTICIPATED TO COMMENCE IN SIX MONTHS



維多利亞港
VICTORIA HARBOUR

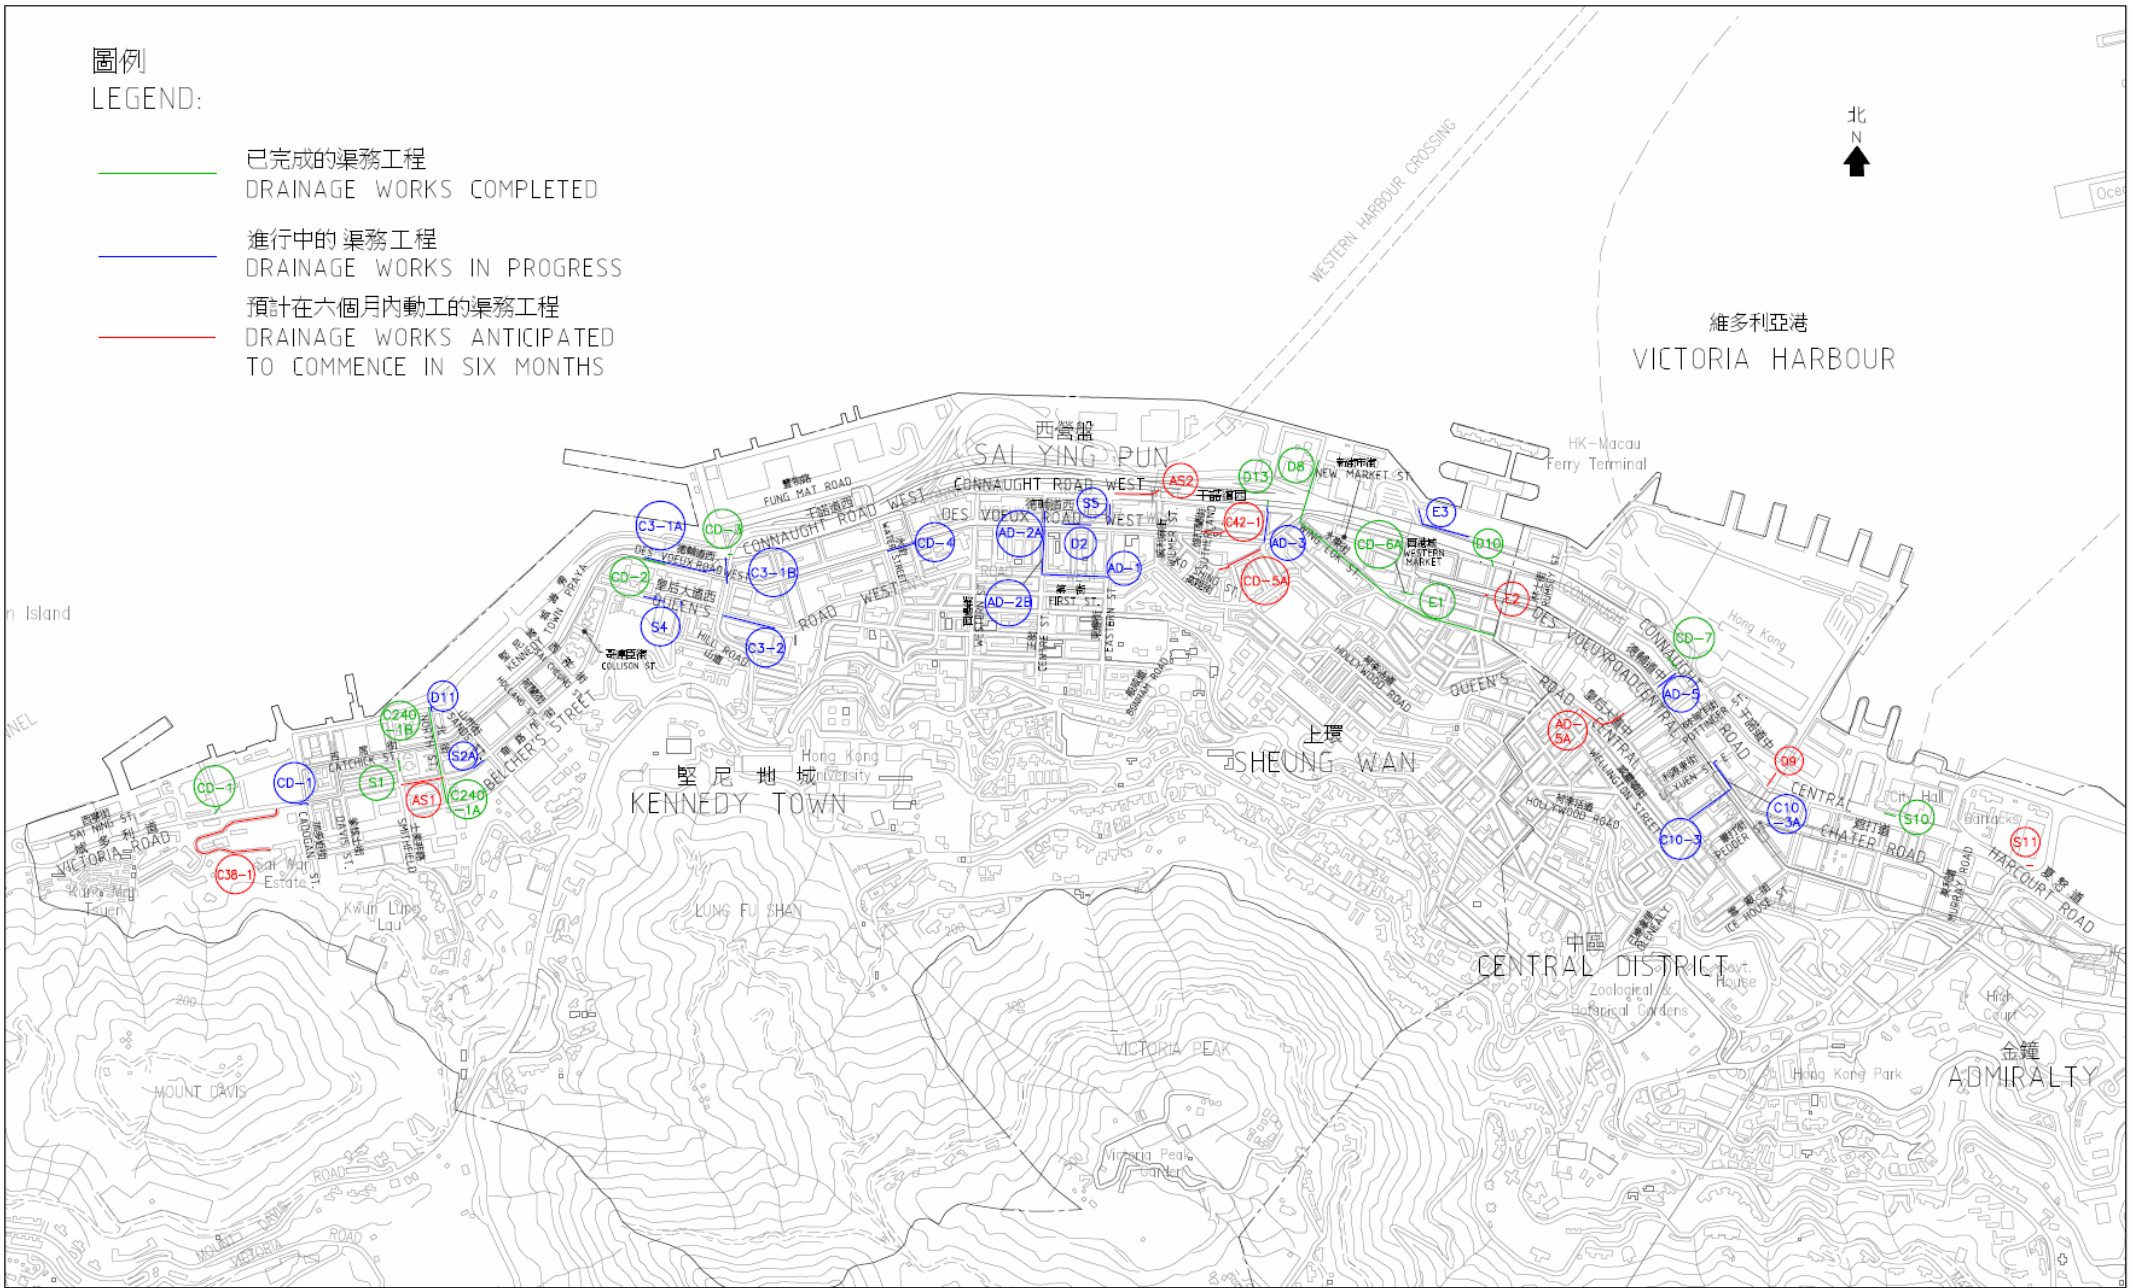

CONSULTING ENGINEERS



AECOM Asia Company Limited

中西區區內的渠務工程進度匯報
WORKS IN CENTRAL AND WESTERN DISTRICTS - PROGRESS UPDATE

中西區區議會食物環境衛生及工務委員會會議 (2011 年 01 月 13 日)
Central & Western District Council, Food, Environment, Hygiene & Works Committee Meeting (13.01.2011)

繪圖 DRAWN	H. M. CHEUNG	31.12.2010
檢查 CHECKED	K. C. CHU	31.12.2010
圖號 DRG.NO.	DC0719/2	比例 SCALE N.T.S.



香港特別行政區渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT
GOVERNMENT OF THE
HONG KONG
SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION

工程管理部
PROJECT MANAGEMENT DIVISION
