

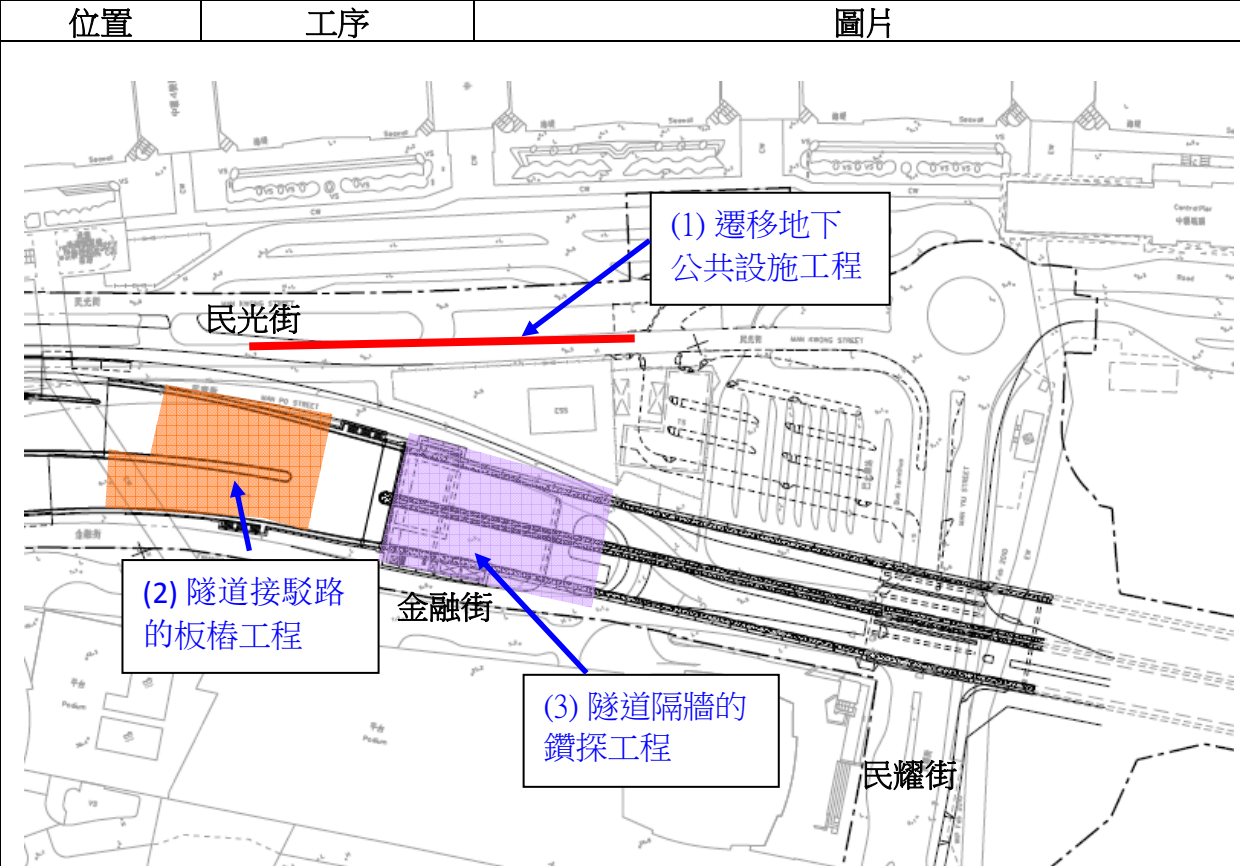

「中環灣仔繞道和東區走廊連接路（中環灣仔繞道）」工程項目

工程進度簡報(2011年7月7日)

1. 引言

在 2011 年 1 月 27 日舉行的中西區區議會交通及運輸委員會會議上，委員會要求路政署在往後的會議上匯報中西區內中環灣仔繞道工程的最新進展及即將開展的工程摘要。

2 中環灣仔繞道工程(中環交匯處)的進度(2011年5月至2011年7月)：

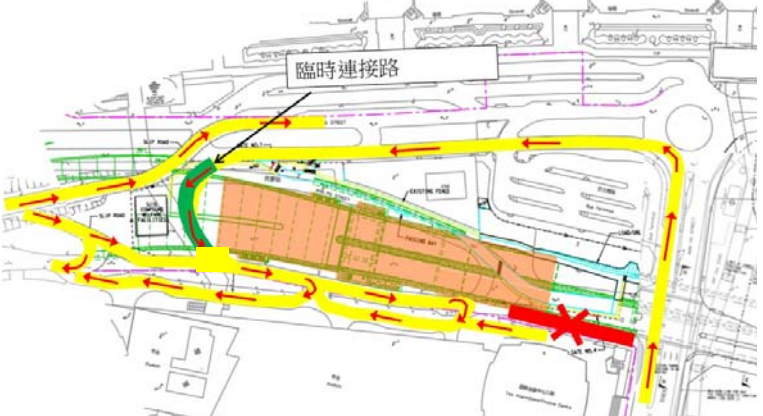


位置	工序	圖片
 <p>進行中工程位置圖</p>		
民光街	(1) 遷移地下公共設施工程	

國際金融中心二期對出的草地	(2) 隧道接駁路的板樁工程	
	(3) 隧道隔牆的鑽探工程	

3. 中環灣仔繞道工程(中環交匯處)未來六個月進行的工程(2011年7月至2011年12月)：

位置	工序
國際金融中心二期對出的草地	隧道接駁路挖掘工程
	隧道隔牆的鑽探工程
	建造隧道接駁路
	建造隧道隔牆
金融街	地底渠務設施改道工程
民耀街東邊行人路	遷移地下公共設施工程
民光街	遷移地下公共設施工程

4. 中環灣仔繞道工程(中環交匯處)未來一年內之臨時交通安排(2011 年 7 月至 2012 年 6 月)：

預計實施時間	臨時交通安排	圖片
2011 年第四季	民光街至金融街的臨時連接路	
2012 年初*	由民耀街迴旋處經 P1 路往龍和路的臨時連接路	
2012 年初*	民耀街臨時交通改道	

* 視乎中環三期填海的進度及與土木工程拓展署提早交收工地的進展
