



西貢及將軍澳 更換及修復 水管之工程 進度匯報圖

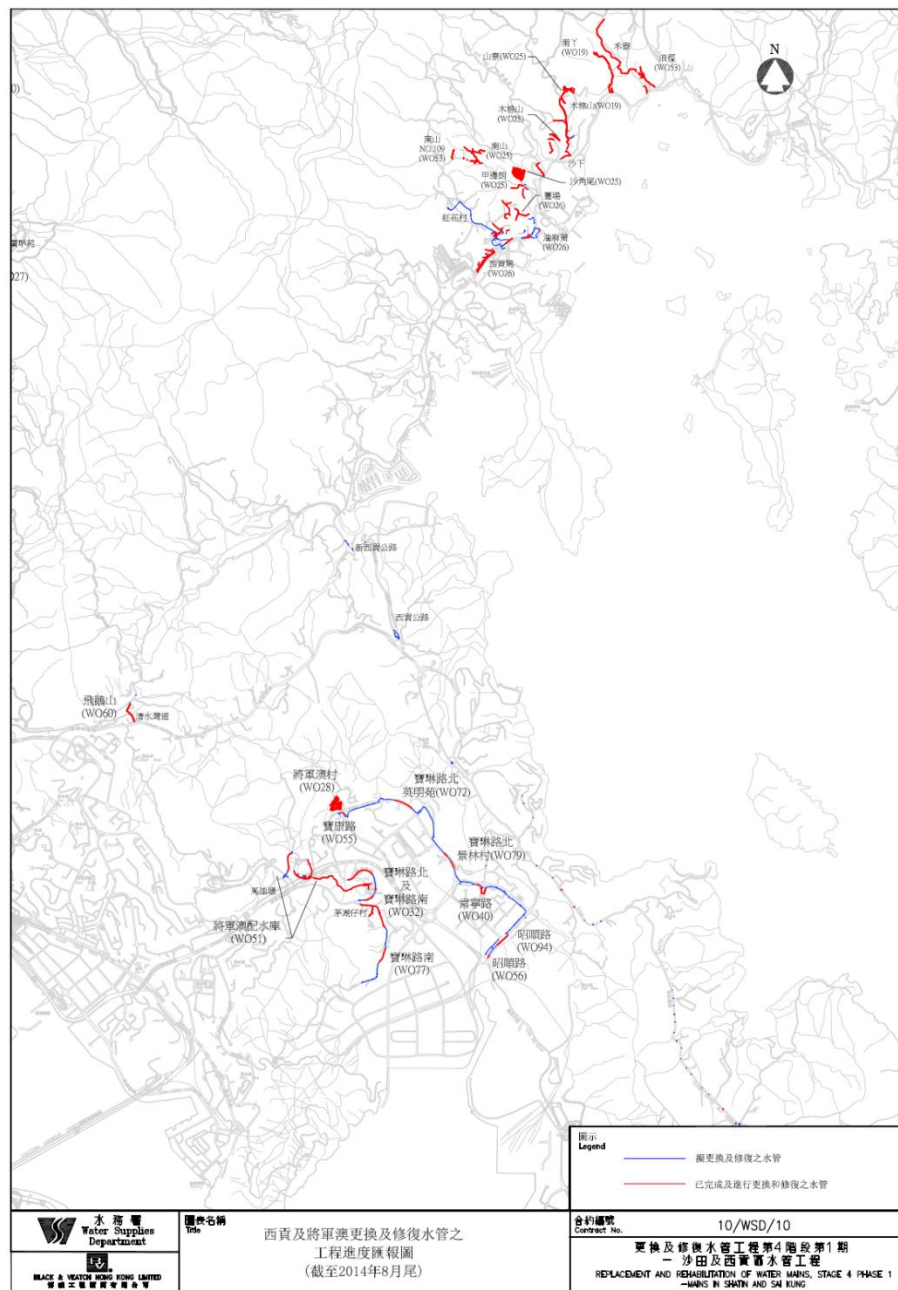

合約編號: 10/WSD/10

西貢

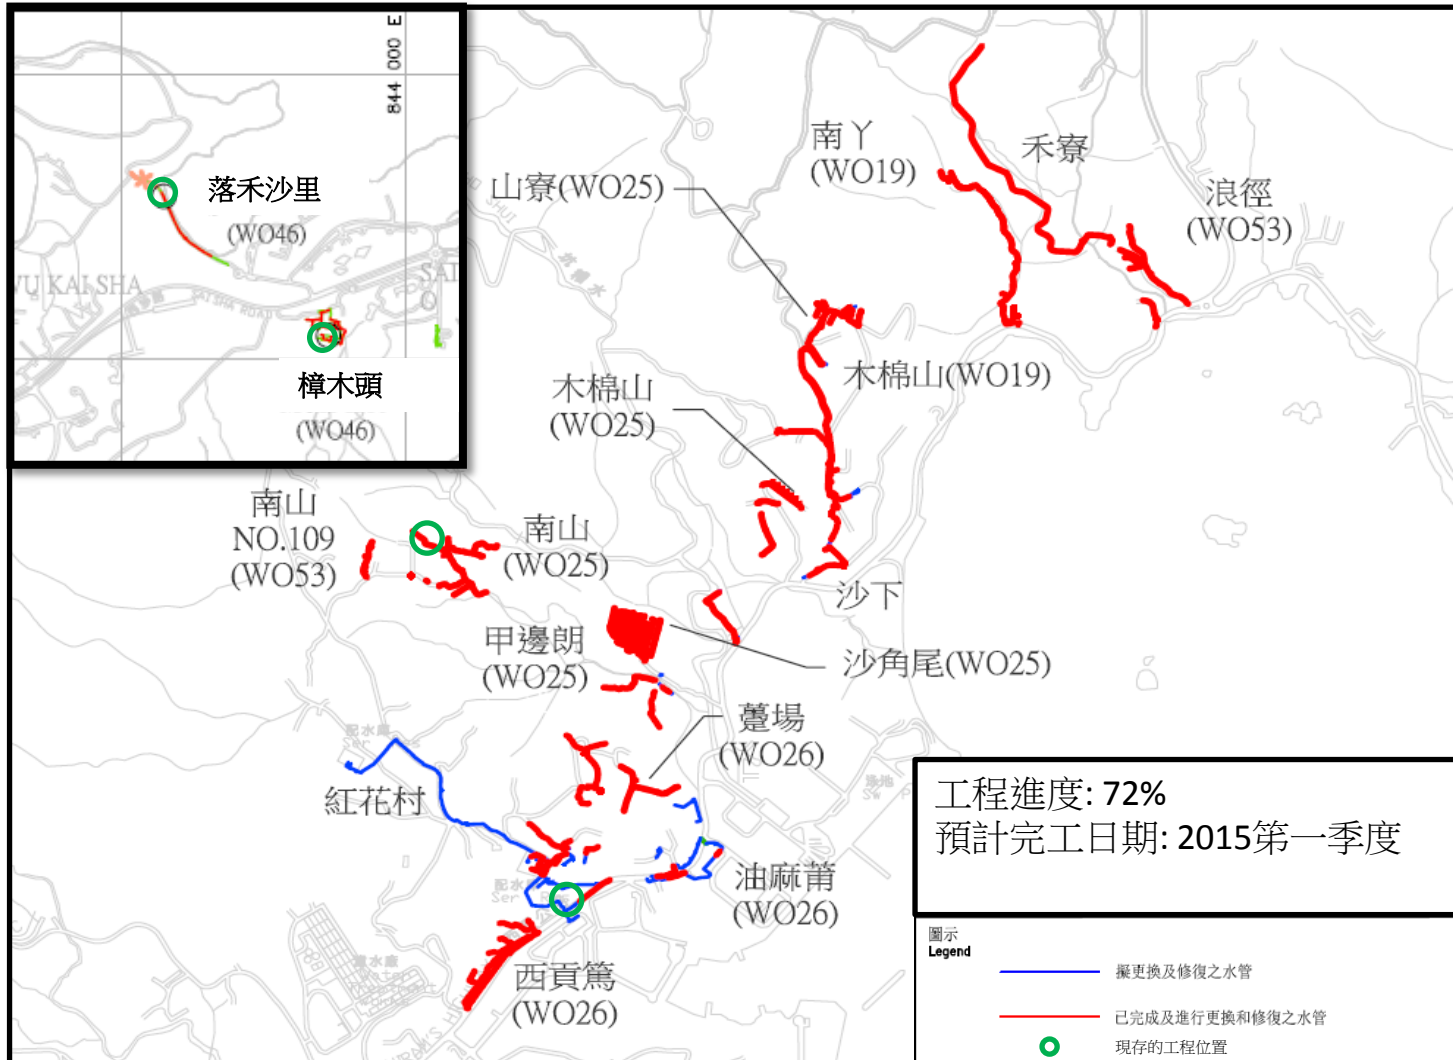

工程進度: 72%
 預計完工日期: 2015第一季度

- 圖示
 Legend
- 擬更換及修復之水管
 - 已完成及進行更換和修復之水管
 - 現存的工程位置

水務署
 Water Supplies Department

BLACK & VEATCH HONG KONG LIMITED
 坤地工程顧問有限公司

圖表名稱
 Title


西貢及將軍澳更換及修復水管之
 工程進度匯報圖
 (截至2014年8月尾)

合約編號
 Contract No.

10/WSD/10

更換及修復水管工程第4階段第1期
 - 沙田及西貢區水管工程
 REPLACEMENT AND REHABILITATION OF WATER MAINS, STAGE 4 PHASE 1
 - MAINS IN SHATIN AND SAI KUNG

將軍澳

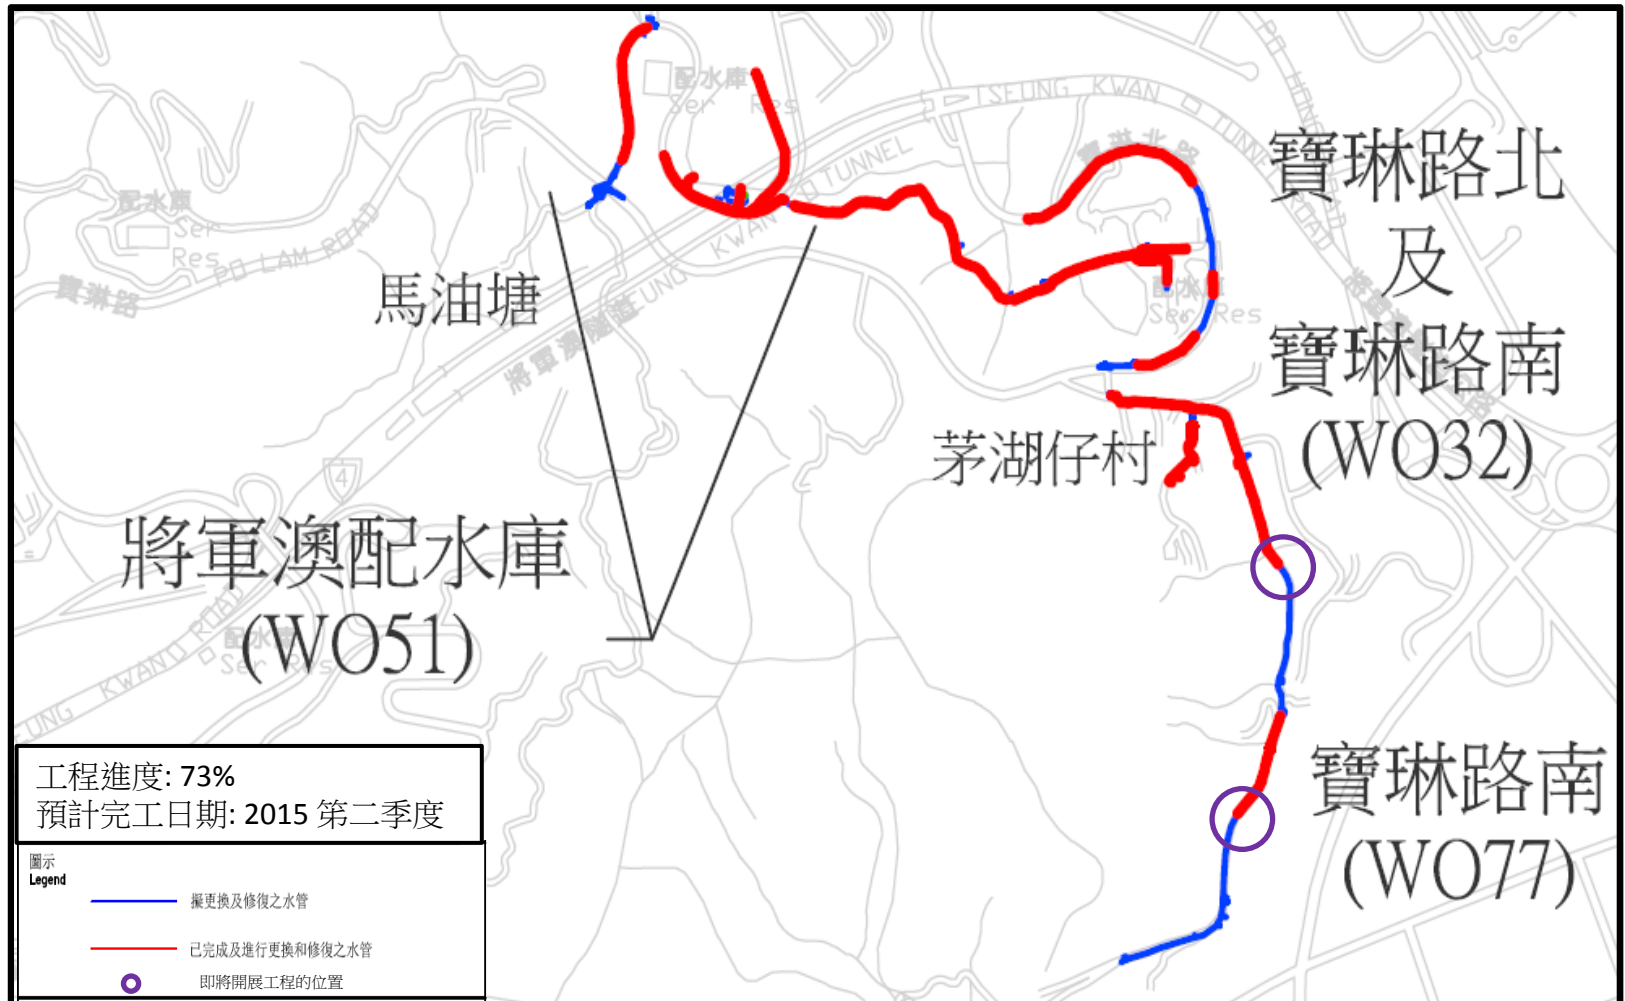

工程進度: 73%
預計完工日期: 2015 第二季度

水務署
Water Supplies
Department

圖表名稱
Title

西貢及將軍澳更換及修復水管之
工程進度匯報圖
(截至2014年8月尾)


合約編號
Contract No.

10/WSD/10

BLACK & VEATCH HONG KONG LIMITED
博城工程顧問有限公司

更換及修復水管工程第4階段第1期
— 沙田及西貢區水管工程
REPLACEMENT AND REHABILITATION OF WATER MAINS, STAGE 4 PHASE 1
— MAINS IN SHATIN AND SA KUNG

將軍澳更換及修復直徑700毫米鹹水管 之工程進度匯報圖

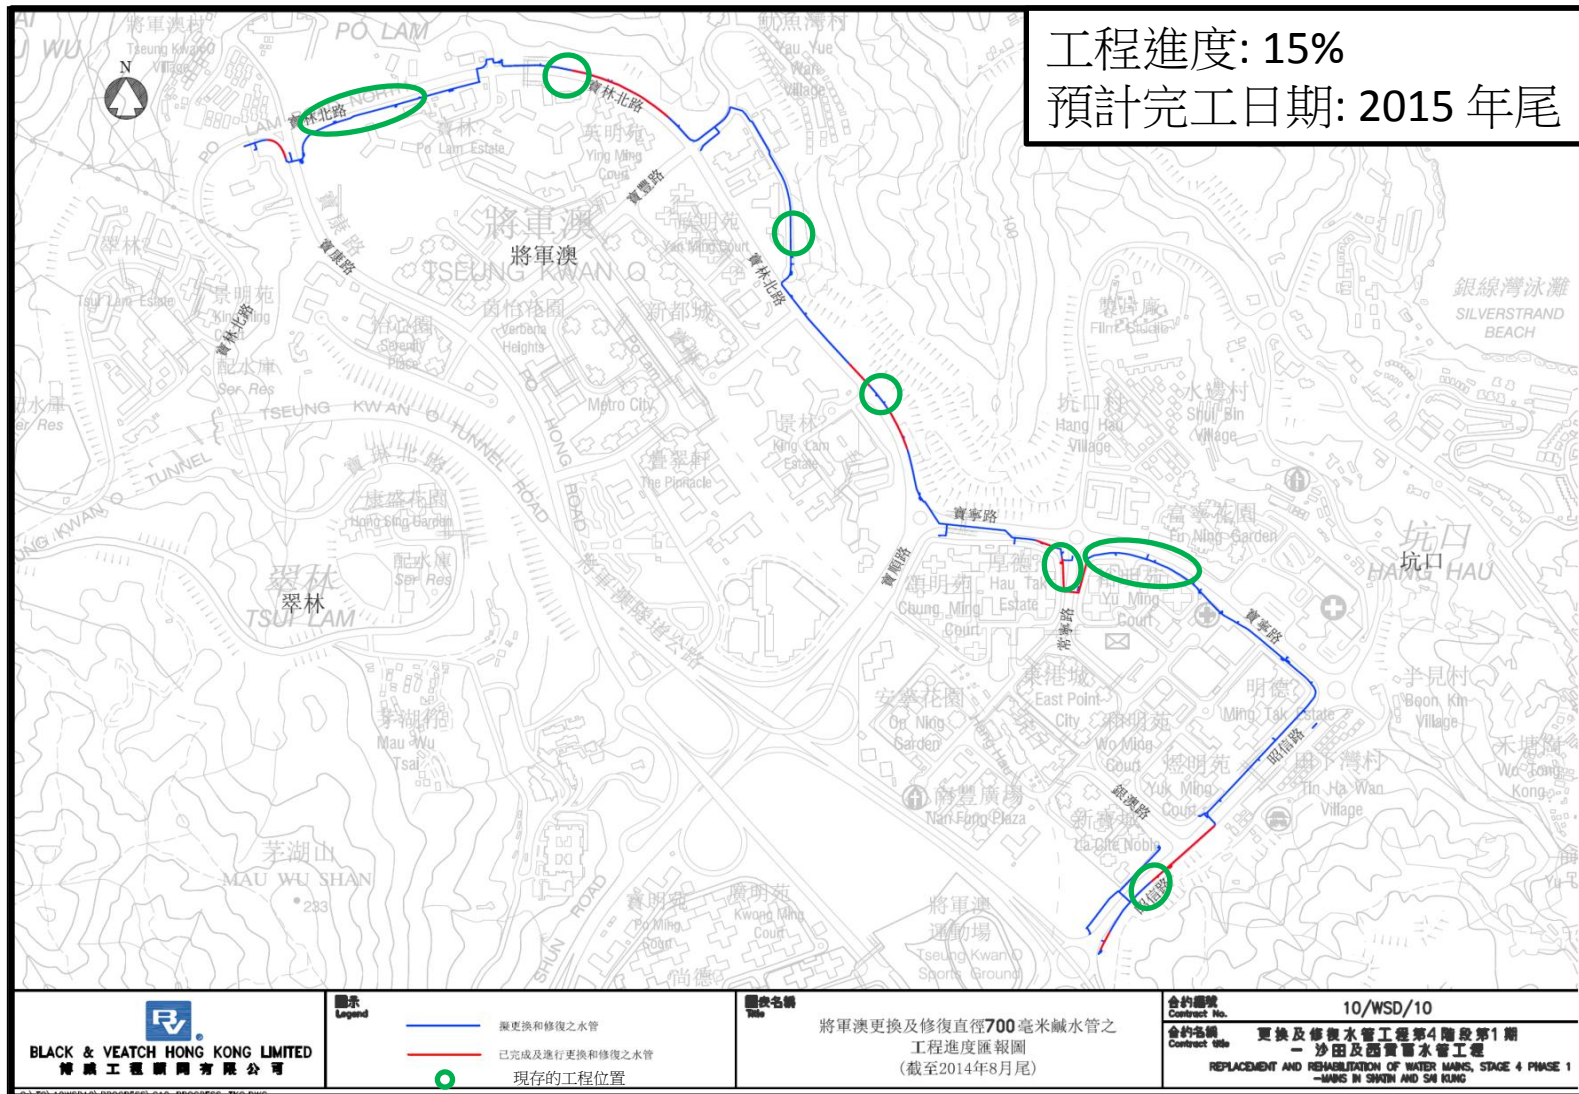

合約編號: 10/WSD/10

西貢區的工程進度

	預計更換及修復的水管 (km)	已更換及修復的水管 (km)	工程進度
西貢	15	10.8	72%
將軍澳	13	6.7	51.5%
合計	28	17.5	62.5%

更換及修復直徑700毫米鹹水管 施工困難

包括:

- 位於寶寧路受限制的施工時間
 - 10:00 至 16:00
 - 寶寧路和寶琳北路回旋處工程需於晚間時段進行
- 受限制的施工範圍 (三十米)
- 地下公用設施密集
- 不同走線之鹹水管工程需分不同階段接駁,不可同時進行,以減低受停水影響的地區範圍

應對策略

包括:

- 緊密與交通管理聯絡小組成員聯絡及商討, 在不影響交通的情況下, 爭取將施工範圍延長或將施工時間延長, 以達至公眾對工程盡快完成的期望
- 鹹水管的走線會繞過敬賢里, 以減低對寶琳北路交通的影響
- 部份工程需由無坑挖掘施工方案轉為開坑挖掘施工方案, 以加快水管更換進度
- 進行區內輸水網絡全面檢視, 優先處理於近寶康路的鹹水閥門更換工程, 以減少因工程而影響供水的範圍。緊密與區議會成員聯絡, 商討有關停水及鹹水管接駁的安排, 以減低受停水影響的地區範圍
