


深水埗區公營房屋建屋進度報告 - 白田邨重建 (截至2019年5月31日)

工程編號	工程說明	項目預算 費用 (百萬元)	發展種類	單位數目	擬住人口	工程計劃		備註
						動工日期	預算竣工日期	
SP14	白田邨重建計劃第七及八期	1,922.00 (建築工程)	出租公屋	1,044個 (第七期) 986個 (第八期)	約3,200 (第七期) 約3,000 (第八期)	2014年 第二季 開始拆 卸工程	2019年 第四季	上蓋建築工程已於2016年10月展開。
	第十一期	932.00 (建築工程)	出租公屋	1,088個	約3,600	2014年 第二季 開始拆 卸工程	2020年 第二季	原有白田巴士總站已於2015年9月關閉，有關的公共交通設施已遷往白雲街繼續提供服務。上蓋建築工程已於2017年5月展開。
	第十期	142.498 (拆卸及地基工程) 其他項目預算待 有關工程招標 後，再作提供	出租公屋	約900	約2,800	2018年 第三季 開始拆 卸工程	2022/23 年度	<ul style="list-style-type: none"> 拆卸及地基工程已於2018年7月展開。 由於放寬建築物高度上限的規劃申請已於2019年4月12日獲得城市規劃委員會批准，單位數目將增至約900個及擬住人口將增至約2,800。

深水埗區公營房屋建屋進度報告 - 石硤尾邨重建 (截至2019年5月31日)


工程編號	工程說明	項目預算 費用 (百萬元)	發展種類	單位數目	擬住人口	工程計劃		備註
						動工日期	預算竣工日期	
KL48	石硤尾邨 第三、六及七期	1,608 (建築工程)	出租公屋	1060	3,240	2014年 第四季	2019年 第三季	第六期建築工程已於 2016年8月展開。
				480	1,470	2015年 第三季	2018年 第四季	第三期建築工程已於 2018年11月竣工。房屋 署獨立審查組已於 2019年1月31日發出入 伙紙，邨管已開始為住 戶辦理入伙手續。截至 2019年4月尾，入伙率 為93%。 第七期建築工程已於 2018年12月竣工，房屋 署獨立審查組已於 2019年3月11日發出入 伙紙，邨管已開始為住 戶辦理入伙手續。截至 2019年4月尾，入伙率 為96%。

美禧樓

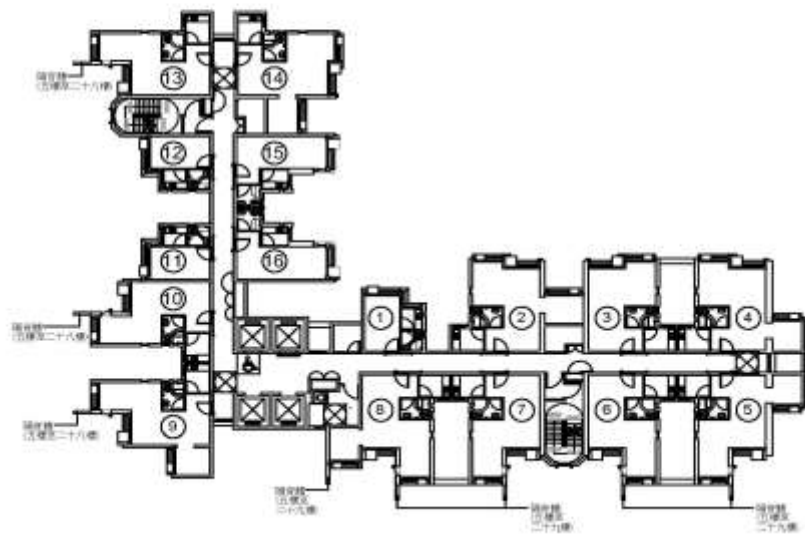

樓面平面圖

美柏樓

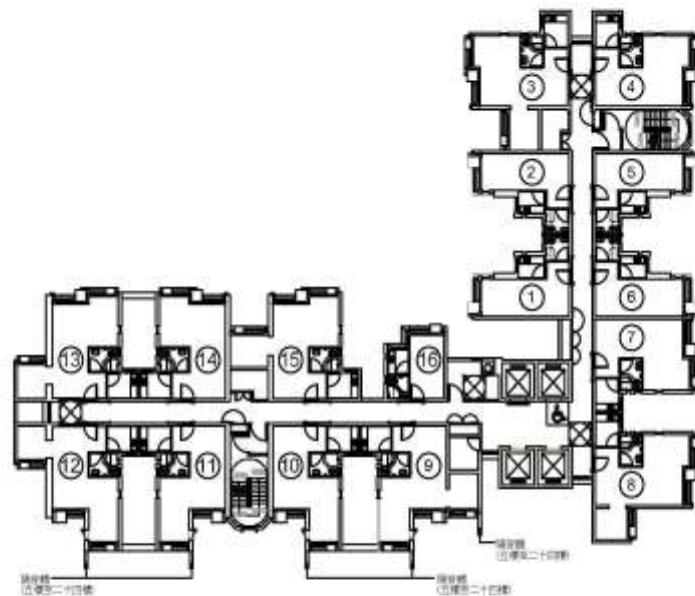

樓面平面圖
