

黃大仙區議會轄下

交通運輸委員會文件第 34/2025 號(2025 年 7 月 17 日會議)

## 黃大仙區「人人暢道通行」計劃工程進展報告

### 目的

本文件旨在向委員報告截至 2025 年 6 月 5 日黃大仙區「人人暢道通行」計劃工程的進度。

### 背景

2. 路政署於過去兩個月內正在施工或規劃中的「人人暢道通行」計劃工程項目及進度已載於附件。

### 文件提交

3. 本文件將提交黃大仙區議會轄下交通運輸委員會 2025 年 7 月 17 日第十次會議，供委員備悉。

路政署

2025 年 7 月

## 黃大仙區「人人暢道通行」計劃工程進展報告

截至2025年6月5日

編號	結構編號	位置	工程階段	預計 動工日期	預計 竣工日期	進度報告
1	CYS03	橫跨竹園道連接竹園廣場及竹園體育館	工程合約已開展	2023年7月	2027年第一季	工程合約已於2023年7月開展。 承建商已完成建造臨時樓梯，並已開放給公眾使用。承建商已完成部分樹木移除工作，現正進行地下管線改道工程。
2	KF62	橫跨鳳德道及蒲崗村道近鳳德邨	工程合約已開展	2023年7月	2027年第一季	工程合約已於2023年7月開展。 一號升降機方面，有關樹木移除工作已經完成。承建商現正與龍蟠苑商討在龍蟠苑的斜坡範圍興建工作平台及拆卸現有樓梯的細節及安排。 二號升降機方面，工程團隊正與水務署商討地下水管改道方案。承建商現正進行拆卸現有樓梯的工作。
3	KF73	橫跨東頭村道近東隆道	工程合約已開展	2024年8月	2025年第三季	工程合約已於2024年8月26日正式開展。 承建商已完成安裝升降機塔，現正準備進行升降機組件安裝及相關機電工程。
4	KF77	橫跨龍翔道近斧山道	工程合約已開展	2023年7月	2027年第一季	工程合約已於2023年7月開展。 一號升降機方面，承建商正進行拆卸部分斧山道游泳池外牆的工作以興建升降機塔的地基。 二號升降機方面，承建商已完成地下管線改道工程，並正進行地基工程的前期準備工作。 三號升降機方面，承建商正進行地基工程。另外，承建商現正進行擬建電箱的探坑挖掘工作。
5	KF92A	橫跨龍蟠街近鳳德道	工程合約已開展	2024年8月	2026年第一季	工程合約已於2024年8月26日正式開展。 承建商現正進行打樁工作。
6	KS7	橫跨龍翔道近彩虹港鐵站	工程合約已開展	2025年第三季	2028年第四季	工程合約已於2024年8月26日正式開展。 為減少挖掘探坑對市民的影響，承建商現正根據相關部門的意見修訂臨時交通管理計劃，於近銀池徑附近的平台建造一條3米闊的臨時行人路。承建商預計於今年7月有關臨時交通管理計劃獲批後，隨即展開臨時行人路的建造，而挖掘探坑亦會在臨時行人路完成後盡快展開。
7	KS14 &KS14A@	橫跨太子道東近觀塘道	工程合約已開展	2023年7月	2026年第一季	工程合約已於2023年7月開展。 一號升降機方面，承建商已完成遷移煤氣喉管的工序，現正向運輸署申請臨時交通安排措施以進行地基工程。 二號升降機方面，承建商已完成樹木移除工作，現正向運輸署申請臨時交通安排措施以進行地基工程。 三號升降機方面，承建商現正進行地基工程及準備地下隧道開口的前期工作。 四號升降機方面，承建商現正進行地下隧道接駁工程及地基工程。
8	TZL01	橫跨雙鳳街連接慈樂邨(一期)及慈樂邨(二期)	工程合約已開展	2025年第三季	2028年第三季	工程合約已於2024年8月26日正式開展。 承建商現正準備文件予相關部門作審批，並將會安排探坑挖掘，以確認現有的地下公用設施及其所需的遷移和改道工程。

## 黃大仙區「人人暢道通行」計劃工程進展報告

截至2025年6月5日


編號	結構編號	位置	工程階段	預計 動工日期	預計 竣工日期	進度報告
9	WTS01	橫跨牛池灣街近 彩雲邨豐澤樓	工程合約已 開展	2023年7月	2027年第一季	工程合約已於2023年7月開展。 承建商現正進行水管改道工程。 另外，承建商正準備移除現有花槽及街燈以配合地基工程。
10	WTS02	橫跨新清水灣道 近坪石遊樂場	工程合約已 開展	2023年7月	2027年第一季	工程合約已於2023年7月開展。 樹木移除及補償方案已獲得核准。承建商正準備樹木移除工作。
11	WTS04	橫跨竹園道連接 鵬程苑及竹園南 邨	工程合約已 開展	2023年7月	2027年第二季	工程合約已於2023年7月開展。 承建商已完成樹木移除工作及樓梯拆卸工作，並正準備地基工程的前期工作。
12	WTS05	橫跨東頭村道近 黃大仙下邨龍達 樓	工程合約已 開展	2023年7月	2026年第三季	工程合約已於2023年7月開展。 承建商已完成地下公用設施改道工程。承建商正進行地基工程。
13	WTS06	橫跨清水灣道及 豐盛街交界	工程合約已 開展	2023年7月	2027年第二季	工程合約已於2023年7月開展。 承建商已完成前期鑽探及探坑挖掘工程。現正與相關部門和持份者商討工程範圍的細節及安排。詳細設計方案已提交相關部門審批。
14	WTH01	橫跨富美街連接 橫頭磡邨宏暉樓 及宏富樓/宏安樓	工程合約已 開展	2025年第三季	2028年第一季	工程合約已於2024年8月26日正式開展。 承建商現正準備文件予相關部門作審批，並將會安排挖掘探坑，以確認現有的地下公用設施及其所需的遷移和改道工程。

備註：

@ 該行人通道橫跨黃大仙區及觀塘區

# 附件1

黃大仙區


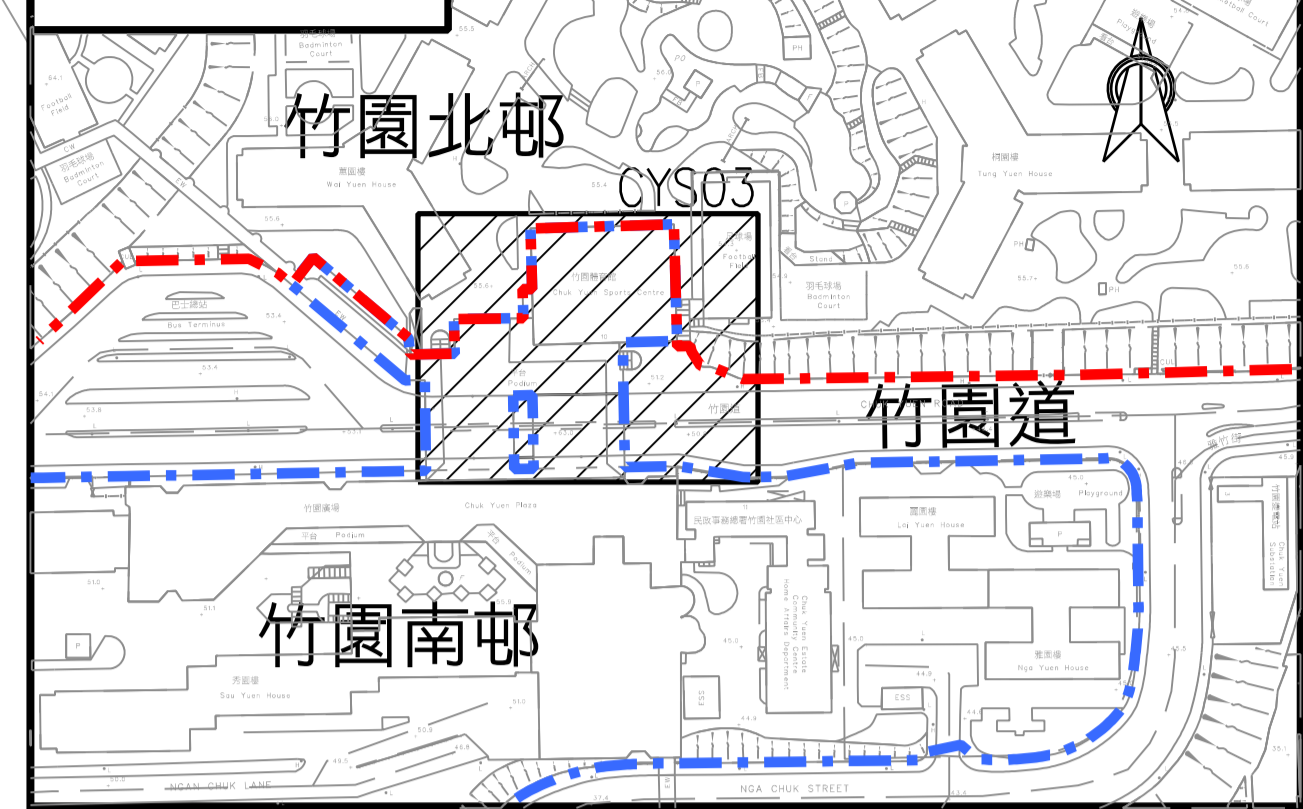


位置圖  
SCALE 1 : 4000


**圖例:**

- 擬建升降機
- GL 擬建升降機地面出口
- DL1 擬建升降機中層出口
- DL2 擬建升降機橋面出口
- 竹園北邨地段界線
- 竹園南邨地段界線
- 現有的行人過路設施
- 擬建高架平台
- 擬建樓梯
- 現有行人天橋 (行人通道編號:CYS03)

**圖紙名稱:**  
橫跨竹園道連接竹園體育館及竹園商場的行人天橋 (行人通道編號 : CYS03)

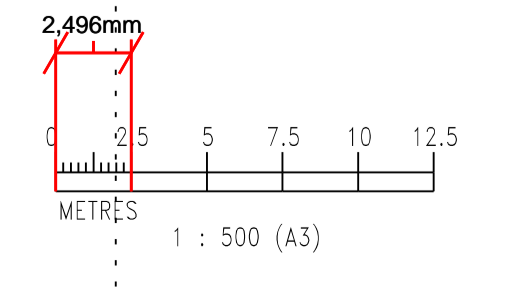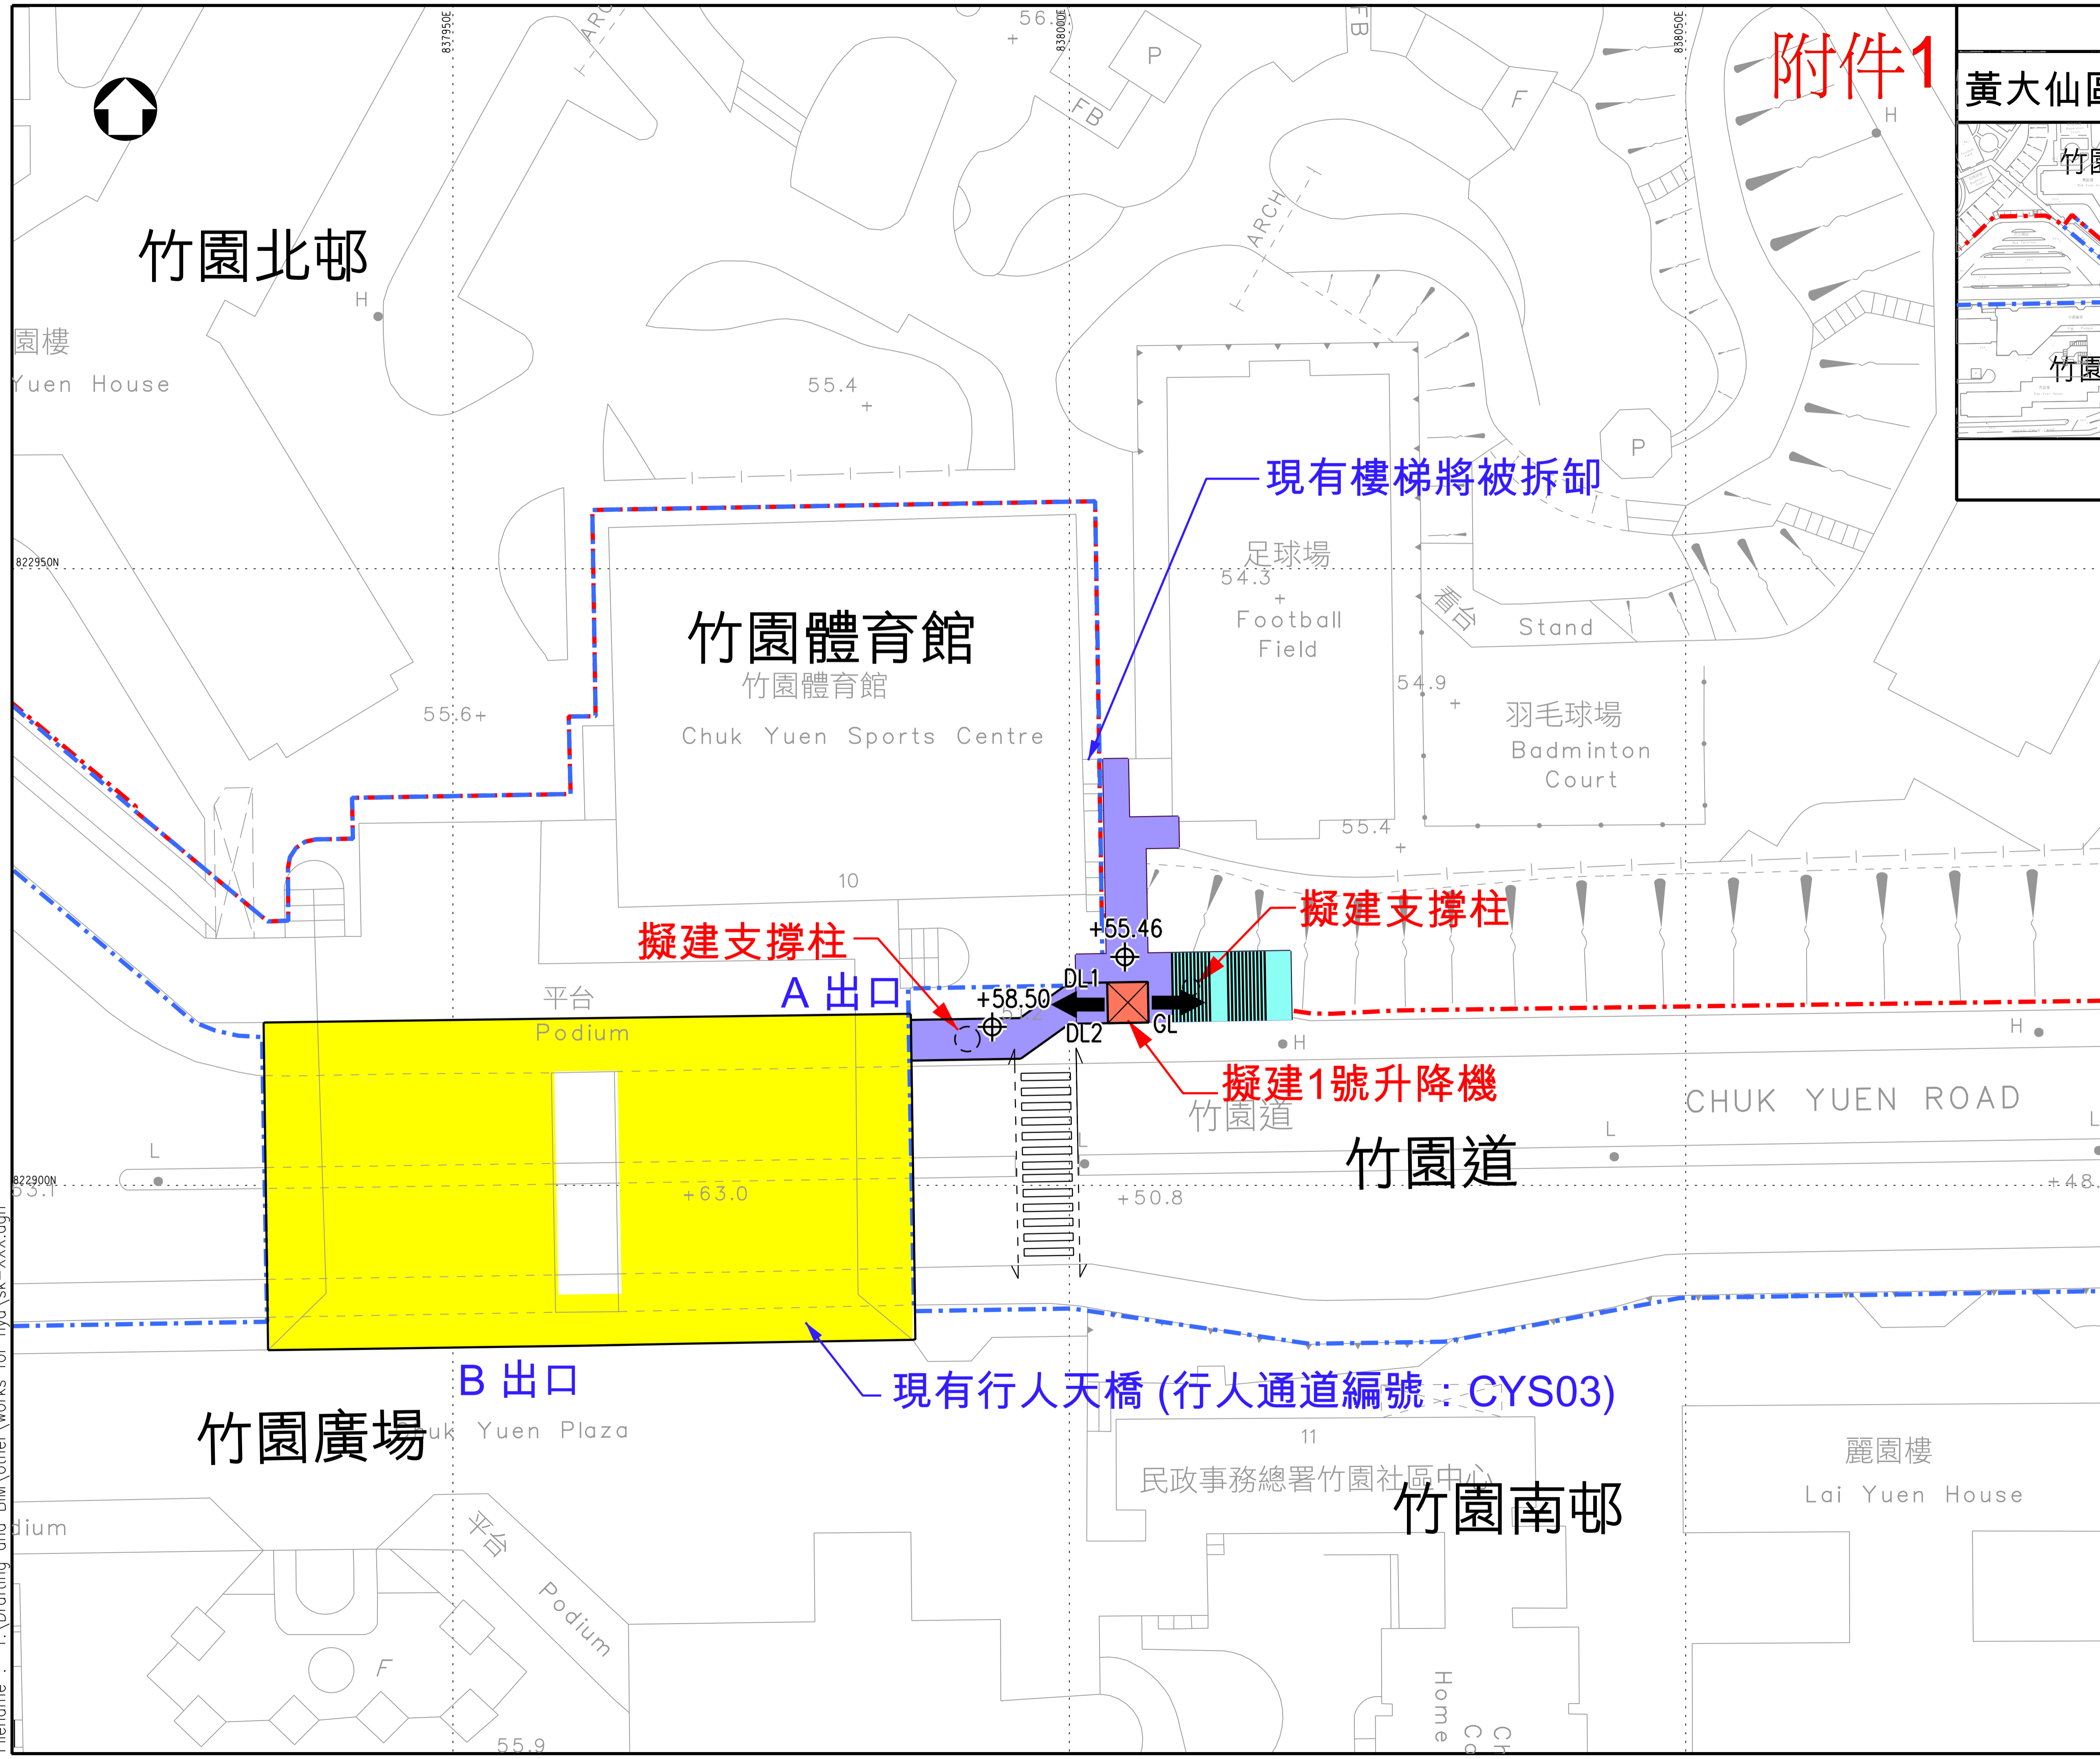


Date : 13/12/2022  
Filename : Y:\Drafting and BIM\other\works for hyd\sk-XXX.dgn

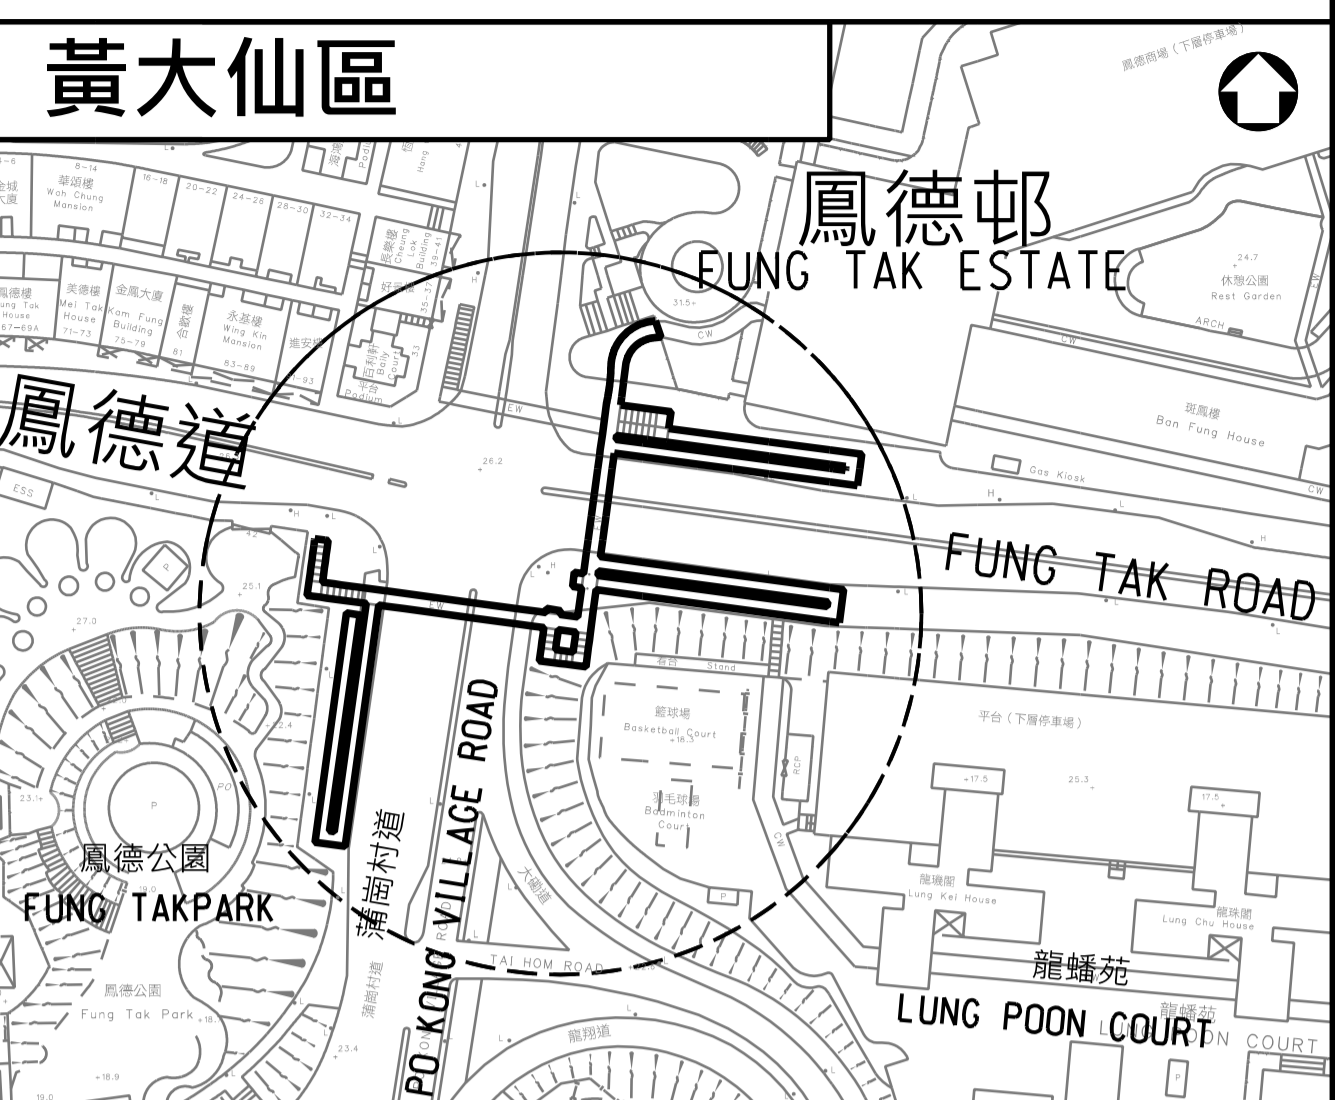


位置圖  
比例 1:3000


- 圖例:**
- 現有行人天橋/隧道
  - 擬拆卸現有斜道樓梯
  - 擬建升降機
  - 擬建高架平台/隧道/斜道/樓梯
  - 擬建行人路
  - 地面出口
  - 橋面出口
  - 現有升降機

圖紙名稱  
橫跨鳳德道及蒲崗村道  
近鳳德邨的行人天橋  
(結構編號: KF62)

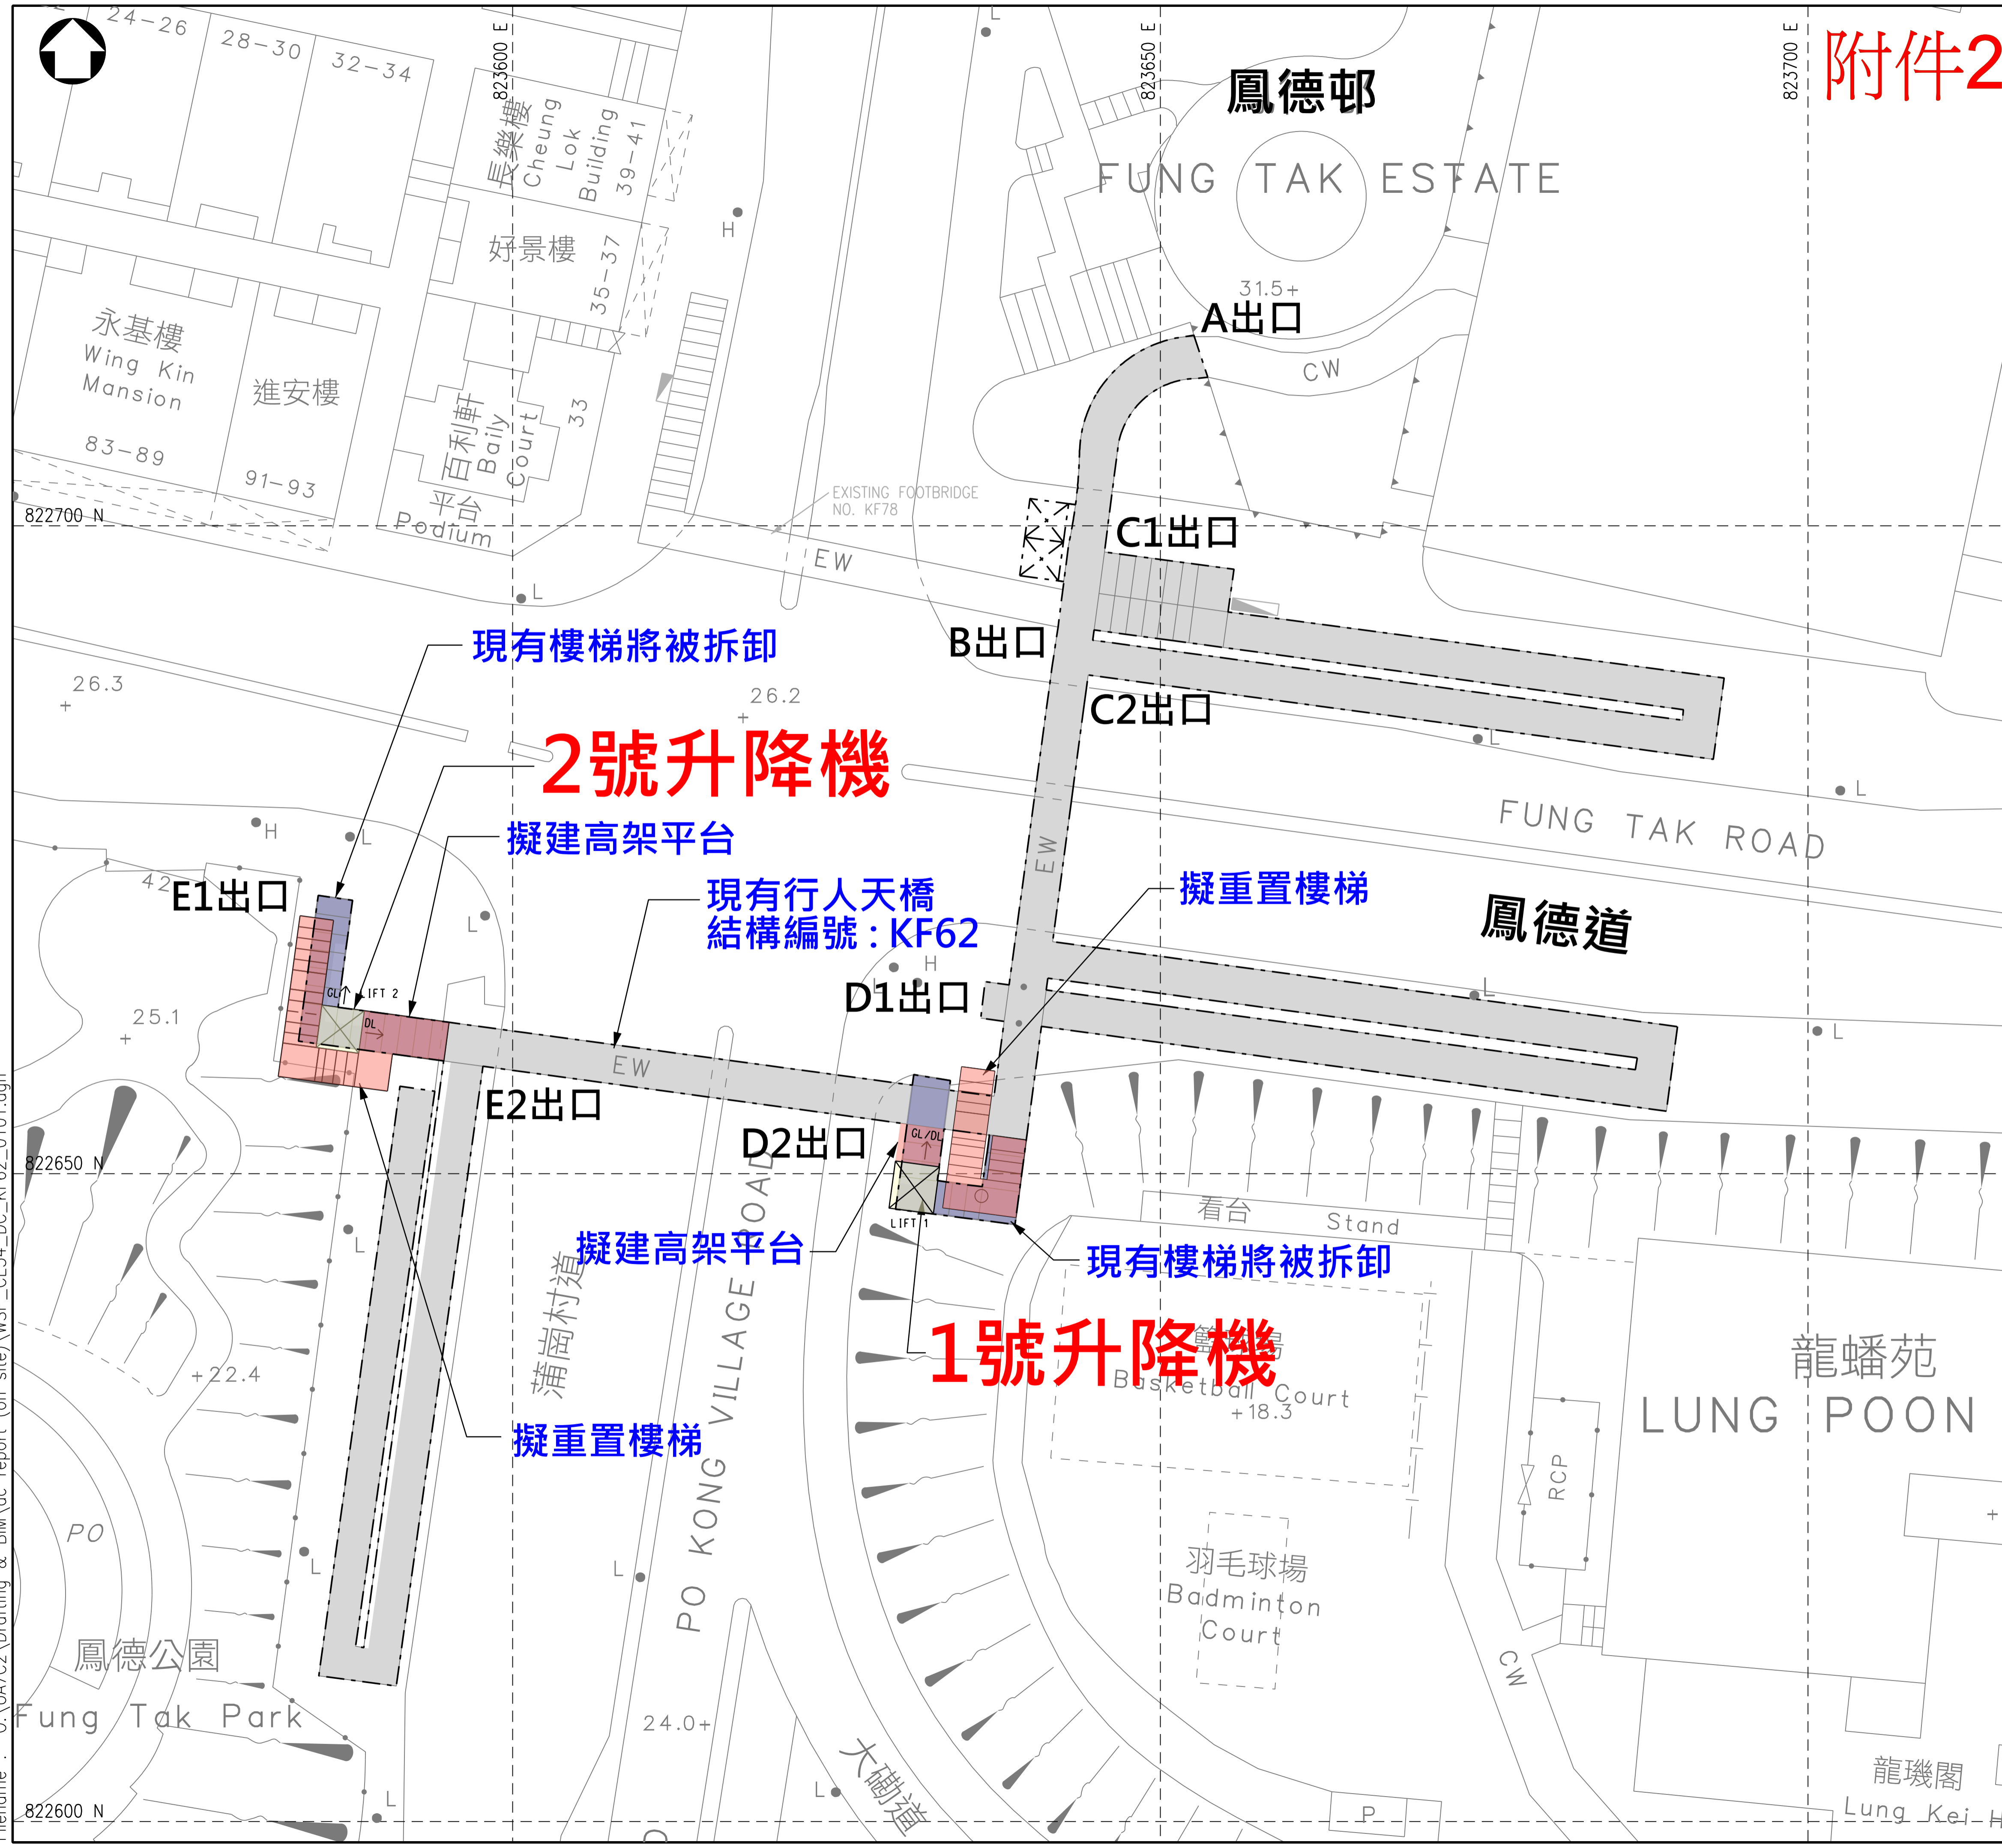

Date: 1/30/2024  
Filename: O:\UA7C2\Drafting & BIM\dc report (on site)\WSP\_CE54\_DC\_KF62\_0101.dgn




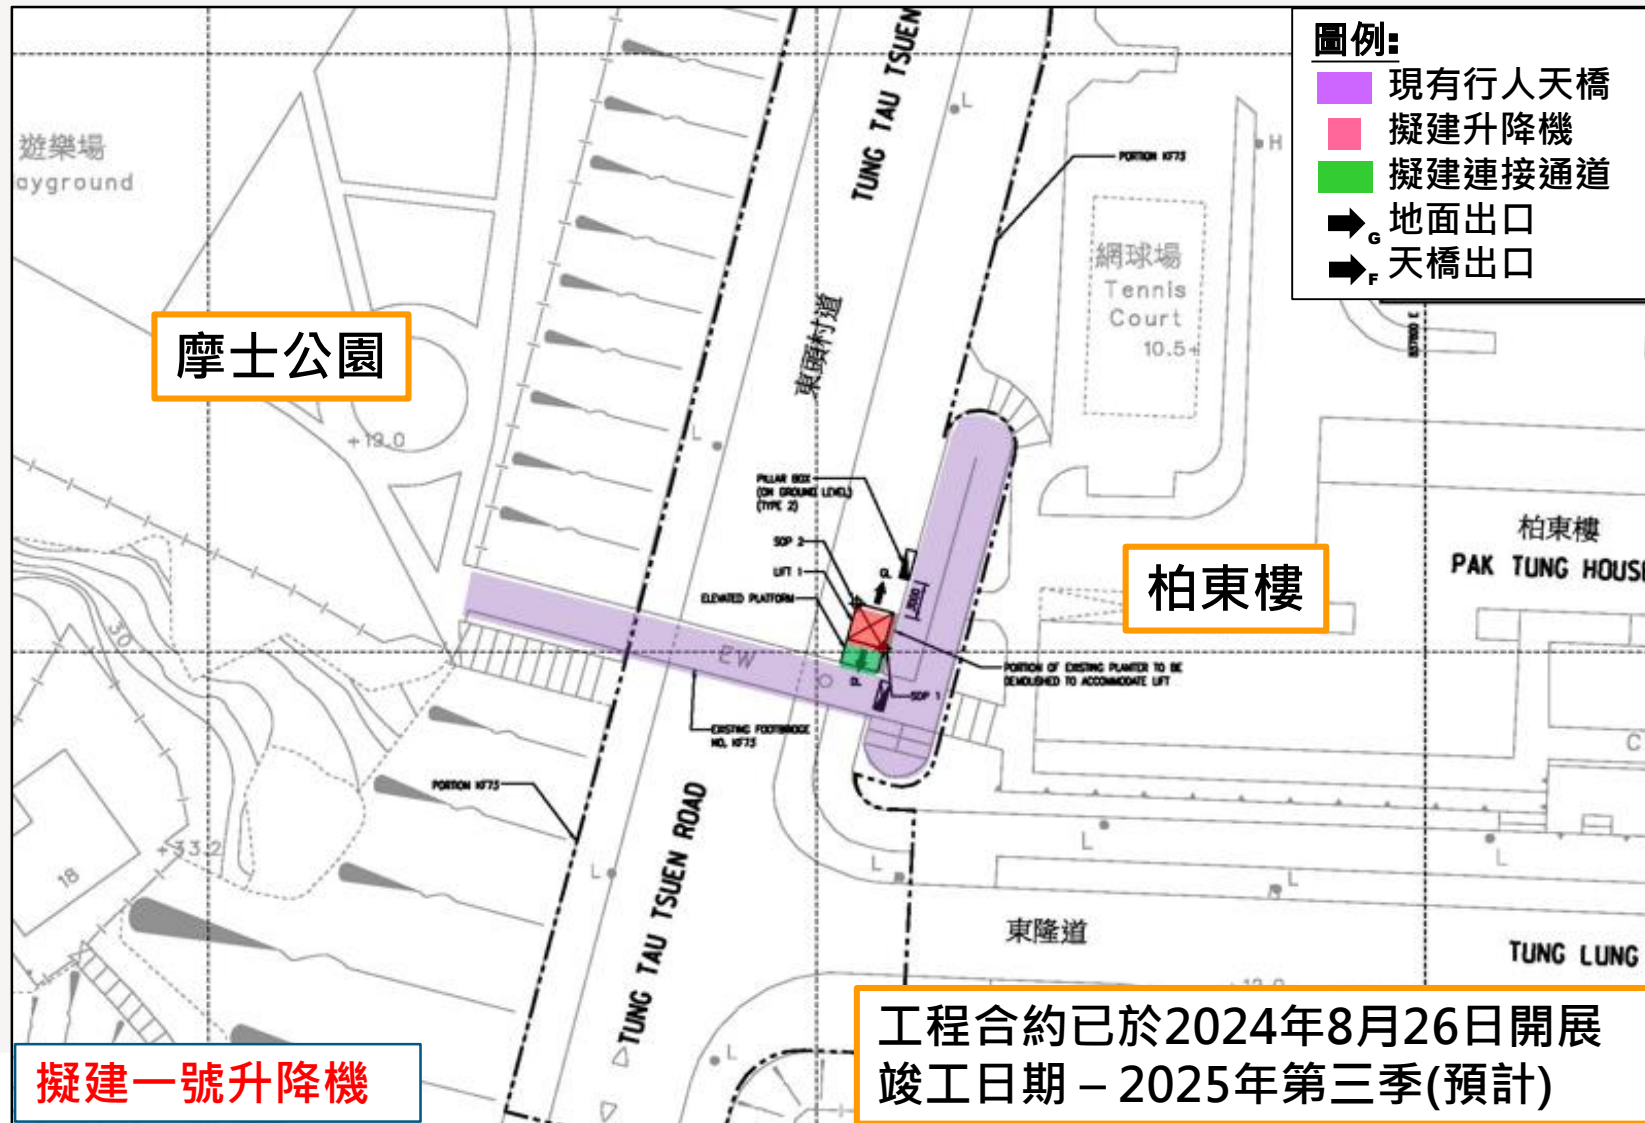








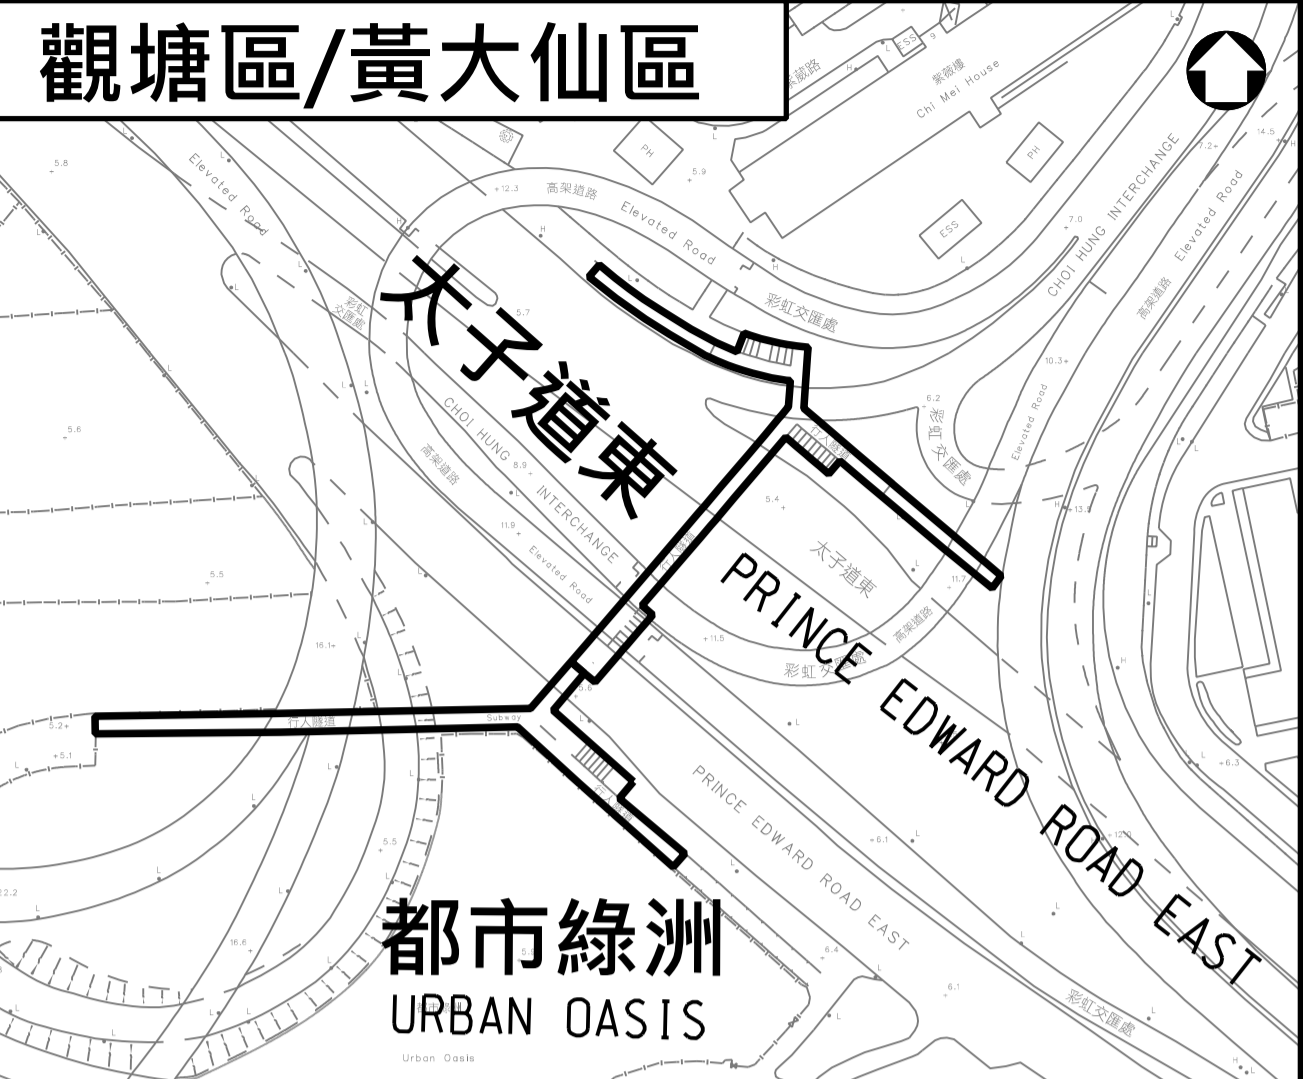


位置圖  
比例 1:3000

**圖例:**

- 現有行人天橋/隧道
- 擬建升降機
- 擬建高架平台/隧道/斜道/樓梯
- 擬建行人路
- GL 地面出口
- SL 隧道出口

**圖紙名稱**  
橫跨太子道東近觀塘道的行人隧道  
(結構編號:KS14)

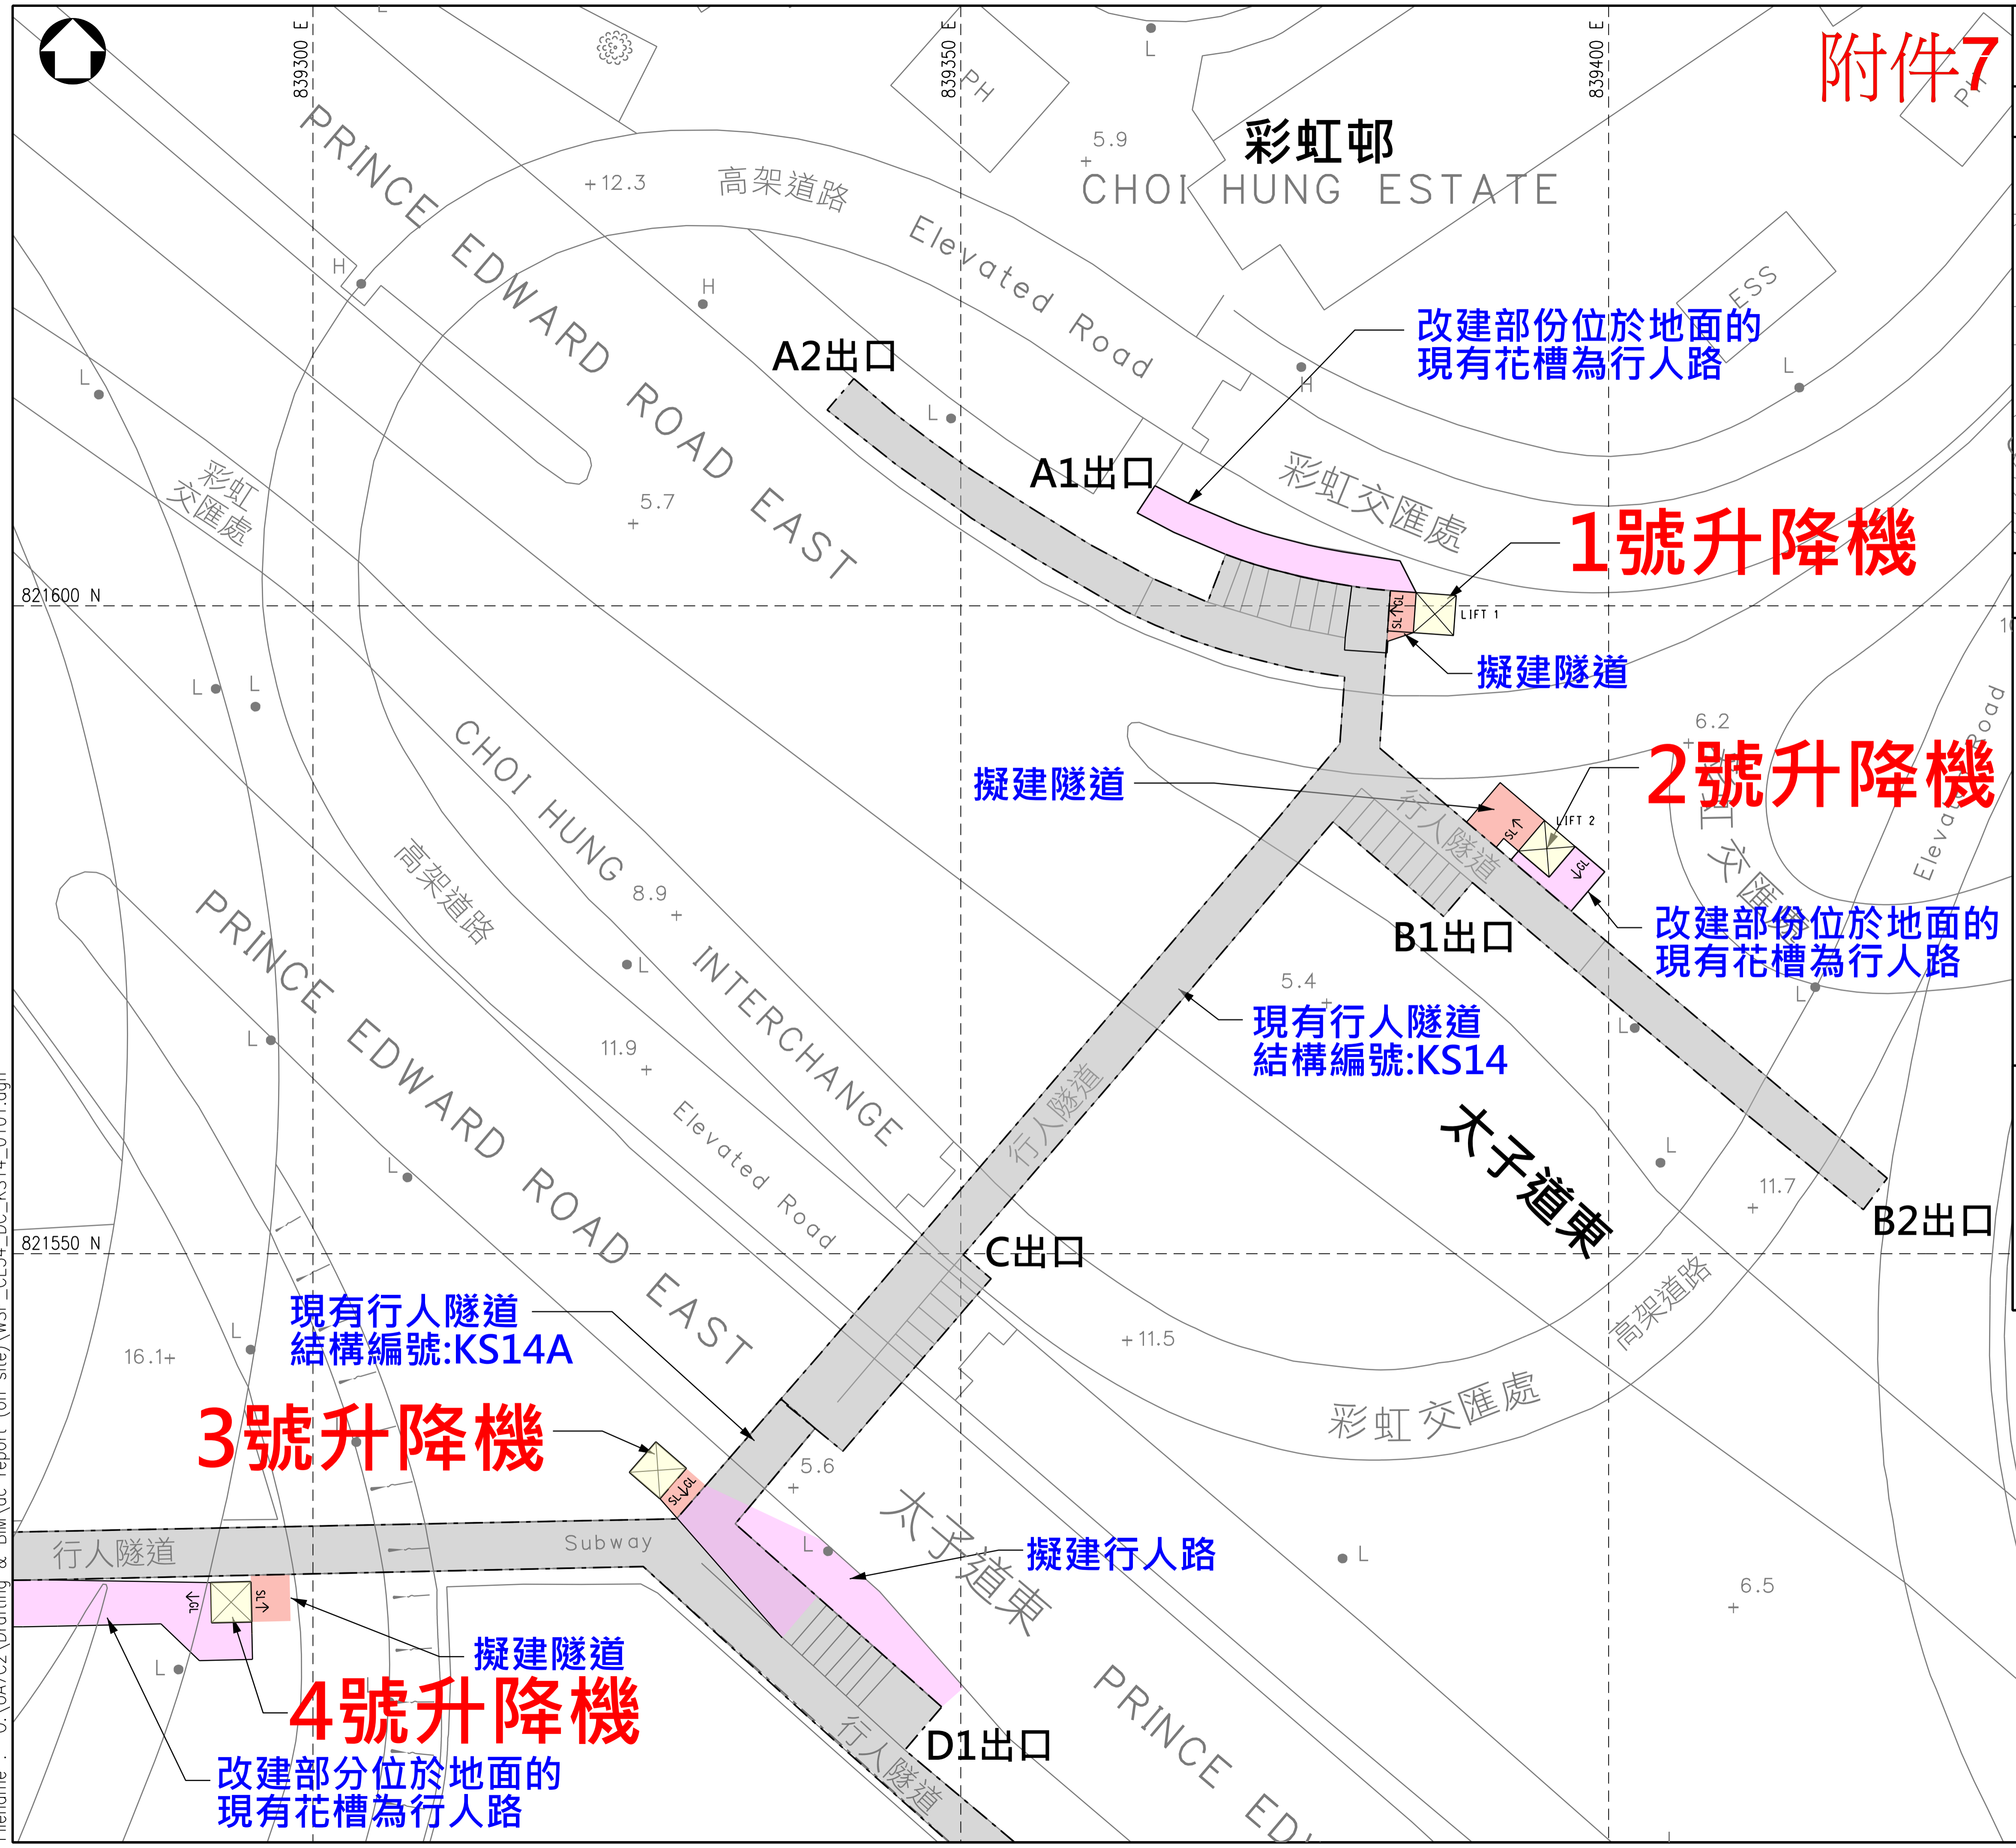

Date : 1/31/2024  
Filename : O:\UA7C2\Drafting & BIM\dc report (on site)\WSP\_CE54\_DC\_KS14\_0101.dgn






位置圖  
比例 1:3000

**圖例:**

- 現有行人天橋/隧道
- 擬建升降機
- 擬建高架平台/隧道/斜道/樓梯
- 擬建行人路
- GL 地面出口
- SL 隧道出口

**圖紙名稱**  
橫跨太子道東近觀塘道的行人隧道  
(結構編號:KS14A)

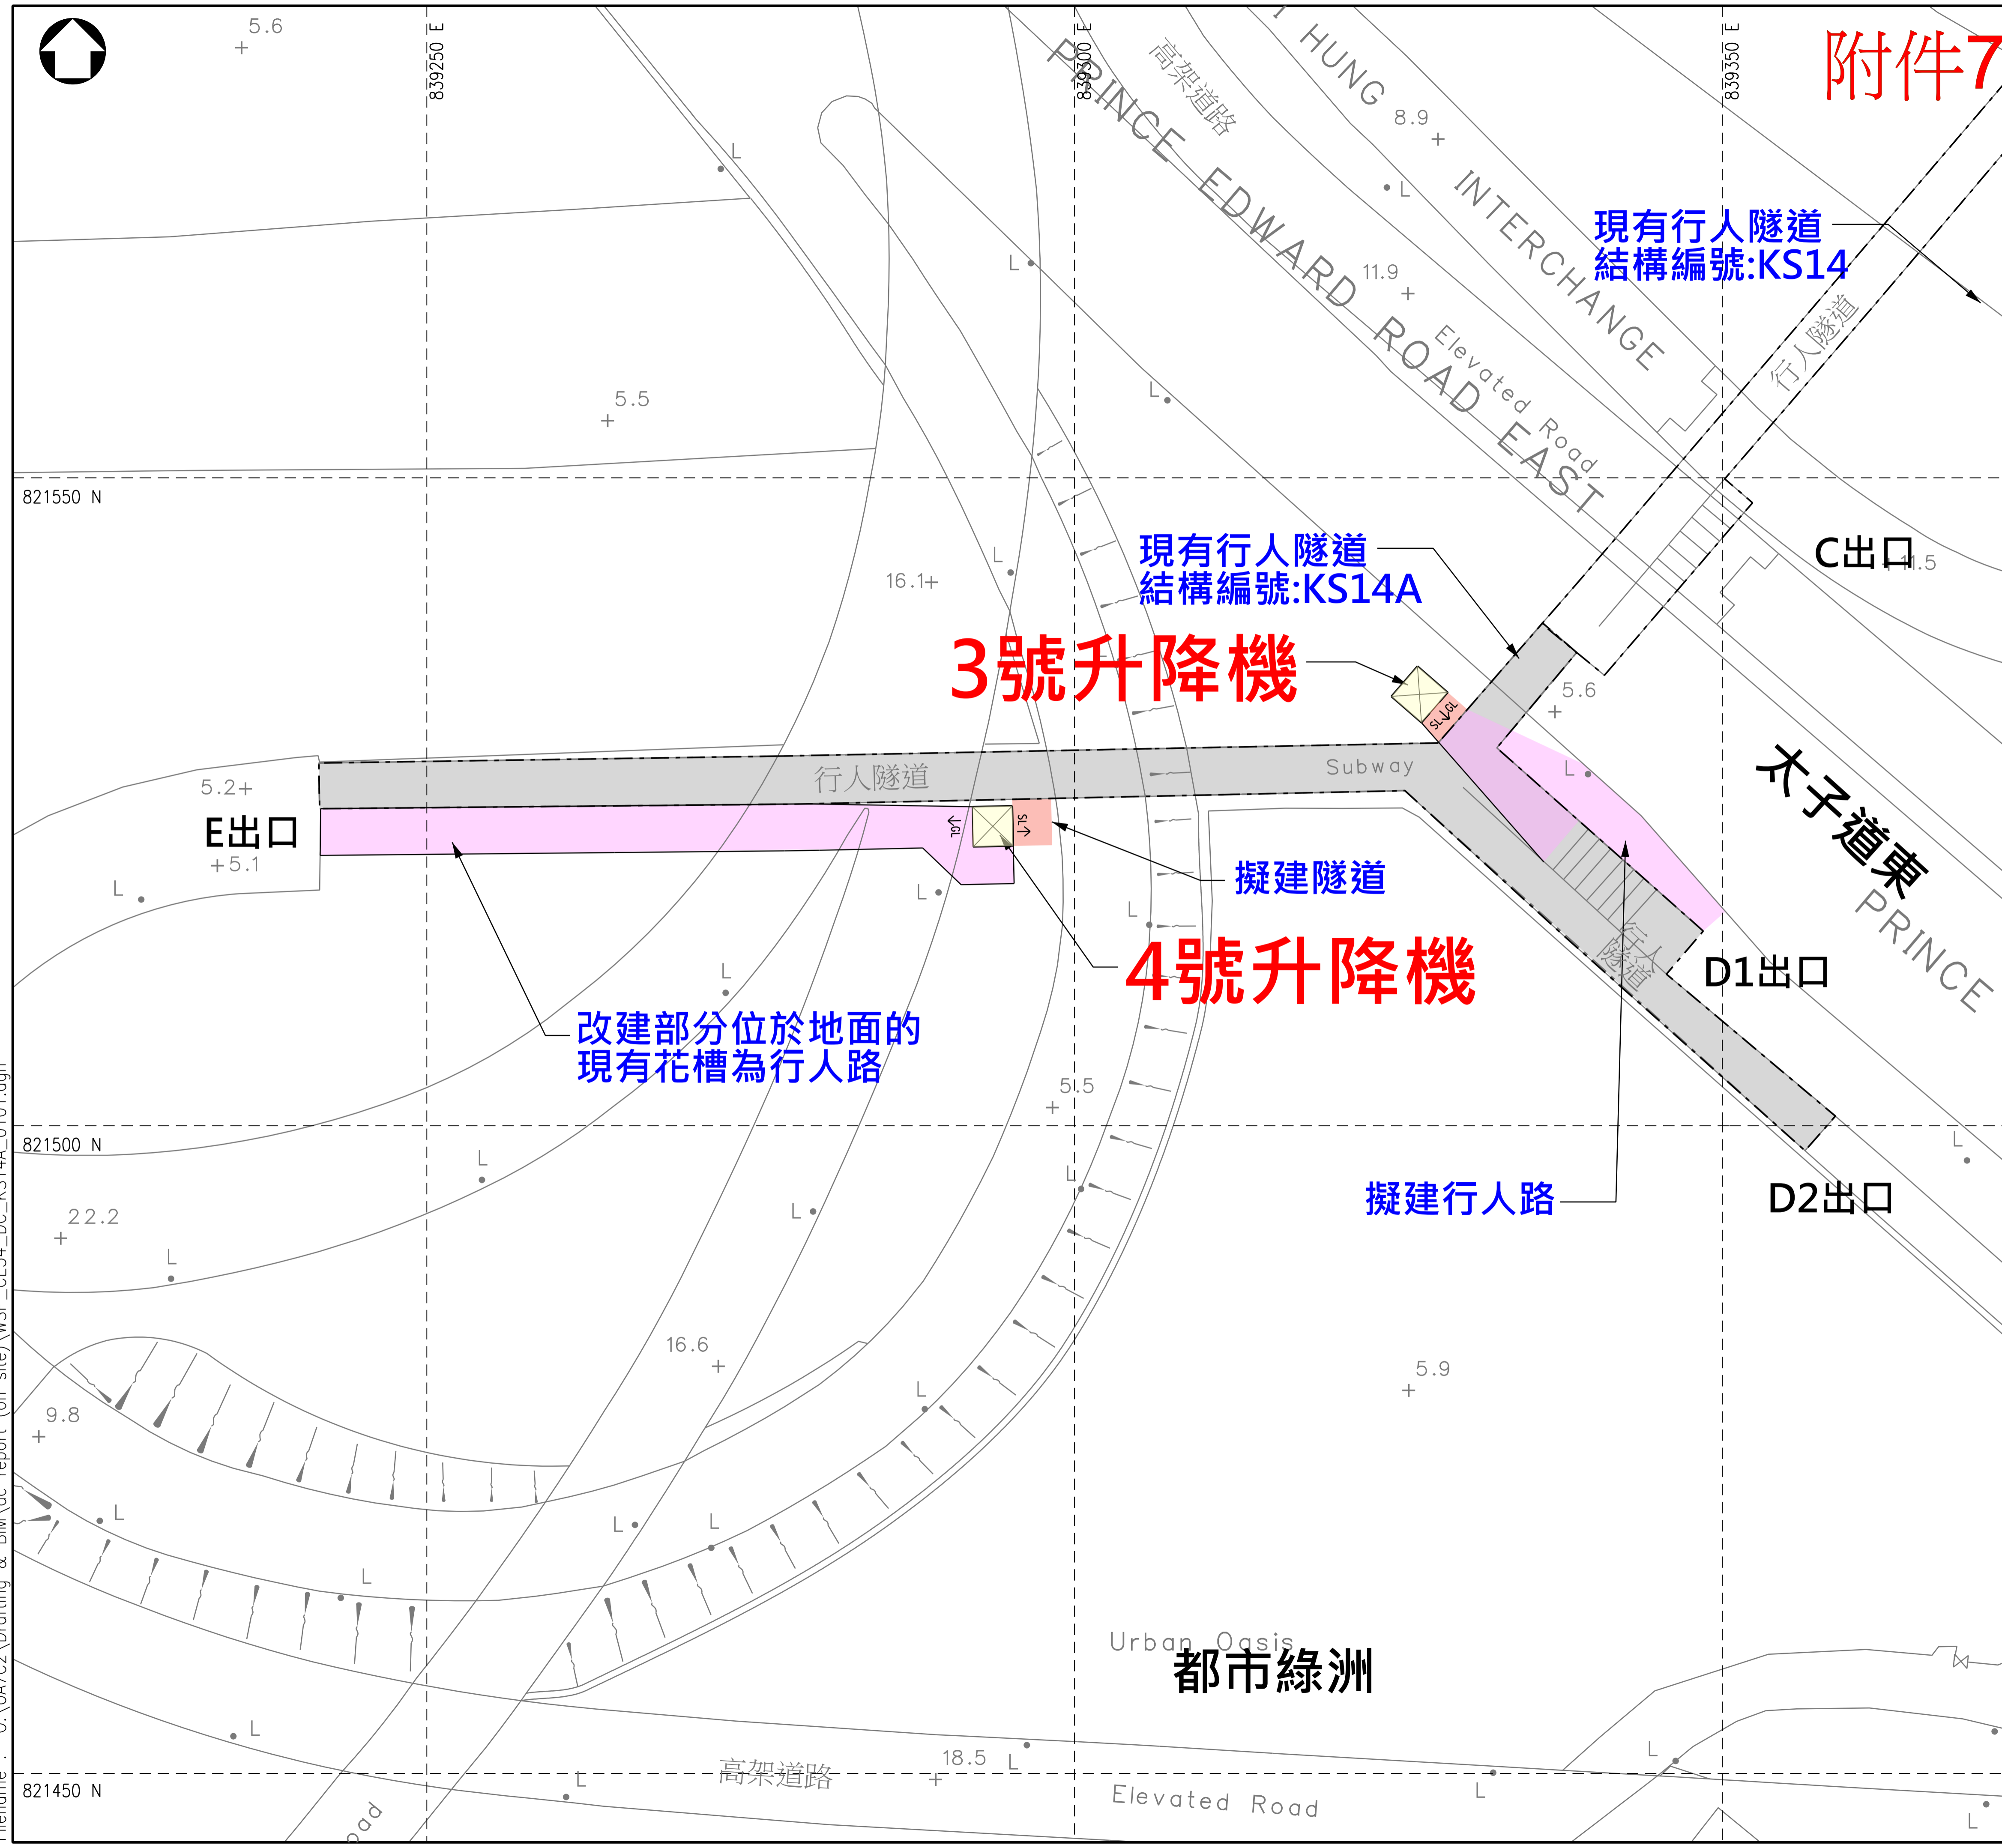

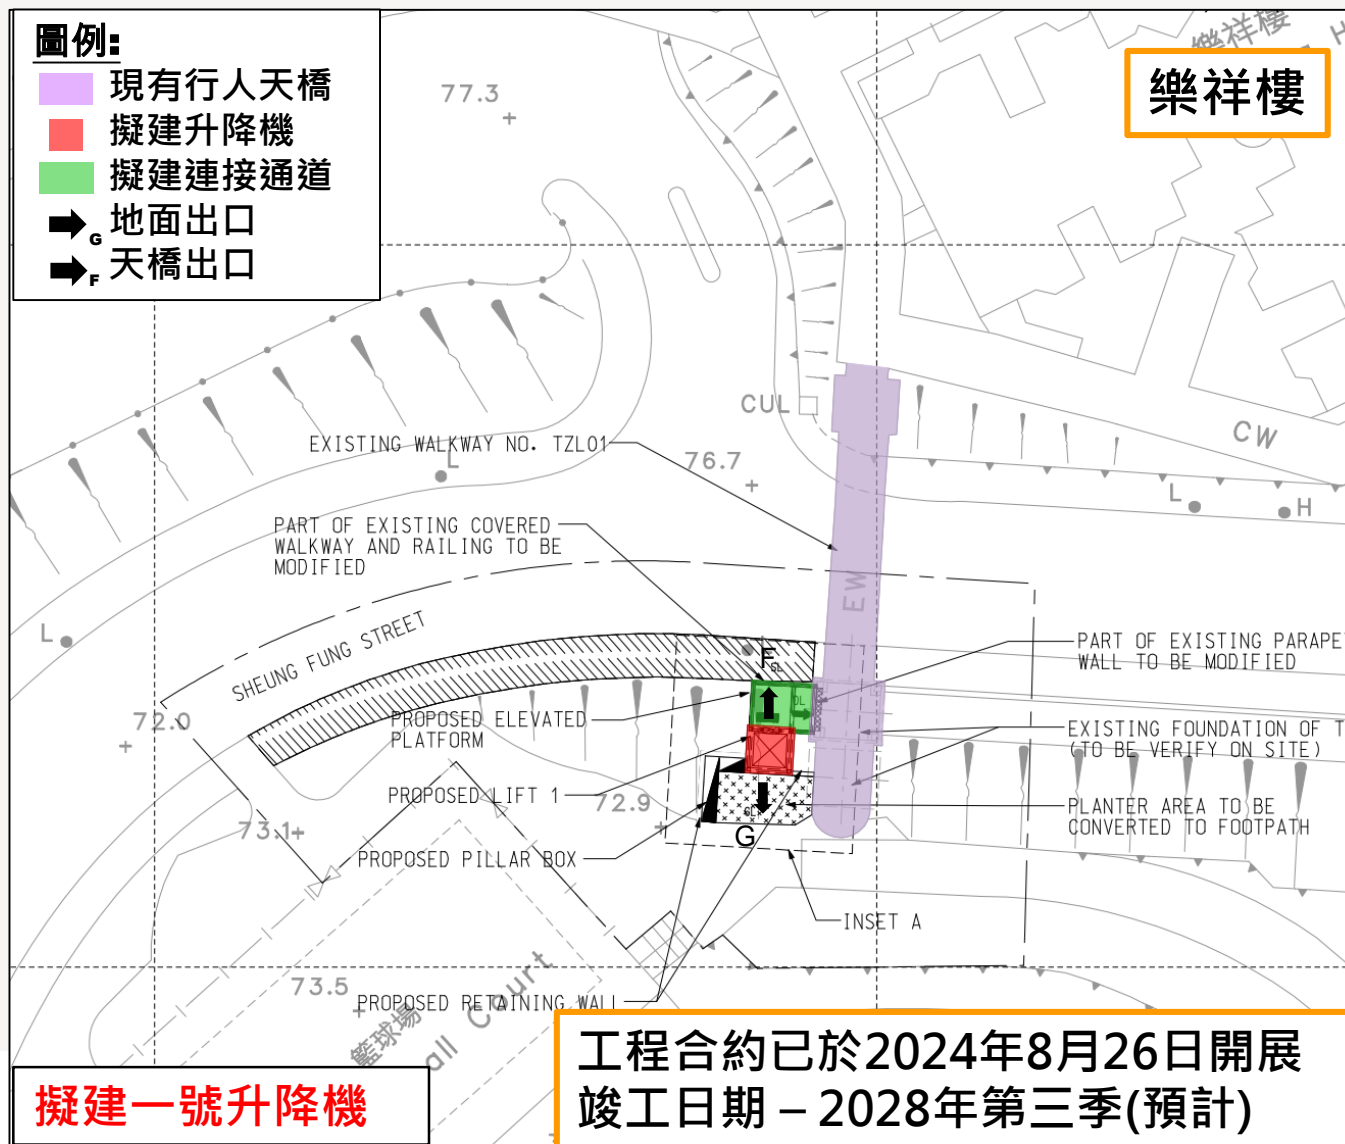



# 附件10

Choi Wan St. Joseph's Primary School  
彩雲聖若瑟小學

黃大仙區




位置圖  
比例 1:3000

### 圖例:


- 現有行人天橋
- 現有樓梯
- 擬建升降機
- 擬建高架平台
- 擬建斜道
- 地面出口
- 橋面出口
- 鄰近地面過路處


### 圖紙名稱

橫跨新清水灣道近  
坪石遊樂場的行人天橋  
(結構編號: WTS02)

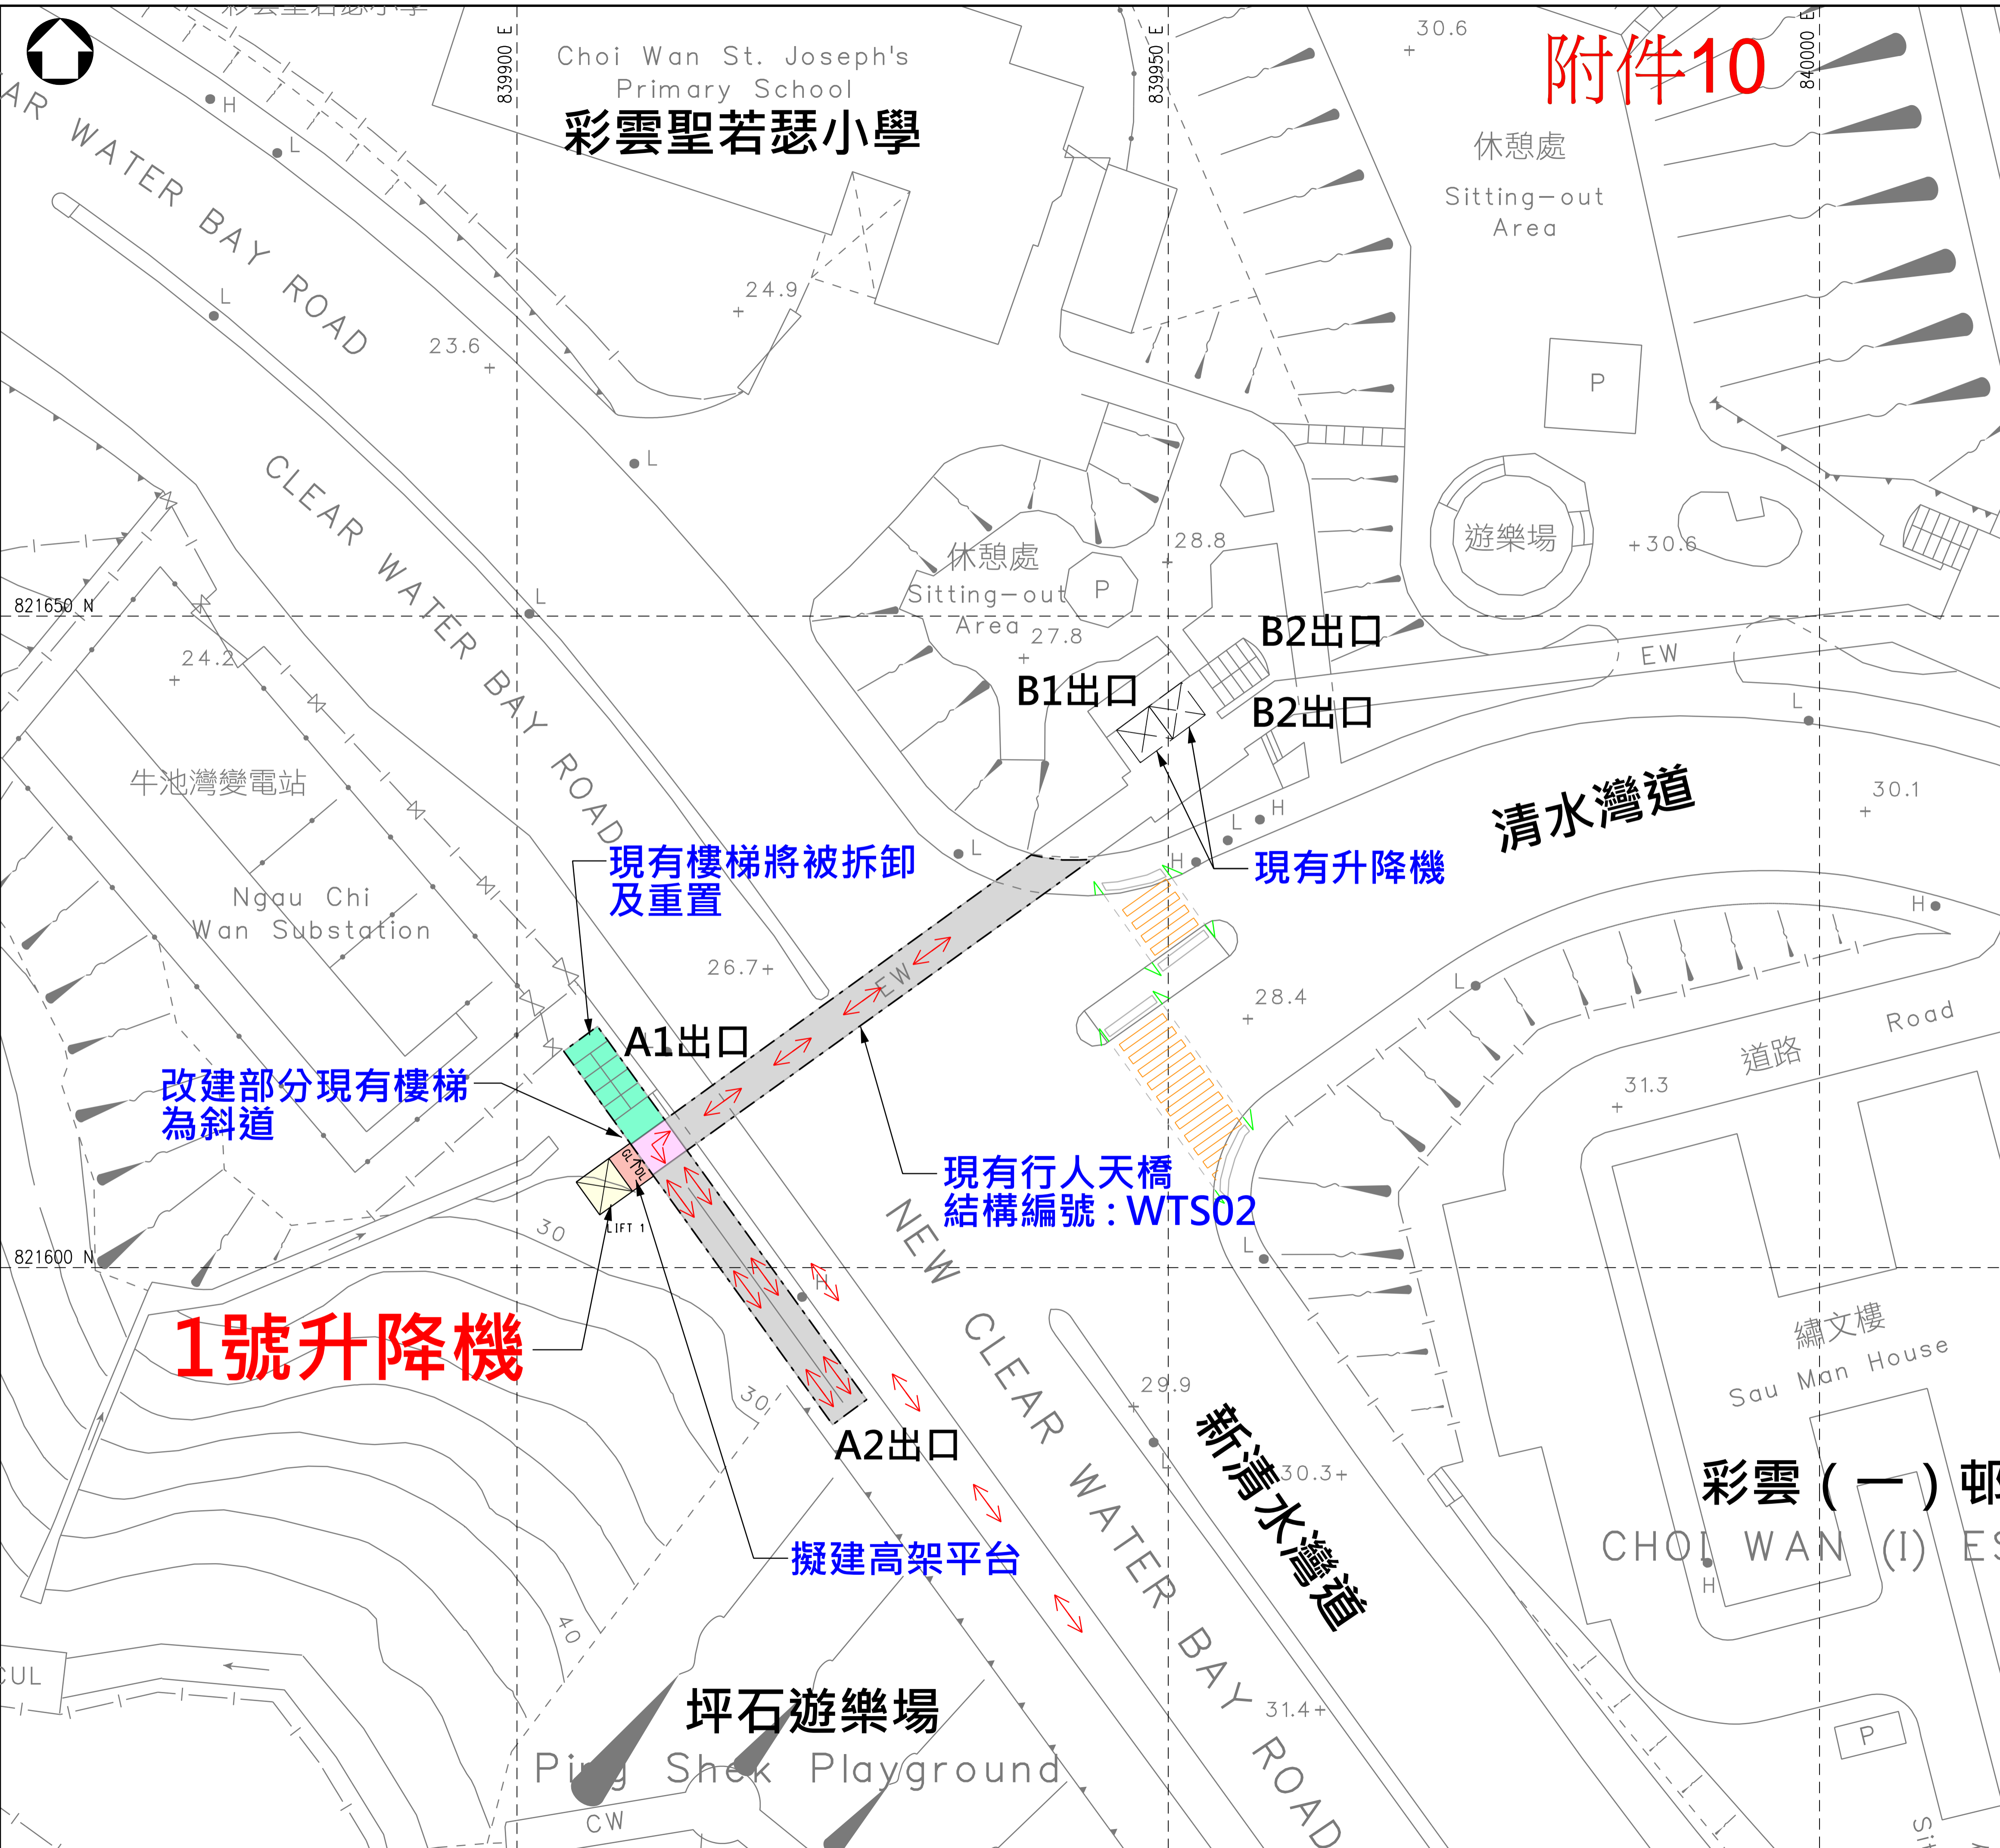

Date : 5/17/2024  
Filename : R:\CAD\_HY202212\Drafting & BIM\dc report (on site)\WSP\_CE54\_DC\_WTS02\_0101.dgn





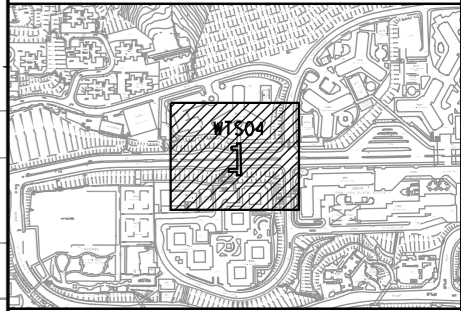

位置圖

圖例:


- 擬建升降機
- 擬建升降機竹園南邨內地行人路出口
- 擬建升降機橋面出口
- 擬建升降機地面出口
- 地段界線
- 擬建高架平台
- 擬建樓梯

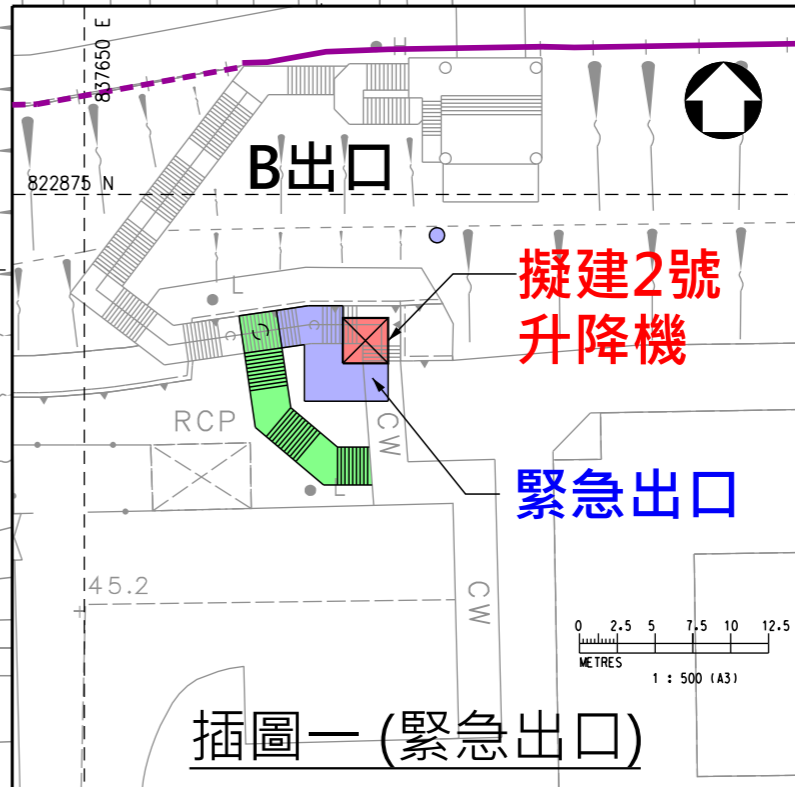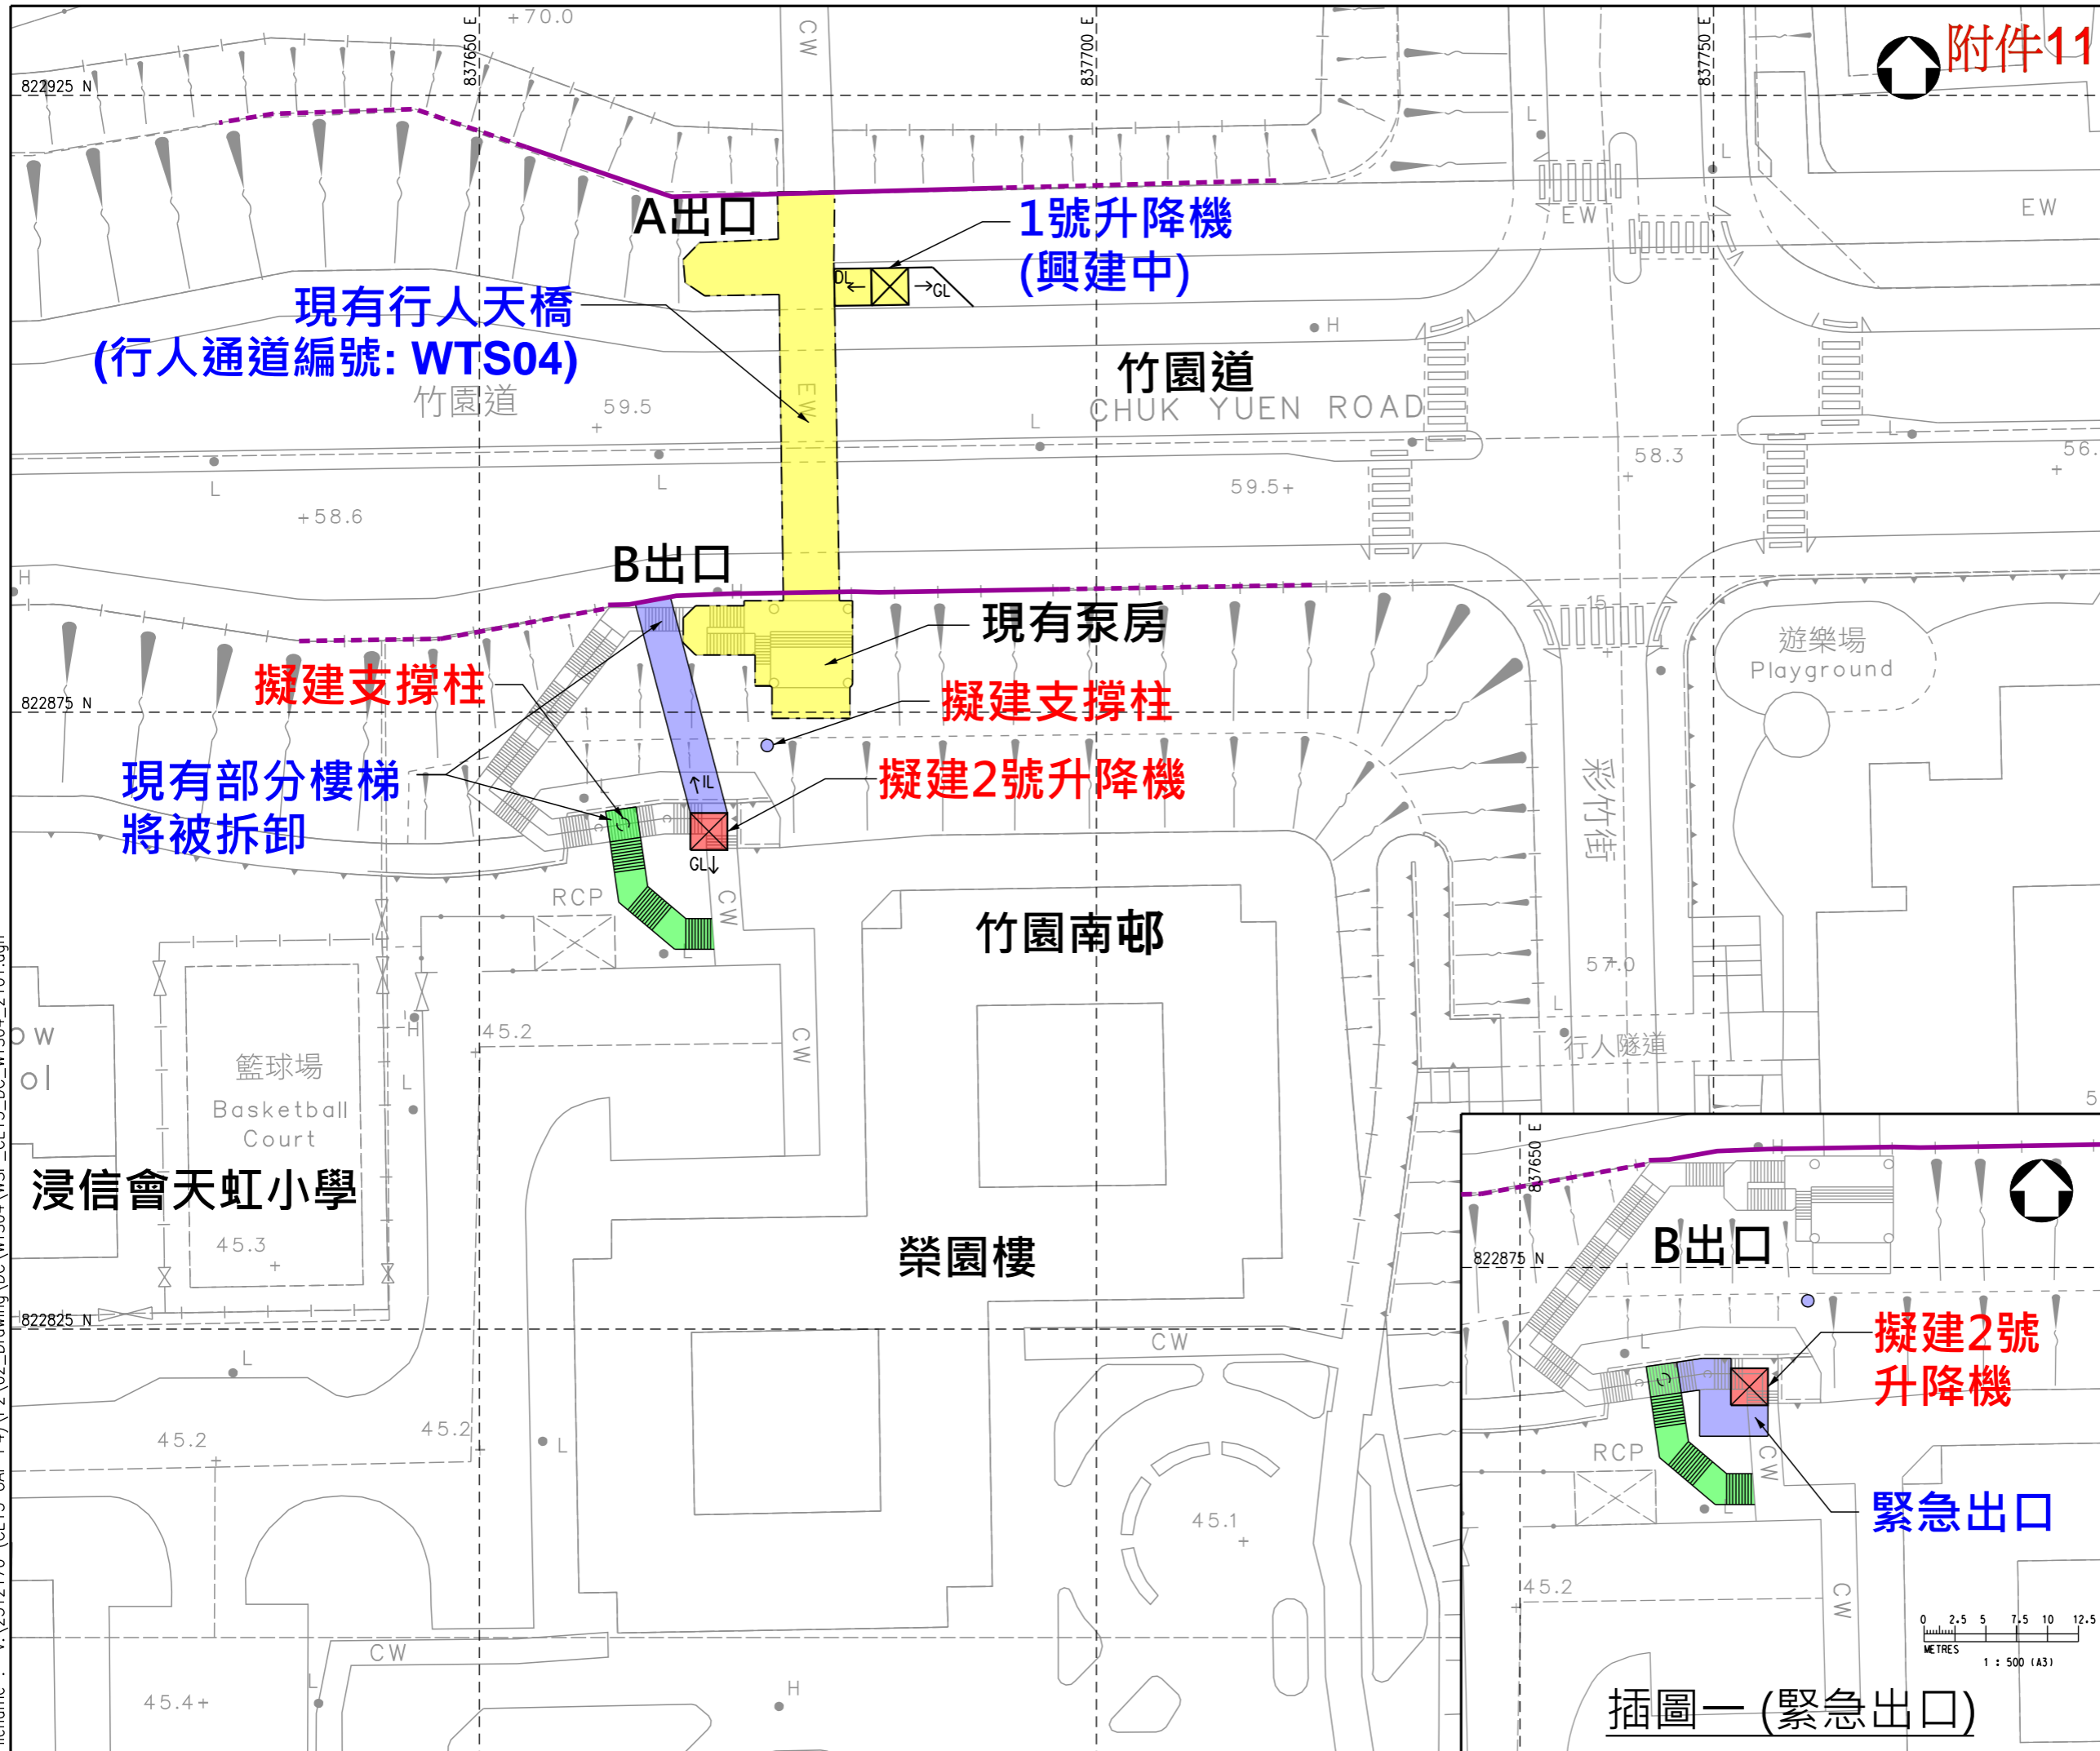

版本	說明	By	日期
<p>顧問 WSP</p>			
<p>項目 顧問合約編號 CE15/2017 (HY) 在行人天橋、高架行人道及行人隧道加建行人暢道通行設施 第四組 - 勘查研究、設計及建造</p>			
<p>圖紙名稱 橫跨竹園道連接鵬程苑及竹園南邨的行人天橋 (行人通道編號: WTS04) 加建升降機圖 (竹園南邨內地行人路及路面)</p>			
圖紙編號 CE 15/DC/WTS04/2101		版本 -	
繪圖 CAD	日期 28-06-22	審核 AL	批准 -
此例 1 : 500 (A3)		狀況 -	
© 版權所有			
路政署 HIGHWAYS DEPARTMENT 主要工程管理處 MAJOR WORKS PROJECT MANAGEMENT OFFICE			

Date : 30/6/2022  
 Filename : V:\2512170 (CE15 UAF P4)\P2\02\_Drawing\DC\WTS04\WSP\_CE15\_DC\_WTS04\_2101.dgn

Date : 13/12/2021  
Filename : X:\2512191A (CE54 UAP PACKAGE 7)\02\_Drawing\Report\DC Report\CADD\WSP\_CE54\_DC\_WTS05\_0101.dgn

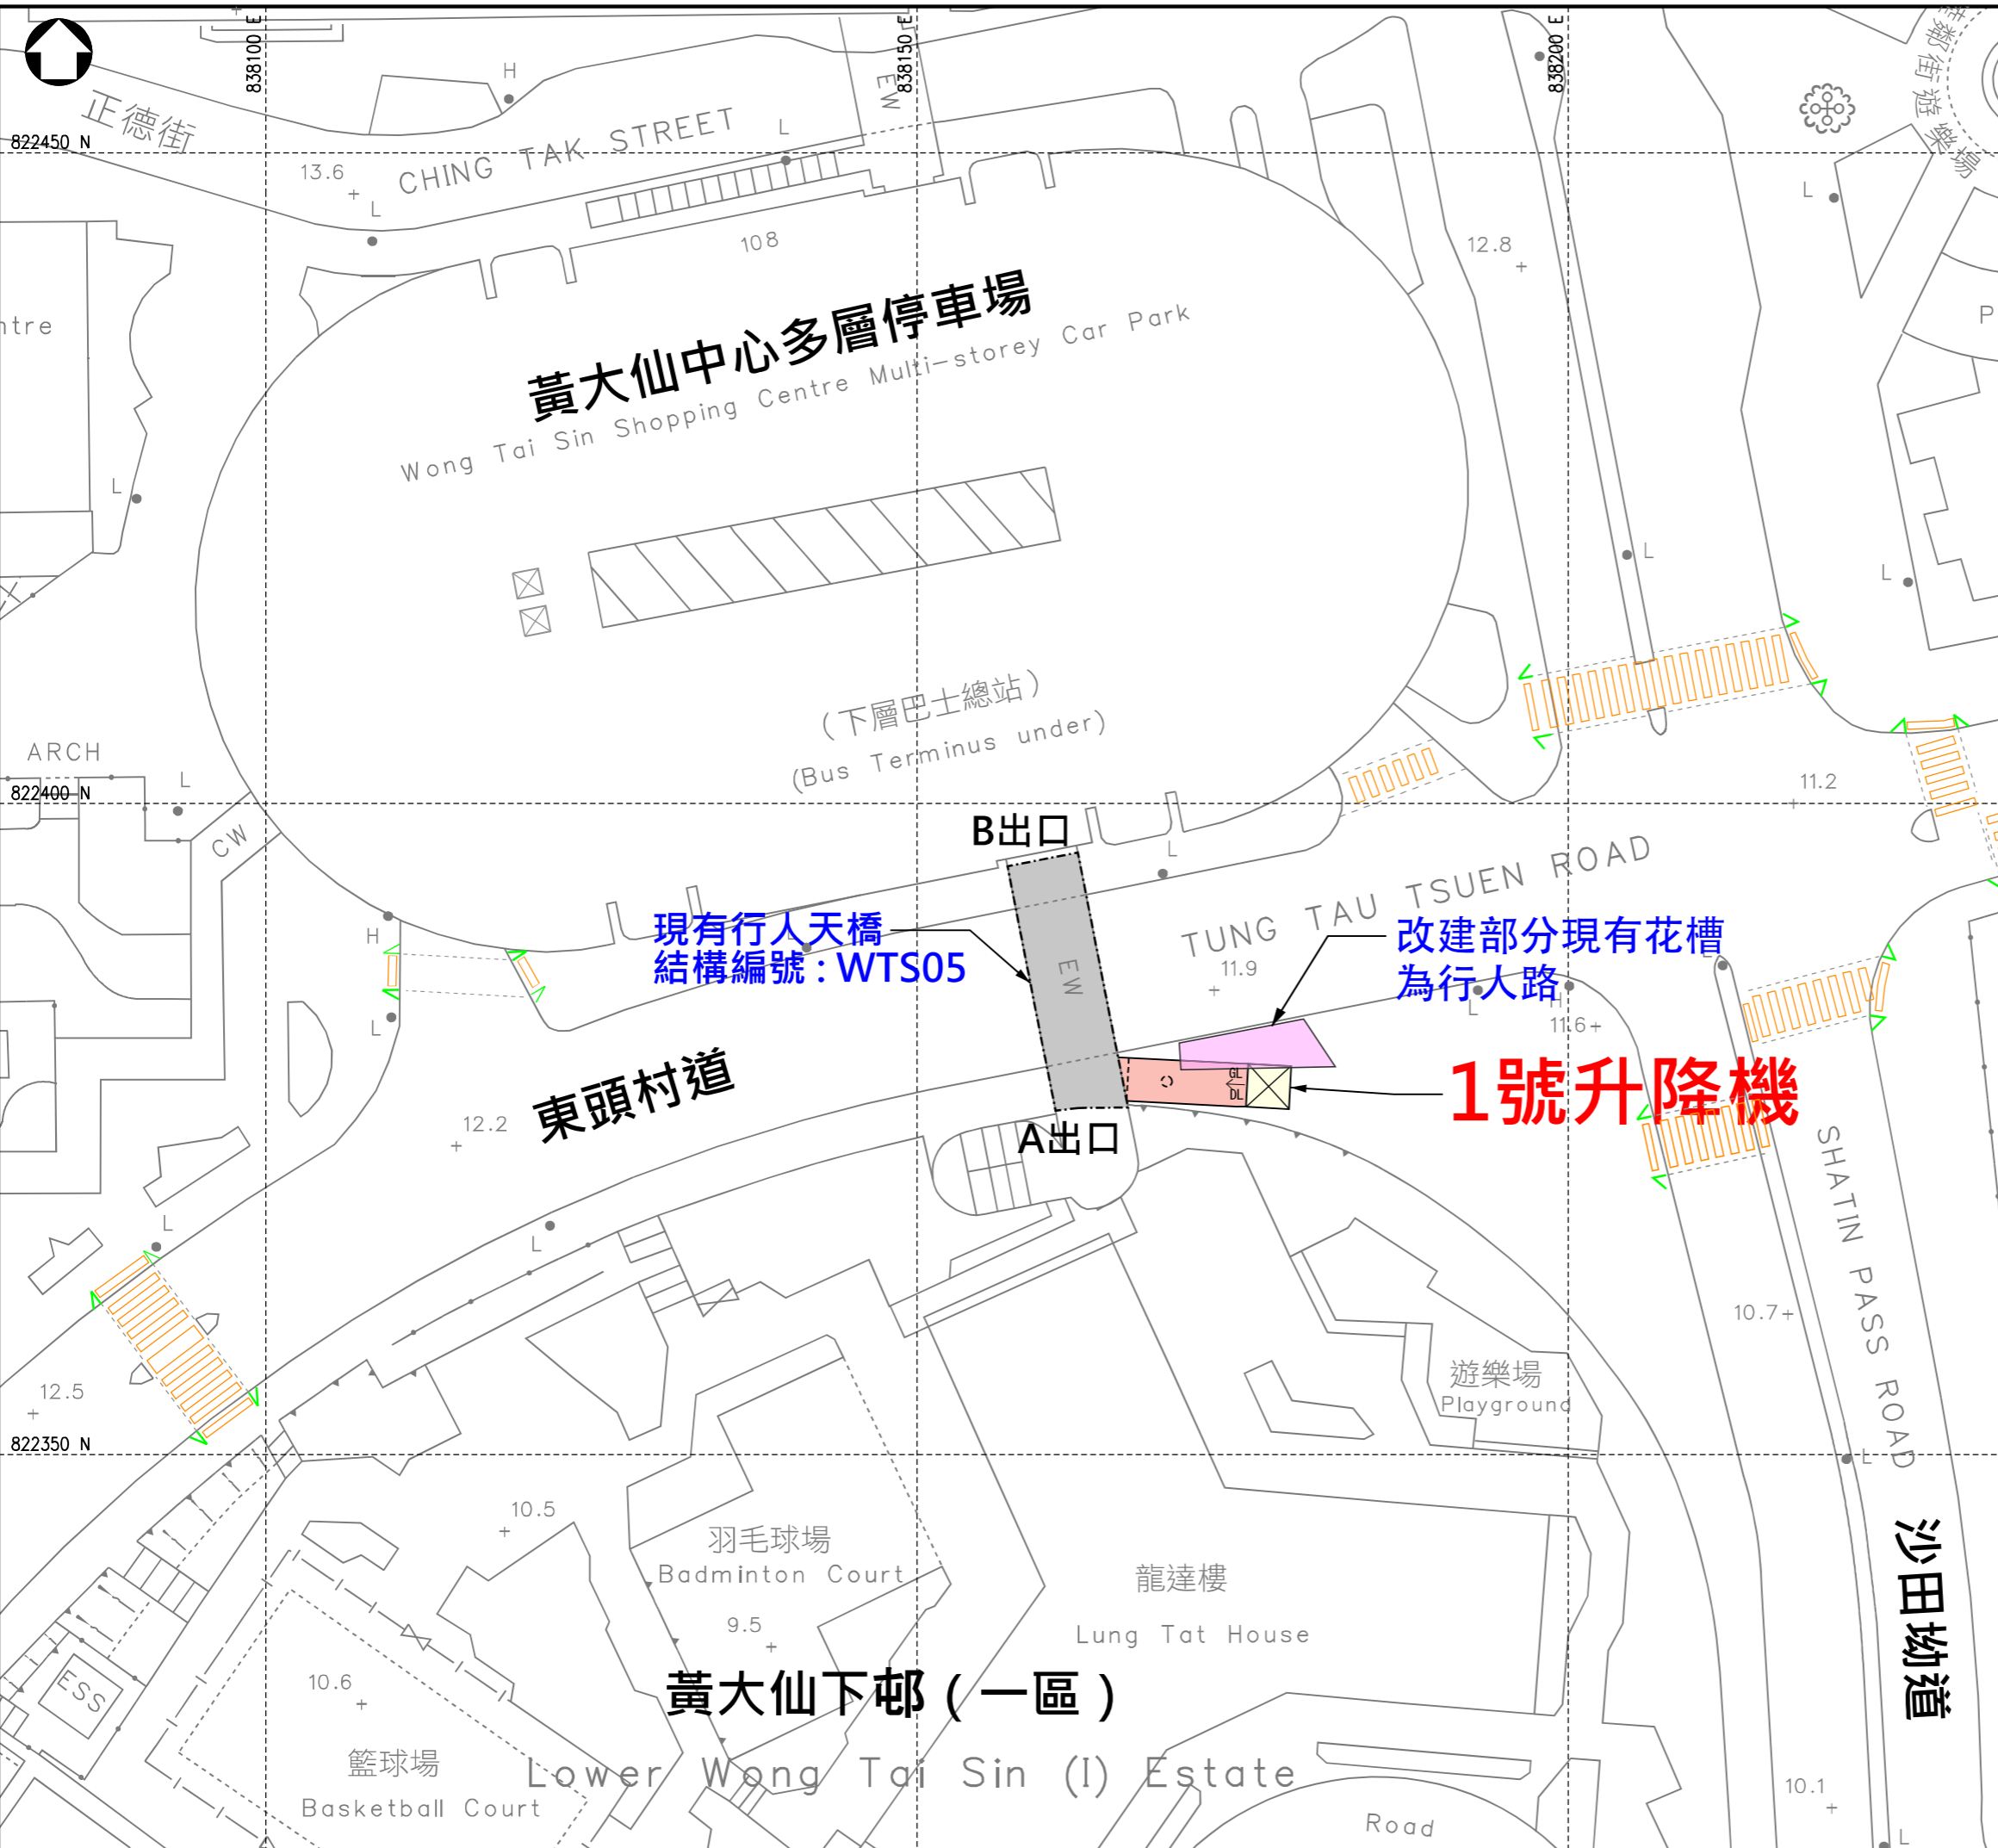

### 附件12

#### 黃大仙區

正德街 CHING TAK STREET  
睦鄰街 MUK LUN ST  
黃大仙紀律部隊宿舍 WONG TAI SIN DISCIPLINED SERVICES QUARTERS  
沙田坳道 SHATIN PASS ROAD  
東頭村道 TUNG TAU TSUEN ROAD

#### 位置圖


比例 1:3000

#### 圖例:

- 現有行人天橋
- 擬建升降機
- 擬建高架平台
- 地面出口
- 橋面出口
- 鄰近地面過路處
- 擬建行人路

#### 圖紙名稱

橫跨東頭村道近黃大仙下邨龍達樓的行人天橋  
(結構編號 : WTS05)

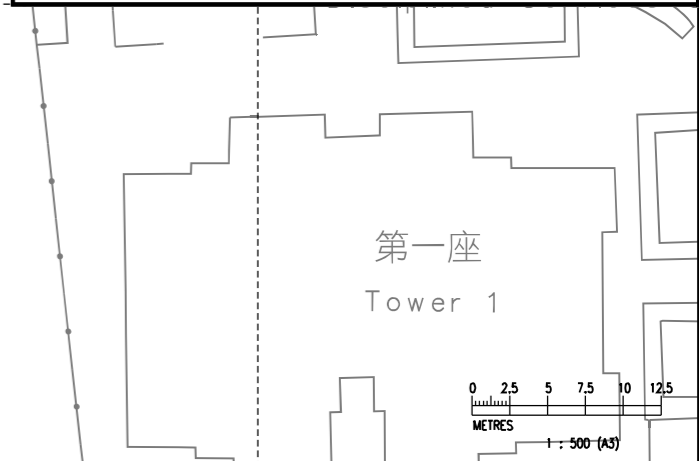

黃大仙中心多層停車場  
Wong Tai Sin Shopping Centre Multi-storey Car Park

(下層巴士總站)  
(Bus Terminus under)

現有行人天橋  
結構編號 : WTS05

改建部分現有花槽  
為行人路

1號升降機

東頭村道

B出口

A出口

TUNG TAU TSUEN ROAD

SHATIN PASS ROAD

沙田坳道

羽毛球場  
Badminton Court

龍達樓  
Lung Tat House

黃大仙下邨 (一區)

Lower Wong Tai Sin (I) Estate


籃球場  
Basketball Court

遊樂場  
Playground

第一座  
Tower 1

# 附件13

黃大仙區

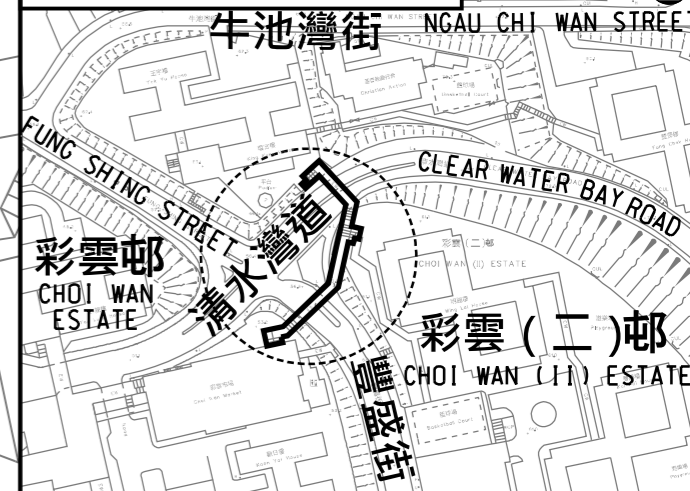


位置圖  
比例 1:3000

## 圖例:

- 現有行人天橋
- 擬建升降機
- 擬建高架平台
- GL 地面出口
- DL 橋面出口
- LL 低層出口
- 鄰近地面過路處

## 圖紙名稱

橫跨清水灣道及豐盛街交界的行人天橋  
(結構編號: WTS06)

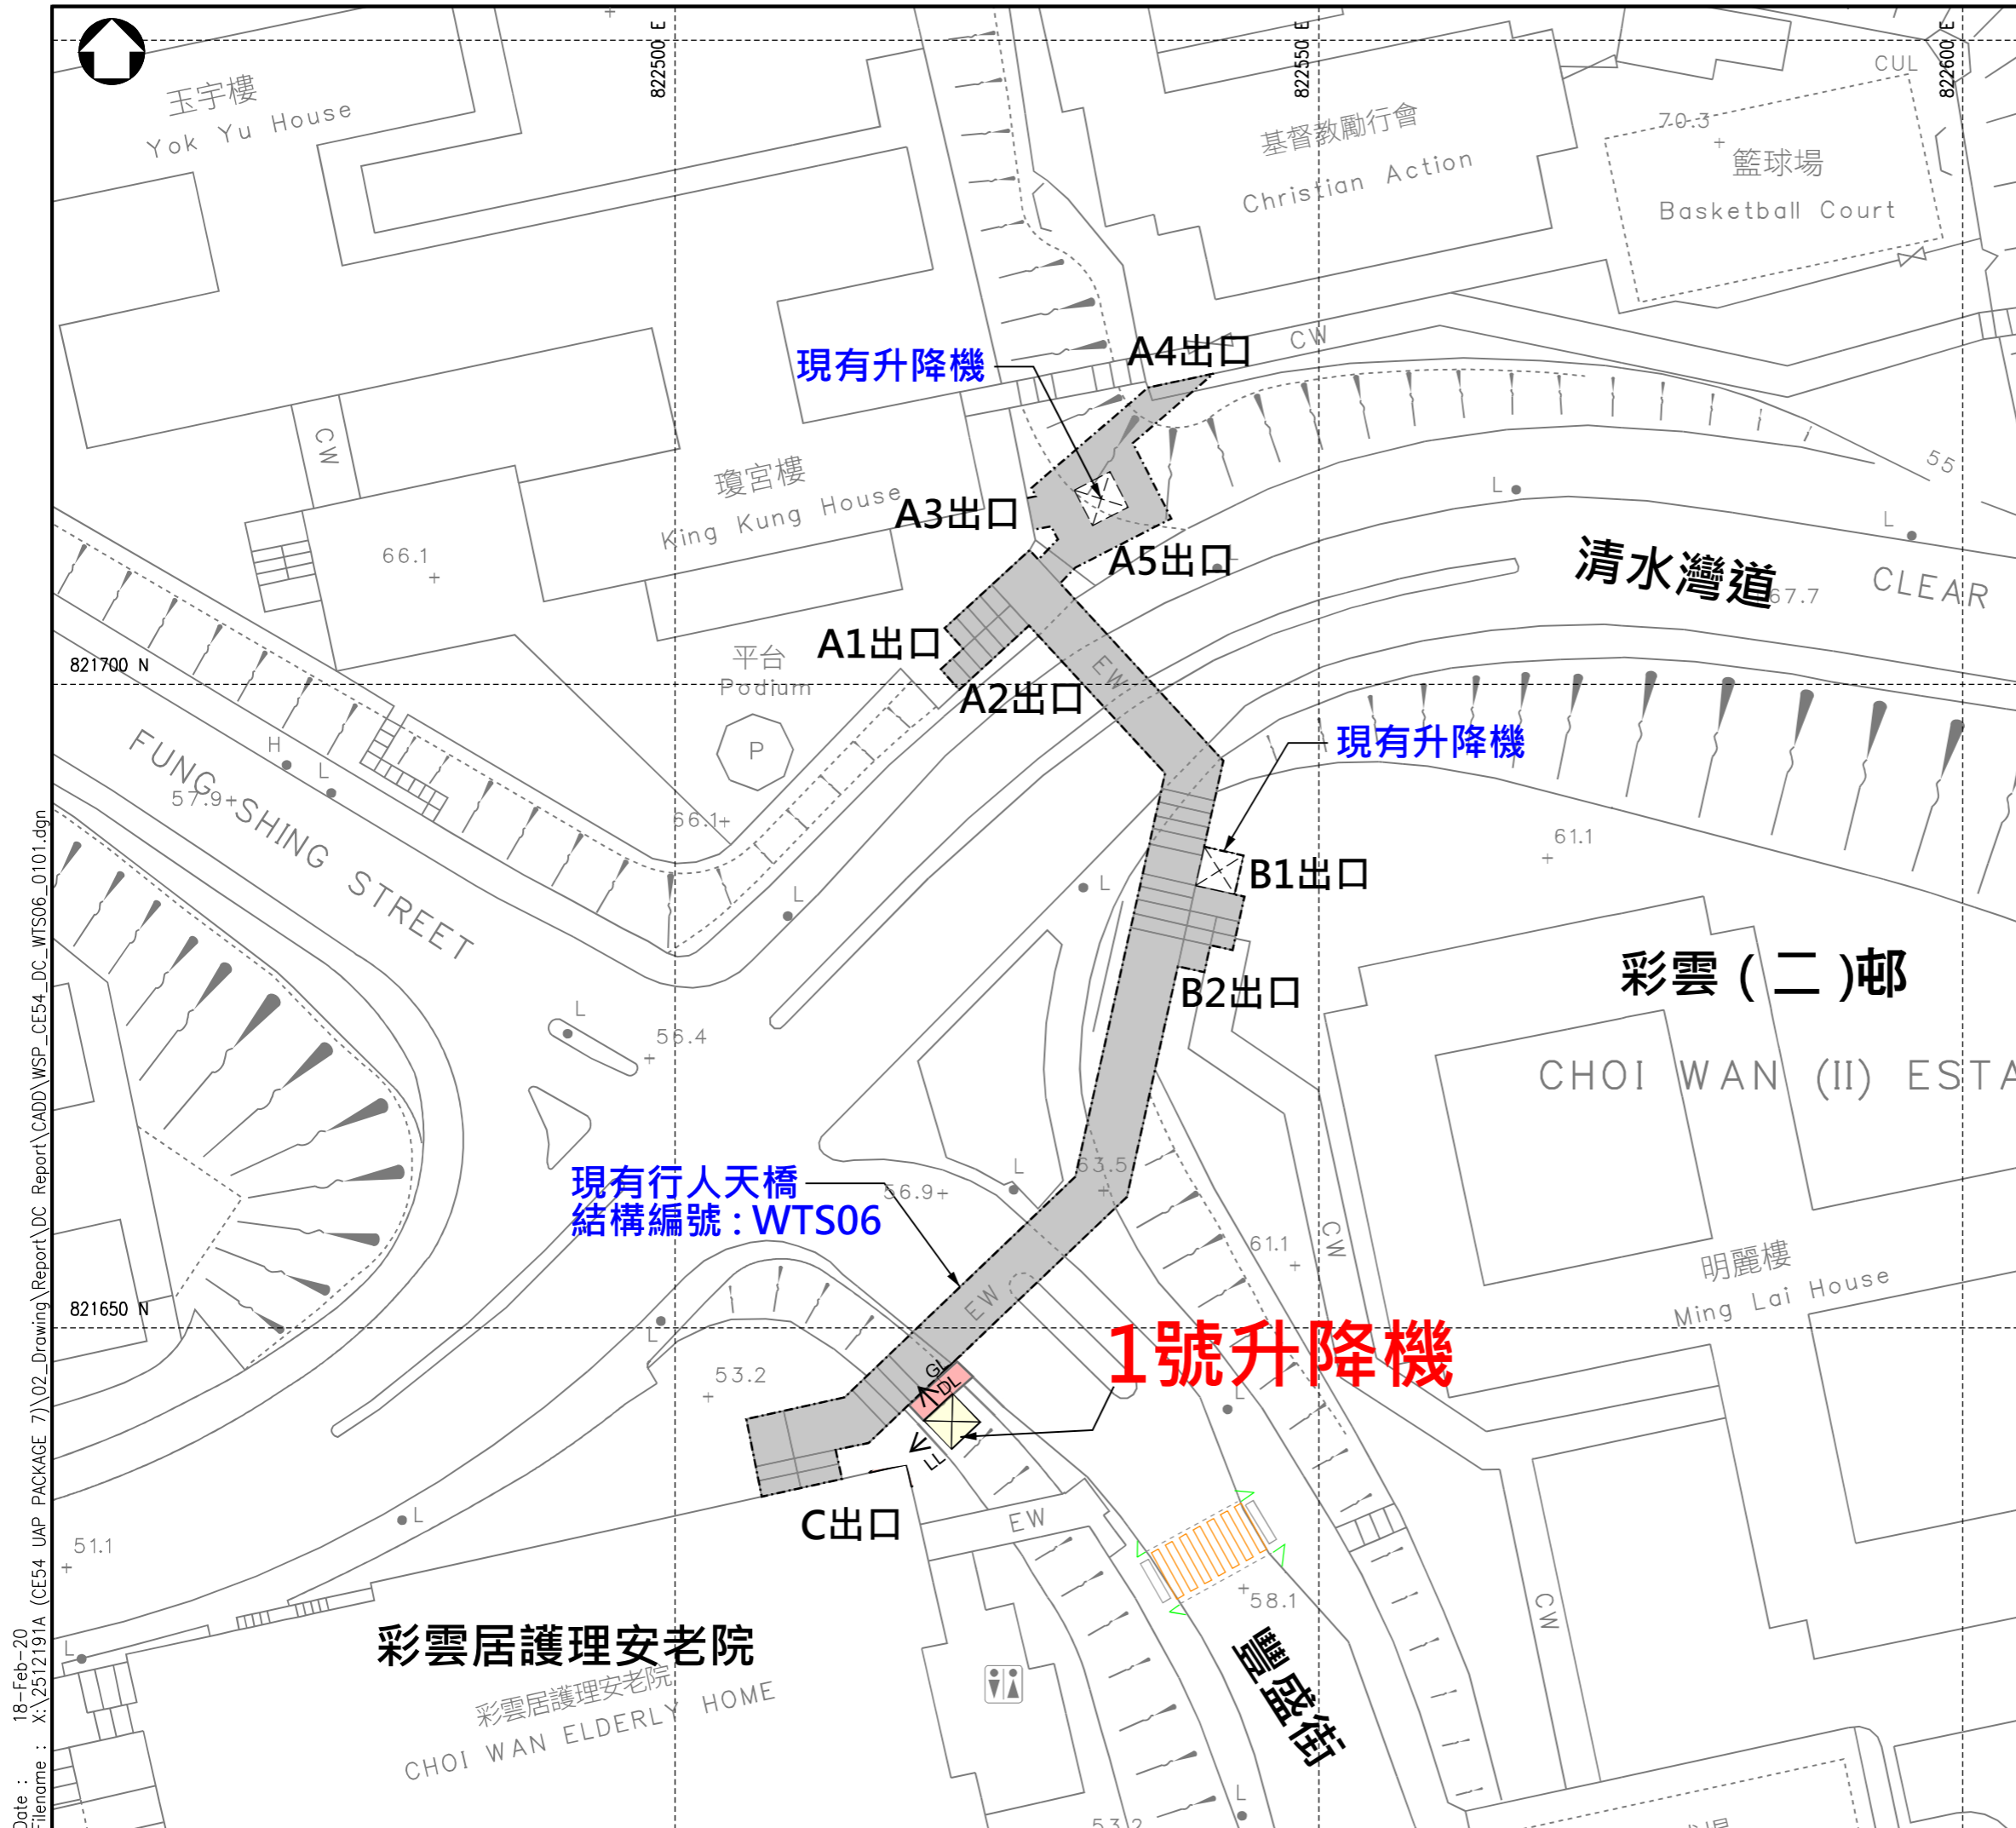

Date : 18-Feb-20  
Filename : X:\2512191A (CE54 UAP PACKAGE 7)\02\_Drawing\Report\DC Report\CADD\WSP\_CE54\_DC\_WTS06\_0101.dgn

