

渠務署

工程合約編號：DC/2008/08 & DC/2010/06
九龍中部及東部污水收集系統改善工程進度報告

目的

這份文件的主要目的，是向黃大仙區議會轄下政府及公用機構工程計劃工作小組各成員，匯報本工程下位於黃大仙區內的工程進度。

DC/2008/08 - 工程進度

2. 東光道、樂善道及育群街（請參閱附圖 1）

承建商已完成了位於東光道及東龍道交界安全島的污水渠接駁工程，並已修復部份行人路。

承建商於 6 月初採用了無坑挖掘方法，展開了位於樂善道及東光道交界花槽旁的污水渠接駁工程，預計 7 月中完成。

飛鳳街及鳴鳳街（請參閱附圖 2）

承建商於 5 月 10 日展開了飛鳳街的鹹水管接駁工程，現已大致完成，行人路面正在修復中。

DC/2010/06 - 工程計劃

3. 牛池灣金池徑之行人路及後巷 (請參閱附圖 3)

承建商計劃於牛池灣金池徑行人路及後巷進行污水渠、食水管及鹹水管改善工程，以提升地區污水收集系統的排放能力和改善現有供水網絡的狀況來配合區內發展。

牛池灣富池徑之行人路 (請參閱附圖 3)

承建商計劃於富池徑行人路進行更換污水渠工程。

DC/2010/06 - 工程計劃的諮詢進度

4. 本署已於 2012 年下半年就有關工程向個別商戶、牛池灣村相關地區人士，包括牛池灣商戶聯合會進行多次諮詢，地區人士大多關注工程開展的目的、施工工期、圍封範圍位置及大小、以及施工期間承建商所採取的環境舒緩措施。

由於牛池灣金池徑現為地區街市，可能受影響的商戶和市民會較多，本署正檢討擬建污水渠的走線，盡量減低對他們的影響。本署正準備在牛池灣富池徑近龍翔道進行工程，現正待路政署批出挖路許可証，希望該路段工程可於本年六月開展，並於二零一四年中完成。

總結


5. 我們會繼續與當區區議員、地區人士、附近居民和商戶保持溝通，並盡量配合他們的需要，以減低工程對他們造成的影響。我們亦已設立了二十四小時熱線（工程編號 DC/2008/08 電話號碼：6209 7517 及工程編號 DC/2010/06 電話號碼：8203 8850），以便市民查詢和收集意見，讓工程能得以順利開展和完成。

文件提交

6. 本文件將提交政府及公用機構工程計劃工作小組二零一三年六月十八日會議，請委員備悉以上安排。

渠務署

二零一三年六月

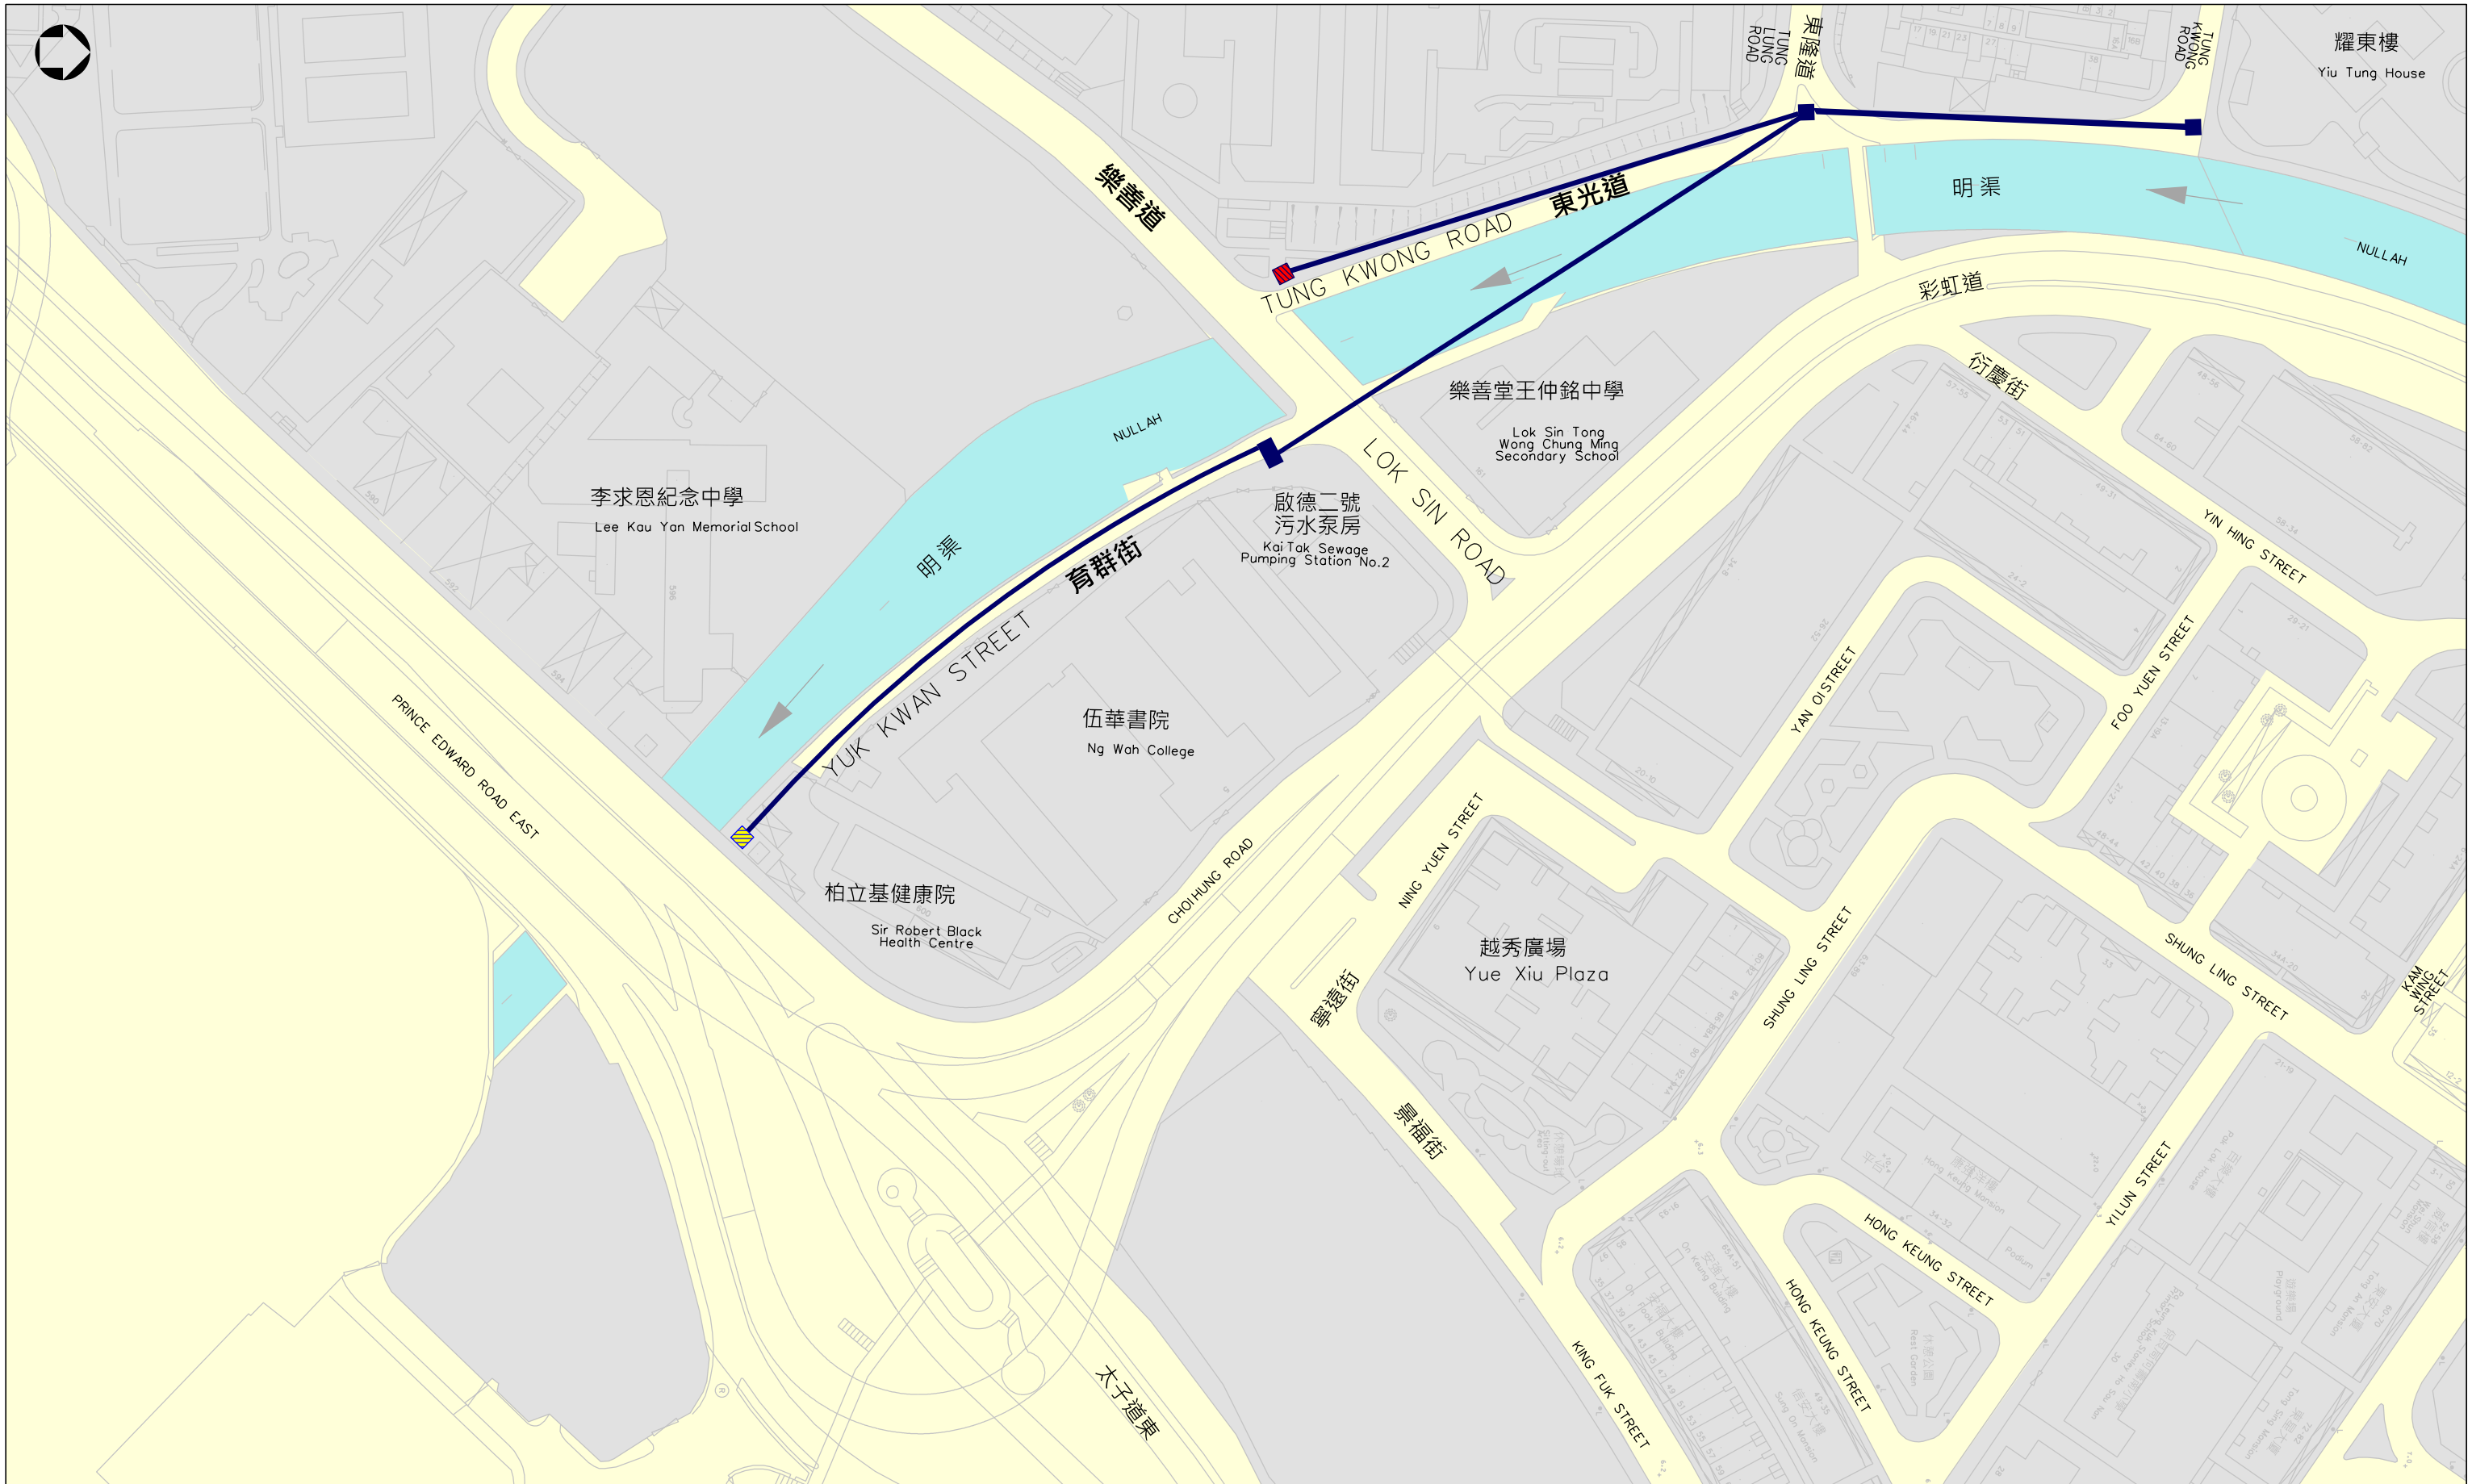


LEGEND 圖例

- 已完成的渠務工程 [採用無坑挖掘方法]
- 已建成的沙井
- 已完成的探井/豎井挖掘工程
- 進行中的污水渠接駁工程 [採用無坑挖掘方法]

 渠務署
Drainage Services Department

 阿特金斯顧問有限公司
Atkins China Ltd

 五洋-協力 聯營
Penta-Ocean - Concentric Joint Venture

CONTRACT NO. 合約編號


DC/2008/08




CONTRACT 合約

九龍中部及東部污水收集系統
改善工程 - 第1期

DRAWING TITLE. 圖則名稱

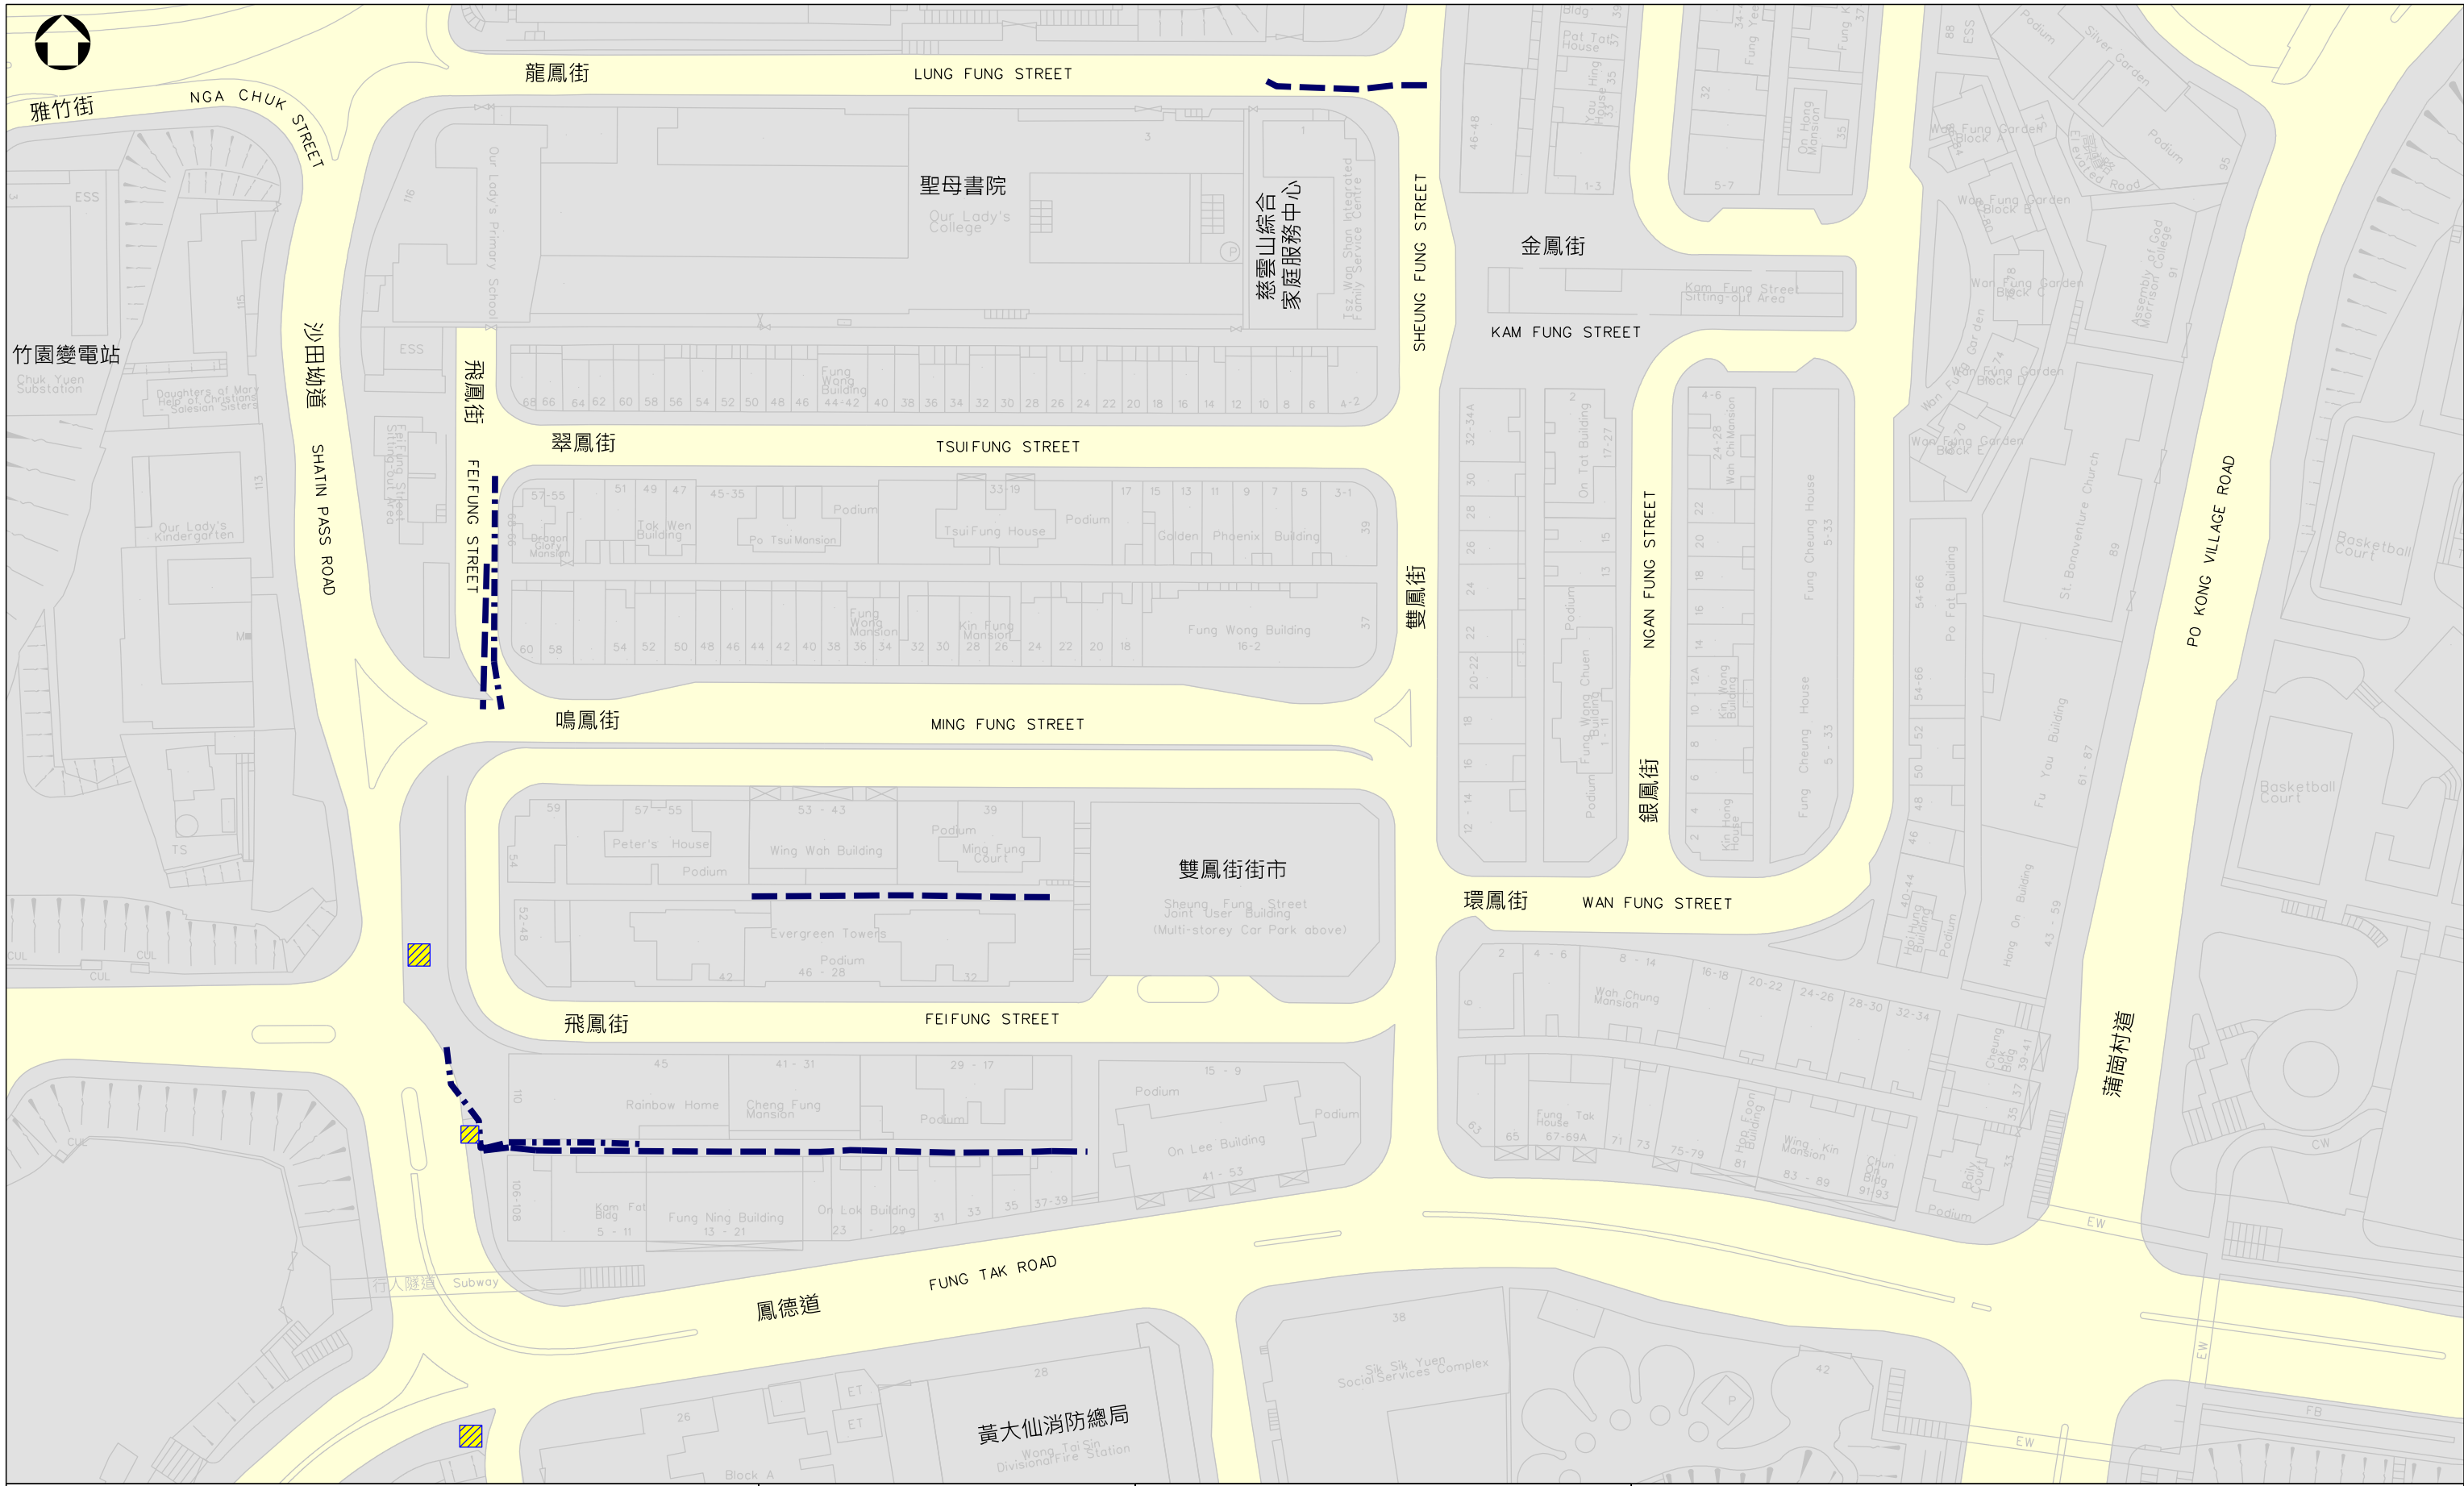黃大仙區工程項目位置(附圖 1)



- LEGEND 圖例
-  已完成的渠務工程[採用傳統的開坑挖掘方法]
 -  已完成的水務工程[採用傳統的開坑挖掘方法]
 -  已完成的探井/豎井挖掘工程

渠務署
Drainage Services Department

ATKINS 阿特金斯顧問有限公司
Atkins China Ltd

五洋-協力 聯營
Penta-Ocean - Concentric Joint Venture

CONTRACT NO. 合約編號
DC/2008/08

CONTRACT 合約
九龍中部及東部污水收集系統
改善工程 - 第 1 期

DRAWING TITLE. 圖則名稱
黃大仙區工程項目位置(附圖 2)

黃大仙區工程項目位置

