

運輸及房屋局/路政署/港鐵公司
工程編號: 6061TR及6062TR
沙中線黃大仙段工程進度報告

目的

此文件的主要目的，是向黃大仙區議會轄下政府及公用機構工程計劃工作小組各成員匯報沙田至中環線（沙中線）黃大仙段的工程進展。

工程進度

2. 沙中線黃大仙段的主要工程包括：
 - (a) 鑽石山站擴建及改善工程；
 - (b) 鑽石山站至啓德站隧道建造工程；
 - (c) 黃大仙段鐵路隧道、相關通風設施及緊急救援通道；
 - (d) 黃大仙公共運輸交匯處；及
 - (e) 慈雲山區行人設施改善工程。

鑽石山站擴建及改善工程

3. 現有港鐵鑽石山站大堂已豎立圍板，並在非行車時間進行改善工程，包括興建行人隧道接駁現有車站及擴建的沙中線部分、拆卸及興建新商舖、增設三部升降機、加建十二條扶手電梯，及加設公眾洗手間等。

4. 為配合工程，鑽石山站將實施多項臨時措施，而下列措施將於今年第四季實行：

- (a) 轉換出入閘機方向
- (b) 圍封月台部份位置
- (c) 圍封大堂A出入口近電梯位置

5. 鑽石山站 A1 出入口外對出近龍蟠街位置正進行升降機建造工程，承建商現正平整工地，預計相關地基工程將於二零一三年十月開展。

6. 前大磡村工地正進行鑽石山站擴建部分的前期工程，包括興建豎井及混凝土隔牆等。承建商正進行搬遷機槍堡的準備工作，至於前皇家空軍飛機庫的搬遷工作已於較早前完成，其組件已妥善放置於工地內；預計車站相關挖掘及建造工程將於二零一三年第四季展開，而隧道鑽挖工程將於二零一四年第二季展開。

鑽石山站至啓德站隧道建造工程

7. 承建商正於采頤花園旁的工地進行地質勘探、豎立圍板、及建造臨時工地出入口等前期工程。部分彩虹道行人路及行車路將於二零一三年第三季至二零一四年第三季分階段臨時改道，以進行地下喉管更新等前期工程。(詳見附圖一)

黃大仙段鐵路隧道、相關通風設施及緊急救援通道

8. 馬仔坑遊樂場臨時工地的工程進展如下(詳見附圖二)：

- (a) 圍板豎立工程已於二零一三年八月完成；
- (b) 接駁現有馬仔坑道行人天橋和巴士站之臨時行人天橋預計於二零一三年九月內落成及啓用，工地出入口同時稍向南遷移，為保障道路使用者安全，工地出入口對出之部分行人路將暫時封閉，行人須經臨時行人天橋前往巴士站；
- (c) 混凝土隔牆建造工程將於二零一三年第四季展開。馬仔坑遊樂場部分草地將於今年第四季重開予公眾使用。

黃大仙公共運輸交匯處

9. 位於黃大仙廟旁的黃大仙公共運輸交匯處，現正進行地質勘探、遷移地下管道及豎立圍板等前期工程，預計公共運輸交匯處將於二零一六年落成。另外，緊急救援通道相關工程將於今年第四季開展。

慈雲山區行人設施改善工程

10. 慈雲山區行人設施改善工程已於二零一二年第三季展開，預計於二零一四年至二零一六年陸續完成。主要工程進展如下：

位置	工程	施工日期	進度
毓華街	興建橫跨毓華街的行人天橋，以連接蒲崗村道現有行人天橋	2012年11月至 2015年第2季	正進行地基工程
	於康秀樓對出興建升降機	2013年1月至 2014年第4季	正進行地基工程
	興建行人天橋及扶手電梯，連接樂安樓現有有蓋行人通道及近樂合樓現有升降機塔	2013年第3季至 2016年第3季	正諮詢地區人士對臨時交通管理措施的意見，預計最快於今年9月展開工程。
蒲崗村道	興建升降機及有蓋行人通道	2012年12月至 2015年第3季	正進行遷移地下公用設施工程
龍蟠街	興建升降機及樓梯	2013年1月至 2014年第3季	正進行遷移地下公用設施工程
鳳德道	興建升降機及有蓋行人通道	2013年2月至 2015年第2季	正進行遷移地下公用設施工程
雲華街	興建升降機	2013年第3季至 2014年第4季	正進行豎立圍板等前期工程
慈雲山道 (近正康樓)	興建升降機及樓梯	2013年第3季至 2016年第1季	正進行地質勘探等前期工程。
慈雲山道 (近正暉樓)	興建行人天橋及電梯	2013年第3季至 2016年第4季	正進行豎立圍板及移除樹木等前期工程。

11. 為配合工程，港鐵公司將在區內分階段實施臨時交通管理措施，如臨時封閉及收窄部分行人路、行車路及遷移巴士站，受影響的道路主要包括慈雲山道、雲華街、惠華街、毓華街、蒲崗村道、鳳德道和龍蟠街等。

社區聯繫

12. 政府及港鐵公司會繼續透過不同渠道，與社區保持溝通，包括向受工程影響的屋苑、地區人士、機構及學校派發通告，適時通知有關臨時交通管理措施的安排及詳情，並會將有關資料上載至沙中線網頁供市民查閱，並會定期印製沙中線通訊，向區內持份者提供最新的交通管理措施的資訊。港鐵公司亦會主動聯絡機構及學校作出簡

介，詳細解釋臨時交通管理的安排，聆聽居民及地區人士對工程進度及臨時交通管理措施的意見。


文件提交

13. 本文件將提交政府及公用機構工程計劃工作小組二零一三年九月二十四日會議，請委員備悉以上安排。

運輸及房屋局
路政署
港鐵公司
二零一三年九月

附圖一

彩虹道的臨時改道措施

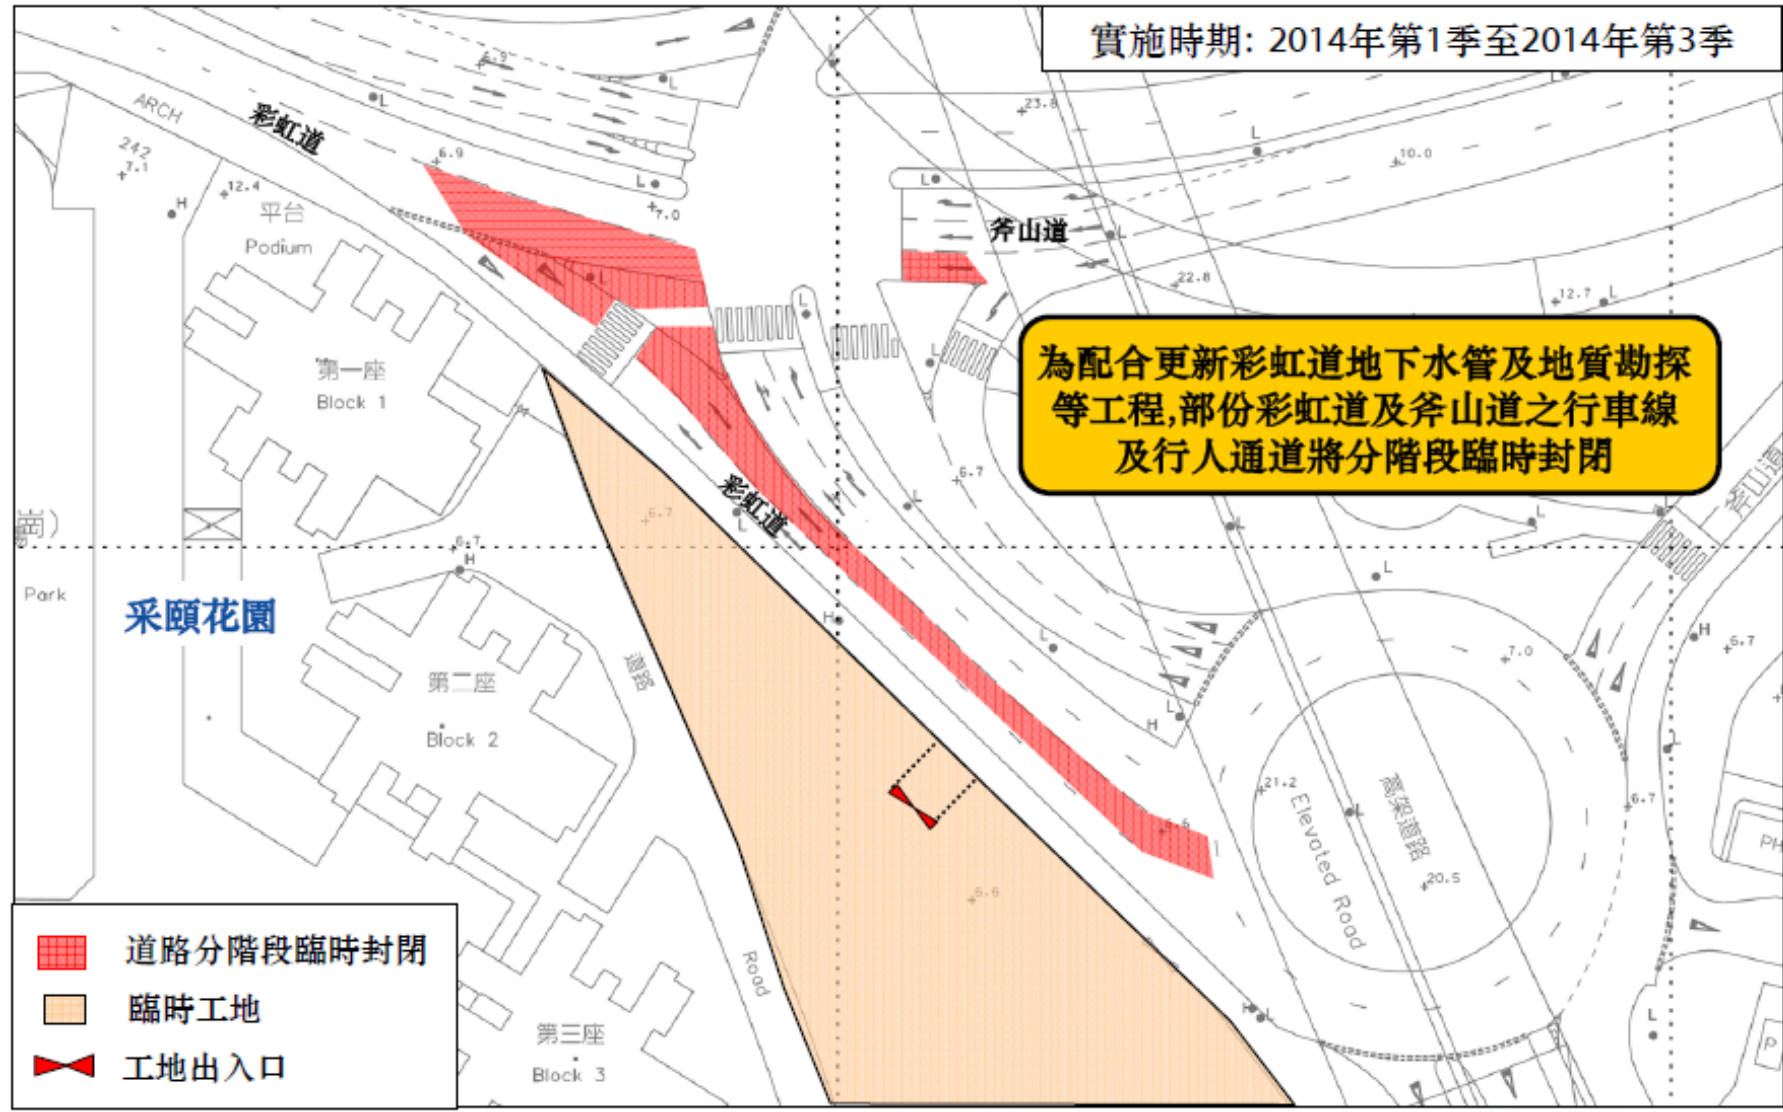

附圖二

馬仔坑道的臨時交通管理措施

