

黃大仙區議會轄下

政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 2 /2014 號 (18.3.2014)

渠務署

工程合約編號：DC/2010/06

九龍中部及東部污水收集系統改善工程(第 2 期)進度報告

目的

這份文件的主要目的，是向黃大仙區議會轄下政府及公用機構工程計劃工作小組各成員，匯報本工程位於黃大仙區內的進度。

工程計劃

2. 牛池灣富池徑之行人路 (請參閱附圖)

承建商計劃於富池徑行人路進行更換污水渠工程。

3. 考慮到商戶、地區人士及康樂及文化事務署的意見後，本署現計劃以無坑挖掘方式更換富池徑商戶對出行人路的污水渠，以減少對商戶及居民的影響。承建商會於新建渠道的兩端(富池徑行人路醫生診所對出位置及龍翔道行人路近樓梯位置)建造豎井。本署計劃於本年 3 月初於診所對出位置進行探坑工程，工期約 1 星期，工程進行期間，富池徑行人路會預留 1.5 米供市民使用。探坑工程完成後，承建商會先回填並重開路面。接著承建商會於富池徑行人路地底挖掘隧道以更換污水渠，其間工程將不會影響富池徑行人路路面，預計本年年中完成有關無坑挖掘工程。隨後，承建商須於診所對出位置開挖路面和進行沙井建造工程，預計富池徑內整段的渠務工程可於本年下旬完成。

4. 至於位於龍翔道行人路的渠務工程，會以明坑挖掘方式更換污水渠，預計於本年 3 月展開，並可於本年下旬完成。

工程計劃的諮詢進度

5. 本署於本年 2 月下旬已就上述最新工程計劃向受影響的商戶進行諮詢，本署未有收到商戶及地區人士的反對意見。同時，本署已邀約當區區議員於本年 3 月會面，並就最新計劃詳細商討以及滙報最新進度。

總結

6. 我們會繼續與當區區議員、地區人士、附近居民和商戶保持溝通，並盡量配合他們的需要，以減低工程對他們造成的影響。我們亦已設立了二十四小時熱線（電話號碼：8203 8850），以便市民查詢和收集意見，讓工程能得以順利開展和完成。

文件提交


7. 本文件將提交政府及公用機構工程計劃工作小組二零一四年三月十八日會議，請委員備悉以上安排。

渠務署

二零一四年三月



附圖

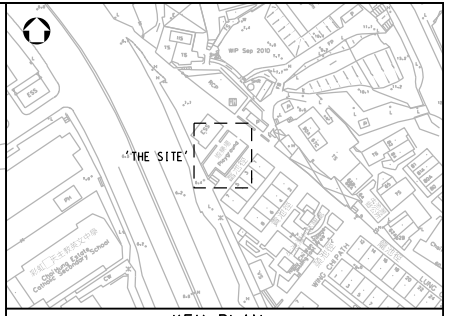

KEY PLAN SCALE: N.T.S.

LEGEND:

- 原有污水渠走線
- 建議的污水渠走線

建議的污水渠走線
(以無坑挖掘方式更換)

(明坑挖掘)

-	SITE SKETCH	SL	11/13	JC	HFC
REV	DESCRIPTION	BY	DATE	CHKD	AUTH

渠務署
Drainage Services Department

顧問工程管理部
Consultants Management Division

ATKINS 阿特金斯顧問有限公司
Atkins China Ltd


CONTRACT
九龍中部及東部
污水收集系統改善工程 - 第2期

CONTRACT No. DC/2010/06

TITLE
黃大仙區工程項目位置 (附圖)

SCALE AT A3	DESIGN SL	DRAWN BW	CHECKED JC	AUTHORISED HFC
AS SHOWN	DATE FEB 14	DATE FEB 14	DATE FEB 14	DATE FEB 14

DRAWING No. DC/2010/06/SK/828



LAYOUT PLAN
SCALE: 1:250

遊樂場
Playground

龍翔道

富池徑

龍池徑

貴池徑

90A 67C

+7.7

+8.6

6.4+

6.2+

3+

+8.4

6.2
