

# 西貢公路 改善工程第一期

# 工程進度


---

- 第三階段的探土工程進行中，預計完工日期為2014年中
- 其他詳細設計現正進行，已考慮過往會議所收集的意見，並適當地反映於設計中

# 第三階段探土工程位置



# 第三階段探土工程位置

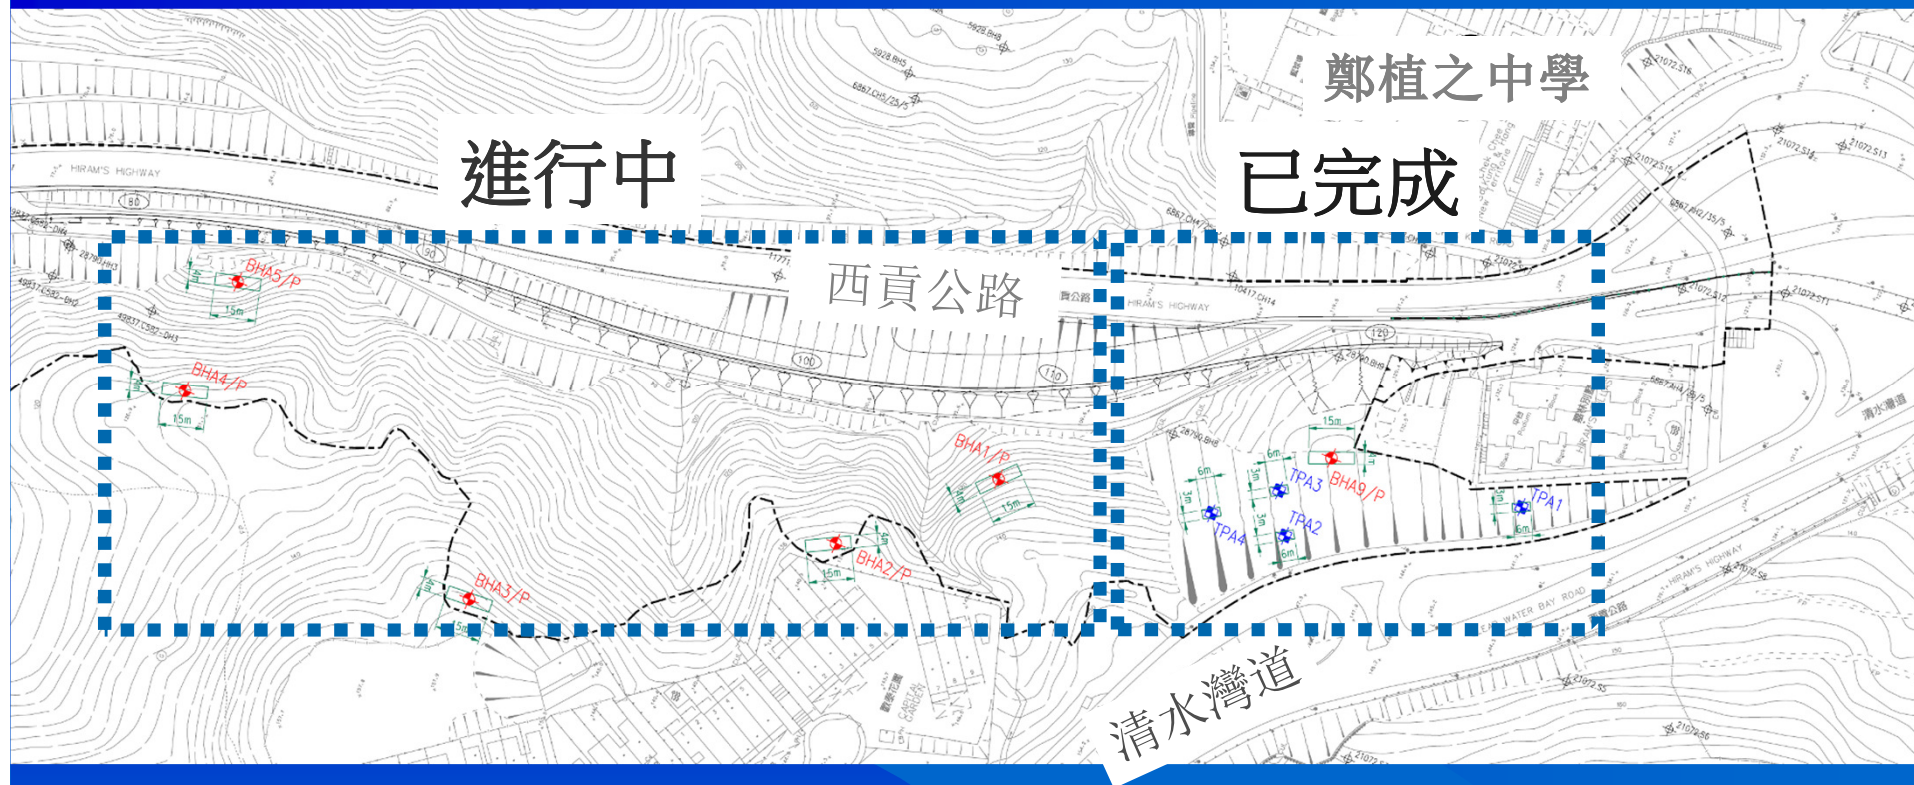

# 橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會

---

- 12月17日已再次遞交了隔音屏障，蠓涌橋(鋼拱橋設計)和南邊圍行人天橋設計圖則給予橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會審核
- 審核結果:同意隔音屏障，鋼拱橋和行人天橋的設計
- 1月21日已遞交了擋土牆設計圖則給予橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會審核
- 審核結果:同意擋土牆的設計



# 南邊圍行人天橋(設計圖片)





# 蠓涌橋 (鋼拱橋設計圖片)



柏麗灣別墅



# 蠔涌橋 (鋼拱橋設計圖片)






# 柏麗灣別墅

---

- 已於2014年2月15日再次與柏麗灣別墅居民會面商談蠔涌橋(鋼拱橋設計)事宜
- 收集了居民對蠔涌橋外觀設計的意見

# 嘉林別墅段:擋土牆(設計圖片)

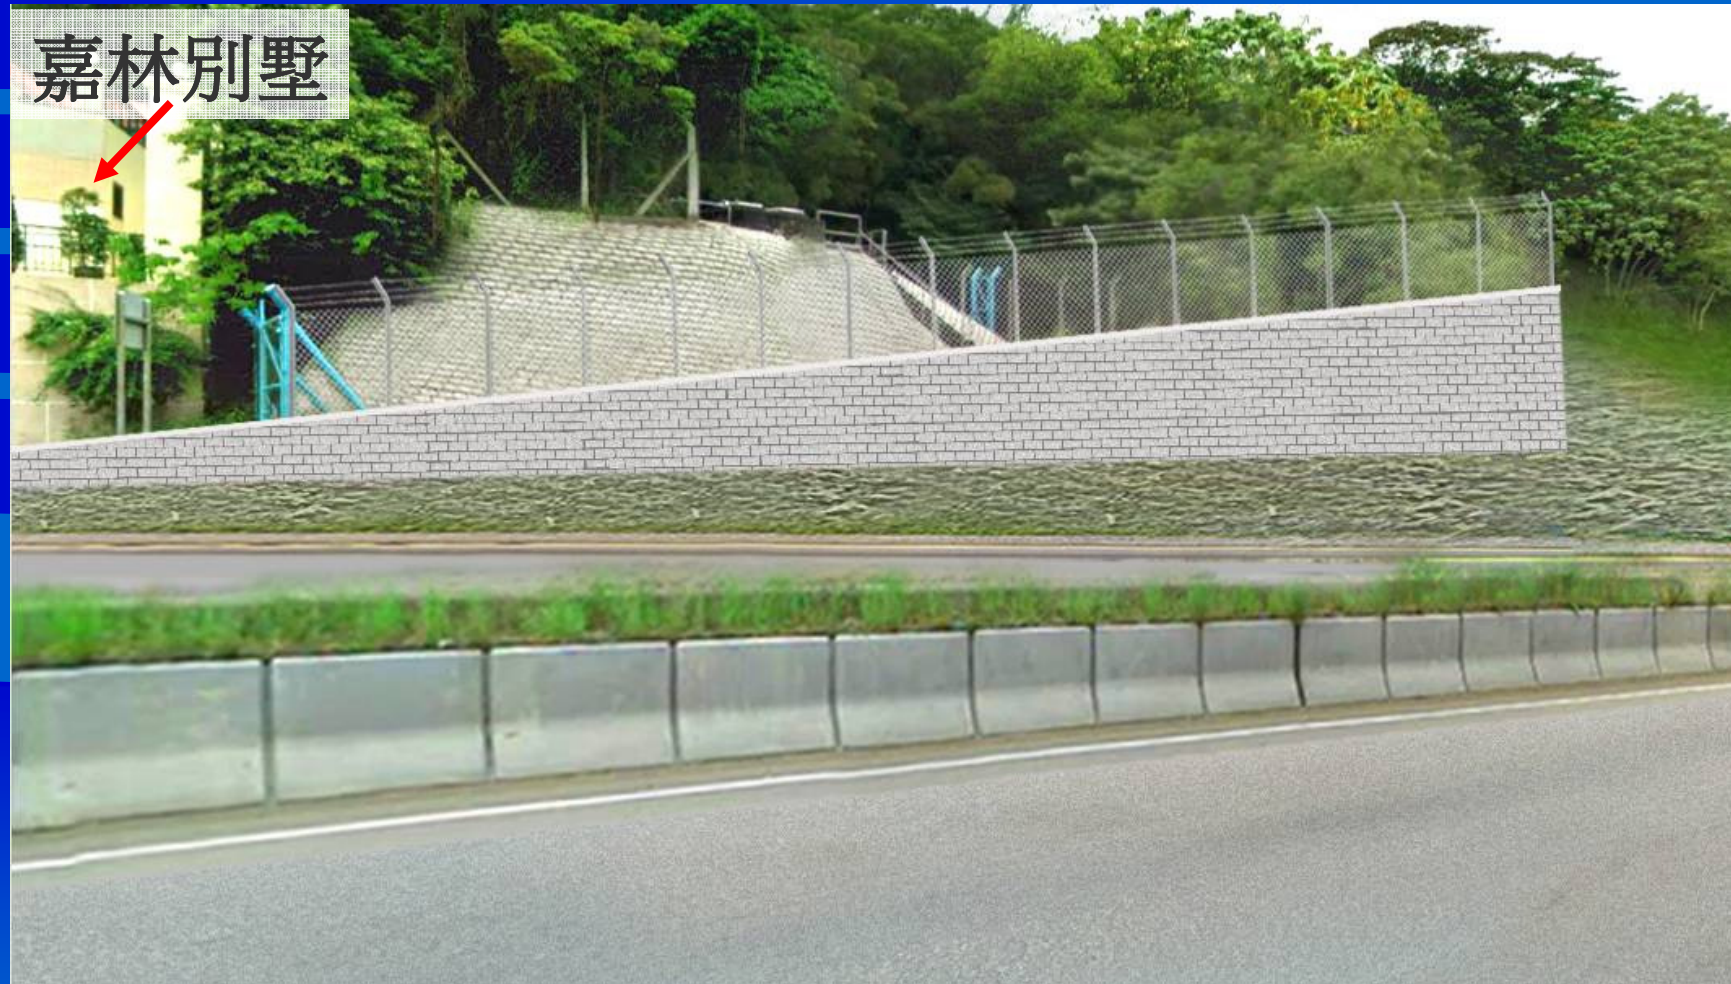




# 匡湖居段:擋土牆(設計圖片)





# 匡湖居段:擋土牆(設計圖片)

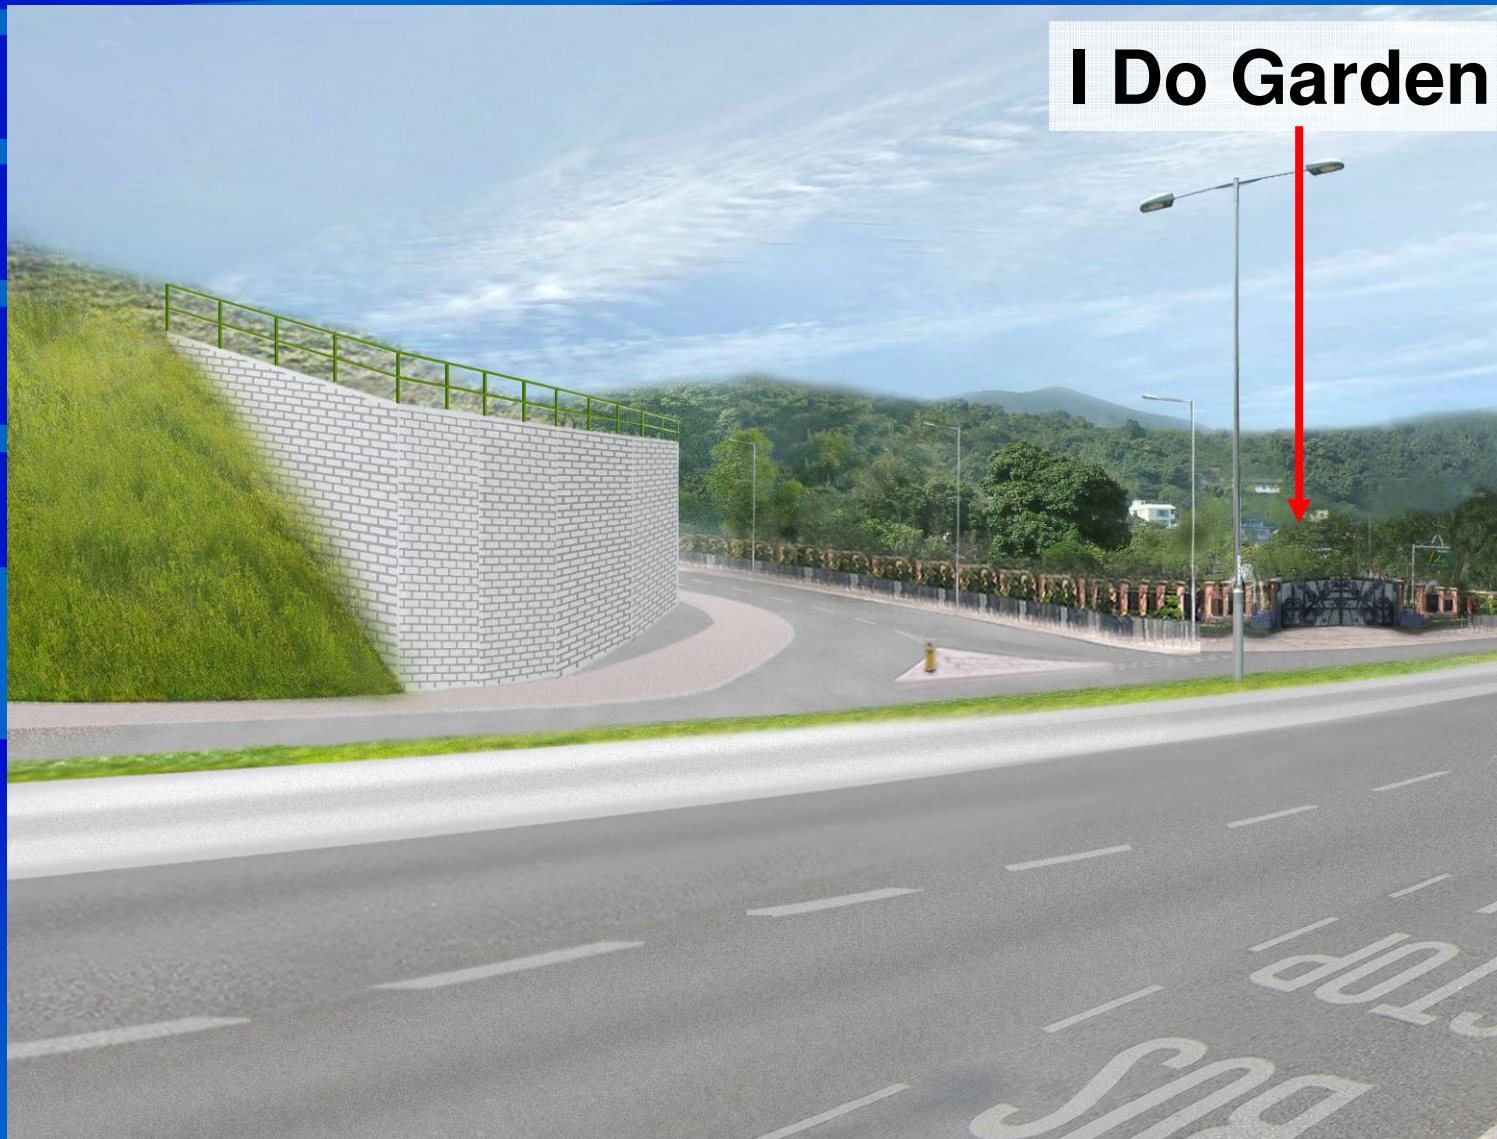


# 匡湖居段:擋土牆(設計圖片)






# 匡湖居段:擋土牆(設計圖片)

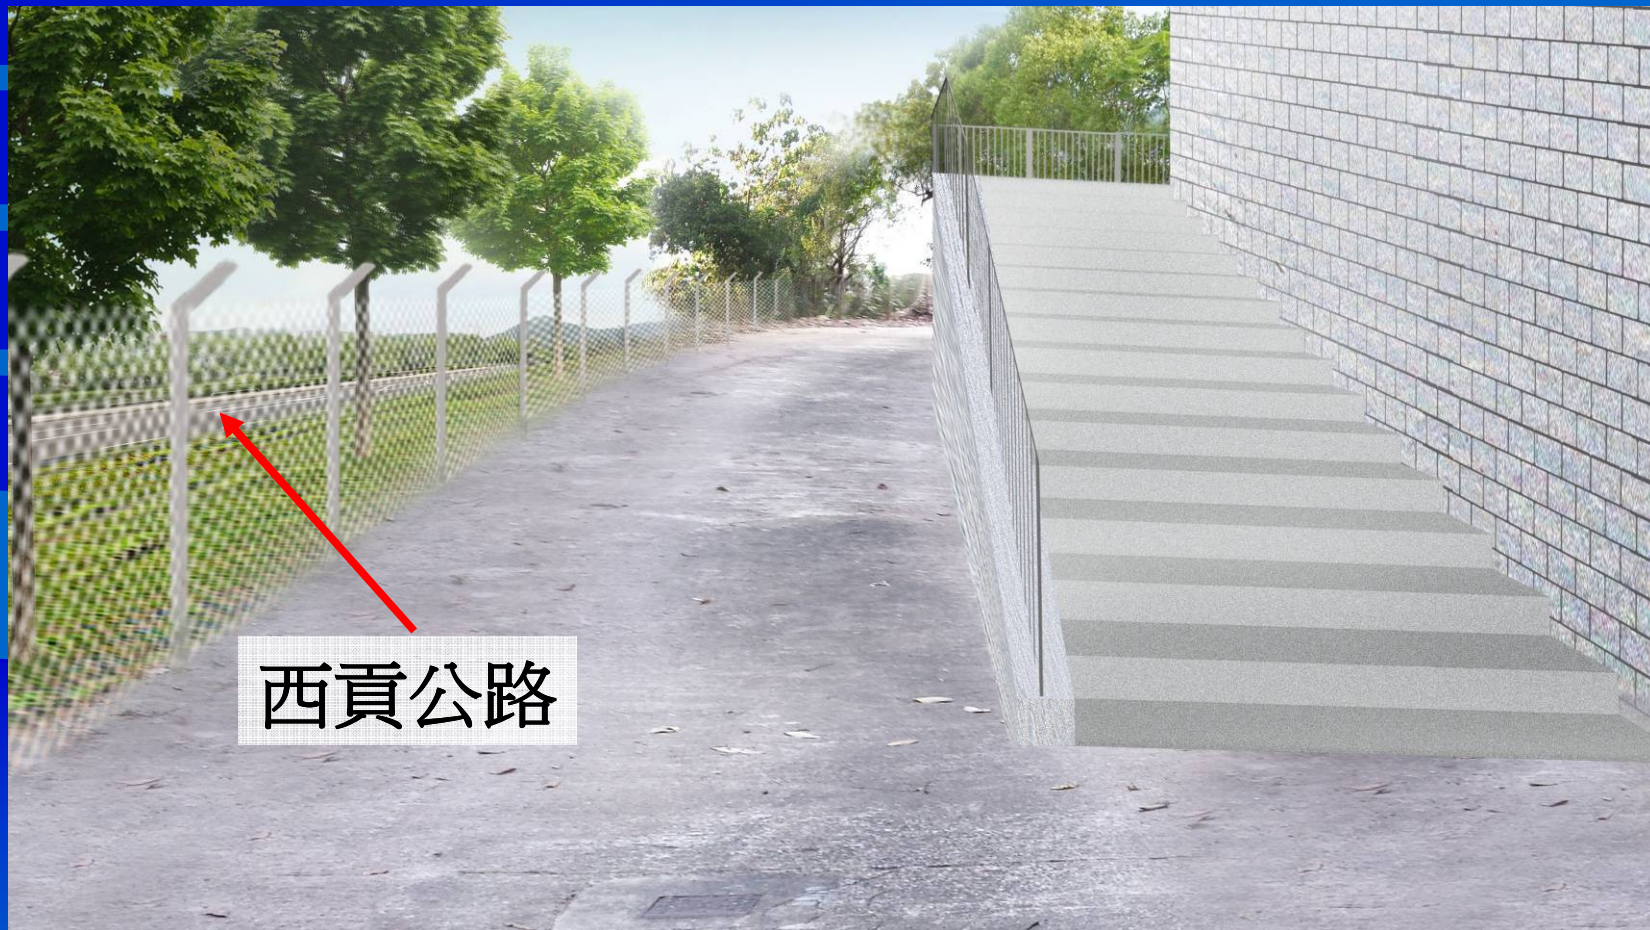

西貢公路



# 匡湖居段:擋土牆(設計圖片)

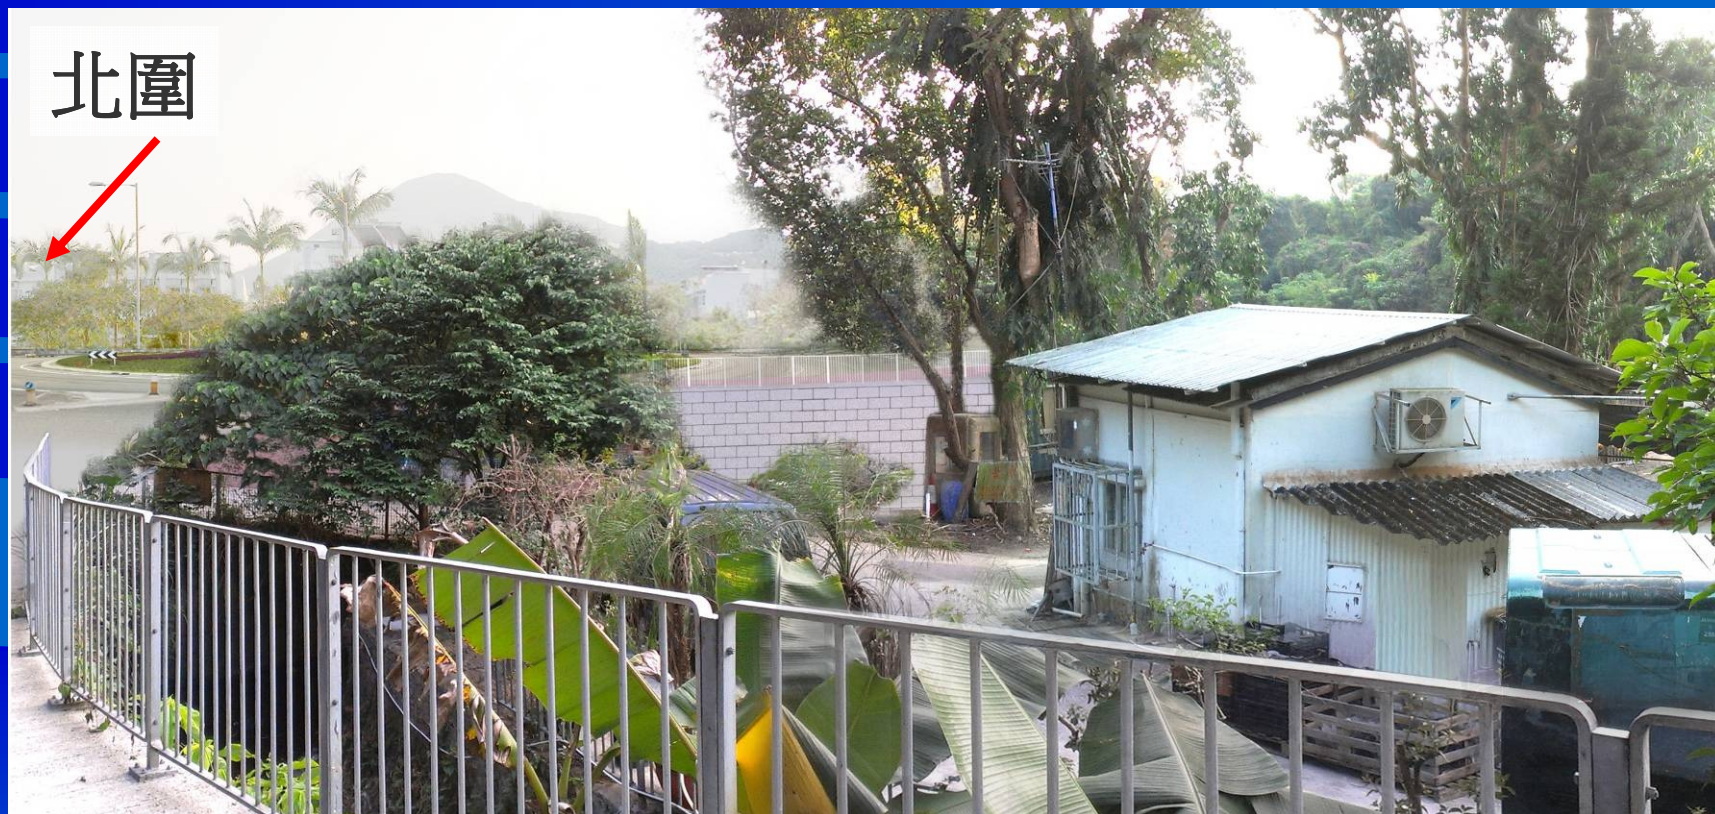

多謝
