

黃大仙區議會轄下

政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 27/2014 號(16.12.2014)

土木工程拓展署

九龍拓展處工程合約編號：KL/2012/02

啟德發展計劃 - 啟德機場北面停機坪的第 3A 期基建工程

進度報告(5)

目的

這份文件的主要目的是向黃大仙區議會轄下政府及公用機構工程計劃工作小組各成員匯報工程進度。有關工程項目的平面圖，請參閱附圖 1。

工程進度

新蒲崗區內的道路工程

2. 為減低工程對市民之影響，新蒲崗區內的道路改善工程都是分段進行的。有關工程正在進行中，進度理想。其中，承建商已完成三祝街、四美街、七寶街，以及四美街/彩虹道交界的第一階段道路擴闊工程，包括把部份行人路擴闊為行車路。承建商會繼續進行餘下道路擴闊及重建工程。

3. 此外，為配合在景福街一段的行車隧道工程，承建商會於二零一五年第一季起封閉東啟德遊樂場附近的一段景福街及四美街，是項道路改動亦是配合已刊憲的新蒲崗整體永久交通安排。屆時，受封路影響的停車位將永久遷往三祝街。

啟德發展區內的道路工程 - 行人隧道和行車隧道

4. 為配合橫過太子道東的隧道工程，承建商會於太子道東實施臨時交通措施，包括將一段長約二百米的西行線由四線行車改為三線，期間太子道東行線仍然維持四線行車。臨時交通措施主要分為五期，由南至北按個別行車道依次進行。承建商已完成第一期臨時交通措施，並已在十一月十六日實施第二期臨時交通措施。本署會與相關持份者保持緊密聯繫，適時檢討及改善有關臨時交通措施，以確保隧道工程順利進行。

5. 除太子道東外，本署承建商現亦於啟德發展區內及東啟德遊樂場旁進行行車隧道 VT1 斜引道的結構建造工程，進度理想。而在啟德行動基地旁的行車隧道 VT1 的結構建造工程亦已展開。

6. 在啟德發展區內行人隧道 SW2 的升降機槽地基工程已經完成，主體挖掘工程隨即展開。至於在新蒲崗房屋署公共房屋工地旁行人隧道 SW3(延伸部分)的挖掘工程則進度理想。

工程協調

7. 為減少在太子道東及新蒲崗區內實施臨時交通措施對市民之影響，本署工程顧問及承建商會繼續與附近施工的各项工程(包括渠務署工程合約編號 DC/2010/03 及 DC/2011/04、水務署工程合約編號 7/WSD/08、8/WSD/08、及 13/WSD/11、沙中線工程合約編號 1107 及 1108)協調施工上的安排，並互相配合。就此，我們與相關部門及其承建商會舉行定期會議，商討工程協調事項。

8. 另外，我們會繼續向當區區議員以及附近的居民、團體、商戶，提供工程資料以及收集意見，並會就上述工程的最新進展向工程計劃工作小組匯報。

9. 我們亦設立了二十四小時熱線電話(電話號碼：6340 8844)，方便市民查詢及收集公眾對工程的意見。


文件提交

10. 本文件將提交政府及公用機構工程計劃工作小組二零一四年十二月十六日會議，請委員備悉以上安排。

土木工程拓展署
九龍拓展處








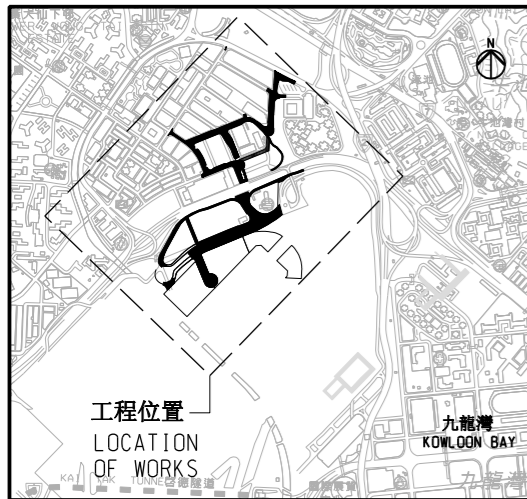
檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt.17


二零一四年十二月



位置平面圖
KEY PLAN

圖例
LEGEND:

-  擬建的行車道/現有行車道將予重建或擴闊
PROPOSED CARRIAGEWAY / EXISTING CARRIAGEWAY TO BE RE-CONSTRUCTED OR WIDENED
-  擬建/重建的行人路, 中央分隔帶, 安全島或美化市容地帶
PROPOSED / RE-CONSTRUCTED FOOTPATH, CENTRAL MEDIAN, TRAFFIC ISLAND OR AMENITY AREA
-  擬建的行車隧道
PROPOSED VEHICULAR UNDERPASS
-  擬建的行人隧道伸延
PROPOSED PEDESTRIAN SUBWAY EXTENSION
-  擬建的行人隧道
PROPOSED PEDESTRIAN SUBWAY
-  永久封閉四美街(部分)及景福街(部分)
PERMANENT CLOSURE OF SZE MEI STREET (PART) & KING FUK STREET (PART)
-  行車道的行車線 (每一箭嘴表示一條行車線)
TRAFFIC LANE FOR CARRIAGEWAY (ONE ARROW REPRESENTS ONE LANE)
-  擬建的行車隧道通風口
VENTILATION OPENING AT PROPOSED VEHICULAR UNDERPASS

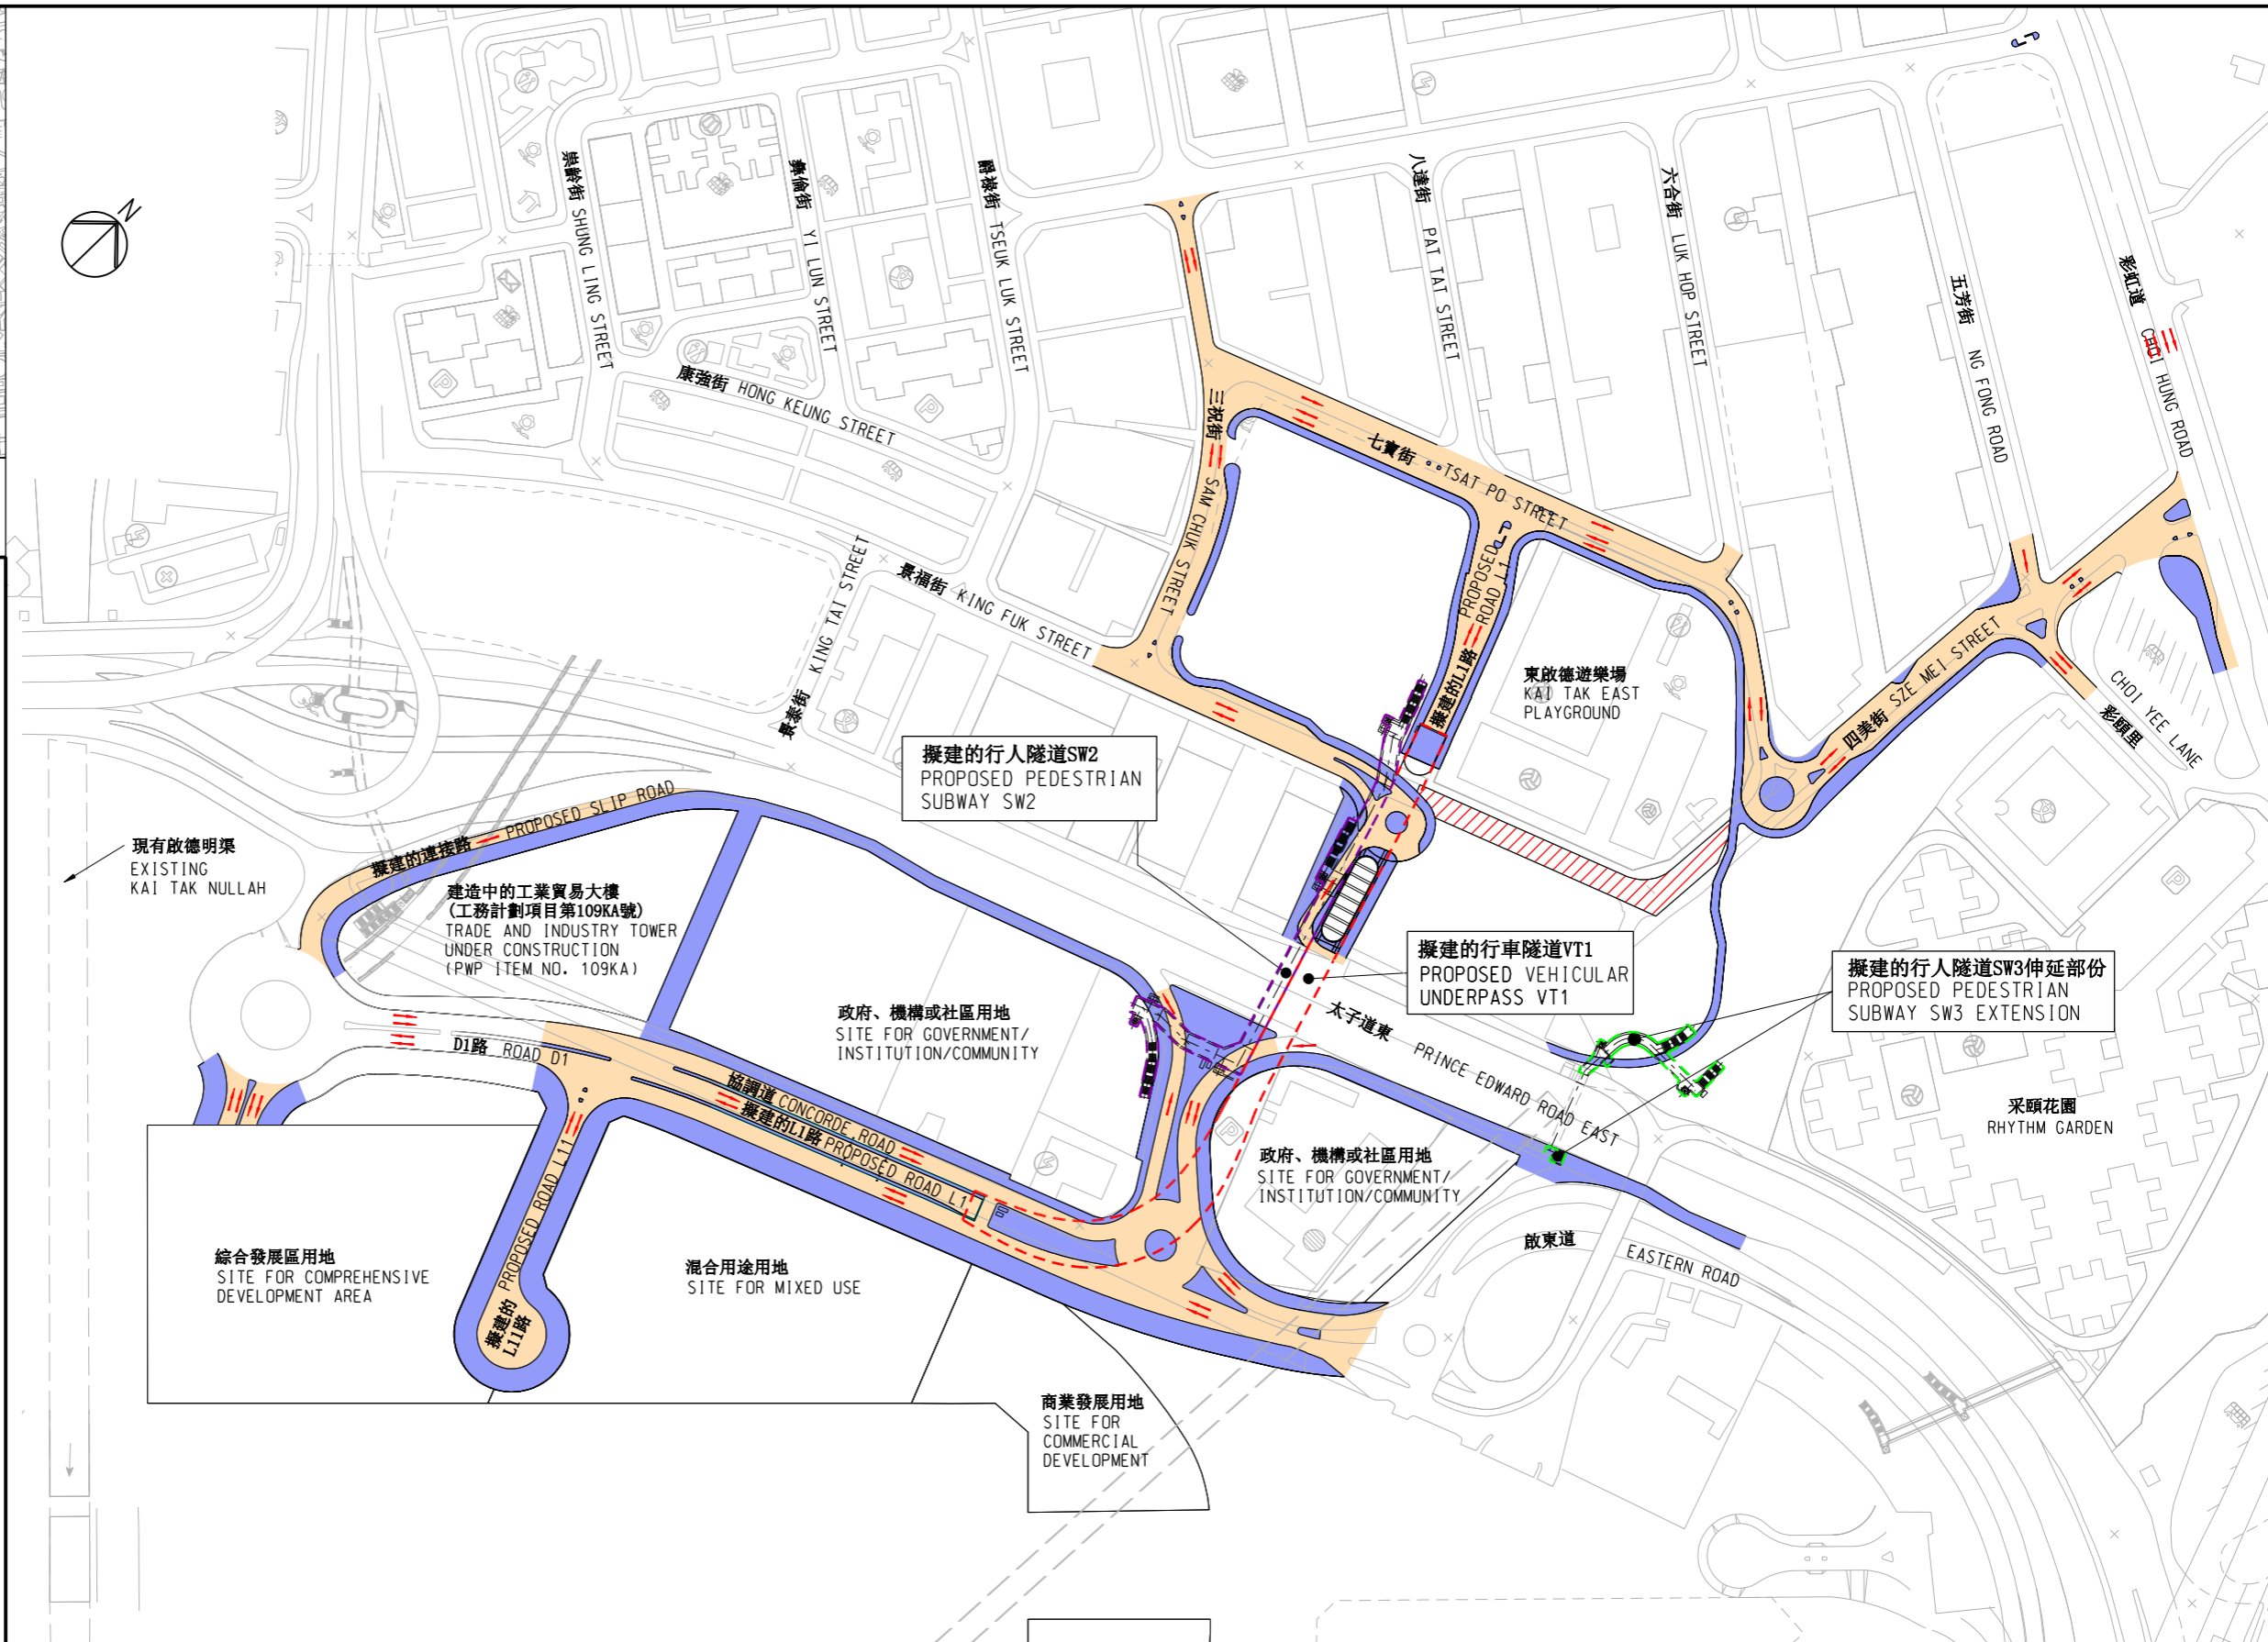

CEDD 土木工程拓展署
Civil Engineering and Development Department

ARUP 奧雅納工程顧問
Ove Arup & Partners Hong Kong Limited

CONTRACT NO. 合約編號
KL/2012/02

CONTRACT TITLE 合約名稱
啟德發展計劃 - 啟德機場北面停機坪的
第3A期基建工程

DRAWING TITLE 圖則名稱
第3A期工程項目圖(附圖1)
