

黃大仙區議會  
政府及公用機構工程計劃工作小組

土木工程拓展署工程合約編號 **KL/2008/09**  
啓德發展計劃 - 啓德機場北面停機坪基礎設施第一期工程

興建橫跨太子道東的兩條行人天橋工程進度報告(8)

1. 目的

這份文件的主要目的是向黃大仙區議會轄下政府及公用機構工程計劃工作小組各成員，匯報興建橫跨太子道東的兩條行人天橋 FB1 和 FB4 的最新工程進度。有關兩條行人天橋的位置和所連接的地區及設施，請參閱附圖 1。

2. 工程進度

行人天橋 FB1

承建商已經完成主橋樑的結構工程，以及大部份的上蓋、機電、裝飾工程，包括鋪設橋面地台磚、安裝橋身及柱樑的不銹鋼面板、上蓋及兩旁的玻璃嵌板、照明系統、綠化項目，以及兩部均連接橋面、地面及行人隧道的升降機等。現時工程進度理想，預計於本年年底之前完成及開放。

行人天橋 FB4

承建商已經完成主要工程。承建商現正積極完成升降機的啓用前測試及餘下工程。行人天橋預計於本年年底之前完成及開放。

3. 工程協調


本署工程顧問及承建商會繼續與附近施工的各项工程(包括水務署工程合約編號 26/WSD/06 及渠務署工程合約編號 DC/2008/12 及 DC/2010/03) 舉行定期會議，協調施工上的安排，並互相配合，以減少在太子道東實施臨時交通改道措施對市民之影響。



另外，我們會繼續向當區區議員以及附近的居民，提供工程資料，並就行人天橋 FB1 及 FB4 該工程的最新進展向工程計劃工作小組匯報。

我們亦已設立了 24 小時熱線電話(電話號碼：5196 6966)，方便市民查詢及收集公眾對工程的意見。

土木工程拓展署  
九龍拓展處  
2012 年 9 月



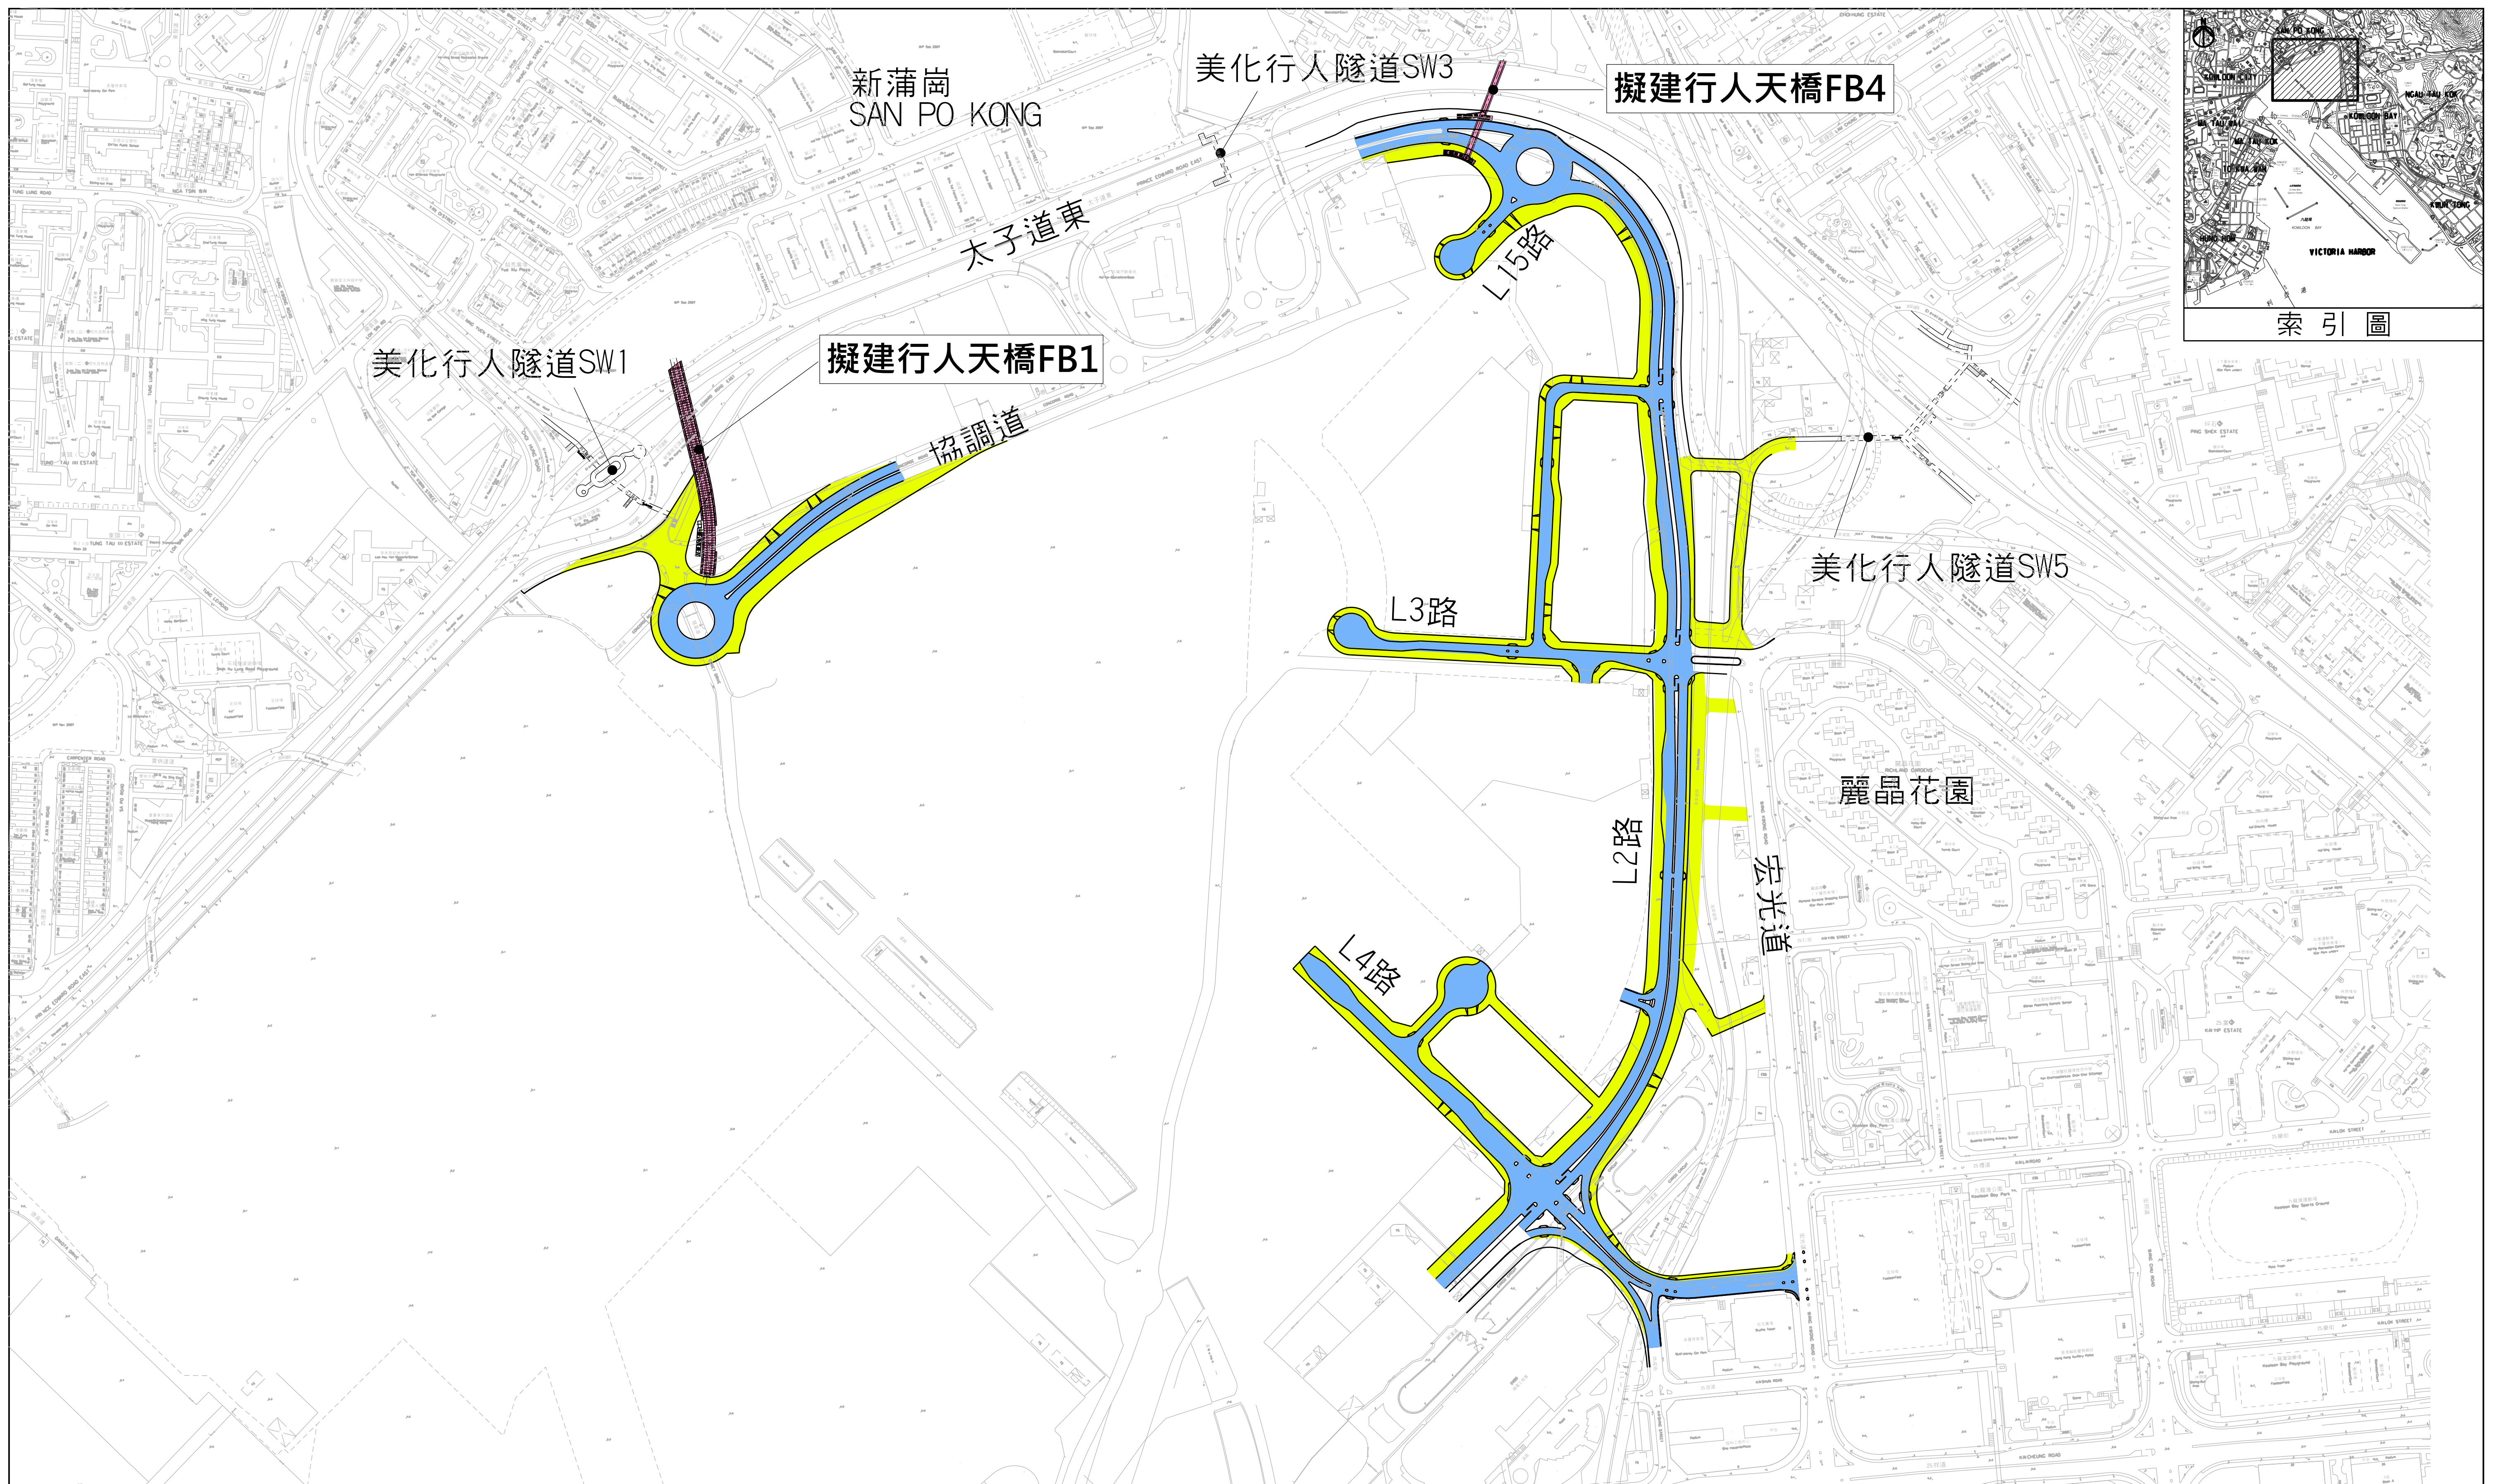

LEGEND 圖例	
	擬建行人路
	擬建行車路

 土木工程拓展署  
 Civil Engineering and Development Department  
  
 奧雅納工程顧問  
 Ove Arup & Partners Hong Kong Limited

CONTRACT NO. 合約編號 KL/2008/09  CONTRACT TITLE 合約名稱 啓德發展計劃 - 啓德機場北面停機坪基礎設施 第一期工程
--

DRAWING TITLE 圖則名稱  第一期工程項目圖(附圖1)
---
