

中西區區議會

第十次會議(2009年7月16日)

中西區區內的渠務改善工程進度滙報

I. 自上次滙報後完成的工程 (2009年5月1日至2009年6月30日) :

項目	位置	動工日期	預計完工日期	實際完工日期
D10*	干諾道中與禧利街交界	02.2009	07.2009	06.2009
S10*	干諾道中(近大會堂)	03.2009	07.2009	06.2009

II. 進行中的渠務工程，其位置如下並在圖則 DC0719/2 標出:

項目	位置	動工日期	預計施工 期(月)	預計完工 日期	施工模式	有無臨時交 通管理安排	備註
E1*	文咸東街及永樂街由文華里至德輔道西	11.2008	17	04.2010	無坑挖掘	有	頂管工程進行中。
D8*	干諾道西及西消防街	12.2008	9	09.2009	無坑挖掘	有	頂管工程進行中。
CD1*	西市街	01.2009	6	07.2009	開坑挖掘	有	
S1*	士美菲路	02.2009	6	08.2009	開坑挖掘	有	
D13*	皇后街 (近千諾道西西行方向)	04.2009	9	01.2010	無坑挖掘	有	正建造頂管井。
CD-2*	德輔道西(近香港工業大廈)	04.2009	6	10.2009	開坑挖掘	有	
C240-1A*	北街(中段和南段)	06.2009	14	08.2010	無坑挖掘	有	中段工程(堅尼地城新海旁與吉席街之間): 正建造頂管井。 南段工程(吉席街與石山街之間): 建造頂管井及接管井的臨時交通安排即將刊憲，其後將展開工程。
CD1*	加多近街及域多利道	06.2009	8	02.2010	無坑及開坑挖掘	有	正在挖掘探井。
C10-3*	戲院里	06.2009	12	06.2010	無坑及開坑挖掘 (夜工)	有	正在挖掘探井，確定需更改的公用設施位置和範圍，從而定出頂管井位置。
CD-7*	干諾道中(近租庇利街)	06.2009	6	12.2009	開坑挖掘	有	正在挖掘探井。

CD-6A	摩利臣街與永樂街交界	06.2009	6	12.2009	開坑挖掘	有	正在挖掘探井。 因應水務署提前進行水管鋪設工程，與水務署協調後，污水渠管和輸水管將鋪設在同一坑道，以避免重覆開挖路面。工程會分階段進行，以減低對交通及公眾的影響。於行車道上的施工時間將限於星期一至六(非假日)晚上 21:00-06:00，另加在施工首兩個週日早上 09:00-12:00 進行開挖行車路面的工序。
-------	------------	---------	---	---------	------	---	---

III 預計在六個月內動工的渠務工程，其位置如下並在圖則 DC0719/2 標出:

項目	位置	動工日期	預計施工期(月)	預計完工日期	施工模式	有無臨時交通管理安排	備註
S4*	皇后大道西(近山道段)	07.2009	9	04.2010	開坑挖掘	需要	工程共分兩部份，每部份均會分階段施工，以減低對交通及市民的影響。已安排在憲報刊登臨時交通安排，刊憲後將展開工程。
AD-1*	皇后大道西(東邊街至正街段)	07.2009	15	10.2010	開坑挖掘	需要	因應水務署提前進行水管鋪設工程，與水務署協調後，雨水渠管和輸水管將鋪設在同一坑道，以避免重覆開挖路面。工程會分階段進行，以減低對交通及公眾的影響。已安排在憲報刊登臨時交通安排，刊憲後將展開工程。
AD-5*	租庇利街(干諾道中至德輔道中段)	10.2009	15	01.2011	開坑挖掘	需要	施工時段暫定於星期一至五(非假日)非繁忙時間(10:00-16:00)及週六進行。由於地下設施非常繁多複雜，改動十分困難且需時。已於2009年5月開始挖掘探井，確定需更改的公用設施位置和範圍，從而訂定施工時間表。
C3-2	皇后大道西(山道至屈地街)	08.2009	12	08.2010	開坑挖掘	需要	與水務署協調後，部份雨水渠管和輸水管將鋪設在同一坑道，以避免重覆開挖路面。工程將分階段施工，以減低對交通及市民的影響。
D2	德輔道西(東邊街至正街)	08.2009	10	06.2010	開坑挖掘	需要	工程將分階段施工，以減低對交通及公眾的影響。
E2	德輔道中與禧利街交界	09.2009	4	01.2010	開坑挖掘(夜工)	需要	工程將安排於晚上及假日早上進行，以減低對交通的影響。工程將於附近的水務工程完結後展開。
CD-4	德輔道西(水街至朝光街)	09.2009	8	05.2010	開坑挖掘	需要	因應水務署提前進行水管鋪設工程，與水務署協調後，污水渠管和輸水管將鋪設在同一坑道，以避免重覆開挖路面。
CD-3	干諾道西	12.2009	3	03.2010	開坑挖掘	需要	工程將於附近的水務工程完結後展開。
AD-3	皇后街(干諾道西至德輔道西)	12.2009	15	03.2011	無坑及開坑挖掘	需要	工程將於附近的水務工程完結後展開。無坑挖掘部份約需時 9 個月。


* 已於上期會議作出匯報

渠務署工程管理部
2009年6月30日

圖例

LEGEND:

- 自上次匯報後完成的渠務工程
DRAINAGE WORKS COMPLETED
SINCE LAST REPORTING
- 進行中的渠務工程
DRAINAGE WORKS IN PROGRESS
- 預計在六個月內動工的渠務工程
DRAINAGE WORKS ANTICIPATED
TO COMMENCE IN SIX MONTHS

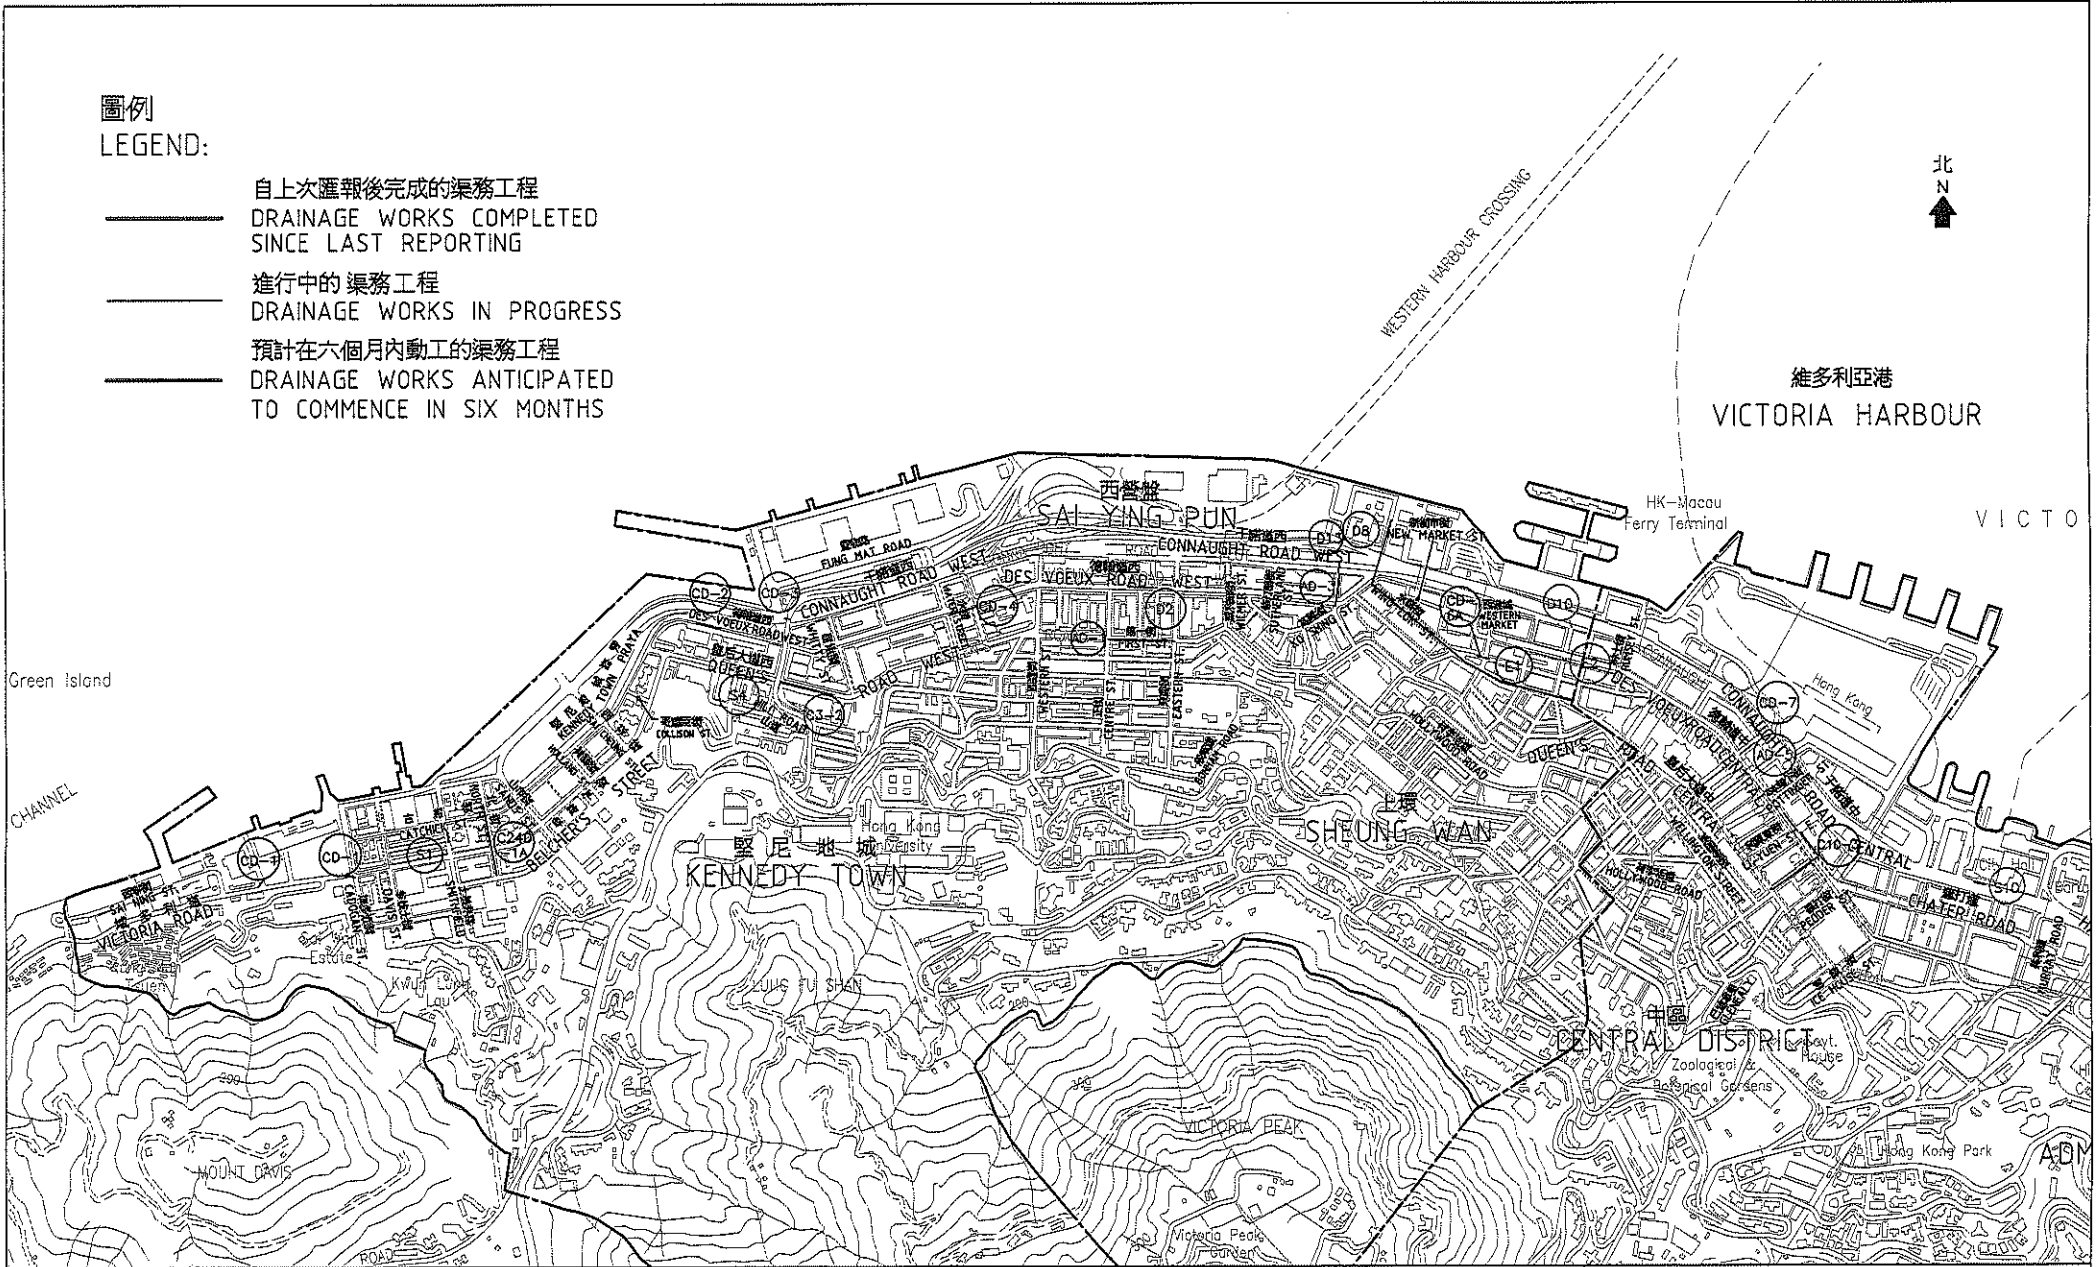

CONSULTING ENGINEERS

AECOM

AECOM - Metcalf & Eddy Joint Venture

中西區區內的渠務工程進度匯報
WORKS IN CENTRAL AND WESTERN
DISTRICTS - PROGRESS UPDATE

中西區區議會會議 (2009 年07月16 日) Central & Western District Council Meeting (16.07.2009)

繪圖 DRAWN Y.C.CHAN 30.06.2009

檢查 CHECKED K.C. CHU 30.06.2009

圖號 DRG.NO.

DC0719/2

比例 SCALE

N.T.S.



香港特別行政區渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT
GOVERNMENT OF THE
HONG KONG
SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION

工程管理部

PROJECT MANAGEMENT DIVISION
