

# 中西區區議會

## 第七次會議(2009年1月8日)

### 中西區區內的渠務改善工程進度滙報

#### I. 自上次滙報後完成的工程 (2008年9月30日至2008年12月31日):

工程合約 DC/2007/19~港島北部雨水排放系統改善計劃~西部下游集水區工程暫未有項目完成。

#### II. 進行中的渠務工程:

項目	位置	動工日期	預計施工期 (月)	預計完工日期	施工模式	有無臨時交通 管理安排	備註
E1	文咸東街及永樂街由文華里至德輔道西	11.2008	17	04.2010	無坑挖掘	有	
D8	干諾道西及西消防街	12.2008	9	09.2009	無坑挖掘	有	

#### III 預計在六個月內動工的渠務工程，其位置如下並在圖則 DC0719/2 標出:

工程合約 DC/2007/19

項目	位置	預計動工日期	預計完工日期	預計施工期 (月)	施工模式	有無臨時交通 管理安排	備註
CD1	西市街	01.2009	08.2009	6	開坑挖掘	需要	
S1	士美菲路	02.2009	08.2009	6	開坑挖掘	需要	

項目	位置	預計動工日期	預計完工日期	預計施工期 (月)	施工模式	有無臨時交通管 理安排	備註
C240-1A	北街	02.2009	10.2009	8	無坑挖掘	需要	
AD5	租庇利街(干諾道中至德 輔道中段)	03.2009	06.2010	15	開坑挖掘	需要	限制於星期一至五非繁忙時間(10:00-16:00) 施工
S5	東邊街	04.2009	02.2010	11	無坑及開坑 挖掘	需要	確實動工時間須配合東邊街 正在施工的水務工程
S10	干諾道中(近大會堂)	01.2009	05.2009	4	開坑挖掘	需要	施工時段限制於星期一至六 晚上 21:00-06:00
D13	皇后街 (近千諾道西西行方向)	03.2009	12.2009	9	無坑挖掘	需要	
D10	干諾道中與禧利街交界	03.2009	08.2009	5	無坑挖掘	需要	施工時段限制於星期一至六 晚上 21:00-06:00

渠務署

工程管理部

2008年12月31日


圖例  
LEGEND:

- 自上次匯報後完成的渠務工程  
DRAINAGE WORKS COMPLETED SINCE LAST REPORTING
- 進行之中的渠務工程  
DRAINAGE WORKS IN PROGRESS
- 預計在六個月內動工的渠務工程  
DRAINAGE WORKS ANTICIPATED TO COMMENCE IN SIX MONTHS



維多利亞港  
VICTORIA HARBOUR

VICTO

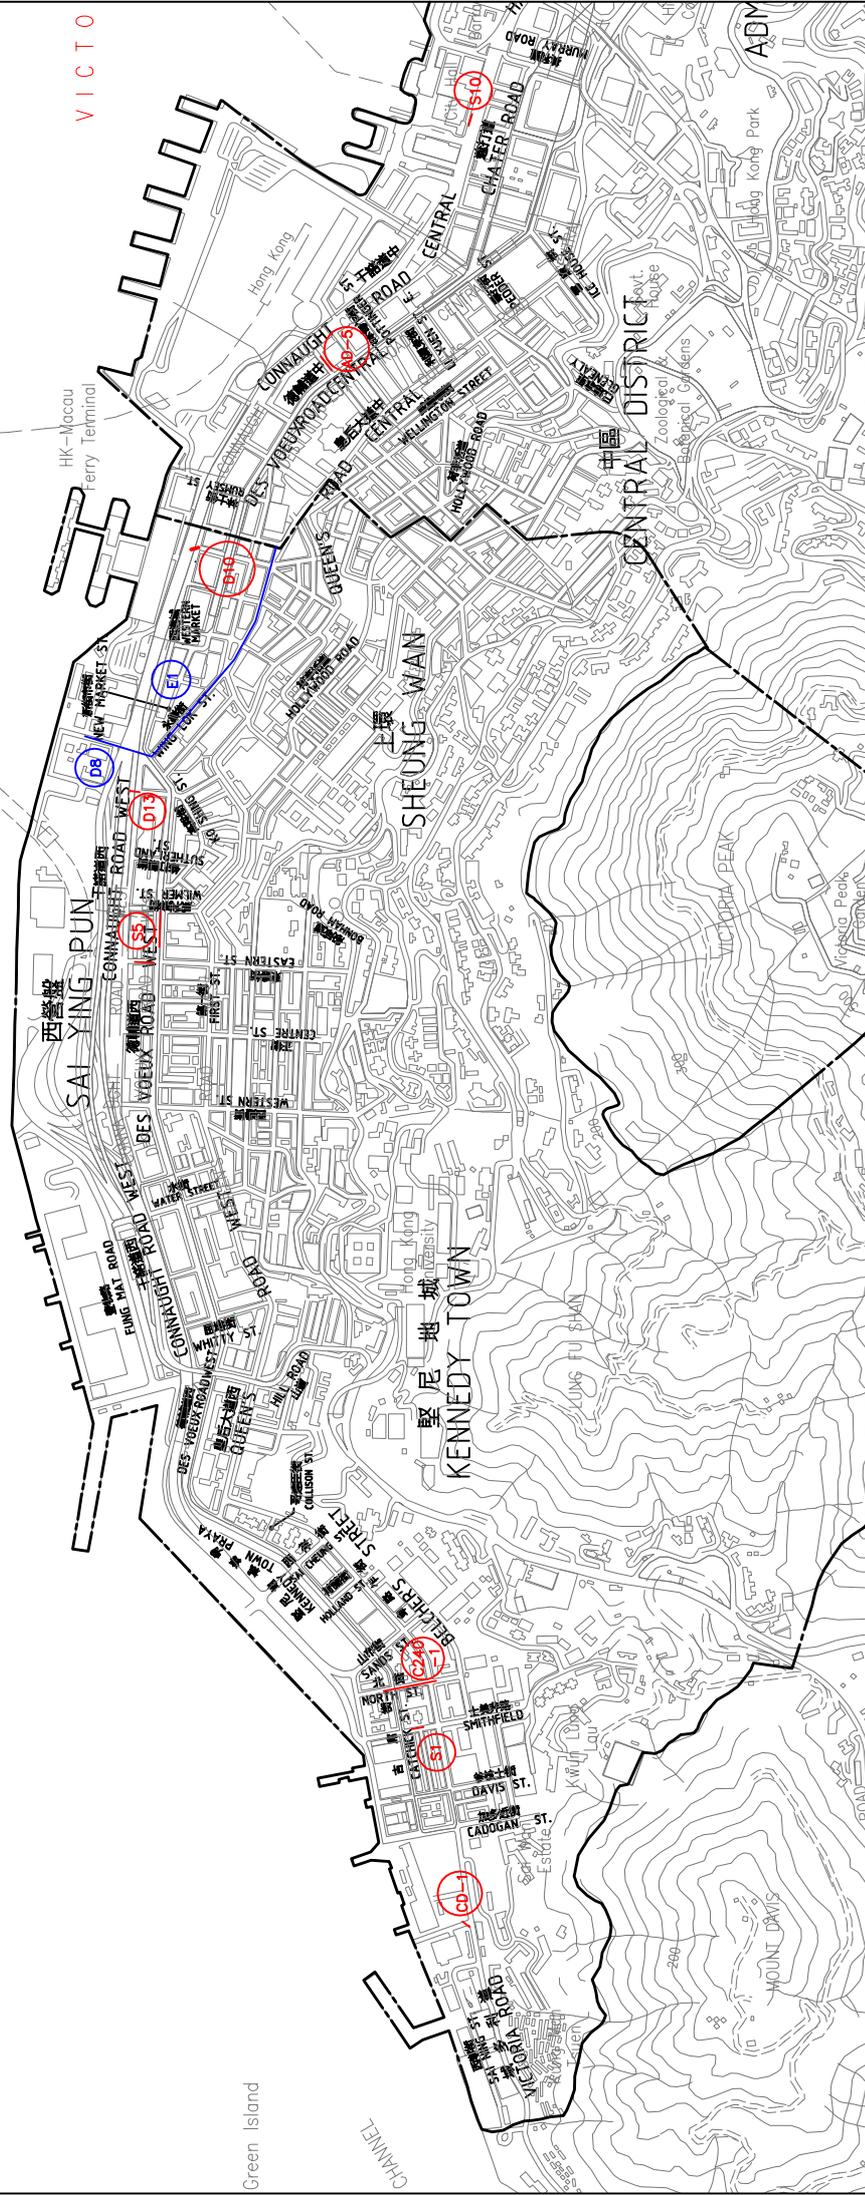

CONSULTING ENGINEERS

**MAUNSELL | AECOM**  
MAUNSELL - Metcalf & Eddy Joint Venture

中西區區內的渠務工程進度匯報  
WORKS IN CENTRAL AND WESTERN DISTRICTS - PROGRESS UPDATE  
中西區區議會 (2009 年01月08日) Central & Western District Council Meeting (08.01.2009)

繪圖 DRAWN	T. CHEUNG	23.12.2008
檢查 CHECKED	K. C. CHU	23.12.2008
圖號 DRG.NO.	DC0719/2	比例 SCALE
		N.T.S.

香港特別行政區渠務署  
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT  
GOVERNMENT OF THE  
HONG KONG  
SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION

工程管理部  
PROJECT MANAGEMENT DIVISION
