

# 中西區區議會食物環境衛生及工務委員會第七次會議 (2011 年 3 月 17 日)

## 中西區區內下游地區的渠務改善工程進度滙報 (2011 年 1 月 1 日至 2011 年 3 月 4 日)

### I. 進行中的渠務工程，其位置如下並在圖則 DC0719/2 標出：

項目	位置	動工日期	預計施工期(月)	預計完工日期	施工模式	有無臨時交通管理安排	備註
CD-1*	加多近街及域多利道	06.2009	21	04.2011	無坑及開坑挖掘	有	無坑挖掘部份因地下設施影響，須更改設計而稍為影響該段的完工期。無坑挖掘現已完成，餘下最後階段建造維修沙井及修復路面的工序，預計兩個月內完成。
C10-3*	戲院里	09.2009-02.2010	14	05.2011	無坑及開坑挖掘	有	無坑挖掘部份：已完成頂管井挖掘，現正進行頂管工序。 開坑挖掘部份：工程如期進行中。
		08.2010					
S4*	皇后大道西(近日富里段)	07.2009-06.2010	15	04.2011	無坑及開坑挖掘	有	工程如期進行中。
		12.2010					
AD-1*	皇后大道西(東邊街至正街段)	08.2009	19	03.2011	開坑挖掘	有	工程如期進行中。
D2*	德輔道西(東邊街至正街)	09.2009-04.2010	12	03.2011	開坑挖掘	有	工程如期進行中。
		10.2010					
CD-4*	德輔道西(水街至朝光街)	10.2009-01.2011	16	04.2011	開坑挖掘	有	渠務工程須與水務工程協調，並讓出工地鋪建輸水管。渠務工程將於 3 月重開，預計兩個月內完成。
		03.2011					
AD-5*	租庇利街(干諾道中至德輔道中段)	12.2009	19	07.2011	開坑挖掘	有	工程如期進行中。
D11*	北街近堅尼地城新海旁	11.2010	5	04.2011	開坑挖掘	有	橫過堅尼地城新海旁最後階段工程，進度受潮汐影響，為減少開挖路面範圍，更改了部份設計，工程將於兩個月內完成。
AD-3*	皇后街(干諾道西至德輔道西)(上游部份)	02.2010	15	05.2011	無坑挖掘	有	工程如期進行中。
C3-1B*	德輔道西近山道	02.2010	14	04.2011	無坑及開坑挖掘	有	工程進行期間，發現原有箱形管道有滲漏，正與有關部門商討解決方案。
C3-2*	皇后大道西(山道至屈地街)	03.2010-11.2010	13	08.2011	無坑及開坑挖掘	有	工程階段一及二已於 11 月完成。新一段工程的臨時交通改道安排，在諮詢當區區議員、計算交通流量及試路後，亦獲運輸署及警察交通部批核，於 2011 年 3 月 1 日重開，預計在 2011 年 8 月完成本工程項目。
		03.2011					

S5*	東邊街	06.2010	11	05.2011	無坑挖掘	有	現正建造頂管井及接管井，頂管工程預計在 5 月完成。
C3-1A*	德輔道西(無坑部份)	05.2010	15	08.2011	無坑挖掘	有	工程如期進行中。
S2A*	卑路乍街近山市街	07.2010- 12.2010	7	05.2011	開坑挖掘	有	第二階段工程主要在行人路進行，預計於兩個月內完成。
		03.2011					
C10-3A*	德輔道中(德忌利士街至戲院里)	07.2010	11	06.2011	開坑挖掘(夜工)	有	工程如期進行中。
E3*	干諾道中(近信德中心)	08.2010	12	08.2011	開坑挖掘	有	工程主要在行人路上進行，因發現大量地下公共設施，現正挖掘勘察井，尋找適合的位置安裝渠管。
AD-2A*及 AD-2B*	正街(中段及南段)	12.2010	12	12.2011	無坑及開坑挖掘	有	現正研究將正街中段及南段的工程合併改為無坑挖掘的可行性，以進一步減少對公眾的影響。
AD-5A*	租庇利街(德輔道中至皇后大道中)	03.2011	12	03.2012	開坑挖掘	有	工程進行中。
AS2*	干諾道西近東邊街	03.2011	11	02.2012	渠管內壁更新 (無坑挖掘)	有	工程進行中。

## II. 預計在六個月內動工的渠務工程，其位置如下並在圖則 DC0719/2 標出：


項目	位置	動工日期	預計施工 期(月)	預計完 工日期	施工模式	有無臨時交 通管理安排	備註
E2*	德輔道中與禧利街交界	04.2011	4	08.2011	開坑挖掘(夜工)	需要	工程將安排於晚上及假日早上進行，以減低對交通的影響。由於附近有其他工程正在進行，並有臨時交通改道安排，與負責部門協調後，本工程需延至 2011 年 4 月動工。
C38-1*	加惠民道	05.2011	16	08.2012	開坑挖掘	需要	早前已就工程安排與當區區議員、居民及附近的學校商討，現正根據所收集的意見及資料審視施工安排、可行的工作時段、以及工程的設計等，再作諮詢。
S11*	夏慤道近添華道	03.2011	4	07.2011	開坑挖掘	需要	工程主要在行人路上進行。
C42-1*	德輔道西近修打蘭街	06.2011	6	12.2011	開坑挖掘	需要	工程展開前將安排試路，測試交通流量。
CD-5A*	高陞街	04.2011	6	10.2011	開坑挖掘	需要	工地附近正進行水務工程，協調後預計於 2011 年 4 月展開工程。

\* 已於上次會議滙報

渠務署工程管理部  
2011 年 3 月 4 日

圖例  
LEGEND:

- 已完成的渠務工程  
DRAINAGE WORKS COMPLETED
- 進行中的渠務工程  
DRAINAGE WORKS IN PROGRESS
- 預計在六個月內動工的渠務工程  
DRAINAGE WORKS ANTICIPATED TO COMMENCE IN SIX MONTHS

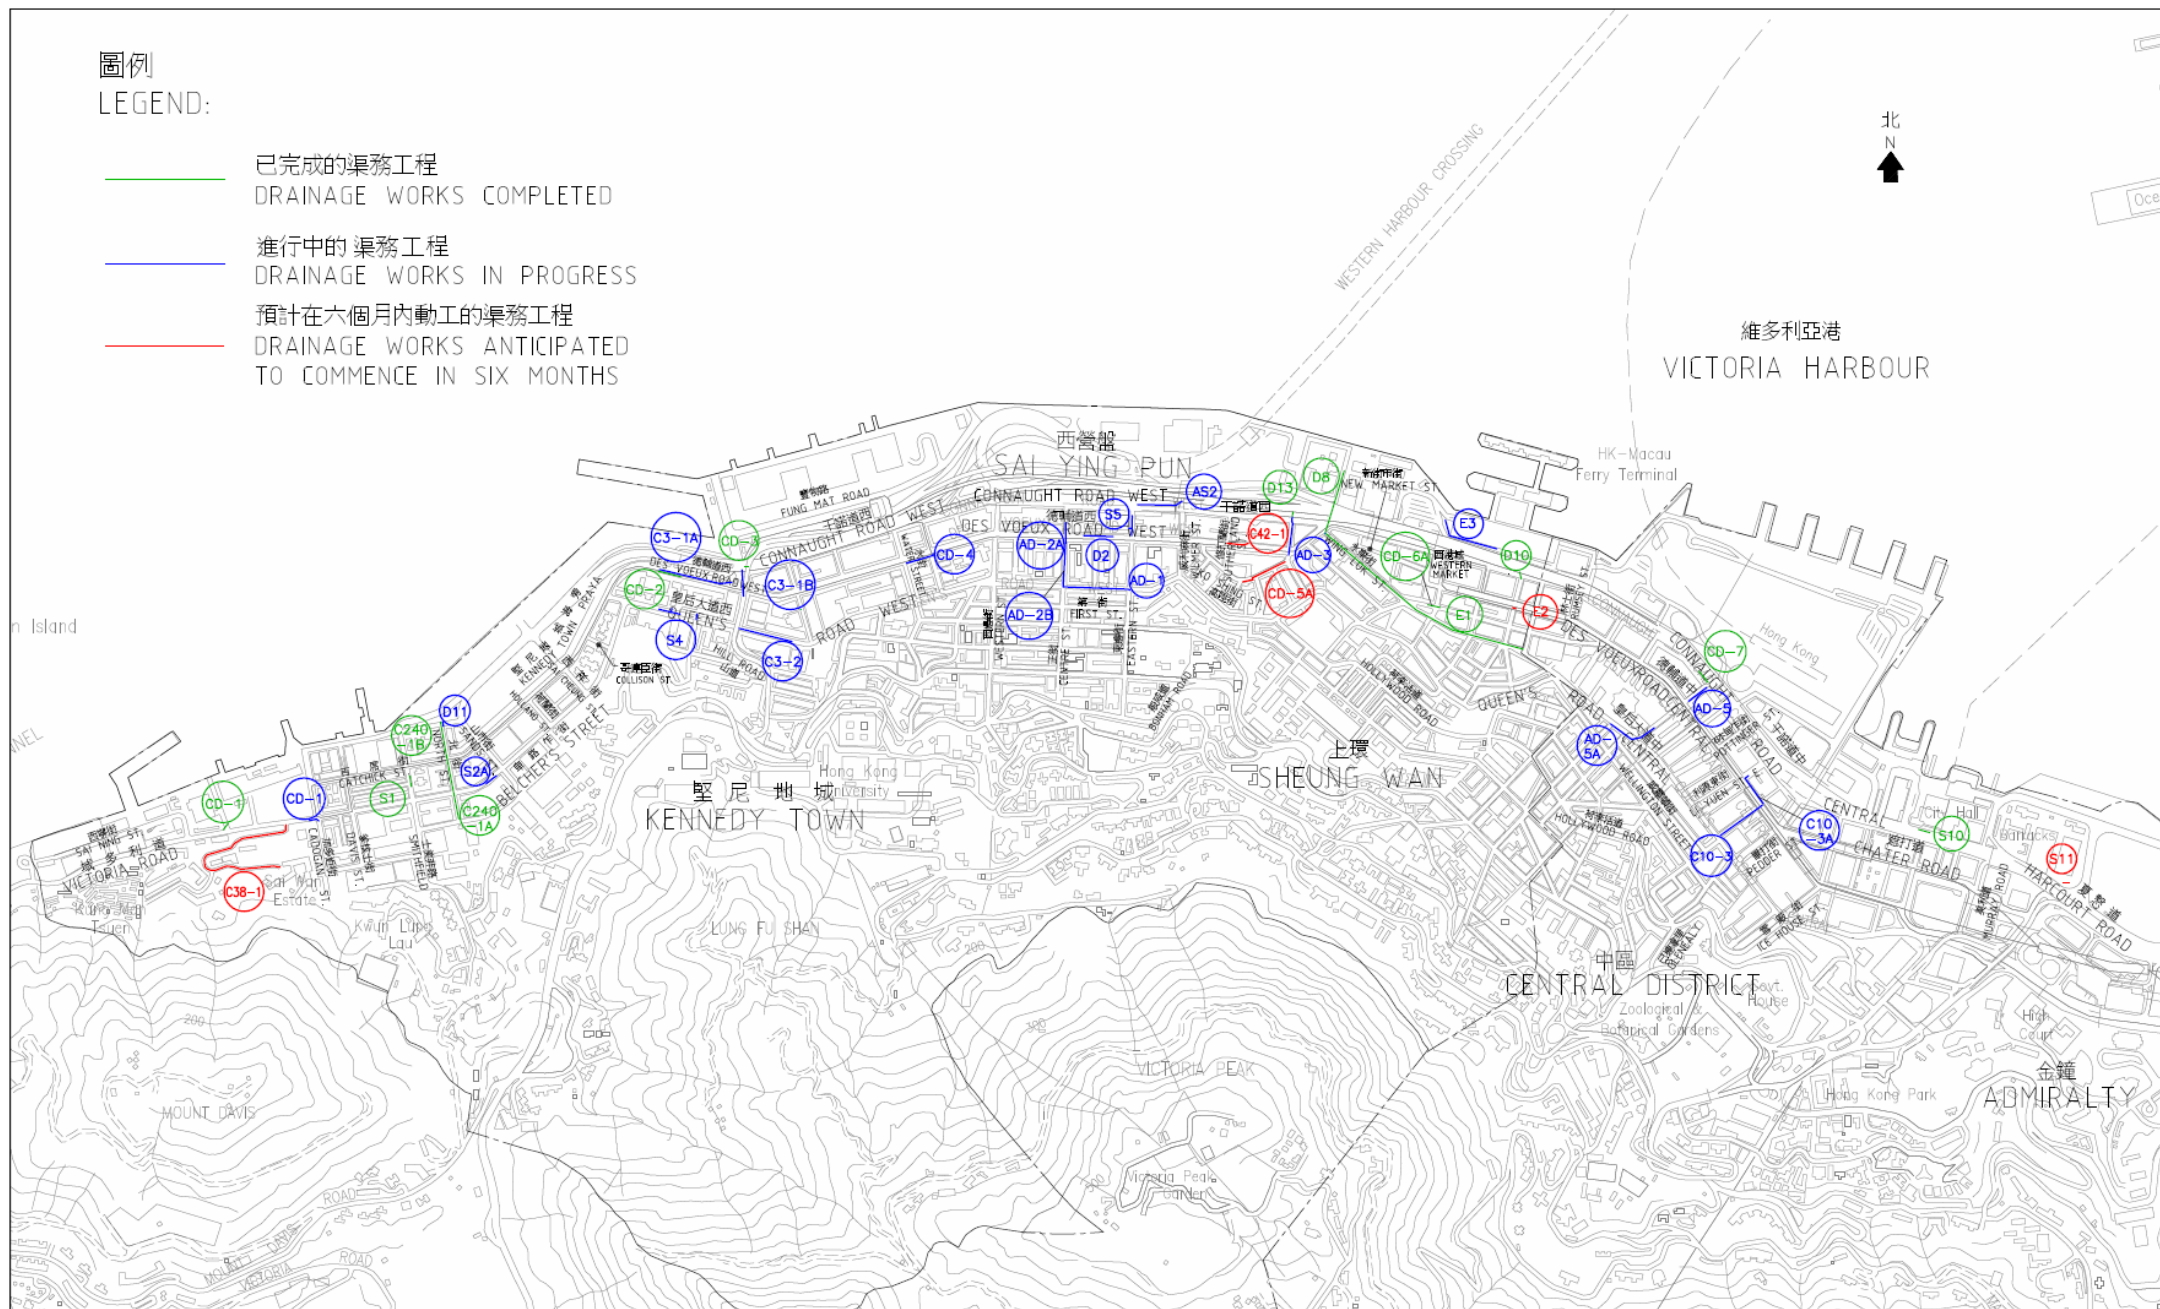

CONSULTING ENGINEERS

**AECOM**

AECOM Asia Company Limited

中西區區內的渠務工程進度匯報  
WORKS IN CENTRAL AND WESTERN DISTRICTS - PROGRESS UPDATE

中西區區議會食物環境衛生及工務委員會會議 (2011 年 03月 17 日)  
Central & Western District Council, Food, Environment, Hygiene & Works Committee Meeting (17.03.2011)

繪畫 DRAWN	H. M. CHEUNG	04.03.2011
檢查 CHECKED	K. C. CHU	04.03.2011
圖號 DRG.NO.	DC0719/2	比例 SCALE N.T.S.



香港特別行政區渠務署  
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT  
GOVERNMENT OF THE  
HONG KONG  
SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION

工程管理部  
PROJECT MANAGEMENT DIVISION
