

中西區區議會食物環境衛生及工務委員會第八次會議 (2011年5月19日)

中西區區內下游地區的渠務改善工程進度匯報 (2011年3月5日至2011年5月9日)

I. 自上次匯報後完成的工程

項目	位置	動工日期	預計完工日期	實際完工日期	施工模式	有無臨時交通管理安排	備註
S4*	皇后大道西(近日富里段)	12.2010	04.2011	04.2011	開坑挖掘	有	該段渠務工程已完成。在皇后大道西段的其他渠務工程，會在水務工程完成後展開。
AD-1*	皇后大道西(東邊街至正街段)	08.2009	03.2011	05.2011	無坑及開坑挖掘	有	因受緊急渠務及水務工程影響，工程略受延誤。現渠務工程已完成，水務署承建商正安裝輸水管。將於5月份內修復路面。
CD-1*	加多近街及域多利道	06.2009	04.2011	04.2011	開坑挖掘	有	喉管鋪設的工程已完成，卑路乍街及域多利道的交通亦已恢復正常。餘下在加多近街需建造兩個維修沙井，預計在二個月內完成。
C10-3A*	德輔道中(德忌利士街至戲院里)	07.2010	05.2011	04.2011	無坑及開坑挖掘	有	在德輔道中的夜間工程已完成，正等待無坑部份接駁。

II. 進行中的渠務工程，其位置如下並在圖則 DC0719/2 標出：

項目	位置	動工日期	預計施工期(月)	預計完工日期	施工模式	有無臨時交通管理安排	備註
CD-4*	德輔道西(水街至朝光街)	10.2009-01.2011 04.2011	16	05.2011	開坑挖掘	有	因配合朝光街的水務工程，渠務工程在2011年2-3月會暫停予水務工程。現工程已恢復，並預計於5月完成。
C10-3B*	戲院里	09.2009-02.2010 08.2010	17	08.2011	無坑及開坑挖掘	有	無坑挖掘部份：已完成頂管井挖掘，現正進行頂管工序。 開坑挖掘部份：工程如期進行中。
D2*	德輔道西(東邊街至正街)	09.2009-04.2010 10.2010	16	07.2011	開坑挖掘	有	與水務署協調提供坑道安裝輸水管。因受地下設施影響，工程預計延至七月完成。
AD-5*	租庇利街(干諾道中至德輔道中段)	12.2009	21	09.2011	開坑挖掘	有	因受地下設施影響，須更改設計而稍為影響完工期約兩個月。
AD-5A*	皇后大道中連接租庇利街	03.2011	12	03.2012	開坑挖掘	有	工程如期進行中。
D11*	北街近堅尼地城新海旁	11.2010	8	07.2011	開坑挖掘	有	橫過堅尼地城新海旁最後階段工程，進度受潮汐影響，為減少開挖路面範圍，更改了部份設計，工程將於兩個月內完成。
AD-3*	皇后街(干諾道西至德輔道西)(上游部份)	02.2010	16	06.2011	無坑挖掘	有	無坑挖掘已完成，現正建造維修沙井，預計兩個月內完成。

C3-1B*	德輔道西近山道	02.2010-01.2011	18	12.2011	無坑及開坑挖掘	有	工程進行期間，發現附近有不尋常地下水情況，懷疑現有渠管滲漏，正協助有關部門商討解決方案，工程已於二月暫停，預計在六月重開。
		06.2011					
C3-2*	皇后大道西(山道至屈地街)	03.2010-11.2010	13	08.2011	無坑及開坑挖掘	有	工程如期進行中。
		03.2011					
S5*	東邊街	06.2010	12	05.2011	無坑挖掘	有	工程如期進行中。
C3-1A*	德輔道西(無坑部份)	05.2010	15	08.2011	無坑挖掘	有	工程如期進行中。
S2A*	卑路乍街近山市街	07.2010-12.2010	7	07.2011	開坑挖掘	有	第二階段於4月27日進行試路，並已獲區議員、運輸署及警方批准，工程預計於兩個月內完成。
		05.2011					
E3*	干諾道中(近信德中心)	08.2010	12	08.2011	開坑挖掘	有	工程主要在行人路上進行，因發現大量地下公共設施，現正挖掘勘察井，尋找適合的位置安裝渠管。
AD-2A*及AD-2B*	正街(中段及南段)	12.2010	12	12.2011	無坑及開坑挖掘	有	現正研究將正街中段及南段的工程合併改為無坑挖掘的可行性，以進一步減少對公眾的影響。
		03.2011					
AS2*	干諾道西近東邊街	03.2011	11	02.2012	渠管內壁更新(無坑挖掘)	有	工程如期進行中。

III. 預計在六個月內動工的渠務工程，其位置如下並在圖則 DC0719/2 標出：


項目	位置	動工日期	預計施工期(月)	預計完工日期	施工模式	有無臨時交通管理安排	備註
E2*	德輔道中與禧利街交界	06.2011	4	10.2011	開坑挖掘(夜工)	需要	工程將安排於晚上及假日早上進行，以減低對交通的影響。由於附近有其他工程正在進行，並有臨時交通改道安排，與負責部門協調後，本工程預計至2011年6月動工。
C38-1*	加惠民道	05.2011	16	08.2012	開坑挖掘	需要	早前已就工程安排與當區區議員、居民及附近的學校商討，現正根據所收集的意見及資料審視施工安排，亦會更改原來的設計，減少對居民和學生的影響。
S11*	夏慤道近添華道	06.2011	4	10.2011	開坑挖掘	需要	工程主要在行人路上進行，將在掘路証發出後施工。
C42-1*	德輔道西近修打蘭街	06.2011	6	12.2011	開坑挖掘	需要	工程展開前將安排試路，測試交通流量。
CD-5A*	高陞街	06.2011	6	12.2011	開坑挖掘	需要	工地附近正進行水務工程，協調後預計於2011年6月展開工程。

* 已於上次會議滙報

渠務署工程管理部
2011年5月9日

圖例
LEGEND:

- 已完成的渠務工程
DRAINAGE WORKS COMPLETED
- 進行中的渠務工程
DRAINAGE WORKS IN PROGRESS
- 預計在六個月內動工的渠務工程
DRAINAGE WORKS ANTICIPATED TO COMMENCE IN SIX MONTHS

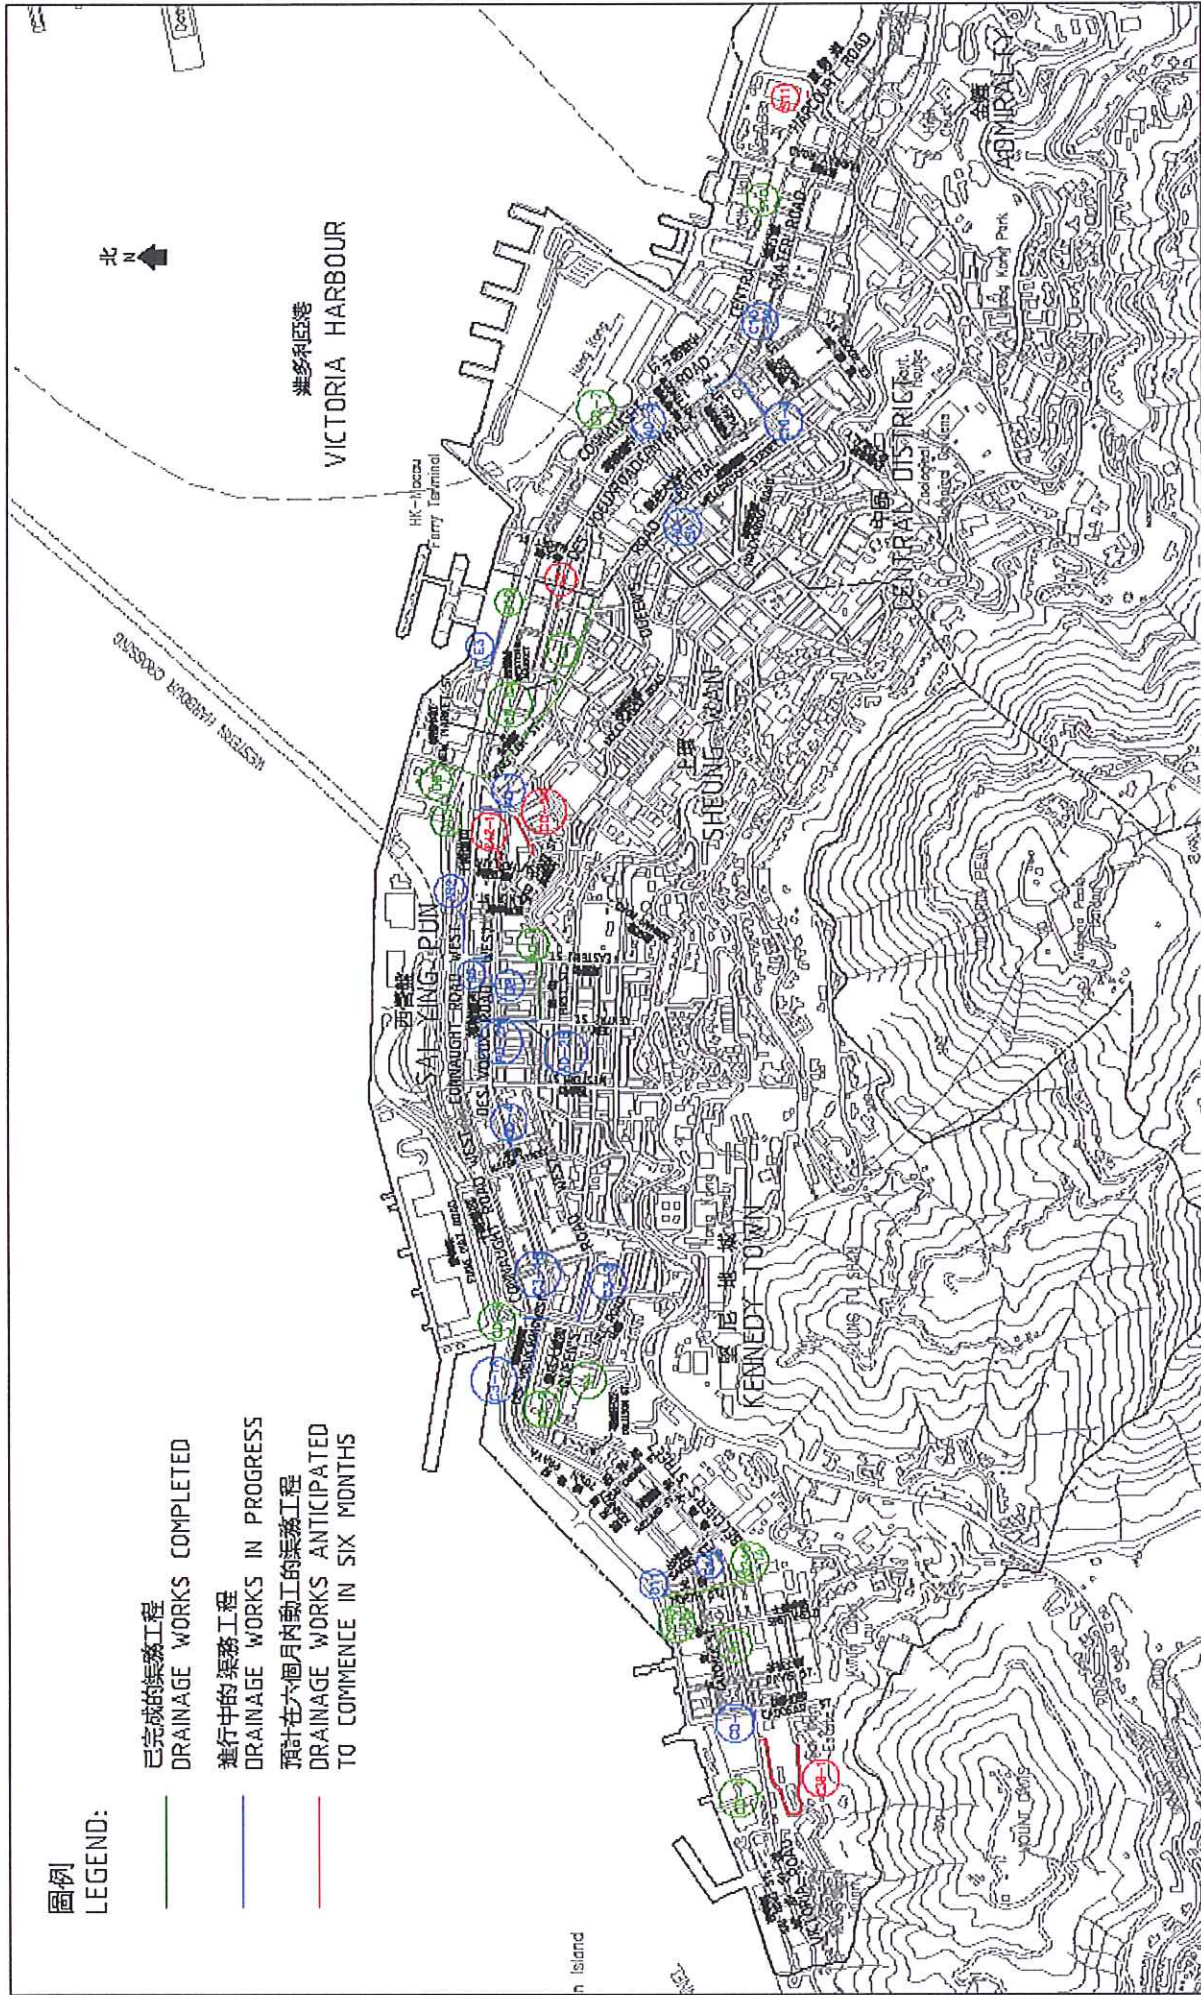

CONSULTING ENGINEERS
AECOM
AECOM Asia Company Limited

中西區內的渠務工程進度匯報
WORKS IN CENTRAL AND WESTERN DISTRICTS - PROGRESS UPDATE
中西區渠務工程進度匯報工作委員會會議 (2011 年 05 月 19 日)
Central & Western District Council, Food, Environment, Hygiene & Works Committee Meeting (19.05.2011)

繪圖 DRAWN H. M. CHEUNG
校核 CHECKED K. C. GU
圖則 DREIGND.
DC0719/2

30.04.2011
30.04.2011
比例 SCALE
N.T.S.
香港特別行政區渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT
GOVERNMENT OF THE
HONG KONG
SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION
工程管理部
PROJECT MANAGEMENT DIVISION
