

# 中西區區議會食物環境衛生及工務委員會第九次會議 (2011 年 6 月 23 日)

中西區區內下游地區的渠務改善工程進度匯報 (2011 年 5 月 10 日至 2011 年 6 月 14 日)

## I. 自上次匯報後完成的工程

項目	位置	動工日期	預計完工日期	實際完工日期	備註
CD-4*	德輔道西(水街至朝光街)	10.2009-01.2011	05.2011	05.2011	
		04.2011			

## II. 進行中的渠務工程，其位置如下並在圖則 DC0719/2 標出：

項目	位置	動工日期	預計施工期(月)	預計完工日期	施工模式	有無臨時交通管理安排	備註
C10-3B*	戲院里	09.2009-02.2010	17	08.2011	無坑及開坑挖掘	有	無坑挖掘部份：已完成頂管井挖掘，現正進行頂管工序。 開坑挖掘部份：工程如期進行中。
		08.2010					
D2*	德輔道西(東邊街至正街)	09.2009-04.2010	16	07.2011	開坑挖掘	有	工程如期進行中。
		10.2010					
AD-5*	租庇利街(干諾道中至德輔道中段)	12.2009	21	09.2011	開坑挖掘	有	工程如期進行中。
AD-5A*	皇后大道中連接租庇利街	03.2011	12	03.2012	開坑挖掘	有	工程如期進行中。
D11*	北街近堅尼地城新海旁	11.2010	8	07.2011	開坑挖掘	有	工程如期進行中。
AD-3*	皇后街(干諾道西至德輔道西)(上游部份)	02.2010	17	07.2011	無坑挖掘	有	無坑挖掘已完成，現正建造維修沙井，因受不明地下設施影响，工程約受 2 星期影响，預計延至 7 月完成。
C3-1B*	德輔道西近山道	02.2010-01.2011	18	12.2011	無坑及開坑挖掘	有	工程進行期間，發現附近有不尋常地下水情況，相關跟進及修補工作剛完成，本工程將按原定計劃繼續進行。
		06.2011					
C3-2*	皇后大道西(山道至屈地街)	03.2010-11.2010	13	08.2011	無坑及開坑挖掘	有	工程如期進行中。
		03.2011					
S5*	東邊街	06.2010	12	07.2011	無坑挖掘	有	工程進行中發現現有水管位置與記錄不同，須更改頂管井及加強保護設施，頂管工程預計延至 7 月完成。

C3-1A*	德輔道西(無坑部份)	05.2010	15	08.2011	無坑挖掘	有	工程如期進行中。
S2A*	卑路乍街近山市街	07.2010- 12.2010	7	07.2011	開坑挖掘	有	工程如期進行中。
		05.2011					
E3*	干諾道中(近信德中心)	08.2010	12	08.2011	開坑挖掘	有	工程主要在行人路上進行，因發現大量地下公共設施，現正挖掘勘察井，尋找適合的位置安裝渠管。
AD-2A*及 AD-2B*	正街(中段及南段)	12.2010	12	12.2011	無坑及開坑挖掘	有	現正研究將正街中段及南段的工程合併改為無坑挖掘的可行性，以進一步減少對公眾的影響。
AS2*	干諾道西近東邊街	03.2011	11	02.2012	渠管內壁更新 (無坑挖掘)	有	工程如期進行中。

### III. 預計在六個月內動工的渠務工程，其位置如下並在圖則 DC0719/2 標出：


項目	位置	動工日期	預計施工 期(月)	預計完工 日期	施工模式	有無臨時交 通管理安排	備註
E2*	德輔道中與禧利街交界	08.2011	4	11.2011	開坑挖掘(夜工)	需要	工程將安排於晚上及假日早上進行，以減低對交通的影響。由於附近有其他工程正在進行，並有臨時交通改道安排，與負責部門協調後，本工程預計至 2011 年 7 月動工。
C38-1*	加惠民道	08.2011	9	04.2012	開坑挖掘	需要	早前已就工程安排與當區區議員、居民及附近的學校商討，現正根據所收集的意見及資料審視施工安排，亦會更改原來的設計，減少對居民和學生的影響。
S11*	夏慤道近添華道	08.2011	4	11.2011	開坑挖掘	需要	工程主要在行人路上進行，將在掘路証發出後施工。
C42-1*	德輔道西近修打蘭街	08.2011	6	01.2012	開坑挖掘	需要	工程展開前將安排試路，測試交通流量。
CD-5A*	高陞街	08.2011	6	02.2012	開坑挖掘	需要	因須配合附近正進行的水務工程，協調後預計於 2011 年 8 月展開工程。

\* 已於上次會議滙報

渠務署工程管理部  
2011 年 6 月 14 日

圖例  
LEGEND:

- 已完成的渠務工程  
DRAINAGE WORKS COMPLETED
- 進行中的渠務工程  
DRAINAGE WORKS IN PROGRESS
- 預計在六個月內動工的渠務工程  
DRAINAGE WORKS ANTICIPATED TO COMMENCE IN SIX MONTHS

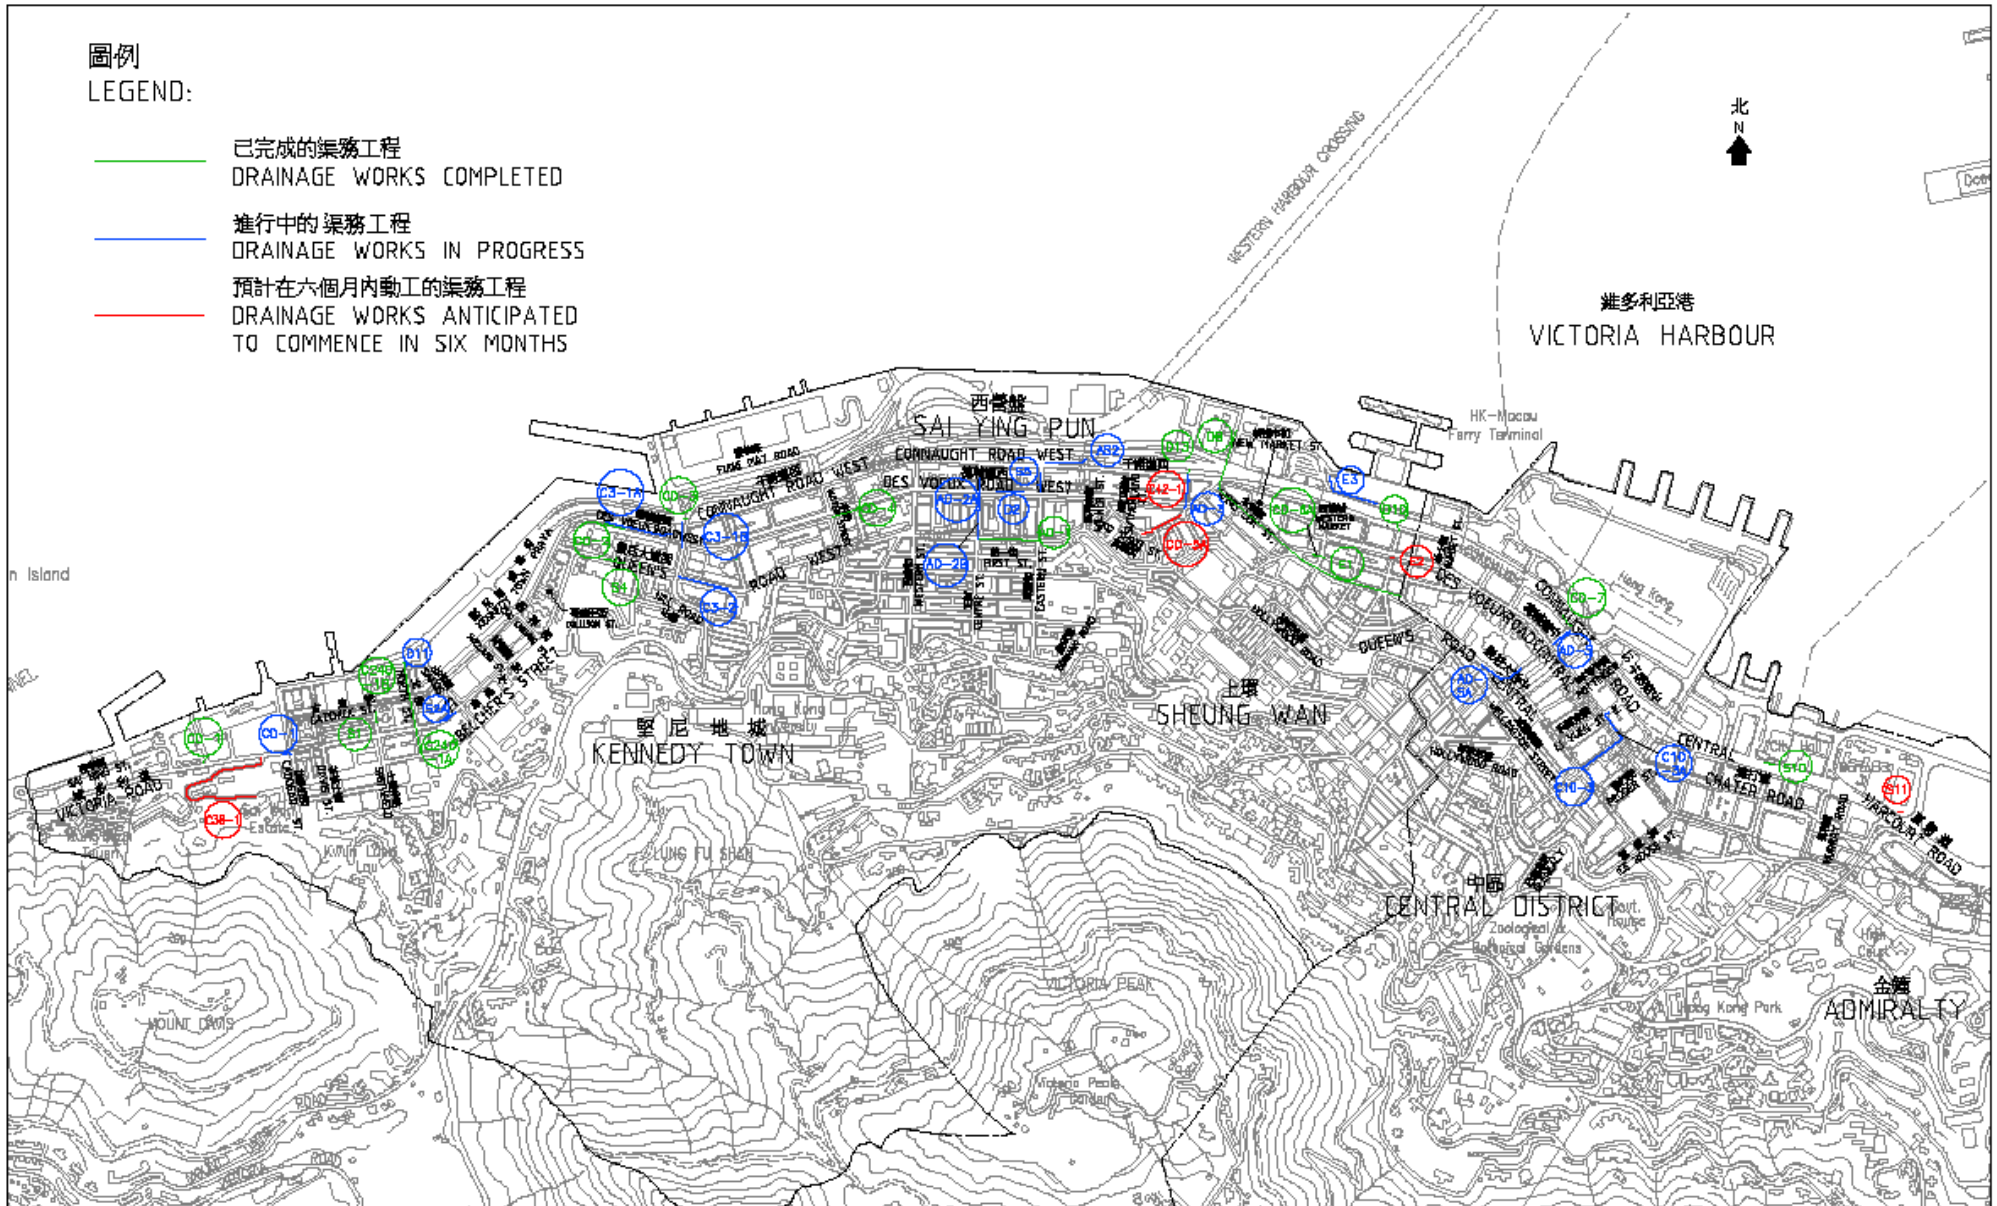

CONSULTING ENGINEERS

**AECOM**

AECOM Asia Company Limited

中西區區內的渠務工程進度匯報  
WORKS IN CENTRAL AND WESTERN  
DISTRICTS - PROGRESS UPDATE

中西區區議會食物環境衛生及工程委員會會議 (2011年06月23日)  
Central & Western District Council, Food, Environment, Hygiene & Works Committee Meeting (23.06.2011)

繪圖 DRAWN	H. M. CHEUNG	31.05.2011
校核 CHECKED	K. C. CHU	31.05.2011
圖則 DRG.NO.		比例 SCALE

DC0719/2

N.T.S.



香港特別行政區渠務署  
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT  
GOVERNMENT OF THE  
HONG KONG  
SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION

工程管理部

PROJECT MANAGEMENT DIVISION
