

離島區議會  
文件 IDC 16/2016 號  
離島區主要工程項目進度報告



土木工程拓展署  
港島及離島拓展處  
二零一六年一月

# 離島區主要工程項目進度報告（截至二零一五年十二月三十一日止）

## 目錄

## 頁數

|                       |    |
|-----------------------|----|
| (1) 主旨                | 2  |
| (2) 社區設施項目            | 3  |
| (3) 港口及填海工程項目         | 10 |
| (4) 道路工程項目            | 15 |
| (5) 渠務工程項目            | 21 |
| (6) 水務工程項目            | 28 |
| (7) 其他                | 32 |
| (8) 附錄 – 離島區部份主要工程位置圖 |    |

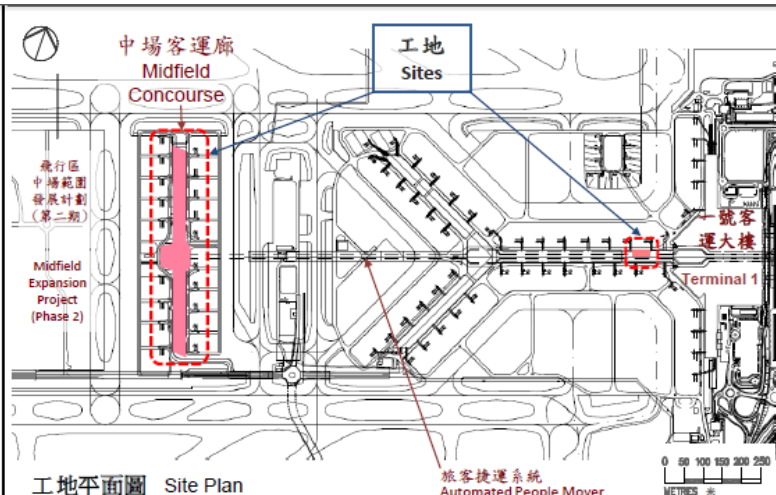
## (1) 主旨

(i) 報告中所載的工程項目資料是由不同政府部門提供，資料截至二零一五年十二月三十一日。

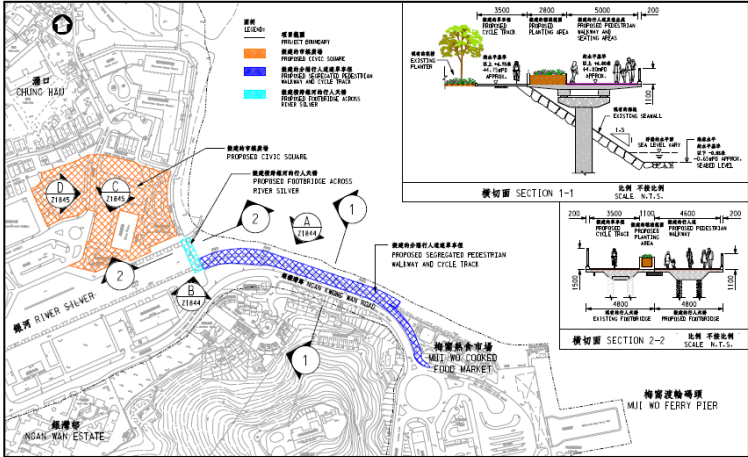
(ii) 所載的工程項目包括

- 在二零一五年一月一日至二零一五年底期間內完成的項目，
- 現在尚進行中的項目；及
- 預計在二零一六年或以後動工的項目。

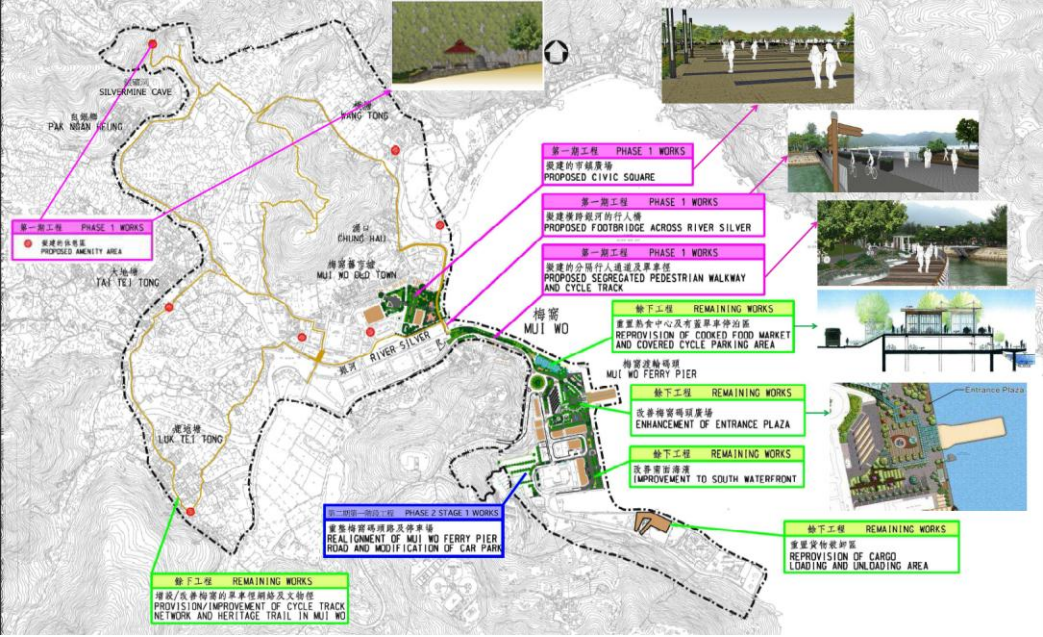
(2) 社區設施項目

| 工程編號<br>及<br>級別                                                                                                           | 工程名稱                                        | 預計費用<br>(百萬元)   | 決策科首長<br>及負責<br>部門/機構                                                                 | 動工日期<br>(月/年) | 竣工日期<br>(月/年) | 工程內容／備註                                                                                   | 照片/圖則                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                |                 |                         |                                                                                                                           |               |                 |                                                                                       |                              |                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--|
| 401IO<br><br>A                                                                                                            | 香港國際機場飛行區中場範圍發展計劃裝置相關的政府設施工程                | 256.50          | 運輸及房屋局局長<br><br>建築署                                                                   | 11/2012       | 2016 年年初      | <p>工程包括在香港國際機場新的中場客運廊及現有一號客運大樓內政府設施的設計和裝置工程。</p> <p>上蓋結構及建築工程基本完成。有關政府設施裝置工程 正進行測試階段。</p> | <div><p>中場客運廊<br/>Midfield Concourse</p><p>工地<br/>Sites</p><p>一號客運大樓<br/>Terminal 1</p><p>旅客捷運系統<br/>Automated People Mover</p><p>工地平面圖 Site Plan</p><table><tr><td>項目名稱<br/>401IO</td><td>繪圖<br/>C.K. SIN</td><td>日期<br/>10/4/2012</td><td>圖則編號<br/>PMB1/8048/XA101</td></tr><tr><td>FITTING-OUT WORKS FOR GOVERNMENT FACILITIES ASSOCIATED WITH MIDFIELD EXPANSION PROJECT AT HONG KONG INTERNATIONAL AIRPORT</td><td>校核<br/>P.K. SO</td><td>日期<br/>10/4/2012</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>香港國際機場飛行區中場範圍發展計劃裝置相關的政府設施工程</td><td>辦事處<br/>PROJECT MANAGEMENT BRANCH<br/>工程策劃管理處</td><td></td></tr></table></div> <div></div> | 項目名稱<br>401IO | 繪圖<br>C.K. SIN | 日期<br>10/4/2012 | 圖則編號<br>PMB1/8048/XA101 | FITTING-OUT WORKS FOR GOVERNMENT FACILITIES ASSOCIATED WITH MIDFIELD EXPANSION PROJECT AT HONG KONG INTERNATIONAL AIRPORT | 校核<br>P.K. SO | 日期<br>10/4/2012 |  | 香港國際機場飛行區中場範圍發展計劃裝置相關的政府設施工程 | 辦事處<br>PROJECT MANAGEMENT BRANCH<br>工程策劃管理處 |  |
| 項目名稱<br>401IO                                                                                                             | 繪圖<br>C.K. SIN                              | 日期<br>10/4/2012 | 圖則編號<br>PMB1/8048/XA101                                                               |               |               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                |                 |                         |                                                                                                                           |               |                 |                                                                                       |                              |                                             |  |
| FITTING-OUT WORKS FOR GOVERNMENT FACILITIES ASSOCIATED WITH MIDFIELD EXPANSION PROJECT AT HONG KONG INTERNATIONAL AIRPORT | 校核<br>P.K. SO                               | 日期<br>10/4/2012 |  |               |               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                |                 |                         |                                                                                                                           |               |                 |                                                                                       |                              |                                             |  |
| 香港國際機場飛行區中場範圍發展計劃裝置相關的政府設施工程                                                                                              | 辦事處<br>PROJECT MANAGEMENT BRANCH<br>工程策劃管理處 |                 |                                                                                       |               |               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                |                 |                         |                                                                                                                           |               |                 |                                                                                       |                              |                                             |  |

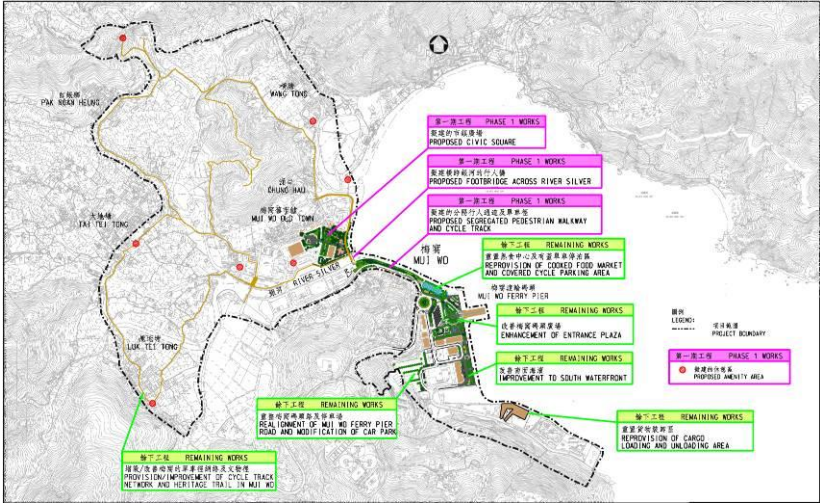
(2) 社區設施項目

| 工程編號及級別    | 工程名稱        | 預計費用(百萬元) | 決策科首長及負責部門/機構    | 動工日期(月/年) | 竣工日期(月/年) | 工程內容／備註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 照片/圖則                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 448RO<br>A | 梅窩改善工程(第一期) | 193.10    | 發展局局長<br>土木工程拓展署 | 07/2014   | 09/2016   | <p>我們在 2013 年 5 月把 414RO 號工程計劃的一部份，梅窩改善工程第一期，提升為甲級，範圍包括：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 在梅窩熟食市場與銀河之間，沿海旁建造 1 條長 230 米、闊 11.5 米的分隔行人道連單車徑；</li><li>2. 建造 1 條長 35 米、闊 4.8 米橫跨銀河的行人天橋；</li><li>3. 在梅窩舊墟附近興建 1 個市鎮廣場，並設置相關的園景美化區、康樂消閒設施及 1 個表演場地；</li><li>4. 在梅窩的鄉村闢建 7 個美化市容地帶；以及</li><li>5. 進行附屬工程，包括資料板、標誌牌、園景美化、排水及公用設施工程。</li></ol> <p>工程已於 2014 年 7 月開展，並預計於 2016 年底完成。</p> |   <p>A 支撐面行人道連單車徑(構思圖)<br/>PEDESTRIAN WALKWAY ON SUSPENDED DECK AND CYCLE TRACK (ARTIST'S IMPRESSION)</p>  <p>B 銀河上的行人天橋(構思圖)<br/>FOOTBRIDGE ACROSS RIVER SILVER (ARTIST'S IMPRESSION)</p> |

(2) 社區設施項目

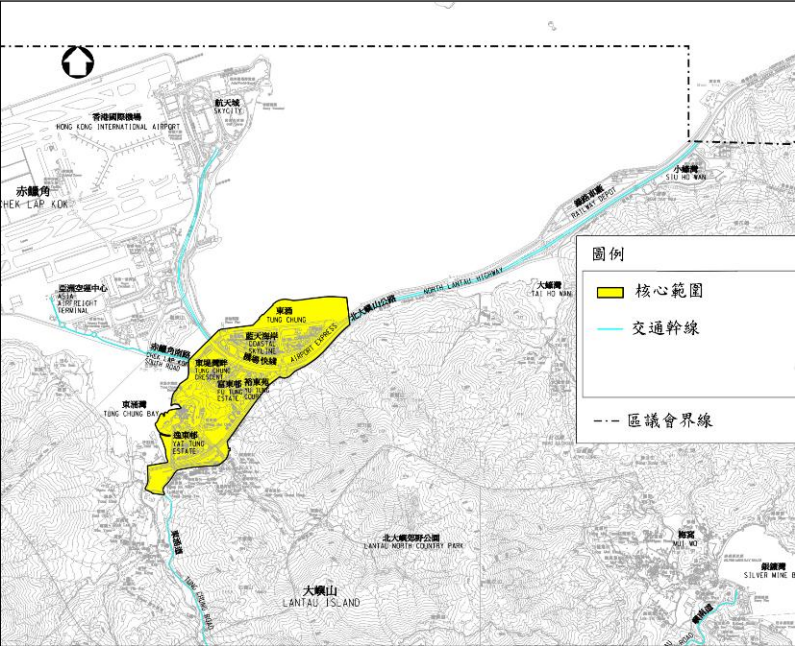
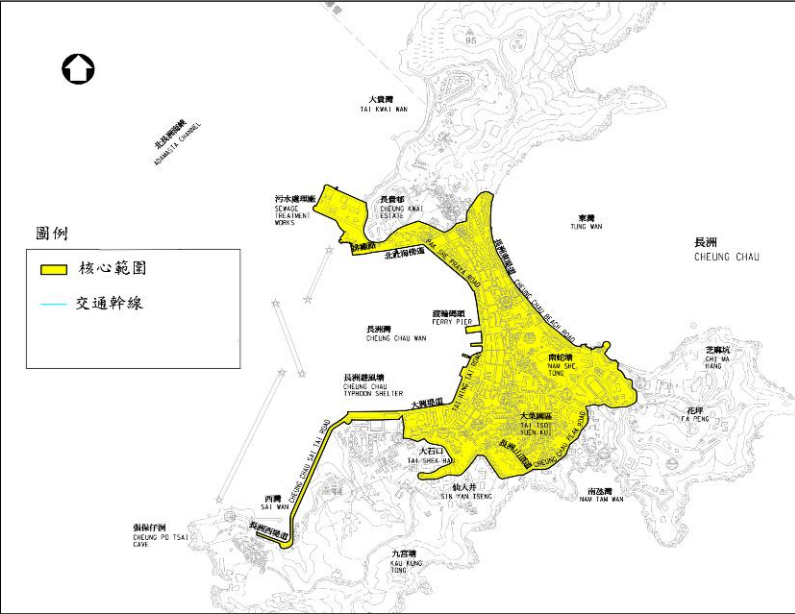
| 工程編號及級別    | 工程名稱          | 預計費用<br>(百萬元) | 決策科首長及負責部門/機構    | 動工日期<br>(月/年) | 竣工日期<br>(月/年) | 工程內容／備註                                                                                                   | 照片／圖則                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414RO<br>B | 梅窩改善工程 – 餘下工程 | 496.00        | 發展局局長<br>土木工程拓展署 | 04/2018       | 05/2020       | <p>此工程計劃包括梅窩改善工程第2期第2階段及第 3 期工程，包括重置梅窩熟食中心、美化南面海濱長廊及碼頭廣場;及改善現有單車徑。</p> <p>工程現正在詳細設計階段。工程的動工及竣工日期在檢討中。</p> |  <p>The map illustrates the project area in Mei Wo, including locations like Silvermine Cave, Pak Ngon, Tai Tet Tong, Lok Tet Tong, Ching Hui, Mei Wo Old Town, and River Silver. It details Phase 1 works (proposed civic square, footbridge, segregated pedestrian walkway and cycle track) and remaining works (reprovision of cooked food market and covered cycle parking area, enhancement of entrance plaza, improvement to south waterfront, realignment of Mei Wo Ferry Pier road and modification of car park, and reprovision of cargo loading and unloading area). Small inset photos show architectural renderings of the proposed facilities.</p> |

(2) 社區設施項目

| 工程編號及級別       | 工程名稱             | 預計費用<br>(百萬元) | 決策科首長及負責部門/機構    | 動工日期<br>(月/年) | 竣工日期<br>(月/年) | 工程內容／備註                                                                   | 照片／圖則                                                                                                                                                                         |
|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414RO-2A<br>B | 梅窩改善工程 - 第二期第一階段 | 72.31         | 發展局局長<br>土木工程拓展署 | 06/2016       | 12/2018       | 此工程計劃包括梅窩改善工程第 2 期第 1 階段工程，包括重整梅窩碼頭路及擴建現有停車場。<br><br>工程現正在詳細設計階段，刊憲程序已完成。 | <br> |



(2) 社區設施項目

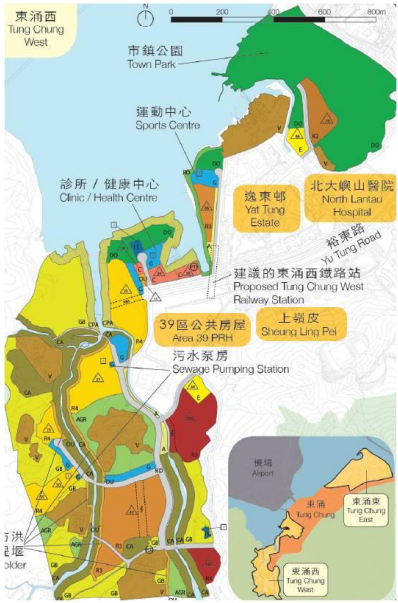
| 工程編號<br>及<br>級別       | 工程名稱                | 預計費用<br>(百萬元)            | 決策科首長<br>及負責<br>部門/機構 | 動工日期<br>(月/年)     | 竣工日期<br>(月/年)         | 工程內容／備註                                                                                              | 照片/圖則                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5101CX<br>5G66CG<br>D | 新界西南綠化總綱圖-顧問研究和工地勘測 | 18.10<br>(費用包括離島、荃灣及葵青區) | 發展局局長<br><br>土木工程拓展署  | 02/2012<br>(研究開始) | 09/2016 (完成綠化總綱圖制訂工作) | <p>工程項目包括制定新界西南區(包括離島、荃灣及葵青區)的綠化總綱圖、就綠化措施擬備詳細設計及進行所需的工地勘測。</p> <p>我們現正進行有關的詳細設計，預計於 2016 年第三季完成。</p> | <div><p>圖例</p><ul style="list-style-type: none"><li>核心範圍</li><li>交通幹線</li><li>區議會界線</li></ul></div> <p>東涌綠化總綱圖核心範圍</p> <div><p>圖例</p><ul style="list-style-type: none"><li>核心範圍</li><li>交通幹線</li></ul></div> <p>長洲綠化總綱圖核心範圍</p> |



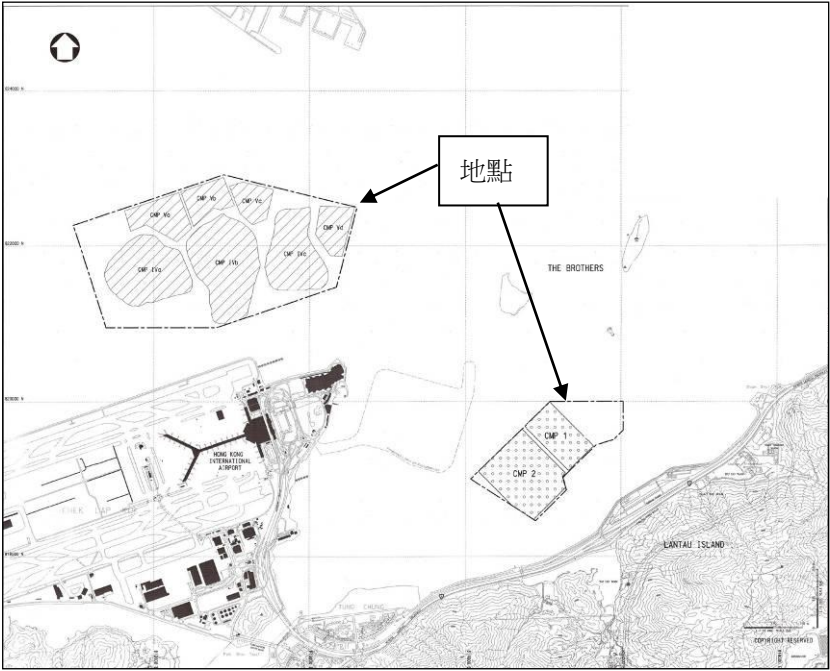
(3) 港口及填海工程項目

| 工程編號<br>及<br>級別 | 工程名稱               | 預計費用<br>(百萬元) | 決策科首<br>長及負責<br>部門/機構                            | 動工日期<br>(月/年) | 竣工日期<br>(月/年) | 工程內容／備註                                                                                                                                                                                                                                                                | 照片／圖則                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 712CL<br>A      | 東涌餘下發展計劃<br>的可行性研究 | 32.00         | 發展局局<br>長<br><br>土木工程<br>拓展署<br><br>及<br><br>規劃署 | 01/2012       | 04/2016       | <p>此研究主要為進行規劃及工程的可行性評估以探討於東涌有擴展潛力的地區，並為擴展東涌新市鎮成為更具規模的社區，建議一個切合房屋、社會、經濟、環境和當地居民需要的發展計劃。</p> <p>我們於 2014 年 10 月完成了三個階段的公眾參與活動後，考慮了所收集到的公眾意見，已制訂東涌新市鎮擴展的建議發展大綱圖，研究已大致完成。我們正進行相關法定程序，包括按城市規劃條例為分區計劃大綱草案及按下前濱及海床（填海工程）條例為擬議的填海工程（第 127 章）進行刊憲，並按環境影響評估條例提交環境影響評估報告尋求批核。</p> |  <p>The map illustrates the potential extension area for the Tung Chung New Town. It shows the Tung Chung River at the bottom, Tung Chung Bay in the center, and Tai Ho Wan at the top right. The extension area is divided into Tung Chung East and Tung Chung West. The existing Tung Chung Town Centre is marked with a blue circle. A legend indicates that the blue shaded area represents the 'Potential New Town Extension Area'.</p> |

(3) 港口及填海工程項目

| 工程編號<br>及<br>級別 | 工程名稱               | 預計費用<br>(百萬元) | 決策科首長<br>及負責<br>部門/機構    | 動工日期<br>(月/年) | 竣工日期<br>(月/年) | 工程內容／備註                                                | 照片／圖則                                                                                                                                                                         |
|-----------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 786CL<br>B      | 東涌新市鎮擴展- 詳細設計及土地勘測 | 729.5         | 發展局局長<br><br>土木工程<br>拓展署 | 05/2016       | 03/2021       | 此項目包括為東涌新市鎮擴展的工程進行詳細設計及土地勘測。我們計劃於 2016 年 5 月展開工程的詳細設計。 | <br> |

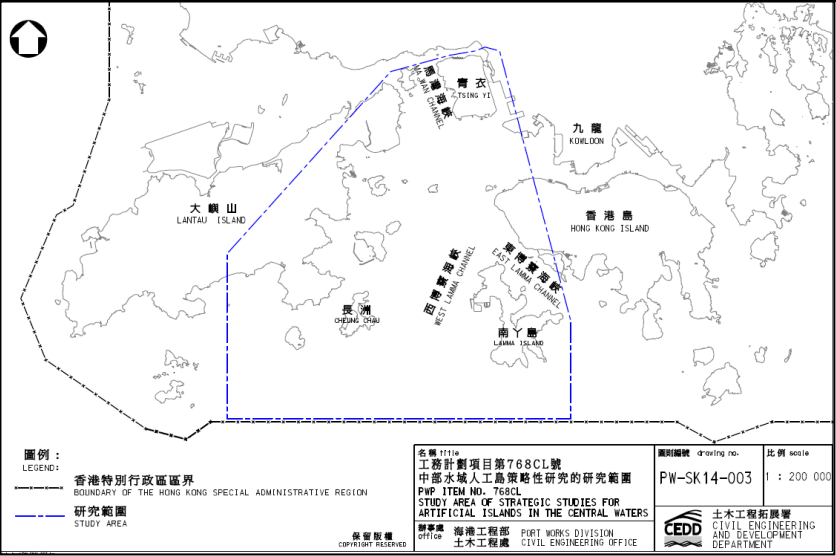
(3) 港口及填海工程項目

| 工程編號<br>及<br>級別 | 工程名稱                             | 預計費用<br>(百萬元) | 決策科首長<br>及負責<br>部門/機構    | 動工日期<br>(月/年) | 竣工日期<br>(月/年) | 工程內容／備註                                                                                                                                                                                                                           | 照片／圖則                                                                                |
|-----------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 737CL<br>A      | 大小磨刀以南污染<br>泥卸置設施的挖<br>掘、管理及覆蓋工程 | 468.55        | 發展局局長<br><br>土木工程<br>拓展署 | 09/2012       | 12/2018       | <p>工程包括在大小磨刀以南的海床挖掘兩個卸置坑，用作卸置約 400 萬立方米的污泥，及在設施範圍內管理卸泥活動以及實施環境監察和審核計劃。</p> <p>第一個泥坑已於 2013 年 8 月底開始接收污染沉積物，並於 2014 年 11 月底填滿及進行覆蓋。第二個泥坑已於 2014 年 11 月底完成挖掘工程，並開始用作卸置污染沉積物。所有卸置及覆蓋工程預計於 2016 年年底完成，而環境監察及審核計劃則會持續進行至 2018 年年底。</p> |  |

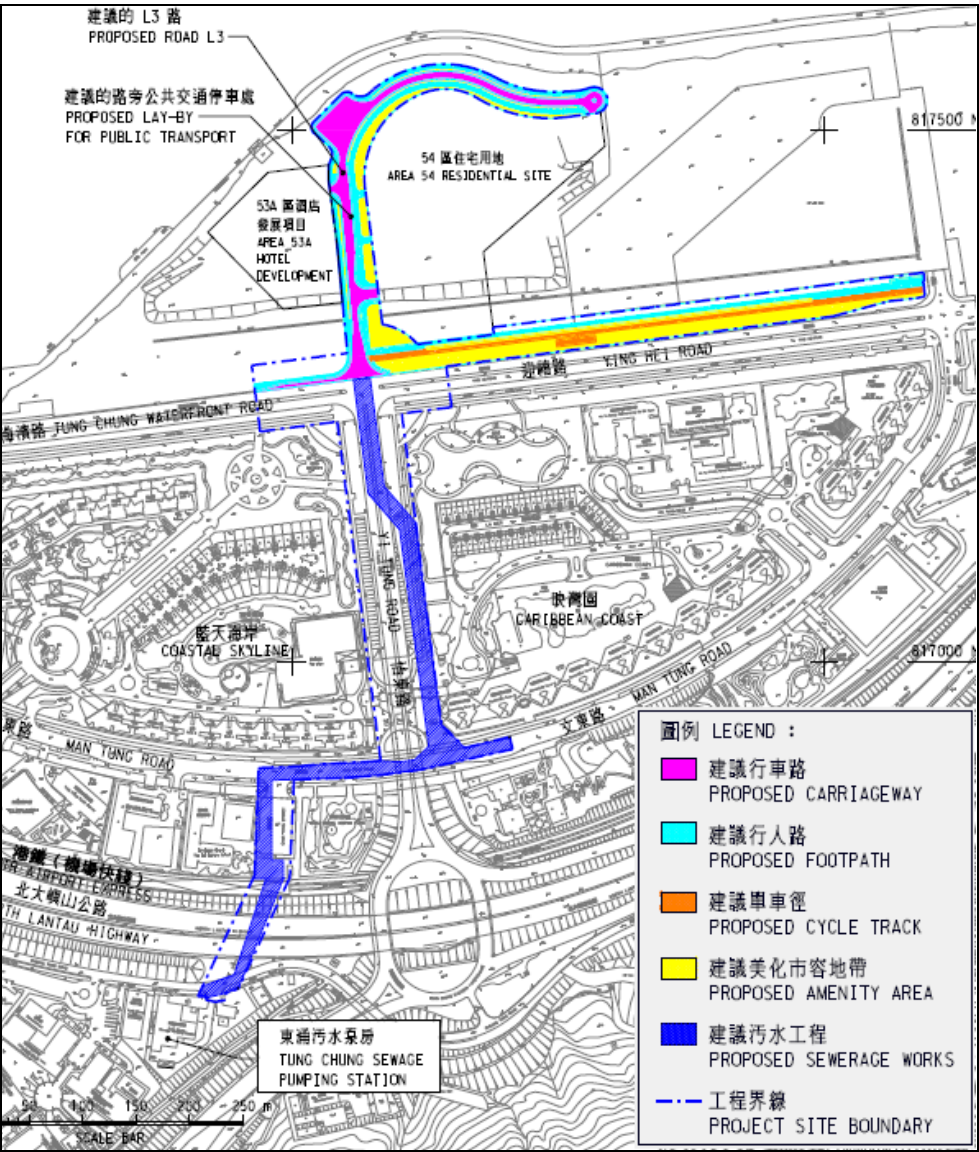
(3) 港口及填海工程項目

| 工程編號<br>及<br>級別 | 工程名稱                | 預計費用<br>(百萬元) | 決策科首長<br>及負責<br>部門/機構         | 動工日期<br>(月/年) | 竣工日期<br>(月/年) | 工程內容／備註                                                                                                    | 照片/圖則                                                                                |
|-----------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 114AP<br>A      | 為葵青貨櫃港池及其進港航道提供足夠水深 | 476.85        | 運輸及<br>房屋局<br><br>土木工程<br>拓展署 | 08/2013       | 02/2016       | <p>工程主要將葵青貨櫃港池以及部份北航道和西航道共約 428 公頃的海床，挖掘至海圖深度基準面以下約 17.5 米。</p> <p>工程於 2013 年 8 月展開，並預計於 2016 年 3 月完成。</p> |  |

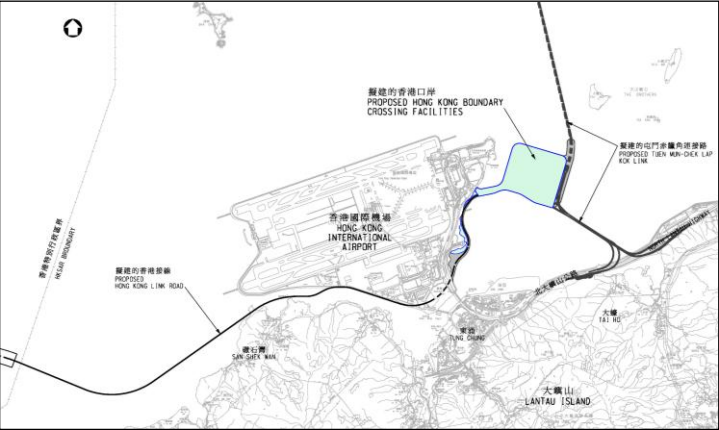
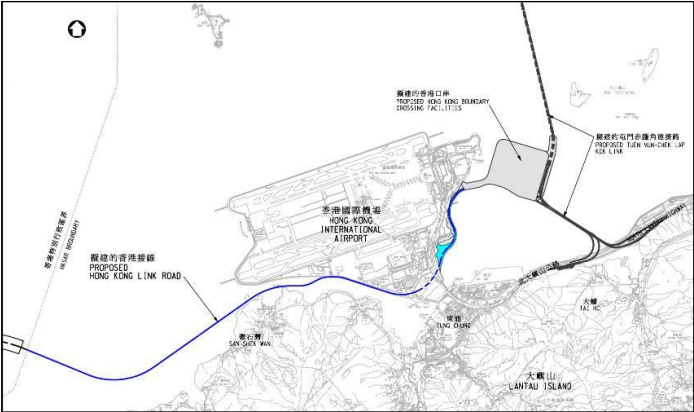
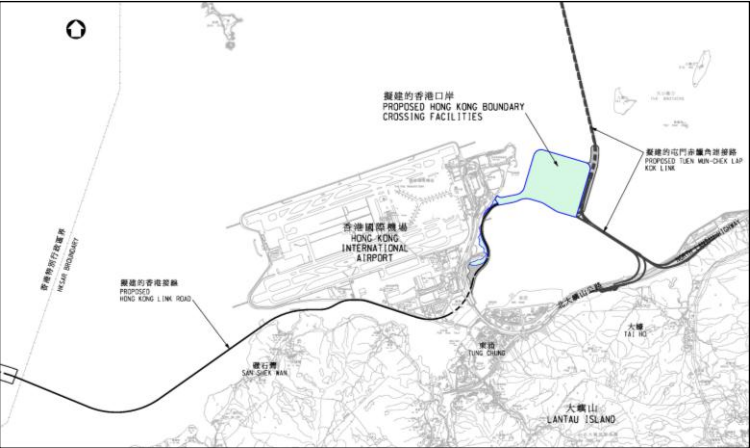
(3) 港口及填海工程項目

| 工程編號及級別     | 工程名稱          | 預計費用<br>(百萬元)                                    | 決策科首長及負責部門/機構    | 動工日期<br>(月/年)                                     | 竣工日期<br>(月/年)                                     | 工程內容／備註                                                                                                                            | 照片/圖則                                                                                |
|-------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5768CL<br>B | 中部水域的人工島策略性研究 | (此項目於2014年11月26日的工務小組委員會會議上撤回。當局正在重新檢視此項目的預計費用。) | 發展局局長<br>土木工程拓展署 | (此項目於2014年11月26日的工務小組委員會會議上撤回。當局正在重新檢視此項目的推展時間表。) | (此項目於2014年11月26日的工務小組委員會會議上撤回。當局正在重新檢視此項目的推展時間表。) | 工程計劃主要為中部水域建設人工島進行策略性研究，範圍包括初步工程可行性及基礎設施研究，包括概括填海範圍及交通連接、初步規劃建議，包括可考慮土地用途、港口運作及海上交通與安全研究、策略性環境評估、漁業影響評估、諮詢相關持份者以及相關的工地勘測工程，包括監督工作。 |  |

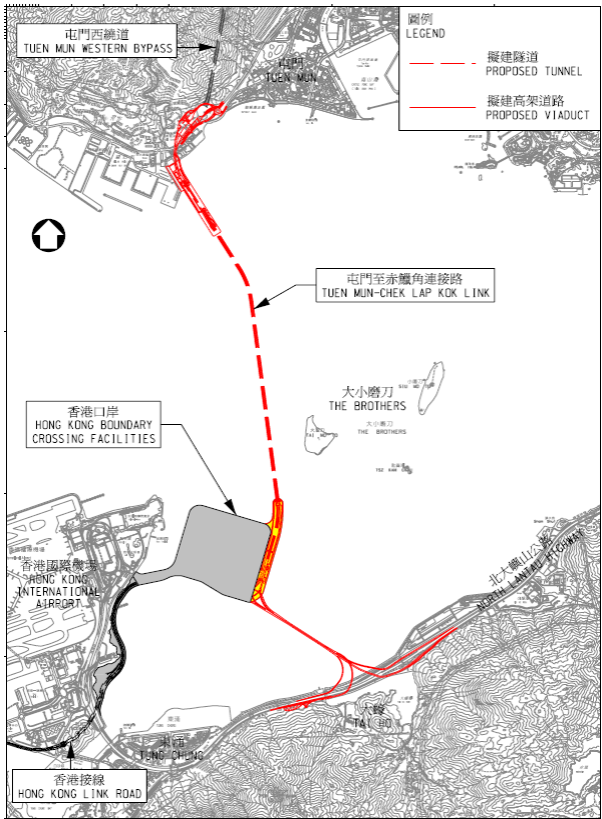
(4) 道路工程項目

| 工程編號<br>及<br>級別 | 工程名稱                  | 預計費用<br>(百萬元) | 決策科首<br>長及負責<br>部門/機構               | 動工日期<br>(月/年) | 竣工日期<br>(月/年) | 工程內容／備註                                                        | 照片／圖則                                                                                |
|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 781CL<br><br>B  | 東涌第54區房屋發<br>展的基礎設施工程 | 232.49        | 運輸及<br>房屋局局<br>長<br><br>土木工程<br>拓展署 | 07/2017       | 07/2020       | 工程旨在配合東涌第54地區房屋發展及鄰近地區的發展，為其提供相關的基礎設施，及於迎禧路以北建造行人路、單車徑及進行美化工程。 |  |

(4) 道路工程項目

| 工程編號<br>及<br>級別 | 工程名稱                  | 預計費用<br>(百萬元) | 決策科首長<br>及負責<br>部門/機構   | 動工日期<br>(月/年) | 竣工日期<br>(月/年)             | 工程內容／備註                                                                                                                                                                                                                                                                               | 照片/圖則                                                                                 |
|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 839TH<br>A      | 港珠澳大橋香港口岸－詳細設計及工地勘測工作 | 621.90        | 運輸及<br>房屋局局長<br><br>路政署 | 07/2009       | 08/2015                   | <p>工程計劃主要包括為建造港珠澳大橋香港口岸的填海及口岸設施進行詳細設計。</p> <p>香港口岸的填海工程已於 2011 年 11 月 30 日動工。香港口岸人工島上的現時主要上蓋及基建工程合約分別已自 2014 年分階段開展，以達通車目標。而這些合約的招標工作已於 2015 年 8 月大致完成。</p>                                                                                                                           |    |
| 844TH<br>A      | 港珠澳大橋香港接線             | 25047.20      | 運輸及<br>房屋局局長<br><br>路政署 | 05/2012       | 2017 年年底                  | <p>工程計劃主要包括詳細設計及建造港珠澳大橋香港接線。</p> <p>香港接線的兩份設計及建造合約已於 2012 年 5 月 31 日開展。</p>                                                                                                                                                                                                           |   |
| 845TH<br>A      | 港珠澳大橋香港口岸－填海及口岸設施     | 35,895.00     | 運輸及<br>房屋局局長<br><br>路政署 | 11/2011       | 2017 年年底<br>(完成通車必不可少的設施) | <p>工程計劃主要包括建造港珠澳大橋香港口岸的填海及口岸設施。</p> <p>香港口岸的填海工程已於 2011 年 11 月 30 日動工。上蓋設施當中的交通管制及監察系統合約、旅檢大樓工程合約、基礎設施工程第 1 期(西面部分)合約、基礎設施工程第 2 期(南面部分)合約、車輛通關廣場,輔助建築物及設施合約、及車輛自動清關支援系統合約亦分別於 2014 年 1 月、2014 年 4 月、2014 年 7 月、2015 年 3 月、2015 年 4 月及 2015 年 8 月展開。餘下 2 份上蓋設施合約亦已於 2015 年 12 月批出。</p> |  |

(4) 道路工程項目

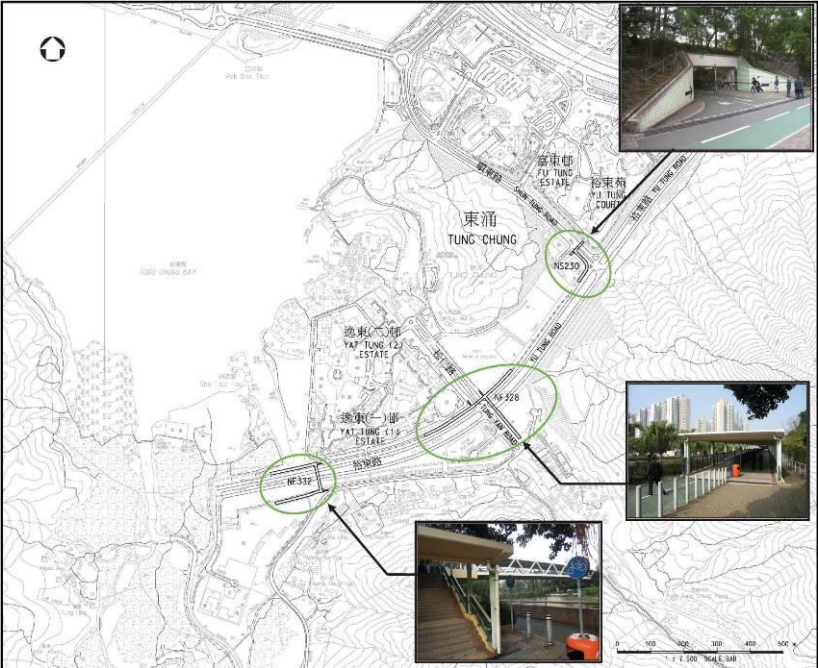
| 工程編號<br>及<br>級別 | 工程名稱                      | 預計費用<br>(百萬元) | 決策科首長<br>及負責<br>部門/機構   | 動工日期<br>(月/年) | 竣工日期<br>(月/年) | 工程內容／備註                                                                                                                                                                                                 | 照片／圖則                                                                                |
|-----------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 846TH<br>A      | 屯門至赤鱸角連接路— 詳細設計、工地勘測及前期工程 | 1,909.60      | 運輸及<br>房屋局局長<br><br>路政署 | 11/2011       | 2016          | <p>工程計劃主要包括進行屯門至赤鱸角連接路的海底隧道南面出入口的填海工程(即前期工程); 以及委聘顧問為屯門至赤鱸角連接路的餘下工程(即除了前期工程外)進行詳細設計和相關工地勘測。</p> <p>前期工程與香港口岸的填海工程已透過同一份工程合約於 2011 年 11 月 30 日動工。相關的工地勘測已於 2013 年 11 月完成。而屯門至赤鱸角連接路的詳細設計將於 2016 年完成。</p> |  |

(4) 道路工程項目

| 工程編號<br>及<br>級別 | 工程名稱                        | 預計費用<br>(百萬元) | 決策科首長<br>及負責<br>部門/機構           | 動工日期<br>(月/年) | 竣工日期<br>(月/年) | 工程內容／備註                                                                                                 | 照片/圖則 |
|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 857TH<br>A      | 屯門至赤鱗角連接路 - 建造工程            | 44,798.40     | 運輸及<br>房屋局局長<br><br>路政署         | 06/2013       | 12/2018       | 工程計劃主要包括建造屯門至赤鱗角連接路。<br><br>屯門至赤鱗角連接路的首三份工程合約已分別於 2013 年 6 月、8 月及 2014 年 7 月開展。餘下的兩份工程合約將於 2016 年分階段開展。 |       |
| 742CL<br>A      | 與東涌第 56 區的建議發展項目有關的主要基礎建設工程 | 54.80         | 運輸及<br>房屋局局長<br><br>土木工程<br>拓展署 | 09/2014       | 05/2016       | 工程計劃包括道路、渠務及供水等基建工程以配合該區域發展。<br><br>工程已於 2014 年 9 月開展，預計於 2016 年年中完成。                                   |       |



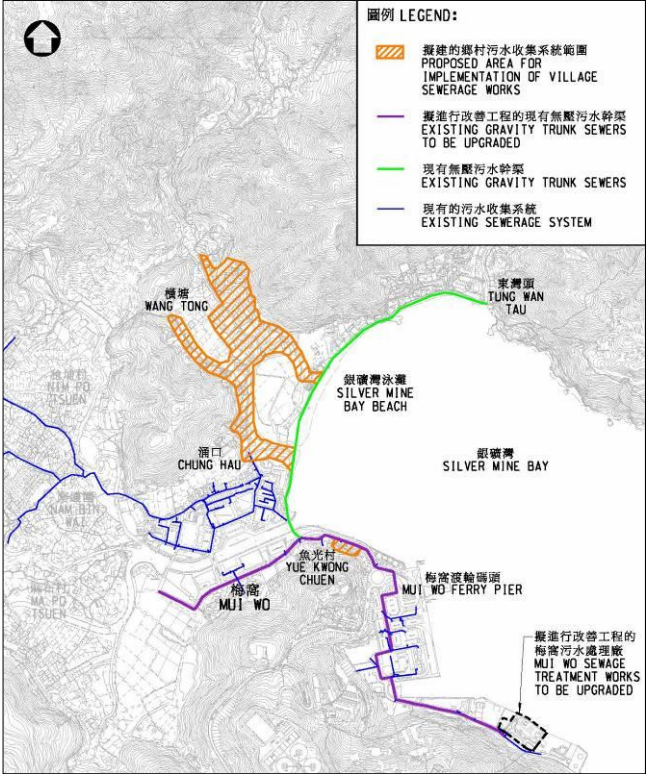
(4) 道路工程項目

| 工程編號<br>及<br>級別 | 工程名稱                                       | 預計費用<br>(百萬元) | 決策科首長<br>及負責<br>部門/機構           | 動工日期<br>(月/年) | 竣工日期<br>(月/年) | 工程內容／備註                                                                                                                                                                                                                                                                   | 照片/圖則                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 6101TX<br>D     | 在公共行人天橋、高架行人道及行人隧道加建暢道通行設施第二組 – 勘查研究、設計及建造 | 118           | 運輸及<br>房屋局局長<br><br>土木工程<br>拓展署 | 10/2015       | 5/2018        | <p>工程主要為離島區下列 3 條公共行人天橋/隧道加建升降機設施:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>橫跨裕東路及松仁路的行人天橋（結構編號：NF328）；</li><li>橫跨裕東路近東涌下嶺皮的行人天橋（結構編號：NF332）；</li><li>橫跨順東路近大嶼山北區警署的行人隧道（結構編號：NS230）。</li></ol> <p>上述工程項目已於 2015 年 11 月開展，工程預計於 2018 年年中完成。有關工程的前期工作，包括申請挖掘準許證現正進行中。</p> |  |

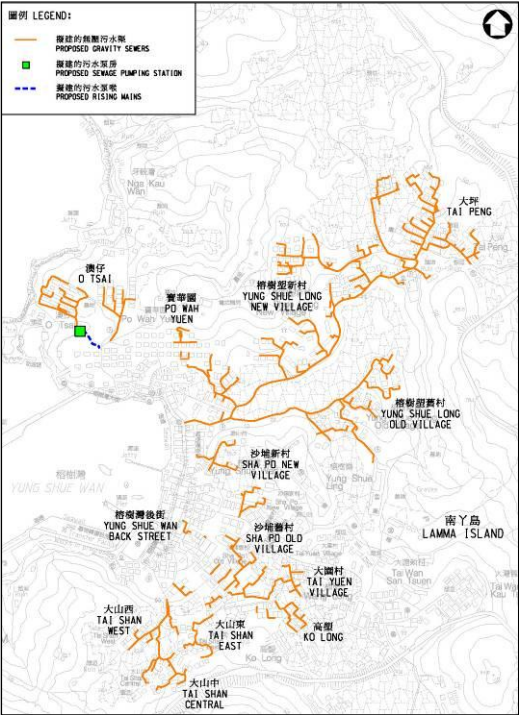
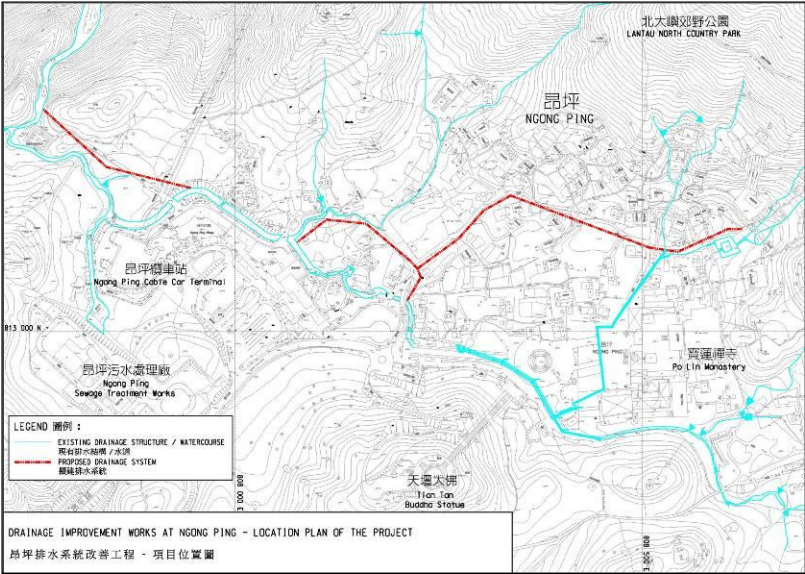
## (5) 渠務工程項目

| 工程編號<br>及<br>級別 | 工程名稱                                                              | 預計費用<br>(百萬元) | 決策科首長<br>及負責<br>部門/機構 | 動工日期<br>(月/年) | 竣工日期<br>(月/年) | 工程內容／備註                                                                                                              | 照片/圖則                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 230DS<br>A      | 離島污水收集系統<br>第 1 階段第 1 期工程<br>第 2 部分 – 榕樹灣<br>污水收集系統、污水<br>處理廠及排放管 | 347.50        | 環境局局長<br><br>渠務署      | 01/2008       | 08/2014       | 工程主要包括在南丫島榕樹灣鋪設 3.3 公里污水渠，建造一所二級污水處理廠連消毒裝置及一條海底排污管道。<br><br>所有渠道工程已於 2011 年完成。污水處理廠工程則於 2014 年 8 月大致完成。              |   |
| 234DS<br>A      | 離島污水收集系統<br>第 1 階段第 2 期工程 – 索罟灣污水收集、處理系統及排放設施                     | 353.70        | 環境局局長<br><br>渠務署      | 01/2008       | 02/2015       | 工程主要在南丫島索罟灣鋪設約 2.8 公里污水渠，建造 2 座污水泵房、一所二級污水處理廠連消毒裝置及一條海底排污管道。<br><br>所有渠道工程已於 2011 年完成。污水處理廠及污水泵房工程則於 2015 年 2 月大致完成。 |  |

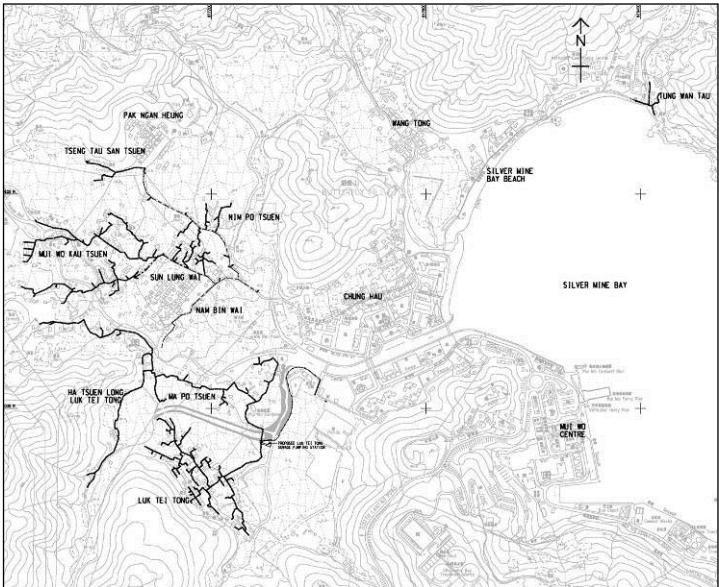
(5) 渠務工程項目

| 工程編號<br>及<br>級別 | 工程名稱                         | 預計費用<br>(百萬元) | 決策科首長<br>及負責<br>部門/機構 | 動工日期<br>(月/年) | 竣工日期<br>(月/年) | 工程內容／備註                                                                                                 | 照片／圖則                                                                                |
|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 387DS<br><br>A  | 梅窩污水處理廠改善工程及梅窩市中心與橫塘污水收集系統工程 | 967.20        | 環境局局長<br><br>渠務署      | 07/2012       | 09/2017       | <p>工程主要改善現有的梅窩污水處理廠及在梅窩市中心現有長約兩公里的污水幹渠，及在梅窩兩個未敷設污水收集設施的地區(即橫塘和魚光村)鋪設污水渠。</p> <p>工程現正在施工階段，已完成約 35%。</p> |  |

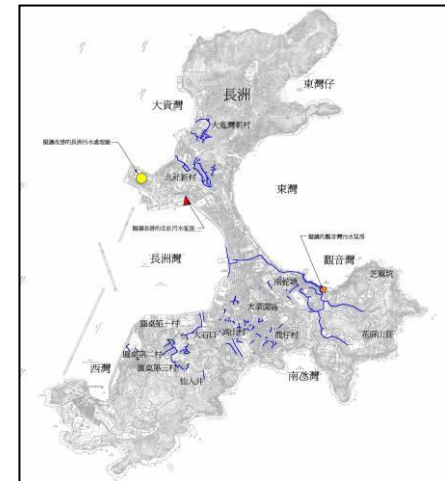
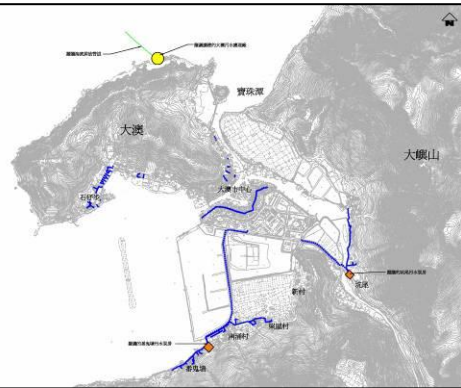
(5) 渠務工程項目

| 工程編號<br>及<br>級別 | 工程名稱                                                | 預計費用<br>(百萬元) | 決策科首長<br>及負責<br>部門/機構 | 動工日期<br>(月/年) | 竣工日期<br>(月/年) | 工程內容／備註                                                                                                                                            | 照片/圖則                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 397DS<br>A      | 離島污水收集系統<br>第 2 階段 – 南丫鄉<br>村污水收集系統第 2<br>期第 1 部分工程 | 340.20        | 環境局局長<br><br>渠務署      | 12/2013       | 06/2018       | 工程主要為南丫島榕樹灣十三個未敷設污水收集設施的地區(即沙埔新村、沙埔舊村、榕樹灣後街、大山西、大山東、大山中、高塋(部分)、大園村(部分)、澳仔、寶華園、榕樹塋新村、榕樹塋舊村及大坪)鋪設長約九公里的污水渠。<br><br>工程已在 2013 年年底動工，現正在施工階段，已完成約 31%。 |   |
| 163CD<br>B      | 昂坪雨水排放系統<br>改善工程                                    | 171.20        | 發展局局長<br><br>渠務署      | 04/2017       | 09/2019       | 工程包括在寶蓮禪寺和昂坪 360 終點站北面建造約 900 米長的排水管道及箱形暗渠，以改善現有的雨水排放系統，從而減低昂坪一帶的水浸風險。<br><br>工程現正在詳細設計階段，預計在 2017 年年中動工。                                          |  |

(5) 渠務工程項目

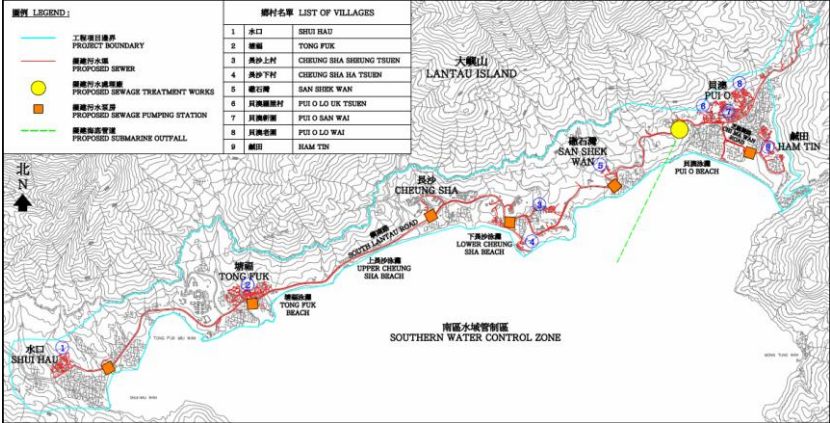
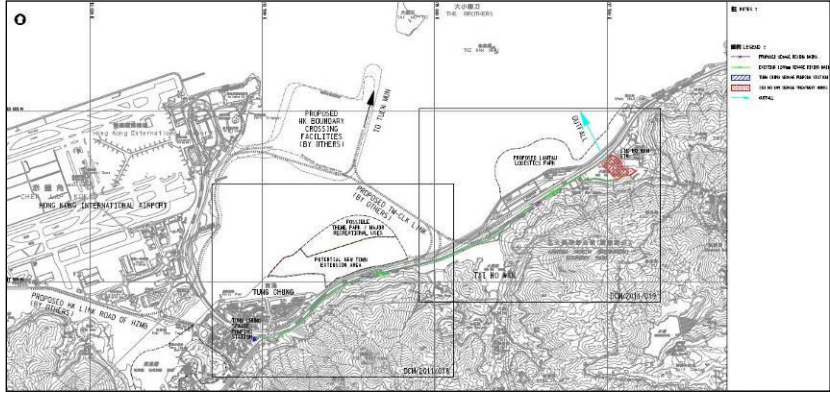
| 工程編號<br>及<br>級別 | 工程名稱                                             | 預計費用<br>(百萬元) | 決策科首長<br>及負責<br>部門/機構 | 動工日期<br>(月/年) | 竣工日期<br>(月/年) | 工程內容／備註                                                                                  | 照片/圖則                                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 343DS<br><br>B  | 離島污水收集系統<br>第 2 階段 – 坪洲鄉<br>村污水收集系統第 2<br>期      | 101.70        | 環境局局長<br><br>渠務署      | 11/2017       | 11/2020       | 工程計劃旨在為坪洲未有污水設施的鄉村提供公共污水收集系統，以改善坪洲的水質和在區內未接駁污水渠地方的衛生情況。<br><br>工程現正在設計階段，預計在 2017 年年底動工。 |   |
| 353DS<br><br>B  | 離島污水收系統第 2<br>階段- 擴展污水收集<br>系統至梅窩其他未<br>有污水設施的鄉村 | 56.50         | 環境局局長<br><br>渠務署      | 12/2017       | 04/2022       | 工程主要為梅窩鄉村未有污水收集系統的地區敷設污水渠。<br><br>工程現正在詳細設計階段，預計分階段在 2017 年年底動工。                         |  |

(5) 渠務工程項目

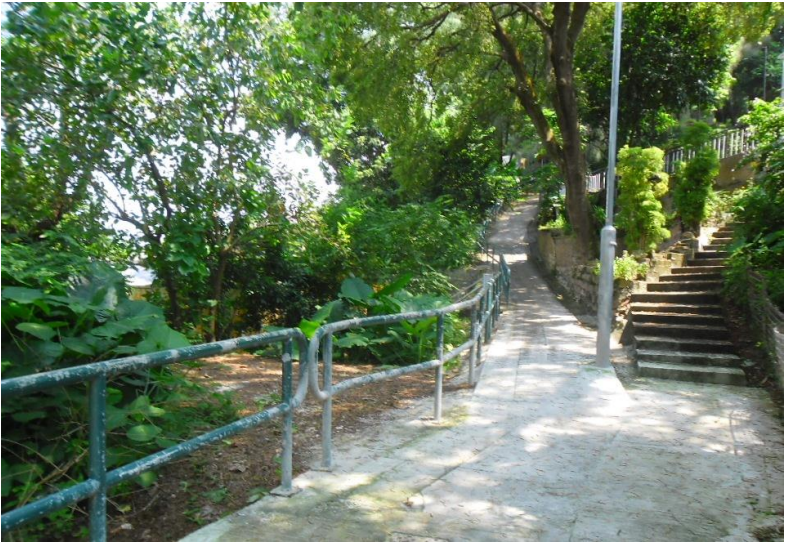
| 工程編號<br>及<br>級別 | 工程名稱                                             | 預計費用<br>(百萬元) | 決策科首長<br>及負責<br>部門/機構 | 動工日期<br>(月/年) | 竣工日期<br>(月/年) | 工程內容／備註                                                                                       | 照片/圖則                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 354DS<br><br>B  | 離島污水收集系統<br>第 2 階段 – 長洲及<br>大澳污水收集、處理<br>及排放改善工程 | 986.70        | 環境局局長<br><br>渠務署      | 05/2017       | 06/2022       | <p>工程主要為長洲及大澳鄉村未有污水收集系統的地區敷設污水渠，及改善現有長洲及大澳污水處理廠的設施。</p> <p>工程現正在詳細設計階段，預計在 2017 年年中分階段動工。</p> | <br> |



(5) 渠務工程項目

| 工程編號<br>及<br>級別 | 工程名稱                                     | 預計費用<br>(百萬元) | 決策科首長<br>及負責<br>部門/機構 | 動工日期<br>(月/年) | 竣工日期<br>(月/年)                                                       | 工程內容／備註                                                                                                                                                         | 照片/圖則                                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 331DS<br><br>B  | 離島污水收集系統<br>第2階段 - 南大嶼<br>山污水收集系統工<br>程  | 817.80        | 環境局局長<br><br>渠務署      | 04/2017       | 08/2023                                                             | <p>工程主要為南大嶼山地區建造公共污水收集系統。工程包括建造污水主幹渠、鄉村污水收集系統、污水泵房、污水處理廠和相關的海底排放管，以便妥善收集及處理來自南大嶼山地區包括水口、塘福、長沙、礮石灣、貝澳和鹹田等地區的污水。</p> <p>工程現正在詳細設計及環境影響評估研究階段。工程的動工及竣工日期乃初步估計。</p> |    |
| 381DS<br><br>B  | 在東涌及小蠔灣之<br>間增建一條加壓污<br>水管及修復現有加<br>壓污水管 | 1,340.30      | 環境局局長<br><br>渠務署      | 08/2016       | 第一期 (建造<br>加壓污水管)<br>06/2023<br><br>第二期 (修復<br>現有加壓污水<br>管) 12/2025 | <p>工程主要在東涌至小蠔灣增建一條加壓污水管、修復現有加壓污水管及建造有關設施。</p> <p>工程的詳細設計階段已經完成。預計在 2016 年 8 月動工。</p> <p>工程的動工及竣工日期乃初步估計。</p>                                                    |  |

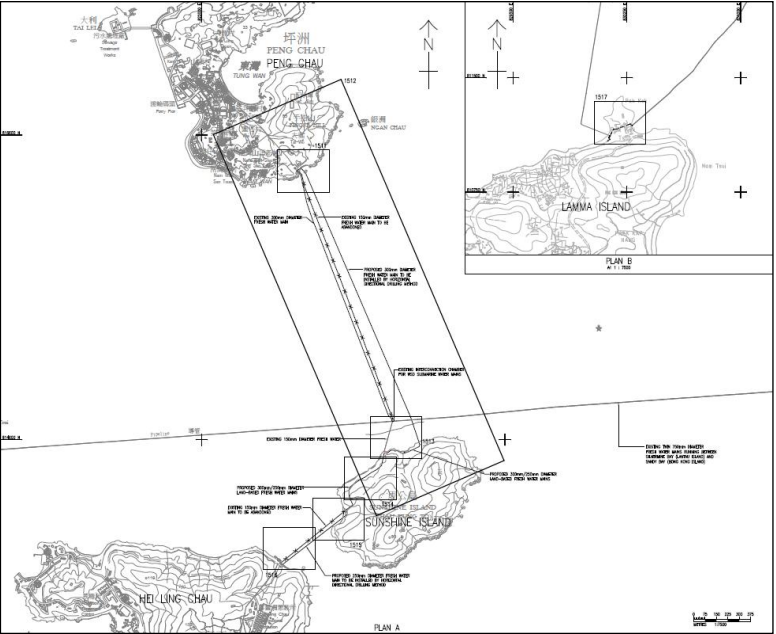
(6) 水務工程項目

| 工程編號<br>及<br>級別 | 工程名稱          | 預計費用<br>(百萬元) | 決策科首長<br>及負責<br>部門/機構 | 動工日期<br>(月/年) | 竣工日期<br>(月/年) | 工程內容／備註                                                                                                                                                           | 照片/圖則                                                                                 |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 186WC<br>A      | 更換及修復水管工程第三階段 | 89.00         | 發展局局長<br>水務署          | 03/2009       | 02/2016       | <p>工程合約編號 18/WSD/08 包括在大嶼山大澳、石壁、長洲及南丫島更換總長度約十六公里，直徑由二十毫米至四百五十毫米的老化食水管。</p> <p>工程於 2009 年 3 月開始，更換及修復水管工程已於 2015 年 12 月底完成。工地清潔及路面修復工程現正進行中，並預計於 2016 年 2 月完成。</p> |   |
|                 |               |               |                       |               |               |                                                                                                                                                                   | 在大嶼山大澳進行中的工程                                                                          |
|                 |               |               |                       |               |               |                                                                                                                                                                   |  |
|                 |               |               |                       |               |               |                                                                                                                                                                   | 在長洲進行中的工程                                                                             |

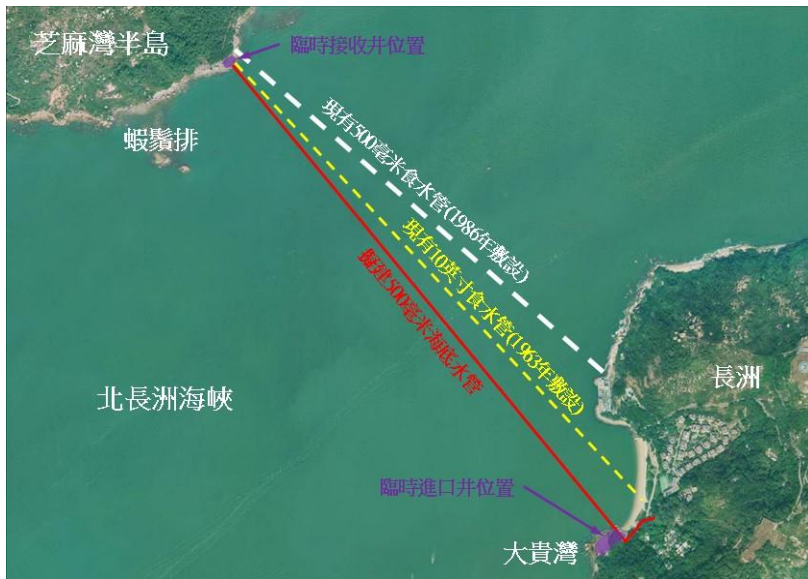
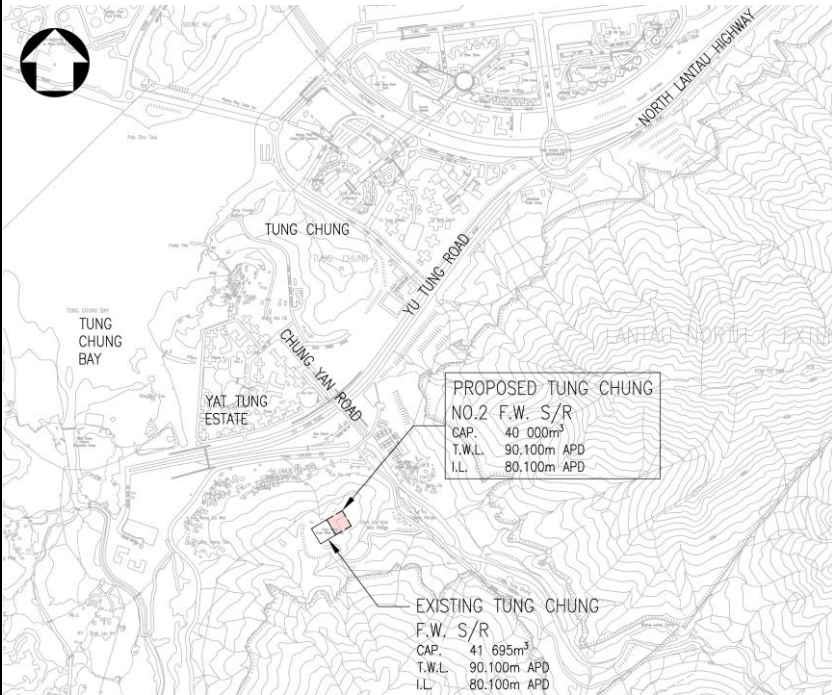
## (6) 水務工程項目

| 工程編號<br>及<br>級別 | 工程名稱             | 預計費用<br>(百萬元) | 決策科首長<br>及負責<br>部門/機構 | 動工日期<br>(月/年) | 竣工日期<br>(月/年) | 工程內容／備註                                                                                                                                                                                         | 照片/圖則                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189WC<br>A      | 更換及修復水管工程第四階段第二期 | 4510.30       | 發展局局長<br>水務署          | 10/2012       | 04/2016       | <p>工程計劃包括在各區更換及修復水管。在離島區的兩項工程如下：</p> <p>(i) 工程合約編號 15/WSD/11</p> <p>工程包括在東大嶼山、南大嶼山、西大嶼山、坪洲、長洲及南丫島更換總長度約 38 公里、直徑由 20 至 1200 毫米的老化食水管。</p> <p>工程已於 2012 年 10 月展開，至 2015 年 12 月底已完成 82%的水管工程。</p> |  <p style="text-align: center;"><u>在大嶼山長沙嶼南道進行中的工程</u></p>  <p style="text-align: center;"><u>在大嶼山大澳大澳道進行中的工程</u></p> |

(6) 水務工程項目

| 工程編號及級別    | 工程名稱                 | 預計費用<br>(百萬元) | 決策科首長<br>及負責<br>部門/機構 | 動工日期<br>(月/年) | 竣工日期<br>(月/年) | 工程內容／備註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 照片/圖則                                                                                |
|------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 189WC<br>A | 更換及修復水管工程<br>第四階段第二期 | 412.00        | 發展局局長<br><br>水務署      | 09/2013       | 04/2016       | <p>(ii) 工程合約編號 16/WSD/11</p> <p>工程包括更換坪洲至周公島及周公島至喜靈洲之間總長度約 2.5 公里、直徑分別為 300 毫米和 250 毫米的老化海底水管;並為港島西和南丫島之間兩條現有 300 毫米的海底水管更換陰極保護系統。</p> <p>至 2015 年 12 月底，坪洲至周公島及周公島至喜靈洲段之海底隧道之鑽挖工程已全部完成，而周公島至喜靈洲段之聚乙烯喉管亦已裝置完成。目前正進行裝置坪洲至周公島段之聚乙烯喉管工程。由於受到天氣影響，有關工程預計於 2016 年 4 月完成。</p> <p>至於港島西和南丫島之間兩條現有 300 毫米的海底水管更換陰極保護系統方面，工程亦已大部份完成，現進行有關之電器裝置，預計有關工程可於 2016 年 2 月完成。</p> |  |

(6) 水務工程項目

| 工程編號<br>及<br>級別                   | 工程名稱         | 預計費用<br>(百萬元) | 決策科首長<br>及負責<br>部門/機構 | 動工日期<br>(月/年) | 竣工日期<br>(月/年) | 工程內容／備註                                                                                                                                                                            | 照片/圖則                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |               |                    |                  |                              |               |                    |                  |
|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 333WF<br>A                        | 長洲食水供應改善工程   | 254.80        | 發展局局長<br>水務署          | 10/2013       | 3/2017        | <p>工程合約編號 1/WSD/13 工程已於 2013 年 10 月展開，並預計於 2017 年 3 月竣工，至 2015 年 12 月已完成 77% 的工程。</p> <p>工程項目包括由大嶼山至長洲，橫跨北長洲海峽敷設一條長約 1.4 公里，直徑 500 毫米的海底水管，以及在上岸地點附近敷設長約 150 米，直徑 250 毫米的地下喉管。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |               |                    |                  |                              |               |                    |                  |
| 356WF<br>B                        | 東涌食水供應系統提升工程 | 230           | 發展局局長<br>水務署          | 05/2017       | 12/2019       | <p>工程項目包括在東涌建造一個容量 40000 立方米的食水配水庫，及相關的水管接駁。</p> <p>此工程項目現正在規劃中。當規劃完成後，工程將進入設計的階段。</p>                                                                                             |  <table><tr><th>PROPOSED TUNG CHUNG NO.2 F.W. S/R</th></tr><tr><td>CAP. 40'000m³</td></tr><tr><td>T.W.L. 90.100m APD</td></tr><tr><td>I.L. 80.100m APD</td></tr></table> <table><tr><th>EXISTING TUNG CHUNG F.W. S/R</th></tr><tr><td>CAP. 41'695m³</td></tr><tr><td>T.W.L. 90.100m APD</td></tr><tr><td>I.L. 80.100m APD</td></tr></table> | PROPOSED TUNG CHUNG NO.2 F.W. S/R | CAP. 40'000m³ | T.W.L. 90.100m APD | I.L. 80.100m APD | EXISTING TUNG CHUNG F.W. S/R | CAP. 41'695m³ | T.W.L. 90.100m APD | I.L. 80.100m APD |
| PROPOSED TUNG CHUNG NO.2 F.W. S/R |              |               |                       |               |               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |               |                    |                  |                              |               |                    |                  |
| CAP. 40'000m³                     |              |               |                       |               |               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |               |                    |                  |                              |               |                    |                  |
| T.W.L. 90.100m APD                |              |               |                       |               |               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |               |                    |                  |                              |               |                    |                  |
| I.L. 80.100m APD                  |              |               |                       |               |               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |               |                    |                  |                              |               |                    |                  |
| EXISTING TUNG CHUNG F.W. S/R      |              |               |                       |               |               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |               |                    |                  |                              |               |                    |                  |
| CAP. 41'695m³                     |              |               |                       |               |               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |               |                    |                  |                              |               |                    |                  |
| T.W.L. 90.100m APD                |              |               |                       |               |               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |               |                    |                  |                              |               |                    |                  |
| I.L. 80.100m APD                  |              |               |                       |               |               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |               |                    |                  |                              |               |                    |                  |

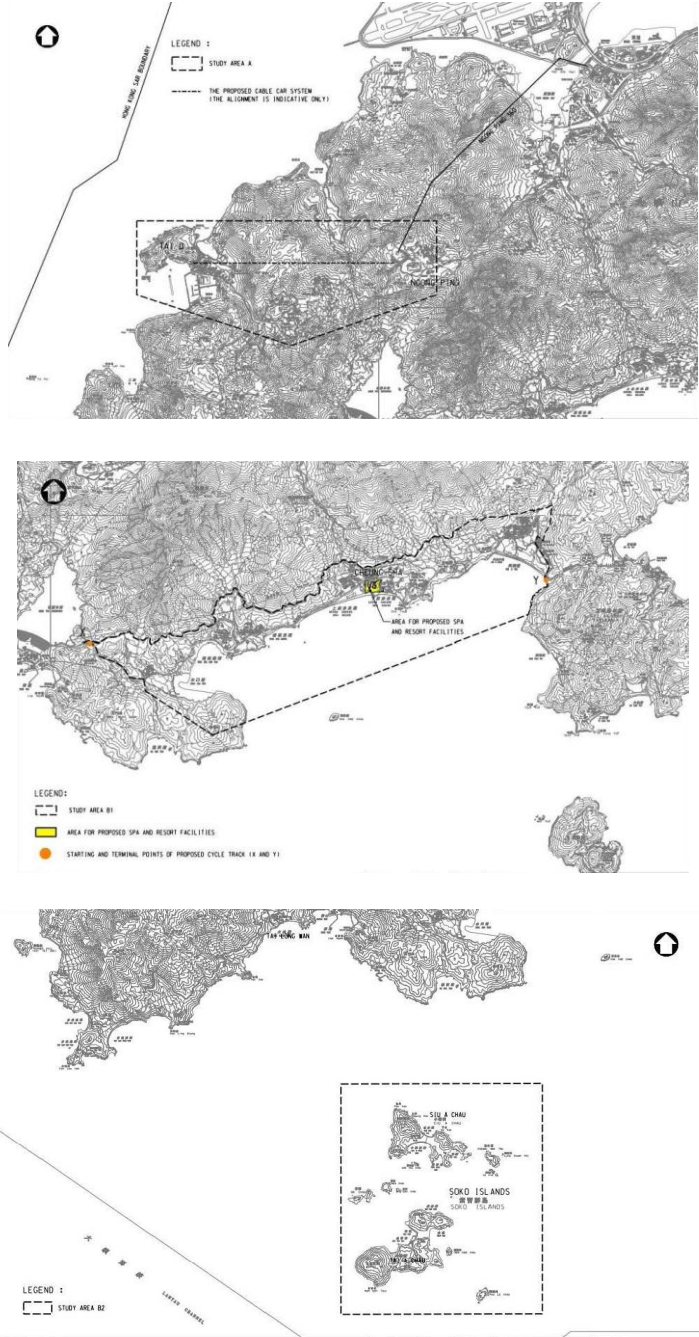
(7) 其他

| 工程編號<br>及<br>級別           | 工程名稱                                                  | 預計費用<br>(百萬元) | 決策科首長<br>及負責<br>部門/機構                        | 動工日期<br>(月/年) | 竣工日期<br>(月/年) | 工程內容／備註                                                                                                                                                                                                                              | 照片/圖則                                                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7100CX<br>7D67CL<br><br>D | 南丫島索罟灣前南<br>丫石礦場地區未來<br>土地用途發展規劃<br>及工程研究 - 可行<br>性研究 | 29.90         | 發展局局長<br><br>規劃署<br><br>及<br><br>土木工程<br>拓展署 | 01/2012       | 11/2016       | <p>研究內容包制訂南丫島索罟灣前南丫石礦場不同的土地用途方案、進行規劃和工程研究及環境影響評估。</p> <p>就發展模式方面，政府正積極考慮利用私人發展商的開發能力，提供基建及配套設施。因此，政府將進行一項為期半年的研究:「南丫島索罟灣前南丫石礦場未來發展的市場意向調查及發展計劃邀請」。該市場意向調查主要內容包括探查建議發展大綱草圖及進行市場意向調查，以對發展模式提出建議。 待該市場意向調查完成後，預計規劃和工程研究於2016 年年底完成。</p> |  |

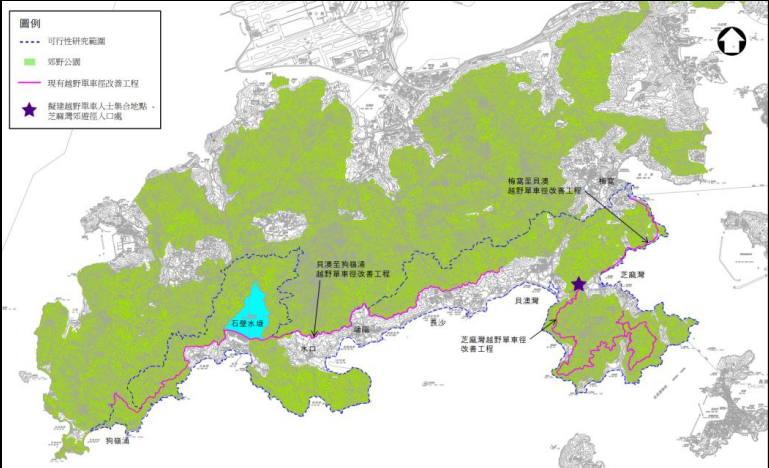
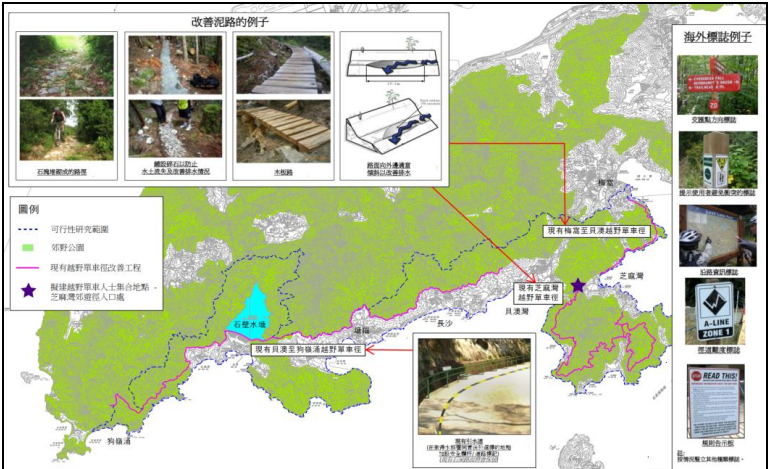
(7) 其他

| 工程編號及級別        | 工程名稱                     | 預計費用<br>(百萬元) | 決策科首長<br>及負責<br>部門/機構                        | 動工日期<br>(月/年) | 竣工日期<br>(月/年) | 工程內容／備註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 照片/圖則                                                                               |
|----------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 770CL<br><br>A | 港珠澳大橋香港口岸上蓋發展的規劃、工程及建築研究 | 60.08         | 發展局局長<br><br>規劃署<br><br>及<br><br>土木工程<br>拓展署 | 01/2015       | 02/2017       | <p>工程包括就港珠澳大橋香港口岸人工島的擬議商業及其他經濟活動的發展進行規劃、工程及建築研究， 以及相關的工地勘測。</p> <p>港珠澳大橋香港口岸上蓋發展的規劃、工程及建築研究已於 2015 年 1 月展開，並預計於 2017 年 2 月完成。</p> <p>為諮詢公眾對上蓋發展的初步發展概念的意見，我們於 2015 年 9 月 7 日完成了為期兩個月的第一階段社區參與活動。公眾普遍沒有就初步發展概念提出反對意見，但有意見要求加強東涌、香港口岸人工島及機場島的交通連接，尤其是香港口岸上蓋發展及機場島北商業區之間的接駁。</p> <p>我們現正就擬議發展方案進行財務及技術可行性評估，包括對環境及交通的影響等。</p> |  |

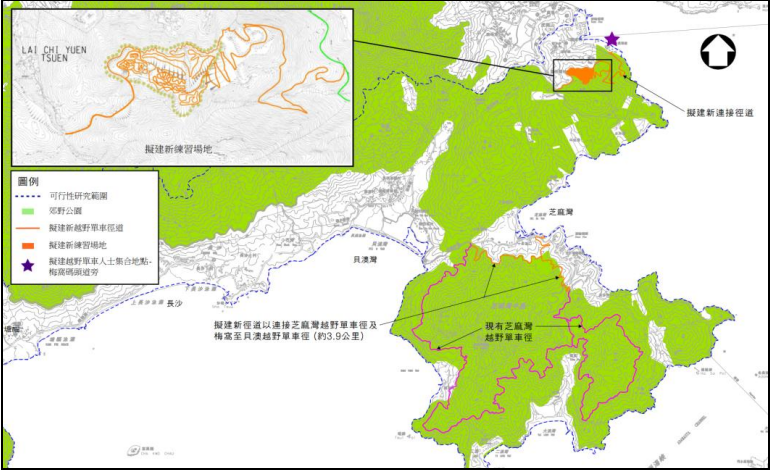
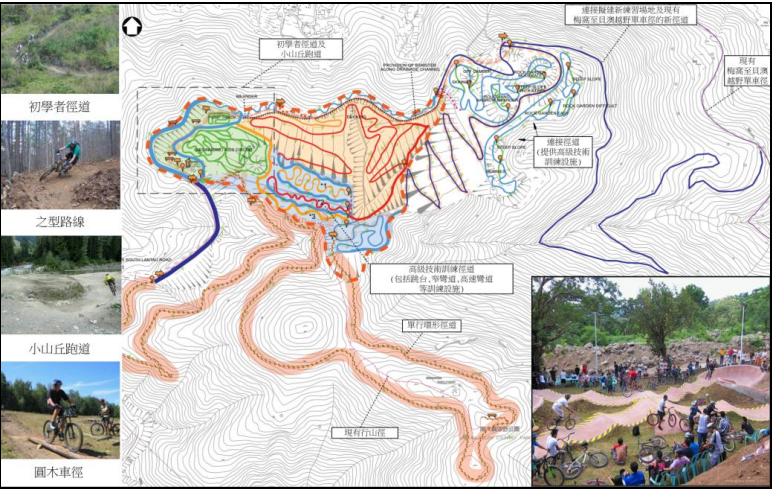
(7) 其他

| 工程編號及級別                   | 工程名稱                                                          | 預計費用<br>(百萬元) | 決策科首長<br>及負責<br>部門/機構         | 動工日期<br>(月/年) | 竣工日期<br>(月/年) | 工程內容／備註                                                                         | 照片/圖則                                                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7E38RG<br>7E34RG<br><br>D | 由昂坪延伸至大澳的<br>纜車系統及長沙與索<br>罟群島的水療度假村<br>發展的初步可行性研<br>究 - 可行性研究 | 18.0          | 發展局局長<br><br>及<br>土木工程<br>拓展署 | 07/2015       | 07/2016       | 初步可行性研究內容包括探討昂坪至大澳的纜車系統及長沙與索罟群島的水療度假村發展在技術、法規以及成本效益等方面的初步可行性。預料研究於 2016 年第三季完成。 |  |

(7) 其他

| 工程編號及級別 | 工程名稱            | 預計費用(百萬元) | 決策科首長及負責部門/機構        | 動工日期(月/年) | 竣工日期(月/年) | 工程內容／備註                                                                                                                                                                                             | 照片/圖則                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5G97RSD | 南大嶼山越野單車徑網絡改善工程 | 11.90     | 發展局局長<br><br>土木工程拓展署 | 11/2015   | 02/2017   | <p>工程主要為現有越野單車徑的改善工程，包括以下項目：</p> <p>1. 改善現有梅窩至貝澳越野單車徑、芝麻灣越野單車徑和貝澳至狗嶺涌越野單車徑部份路段，使其更安全及適合騎車行走，並防止水土流失</p> <p>2. 在芝麻灣越野單車徑西面起點設置越野單車人士集合地點，提供配套設施如資訊/教育服務站</p> <p>工程預計將於 2015 年年底動工，並於 2016 年年底完成。</p> |   |

(7) 其他

| 工程編號及級別     | 工程名稱                    | 預計費用<br>(百萬元) | 決策科首長<br>及負責<br>部門/機構    | 動工日期<br>(月/年) | 竣工日期<br>(月/年) | 工程內容／備註                                                                                                                                                                                                                                                                        | 照片／圖則                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5290RS<br>B | 南大嶼山(梅窩及芝麻灣)越野單車徑網絡擴建工程 | 41.63         | 發展局局長<br><br>土木工程<br>拓展署 | 03/2016       | 07/2018       | <p>工程主要為南大嶼山新增的越野單車徑道和訓練設施，包括以下項目：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>在荔枝園村附近的山頂上建設一個具各種不同技術水平徑道的訓練場</li><li>開闢連接現有芝麻灣徑道的東西兩端的新徑道，成為一個循環網絡</li><li>在梅窩至貝澳越野單車徑東面起點設置越野單車人士的集合地點，提供配套設施如資訊/教育服務站，並開闢一條連接訓練場及梅窩徑道起點的新徑道</li></ol> <p>工程預計將於 2016 年年底動工，並於 2017 年年底完成。</p> |   |
