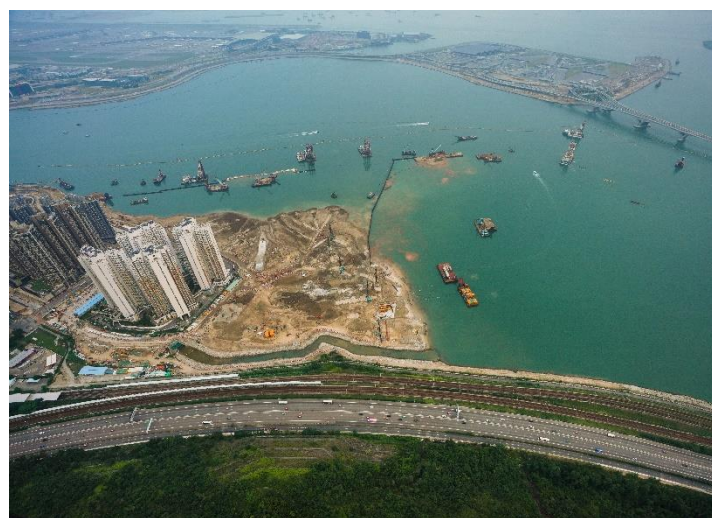


離島區議會
文件 IDC 45/2020 號
離島區主要工程項目進度報告



土木工程拓展署
可持續大嶼辦事處
二零二零年四月

離島區主要工程項目進度報告（截至二零一九年十二月三十一日止）

目錄

頁數

(1) 主旨	2
(2) 社區設施項目	3
(3) 港口及填海工程項目	9
(4) 道路工程項目	12
(5) 渠務工程項目	17
(6) 水務工程項目	25
(7) 其他	26
(8) 附錄 – 離島區主要工程位置圖	

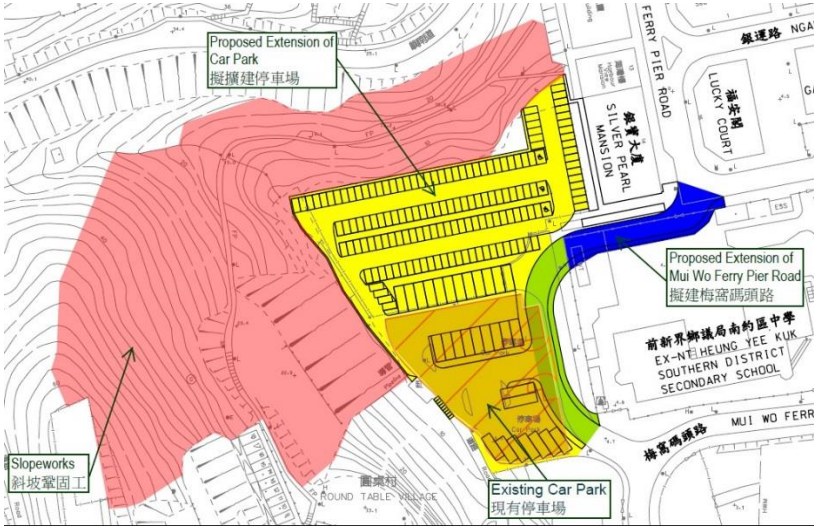
(1) 主旨

(i) 報告中所載的工程項目資料是由不同政府部門提供，資料截至二零一九年十二月三十一日。

(ii) 所載的工程項目包括

- 在二零一九年一月一日至二零一九年底期間內完成的項目；
- 現在尚進行中的項目；及
- 預計在二零二零年或以後動工的項目。

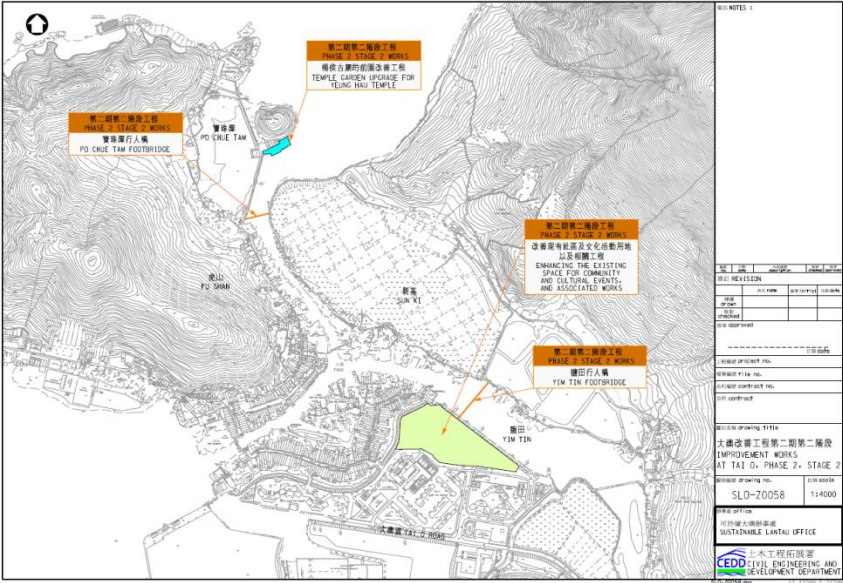
(2) 社區設施項目

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首 長及負責 部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容／備註	照片／圖則
464RO A	梅窩改善工程 – 第二期第一階段	72.3	發展局局 長 土木工程 拓展署	07/2016	03/2019	我們在 2016 年 6 月把 414RO 號工程計劃的一部份，梅窩改善工程第二期第一階段，提升為甲級，範圍包括: (1) 重整一段梅窩碼頭路及擴建現有停車場；以及 (2) 附屬工程，包括岩土，園境，排水及公共設施工程 工程已於2019年3月完成，停車場並已於2019年4月開放給公眾使用。	 

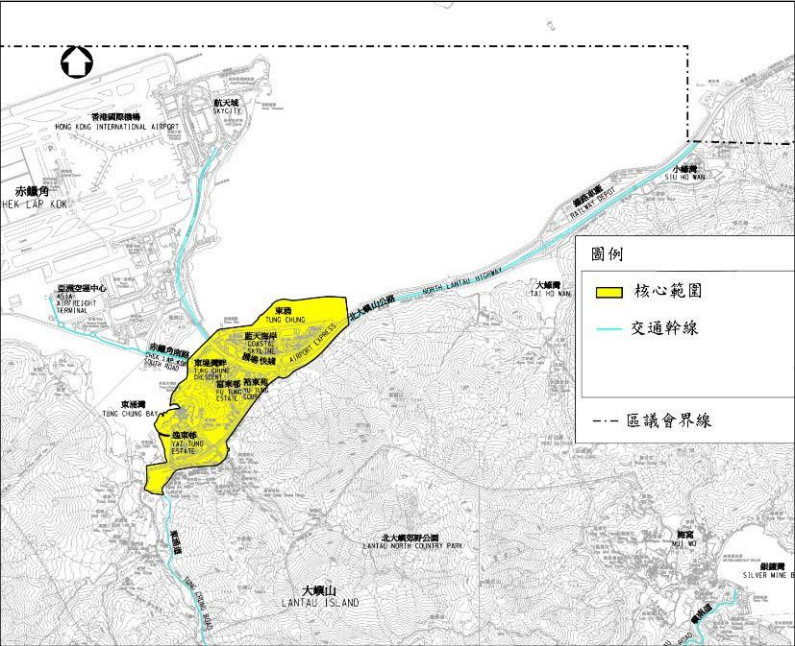
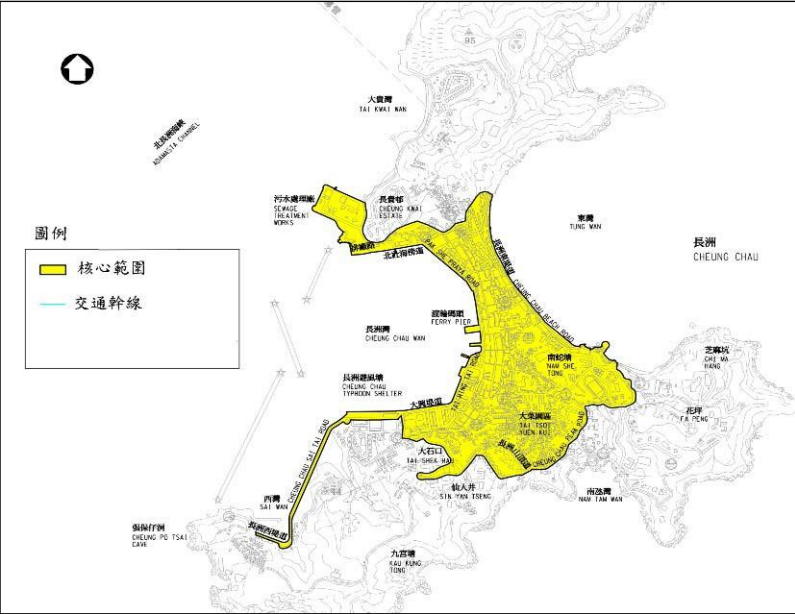
(2) 社區設施項目

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容／備註	照片／圖則
414RO B	梅窩改善工程 - 餘下工程	檢討中	發展局局長 土木工程拓展署	檢討中	檢討中	此工程計劃包括梅窩改善工程第二期第二階段及第三期工程，包括重置梅窩熟食中心、美化南面海濱長廊及碼頭廣場;及改善現有單車徑。 根據2017年3月所舉行之公眾參與活動所收集的意見，工程佈局重新檢視的工作將完成。預計將於稍後時間先諮詢梅窩鄉事委員會及當區區議員，然後將再次舉行公眾參與活動進行諮詢。工程的動工及竣工日期在檢討中。	

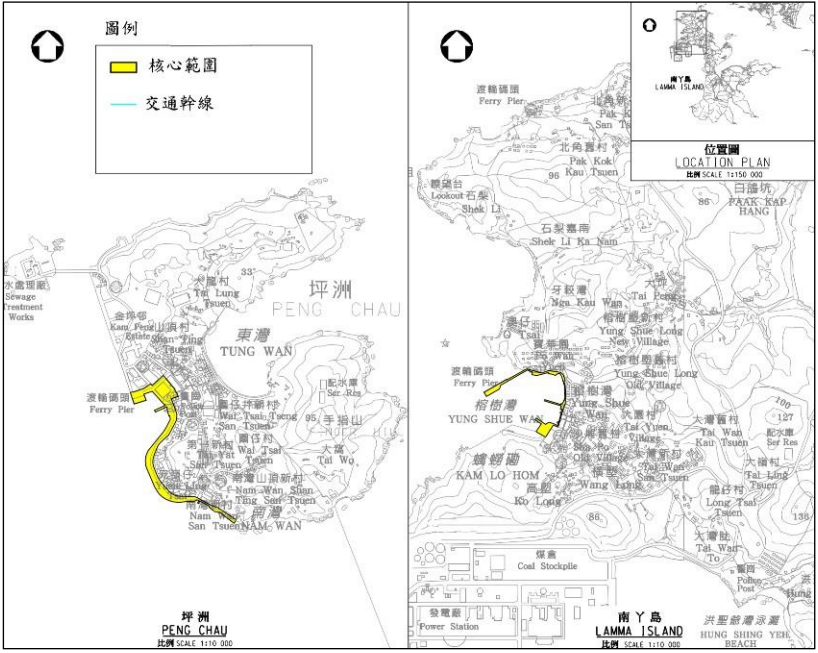
(2) 社區設施項目

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長 及負責 部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容／備註	照片/圖則
469RO A	大澳改善工程 (第二期第一階段)	124.0	發展局局長 土木工程 拓展署	09/2016	10/2019	工程計劃旨在落實大澳改善工程的餘下階段，包括第二期第一階段、第二期第二段和餘下工程。 大澳改善工程第二期第一階段包括興建公眾休憩用地、公共交通總站、公眾停車場、上落客貨區、單車停放處及附屬工程，旨在改善大澳交通及行人流通情況，以及增加泊車位。第二期第一階段工程已於 2016 年 9 月開展，並於 2019 年10月大致完成。	 大澳改善工程(第二期第一階段) - 平面圖 IMPROVEMENT WORKS AT TAI O - PHASE 2, STAGE 1 - GENERAL LAYOUT PLAN 大澳改善工程第二期第一階段
417RO B	大澳改善工程 (第二期第二階段和餘下工程)	檢討中	發展局局長 土木工程 拓展署	檢討中	檢討中	大澳改善工程第二期第二階段工程計劃主要包括兩條擬議行人橋，以改善區內連通，我們已聘請顧問公司進行詳細設計，第二期第二階段工程現正在設計中。大澳改善工程餘下工程計劃主要包括改善區內設施，以幫助保存大澳文化遺產及方便遊人欣賞大澳自然風貌，工程範圍正在檢討中。	 大澳改善工程第二期第二階段

(2) 社區設施項目

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長 及負責 部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容／備註	照片/圖則
5101CX 5G66CG D	新界西南綠化總綱圖-顧問研究和工地勘測	18.1 (費用包括離島、荃灣及葵青區)	發展局局長 土木工程 拓展署	2012 (研究) 2015 (詳細設計)	2015 (研究) 2017 (詳細設計)	工程項目包括制定新界西南區(包括離島、荃灣及葵青區)的綠化總綱圖、就綠化措施擬備詳細設計及進行所需的工地勘測。 有關的綠化總綱圖草擬本已於2013 年 9 月 30 日提交至離島區議會旅遊漁農及環境衛生委員會作諮詢，並得到委員會支持推行綠化總綱圖工程。 土木工程拓展署於2019年3月以傳閱文件方式向離島區議會簡介最新擬議綠化措施及推展時間表,並於2019年6月25日向立法會發展事務委員會作簡介。土木工程拓展署亦已為項目展開撥款程序，如有關工程項目的撥款申請在2020年年中獲得批准，預計2020年第三季開展工程。	 東涌綠化總綱圖核心範圍  長洲綠化總綱圖核心範圍

(2) 社區設施項目

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長 及負責 部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容／備註	照片/圖則
							 坪洲及南丫島綠化總綱圖核心範圍

(2) 社區設施項目

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長 及負責 部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容／備註	照片/圖則
111ET A	東涌第108區1所為輕度、中度及嚴重智障兒童而設的特殊學校	334.7	教育局/ 建築署	06/2017	09/2019	工程項目包括在東涌第108區興建一所為輕度、中度及嚴重智障兒童而設的設有十八間課室、六十個宿位宿舍及相關附屬設施的特殊學校。 工程已於2017年6月開展並於2019年9月完成。	
7E91RG D	馬灣涌小型改善工程	0.5	土木工程拓展署	02/2018	01/2020	於馬灣涌村內進行小型改善工程，包括美化現有東涌碼頭、美化及更新現有鄉村地圖、美化行人天橋、提供尋路指示設施，以及美化現有建築物外牆。	

(3) 港口及填海工程項目

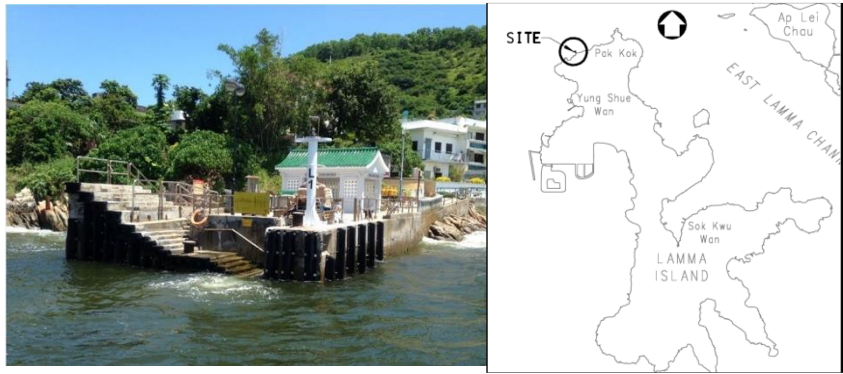
工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長 及負責 部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容／備註	照片／圖則
799CL A	東涌新市鎮擴展- 詳細設計及土地勘测	729.5	發展局局長 土木工程 拓展署	06/2016	03/2024	擬議東涌新市鎮擴展計劃將涵蓋現有東涌新市鎮東西兩面的範圍。東涌新市鎮擴展計劃將會提供約49,600個住宅單位，容納約145,500人口。工程編號799CL之詳細設計項目竣工日期變更原因為土地徵收及清拆所需時間比預期為長。東涌新市鎮擴展之整體發展計劃將不受影響。 填海及前期工程已於2017年12月展開，並於2020年3月移交第一幅土地予房屋署作公營房屋發展。 土地平整及基建工程的詳細設計正在進行中。	 東涌東 Tung Chung East
814CL A	東涌新市鎮擴展- 填海及前期程	20,210.0		12/2017	12/2023		
786CL B	東涌新市鎮擴展 - 土地平整及基建工程	檢討中		檢討中	檢討中		

東涌東擴展區



東涌西擴展區

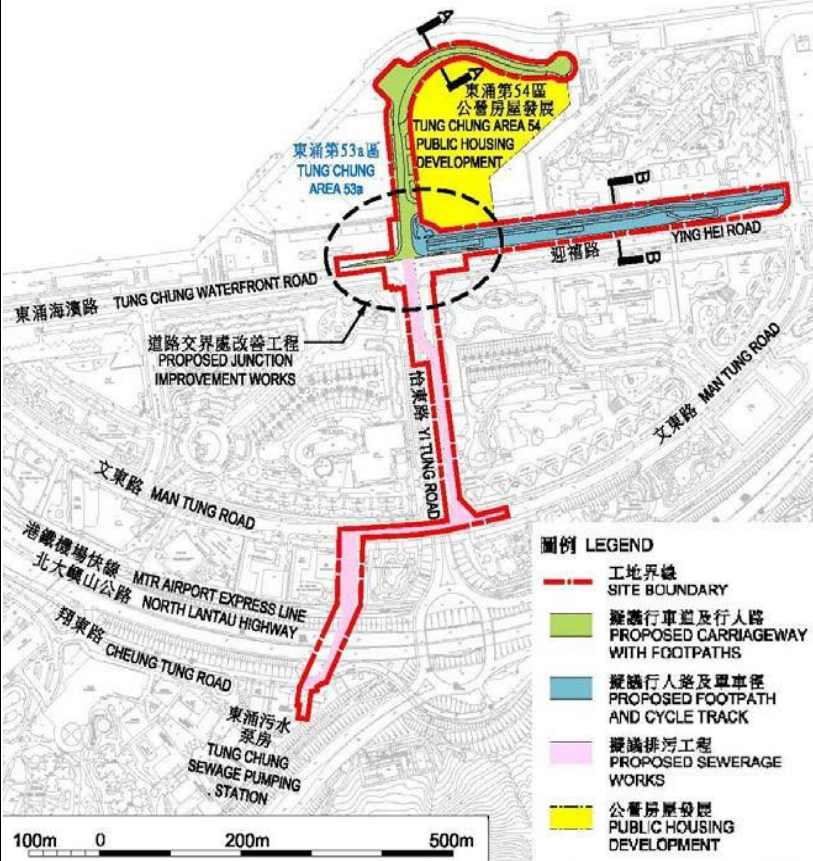
(3) 港口及填海工程項目

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長 及負責 部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容／備註	照片/圖則
5101CX D	榕樹灣、石仔灣、二澳及馬灣涌碼頭改善工程研究 - 勘查研究	9.2	發展局局長 土木工程拓展署	11/2017	2020年 上半年	研究範圍包括： (i) 評估潛在的環境影響，包括生態和漁業影響，並開展初步的環境研究； (ii) 初步工程研究包括水力研究和岩土評估，以及預備初步工程簡圖； (iii) 工地勘探和相關工程監督工作；及 (iv) 諮詢相關持份者。 <u>現況</u> 於2019年7月22日諮詢離島區議會的交通及運輸委員會。有關研究即將完成。	
5051TF A	重建南丫島北角碼頭	72.4	運輸及房屋局局長 土木工程拓展署	04/2020	2022年 下半年	工程計劃旨在重建南丫島北角碼頭。 工程已於2020年2月28日獲得立法會財務委員會撥款批准。工程將於2020年4月動工。	

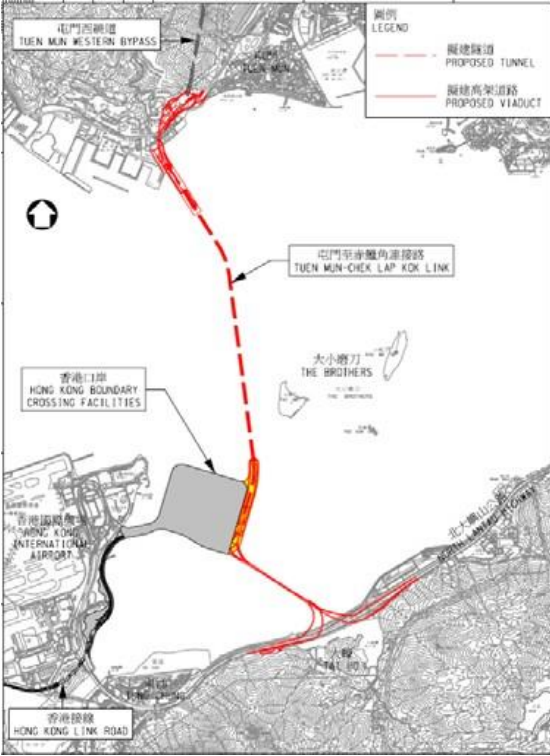
(3) 港口及填海工程項目

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容／備註	照片/圖則
5768CL B	中部水域人工島相關研究	檢討中	發展局局長 土木工程拓展署	2020年 第四季 (如撥款申請獲批准)	2024年 第二季 (如撥款申請獲批准)	研究範圍包括: (a) 為鄰近交椅洲的人工島進行詳細的規劃及工程研究; (b) 進行運輸基礎設施研究; (c) 在鄰近喜靈洲和長洲南可能劃作人工島的範圍及附近水域收集資料，作為長遠規劃參考；以及 (d) 進行相關的工地勘測工程及監管工作。 現時，土木工程拓展署正尋求立法會財務委員會的撥款批准。在取得撥款批准後，土木工程拓展署會展開研究。	圖例：概念性位置 LEGEND: CONCEPTUAL LOCATION - 擬議交椅洲人工島 PROPOSED KAU YI CHAU ARTIFICIAL ISLANDS - 可能的喜靈洲人工島 POSSIBLE MEI LING CHAU ARTIFICIAL ISLANDS - 可能的長洲南人工島 POSSIBLE CHEUNG CHAU SOUTH ARTIFICIAL ISLANDS - 優先鐵路連接 PRIORITY RAIL LINK - 優先道路連接 PRIORITY ROAD LINK - 可能的較遠期鐵路連接 POSSIBLE RAIL LINK IN LONGER TERM - 可能的較遠期道路連接 POSSIBLE ROAD LINK IN LONGER TERM - 研究中的十一號幹線 [870TH - 十一號幹線(北大嶼山至元朗)的可行性研究] ROUTE 11 BEING STUDIED UNDER ROUTE 11 FEASIBILITY STUDY ON ROUTE 11 (BETWEEN NORTH LANTAU AND YUEN LONG) 大嶼山 LANTAU ISLAND 九龍 KOWLOON 香港島 HONG KONG ISLAND 東涌 Wai Tung 喜靈洲 Mei Ling Chau 交椅洲 Kau Yi Chau 長洲 Cheung Chau 北大嶼山 North Lantau 西貢灣 West Lantau Channel 東貢灣 East Lantau Channel 南島 Lamma Island

(4) 道路工程項目

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長 及負責 部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容／備註	照片／圖則
781CL A	東涌第 54 區房屋發 展的基礎設施工程	284.8	運輸及 房屋局局長 土木工程 拓展署	11/2017	12/2020	工程旨在配合東涌第54地區公營房屋的發展，為其提供相關的基礎設施，包括建造新行車路、行人路、單車徑及單車停放處、美化市容地帶、巴士停車處和排污設施。 工程已在2017年11月展開，並分兩階段完成。其中在迎禧路以北的擬建行人路、單車徑、單車停放處及巴士停車處，已於2019年7月大致完成。餘下工程包括擬建新行車路和排污設施，亦預計於2020年年底完成。	

(4) 道路工程項目

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長 及負責 部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容／備註	照片／圖則
857TH A	屯門至赤鱗角連接路 - 建造工程	44,798.4	運輸及 房屋局局長 路政署	06/2013	屯門至赤鱗 角連接路南 面連接路已 於2018年10 月通車，而 屯門至赤鱗 角連接路北 面連接路預 計最快於 2020年年底 完成	工程計劃包括興建一條位於港珠澳大橋香港口岸與北大嶼山之間的雙線雙程高架道路(南面連接路)；一條雙線雙程行車的海底隧道，以連接屯門第40區及港珠澳大橋香港口岸(北面連接路)；並建造相關構築物；及進行有關的附屬工程。 屯門至赤鱗角連接路北面連接路預計最快於2020年年底完成，但由於近月發生多項不能預見的情況，包括新型冠狀病毒感染疫情，影響了建築材料及裝置的供應，亦曾令工人數目減少。路政署會緊密監察有關工程進度，並持續評估疫情對整體工程的影響。	 The map illustrates the proposed infrastructure for the Tuen Mun to Chek Lap Kok Link. It shows the 'Tuen Mun Western Bypass' at the top left, the 'Tuen Mun to Chek Lap Kok Link' route running vertically through the center, and the 'Hong Kong Link Road' at the bottom left. A legend in the top right corner identifies the 'Proposed Tunnel' (indicated by a dashed red line) and the 'Proposed Viaduct' (indicated by a solid red line). Other geographical features labeled include 'The Brothers' and 'Hong Kong Boundary Crossing Facilities'. The map also shows the proximity to 'Hong Kong International Airport'.

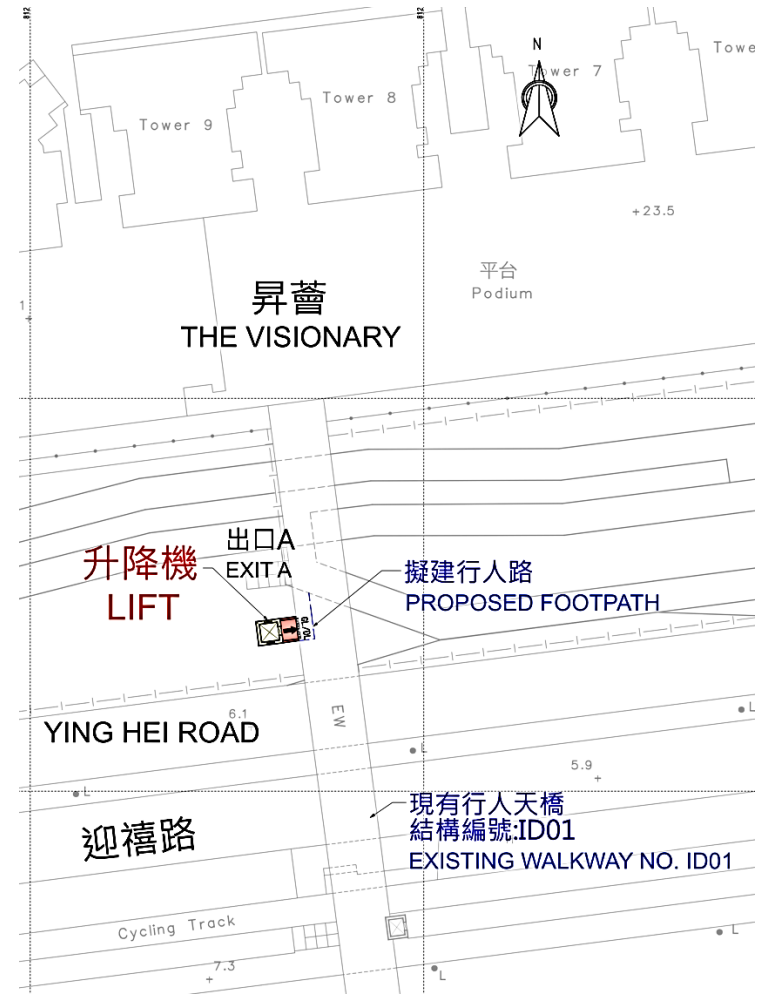
(4) 道路工程項目

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首 長及負責 部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容／備註	照片/圖則
6850TH B	新橫塘河橋	檢討中	運輸及 房屋局局 長 路政署	檢討中	檢討中	工程計劃主要是在梅窩橫塘河興建長約35米的雙橋，包括一條淨闊2米的行人路和一條淨闊3.5米的單車橋，並拆卸現有橫塘河橋。 路政署在2019年12月20日就擬議工程計劃諮詢立法會交通事務委員會，委員普遍支持擬議工程計劃。路政署將盡快諮詢立法會財務委員會（下稱「財委會」）轄下的工務小組委員會，及尋求財委會的撥款批准，以期展開建造工程。	

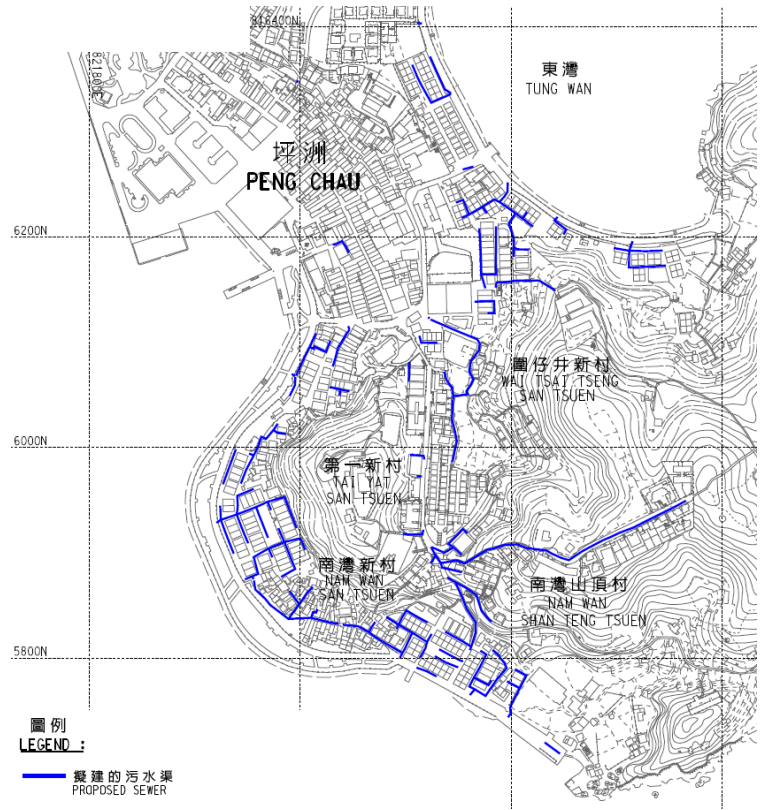
(4) 道路工程項目

工程編號及級別	工程名稱	預計費用（百萬元）	決策科首長及負責部門/機構	動工日期（月/年）	竣工日期（月/年）	工程內容／備註	照片/圖則																
6101TX D	在公共行人天橋、高架行人道及行人隧道加建暢道通行設施第二組－ 勘查研究、設計及建造	118.0	運輸及房屋局局長 路政署	11/2015	01/2020	工程主要為離島區下列 三條公共行人天橋/隧道加建升降機設施: 1) 橫跨裕東路及松仁路的行人天橋（結構編號：NF328）； 2) 橫跨裕東路近東涌下嶺皮的行人天橋（結構編號：NF332）； 3) 橫跨順東路近大嶼山北區警署的行人隧道（結構編號：NS230）。 上述工程項目已於 2015 年 11 月開展，目前工程進度如下: <table><tr><th>結構編號</th><th>加建升降機數目</th><th>完工日期</th><th>目前工程進度</th></tr><tr><td>NF328</td><td>3</td><td>2020年1月 (實際)</td><td>一號升降機：已於2019年7月開放予公眾使用。 二號升降機：已於2018年11月開放予公眾使用。 三號升降機：已於2020年1月開放予公眾使用。</td></tr><tr><td>NF332</td><td>2</td><td>2018年8月 (實際))</td><td>一號升降機：已於2018年8月開放予公眾使用。 二號升降機：已於2018年8月開放予公眾使用。</td></tr><tr><td>NS230</td><td>2</td><td>2019年10月 (實際)</td><td>一號升降機：已於2018年10月開放予公眾使用。 二號升降機：已於2019年10月開放予公眾使用。</td></tr></table>	結構編號	加建升降機數目	完工日期	目前工程進度	NF328	3	2020年1月 (實際)	一號升降機 ：已於2019年7月開放予公眾使用。 二號升降機 ：已於2018年11月開放予公眾使用。 三號升降機 ：已於2020年1月開放予公眾使用。	NF332	2	2018年8月 (實際))	一號升降機 ：已於2018年8月開放予公眾使用。 二號升降機 ：已於2018年8月開放予公眾使用。	NS230	2	2019年10月 (實際)	一號升降機 ：已於2018年10月開放予公眾使用。 二號升降機 ：已於2019年10月開放予公眾使用。	
結構編號	加建升降機數目	完工日期	目前工程進度																				
NF328	3	2020年1月 (實際)	一號升降機 ：已於2019年7月開放予公眾使用。 二號升降機 ：已於2018年11月開放予公眾使用。 三號升降機 ：已於2020年1月開放予公眾使用。																				
NF332	2	2018年8月 (實際))	一號升降機 ：已於2018年8月開放予公眾使用。 二號升降機 ：已於2018年8月開放予公眾使用。																				
NS230	2	2019年10月 (實際)	一號升降機 ：已於2018年10月開放予公眾使用。 二號升降機 ：已於2019年10月開放予公眾使用。																				

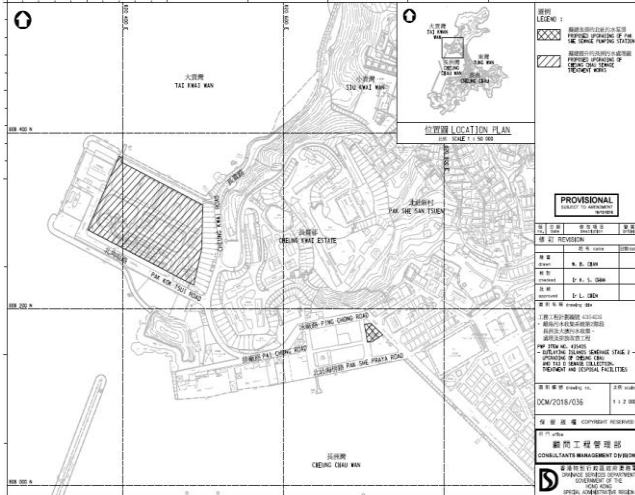
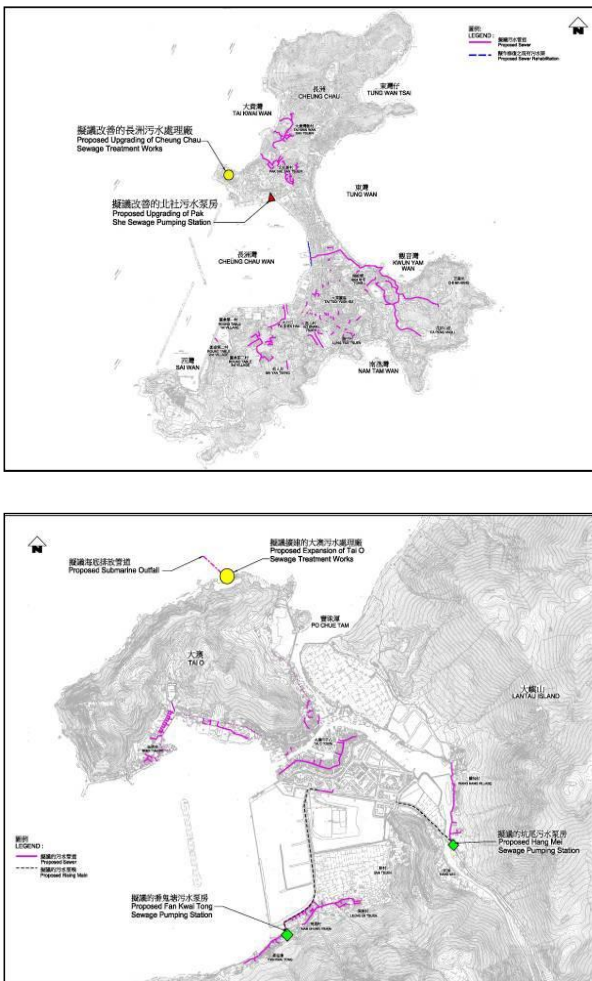
(4) 道路工程項目

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容／備註	照片/圖則
6101TX D	在行人天橋、高架行人道及行人隧道加建人人暢道通行設施 第三組 – 勘查研究、設計及建造	檢討中	運輸及房屋局局長 路政署	2020年 第二季 (預計)	2022年 第四季 (預計)	工程主要為「人人暢道通行」計劃「第二階段計劃」中橫跨迎禧路近昇薈和映灣園的行人天橋（結構編號:ID01）加建升降機。 上述工程項目已於 2019 年 12 月13日展開招標程序。	

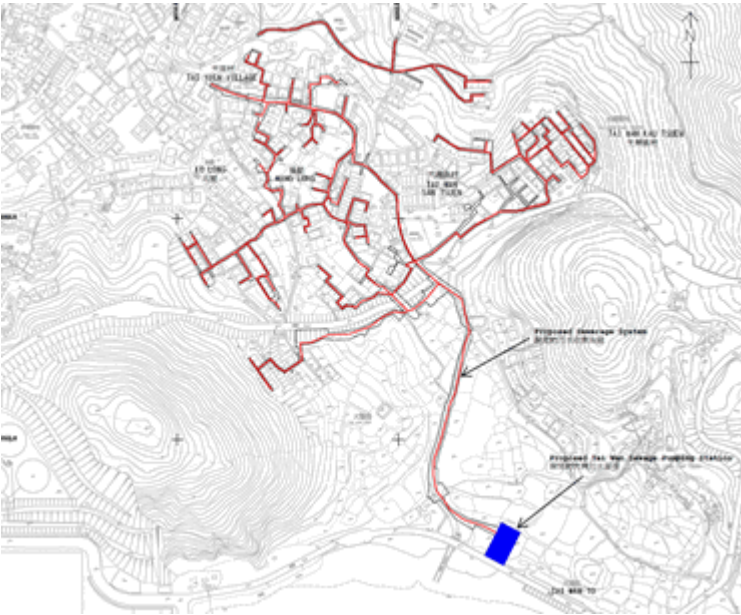
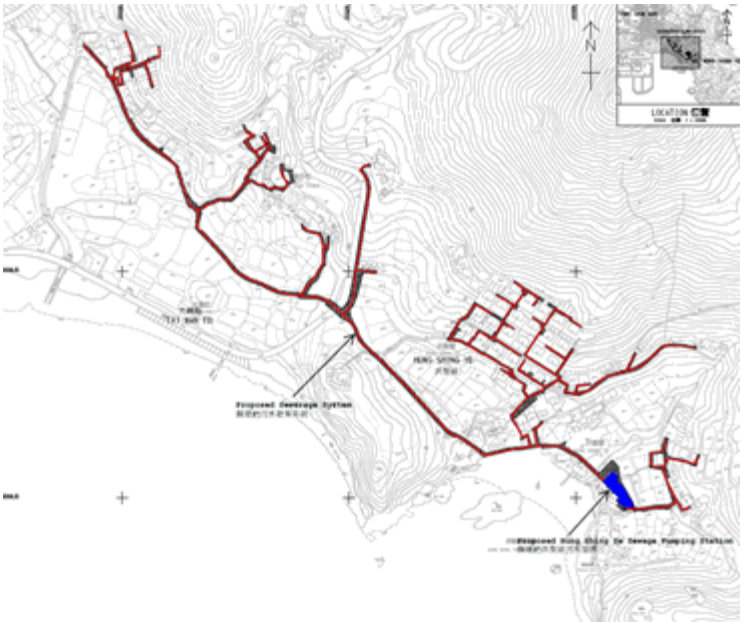
(5) 渠務工程項目

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長 及負責 部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容／備註	照片／圖則
422DS A (之前為 343DS-1)	離島污水收集系統 第2階段－坪洲鄉 村污水收集系統第2 期第1部分工程	133.7	環境局局長 渠務署	2018 年 第四季	2022 年 第四季	工程計劃旨在為坪洲未有污水設施的鄉村提供公共污水收集系統，以改善坪洲的水質和在六個未接駁污水渠地區（即南灣新村、第一新村(部分)、圍仔井新村、坪洲(中)、南灣山頂村及東灣村(部分)）的衛生情況。 工程已於 2018年 11 月動工。	

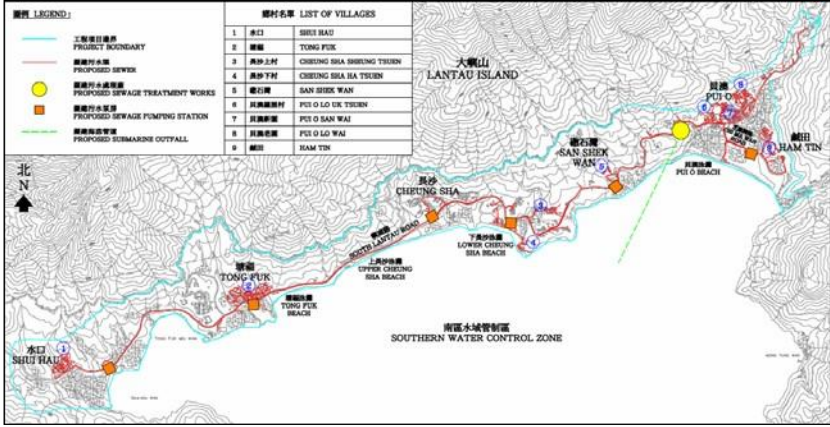
(5) 渠務工程項目

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容／備註	照片／圖則
354DS-1 B	離島污水收集系統第2階段－長洲污水處理及排放改善工程	檢討中	環境局局長 渠務署	2020 年 第三季	2026 年 第一季	工程主要改善現有長洲污水處理廠的設施以及北社污水泵房。 工程在詳細設計階段。	
354DS-2 B	離島污水收集系統第2階段－大澳污水處理和排放、及長洲及大澳污水收集改善工程	檢討中	環境局局長 渠務署	2022 年 第四季	2027 年 第三季	工程主要為長洲及大澳鄉村未有污水收集系統的地區敷設污水渠，及改善現有大澳污水處理廠的設施。 工程在詳細設計階段。	

(5) 渠務工程項目

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長 及負責 部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容／備註	照片/圖則
355DS B	離島污水收集系統 第2階段－南丫鄉 村污水收集系統第2 期第2部分工程	檢討中	環境局局長 渠務署	2021 年 第二季	2026 年 第一季	工程主要為榕樹灣七個未敷設污水收集設施的地區(大園村(部分)、高塢(部分)、橫塢、大灣新村、大灣舊村、龍仔村及洪聖爺)敷設污水渠及建造兩座污水泵房。 工程已於2019年9月27日刊憲，於法定兩個月反對期限內收到一些書面反對，對這工程的建議污水渠路線和涉及的土地收回範圍提出意見。因應擬議工程的修訂工作及所需刊憲，預計這工程最快可於2021年第2季展開。	 

(5) 渠務工程項目

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容／備註	照片/圖則
331DS-1 B	礮石灣污水處理廠和相關海底排放管及貝澳污水收集系統建造工程	檢討中	環境局局長 渠務署	2020 年 第四季	2026 年 第三季	工程主要為南大嶼山地區建造公共污水收集系統。工程包括於礮石灣建造一所二級污水處理廠和相關的海底排放管、建造貝澳至長沙的污水主幹渠、於貝澳羅屋建造鄉村污水收集系統及於貝澳建造一所污水泵房。 工程在詳細設計階段。	
331DS-2 B	離島污水收集系統第2階段 - 南大嶼山污水收集系統工程(餘下工程)	檢討中	環境局局長 渠務署	2021 年 第四季	2027 年 第一季	工程主要為南大嶼山地區建造公共污水收集系統。工程包括於水口、塘福、長沙、礮石灣、貝澳及鹹田建造主幹渠及鄉村污水收集系統。 工程在詳細設計階段。	

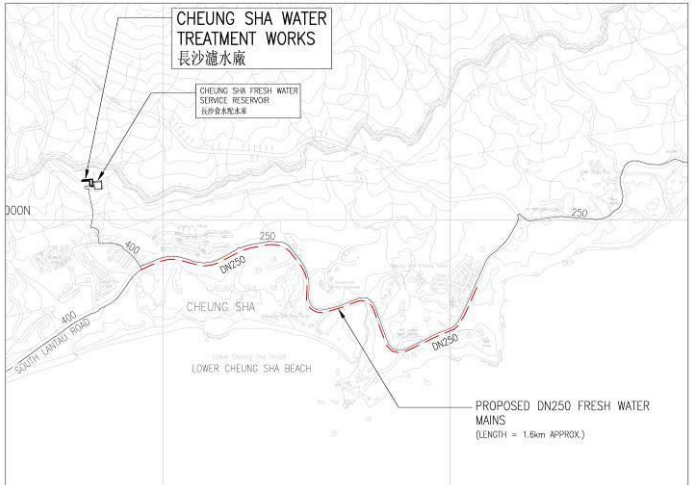
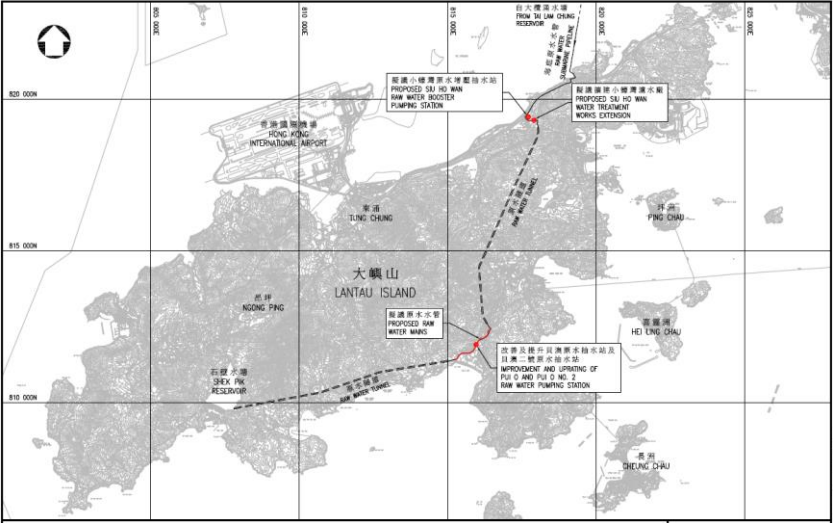
(5) 渠務工程項目

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容／備註	照片/圖則
426DS A 及 180CD A	地下污水渠修復工程第1階段 地下雨水渠修復工程第1階段	514.7 (7.0 離島區)	環境局局長 渠務署 發展局局長 渠務署	01/2019	2022年 第四季	第一階段工程包括為全港約110公里的地下渠管進行勘測及修復約18公里的地下渠管。當中，會為離島區內共約700米長的地下污水渠及雨水渠進行勘測和修復共約400米長的地下污水渠及雨水渠。工程項目426DS及180CD已於2019年1月展開，預計工程將於2022年第四季完成。	
356WF A	東涌食水供應系統提升工程	300.2	發展局局長 水務署	12/2017	2020 年 第四季	工程項目包括建造東涌二號食水配水庫(存水量約 40000 立方米)以及接駁擬議東涌二號食水配水庫至現有食水分配網絡。 前期工程已於2017年12月開難展，而工程合約編號 4/WSD/17 工程已於2018 年2月開展並預計於2020 年竣工。	

(5) 渠務工程項目

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長 及負責 部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容／備註	照片/圖則
415DS B	長洲發展計劃 - 長洲舊墟現有道路及渠道改善工程餘下部分	檢討中	環境局局長 渠務署	2022 年 第四季	2026 年 第三季	工程主要為長洲舊墟四個未敷設污水渠的村落，即龍仔村、高山村、大菜園區及北社新村敷設污水渠	

(6) 水務工程項目

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長 及負責 部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容／備註	照片／圖則
9100WX D	長沙濾水廠提升工程	檢討中	發展局局長 水務署	2020 年 第二季	2022 年 第一季	項目主要用作長沙濾水廠，由現在的日產量6,000 立方米提升至 7,500 立方米。工程將會包括在濾水廠撥地範圍內增建/改裝/翻新濾水裝置及附帶的土木、結構、土力及機電工程。另外，嶼南道將敷設一段長約 1.6 公里，直徑250 毫米的水管，以滿足消防用水流量要求。	
365WF B	小蠔灣濾水廠擴展工程	檢討中	發展局局長 水務署	2021 年 第三季	2025 年 第四季	工程項目包括將小蠔灣濾水廠的每日產水量由現時的15萬立方米提升至30萬立方米，並相應提升相關原水供應系統的輸水量。 工程項目的勘察研究和設計及相關的工地勘測工程已於 2018 年8月展開。	

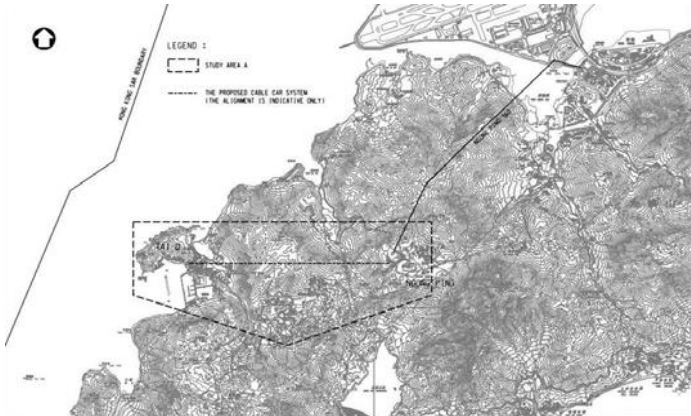
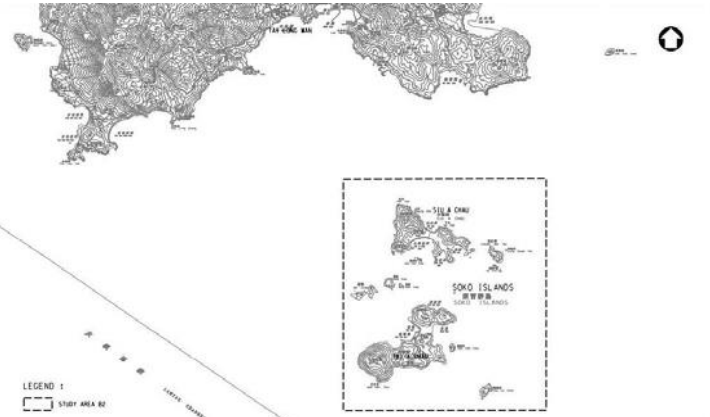
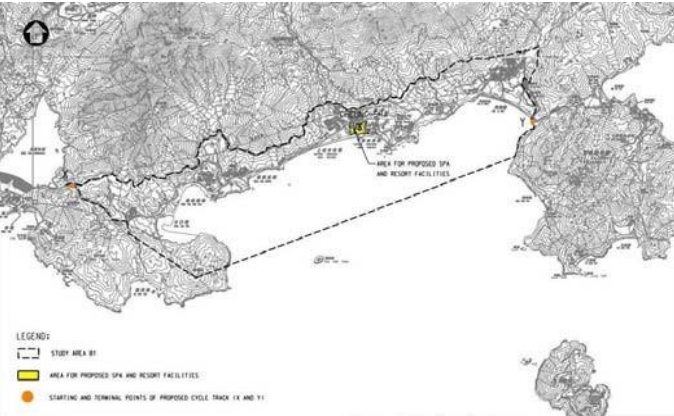
(7) 其他

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長 及負責 部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容／備註	照片/圖則
7100CX 7D67CL D	南丫島索罟灣前南 丫石礦場地區未來 土地用途發展規劃 及工程研究 - 可行 性研究	29.9	發展局局長 規劃署 及 土木工程 拓展署	01/2012	2020 年 年初	研究內容包制訂南丫島索罟灣前南丫石礦場不同的土地用途方案、進行規劃和工程研究及環境影響評估。 就發展模式方面，政府正積極考慮利用私人發展商的開發能力，提供基建及配套設施。政府已完成「南丫島索罟灣前南丫石礦場未來發展的市場意向調查及發展計劃邀請」(市場意向調查)。 因應市場意向調查所收到的意見、土地規劃建議、基礎設施及用地的發展模式、整項發展的成本效益，以及過往兩階段社區參與所收集的公眾意見，政府會通盤考慮前南丫石礦場的未來發展方向及跟進工作。	

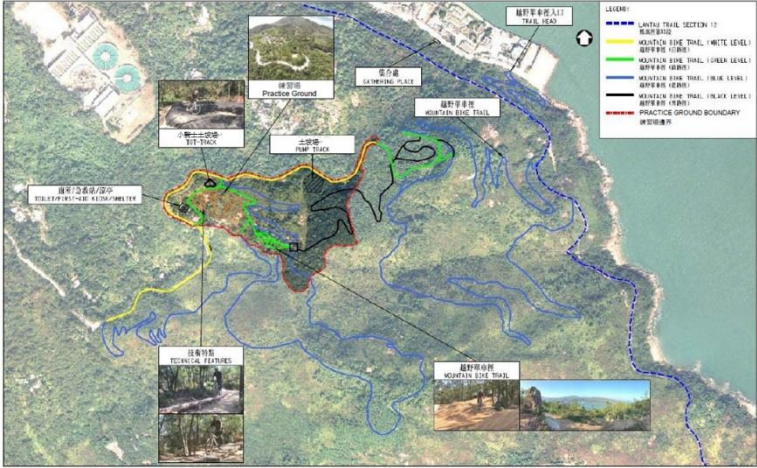
(7) 其他

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長 及負責 部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容／備註	照片／圖則
770CL A	港珠澳大橋香港口岸上蓋發展的規劃、工程及建築研究	63.4	發展局局長 規劃署 及 土木工程拓展署	01/2015	檢討中	工程包括就港珠澳大橋香港口岸人工島的擬議商業及其他經濟活動的發展進行規劃、工程及建築研究， 以及相關的工地勘測。 因應機場和周邊最新的規劃和發展，香港機場管理局（機管局）已接受政府的邀請，就香港口岸人工島上蓋發展提出建議。機管局現正就港珠澳大橋香港口岸人工島上蓋發展機場相關業務進行研究。待機管局提交發展方案之後，政府會詳細考慮有關建議，以制定香港口岸人工島上蓋發展的規劃和用途。	

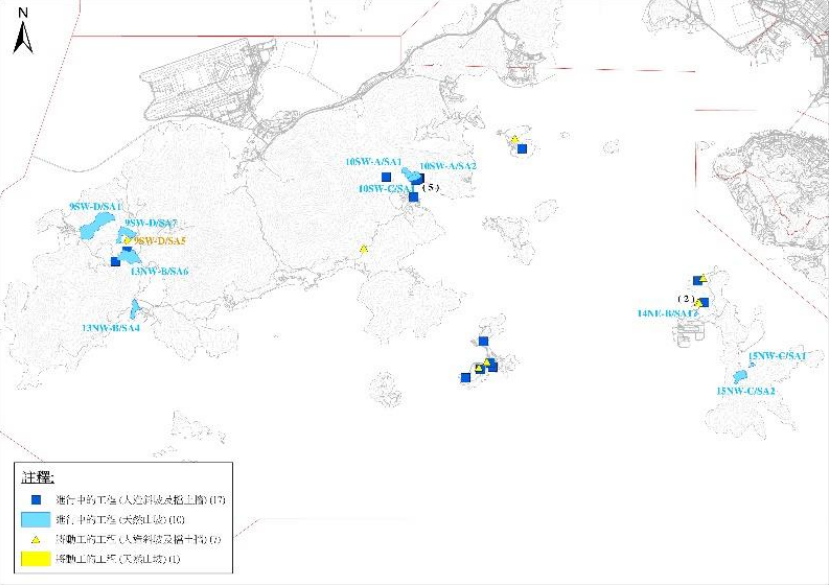
(7) 其他

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長 及負責 部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容／備註	照片/圖則
7E38RG 7E34RG D	由昂坪延伸至大澳的纜車系統及長沙與索罟群島的水療度假村發展的初步可行性研究 - 可行性研究	18.0	發展局局長 土木工程拓展署	07/2015	01/2019	初步可行性研究內容包括探討昂坪至大澳的纜車系統及長沙與索罟群島的水療度假村發展在技術、法規以及成本效益等方面的初步可行性。 研究已於2019年1月完成。研究結果指出，從技術角度來看，纜車系統和水療度假村發展是可行的。但考慮到其財務可行性和收到的公眾意見，現階段不會推展這兩項建議。	 昂坪延伸至大澳的纜車系統研究  索罟群島的水療度假村發展研究  長沙的水療度假村發展研究

(7) 其他

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容／備註	照片／圖則
5290RS A	南大嶼山(梅窩及芝麻灣)越野單車徑網絡擴建工程	41.6	發展局局長 土木工程拓展署	12/2016	2020 年下半年	工程主要為南大嶼山新增的越野單車徑道和練習設施，包括以下項目： (i) 在荔枝園村附近的山頂上建設一個具各種不同技術水平徑道的練習場和相關配套設施； (ii) 連接現有芝麻灣越野單車徑兩端，使之形成一個循環網絡的越野單車徑； (iii) 在梅窩碼頭路的梅窩越野單車徑入口處附近建造一個單車人士的集合地點； (iv) 建造由梅窩越野單車徑入口處至擬建越野單車練習場的越野單車徑；以及 (v) 相關的岩土、環境美化和附屬工程。 部份工程已於 2016 年年底展開。主體工程合約亦已於2017年11月展開，並預計於2020年下半年完成。	 南大嶼山(梅窩及芝麻灣)越野單車徑網絡擴建工程－位置圖  擬建在荔枝園村附近的山頂上的練習場

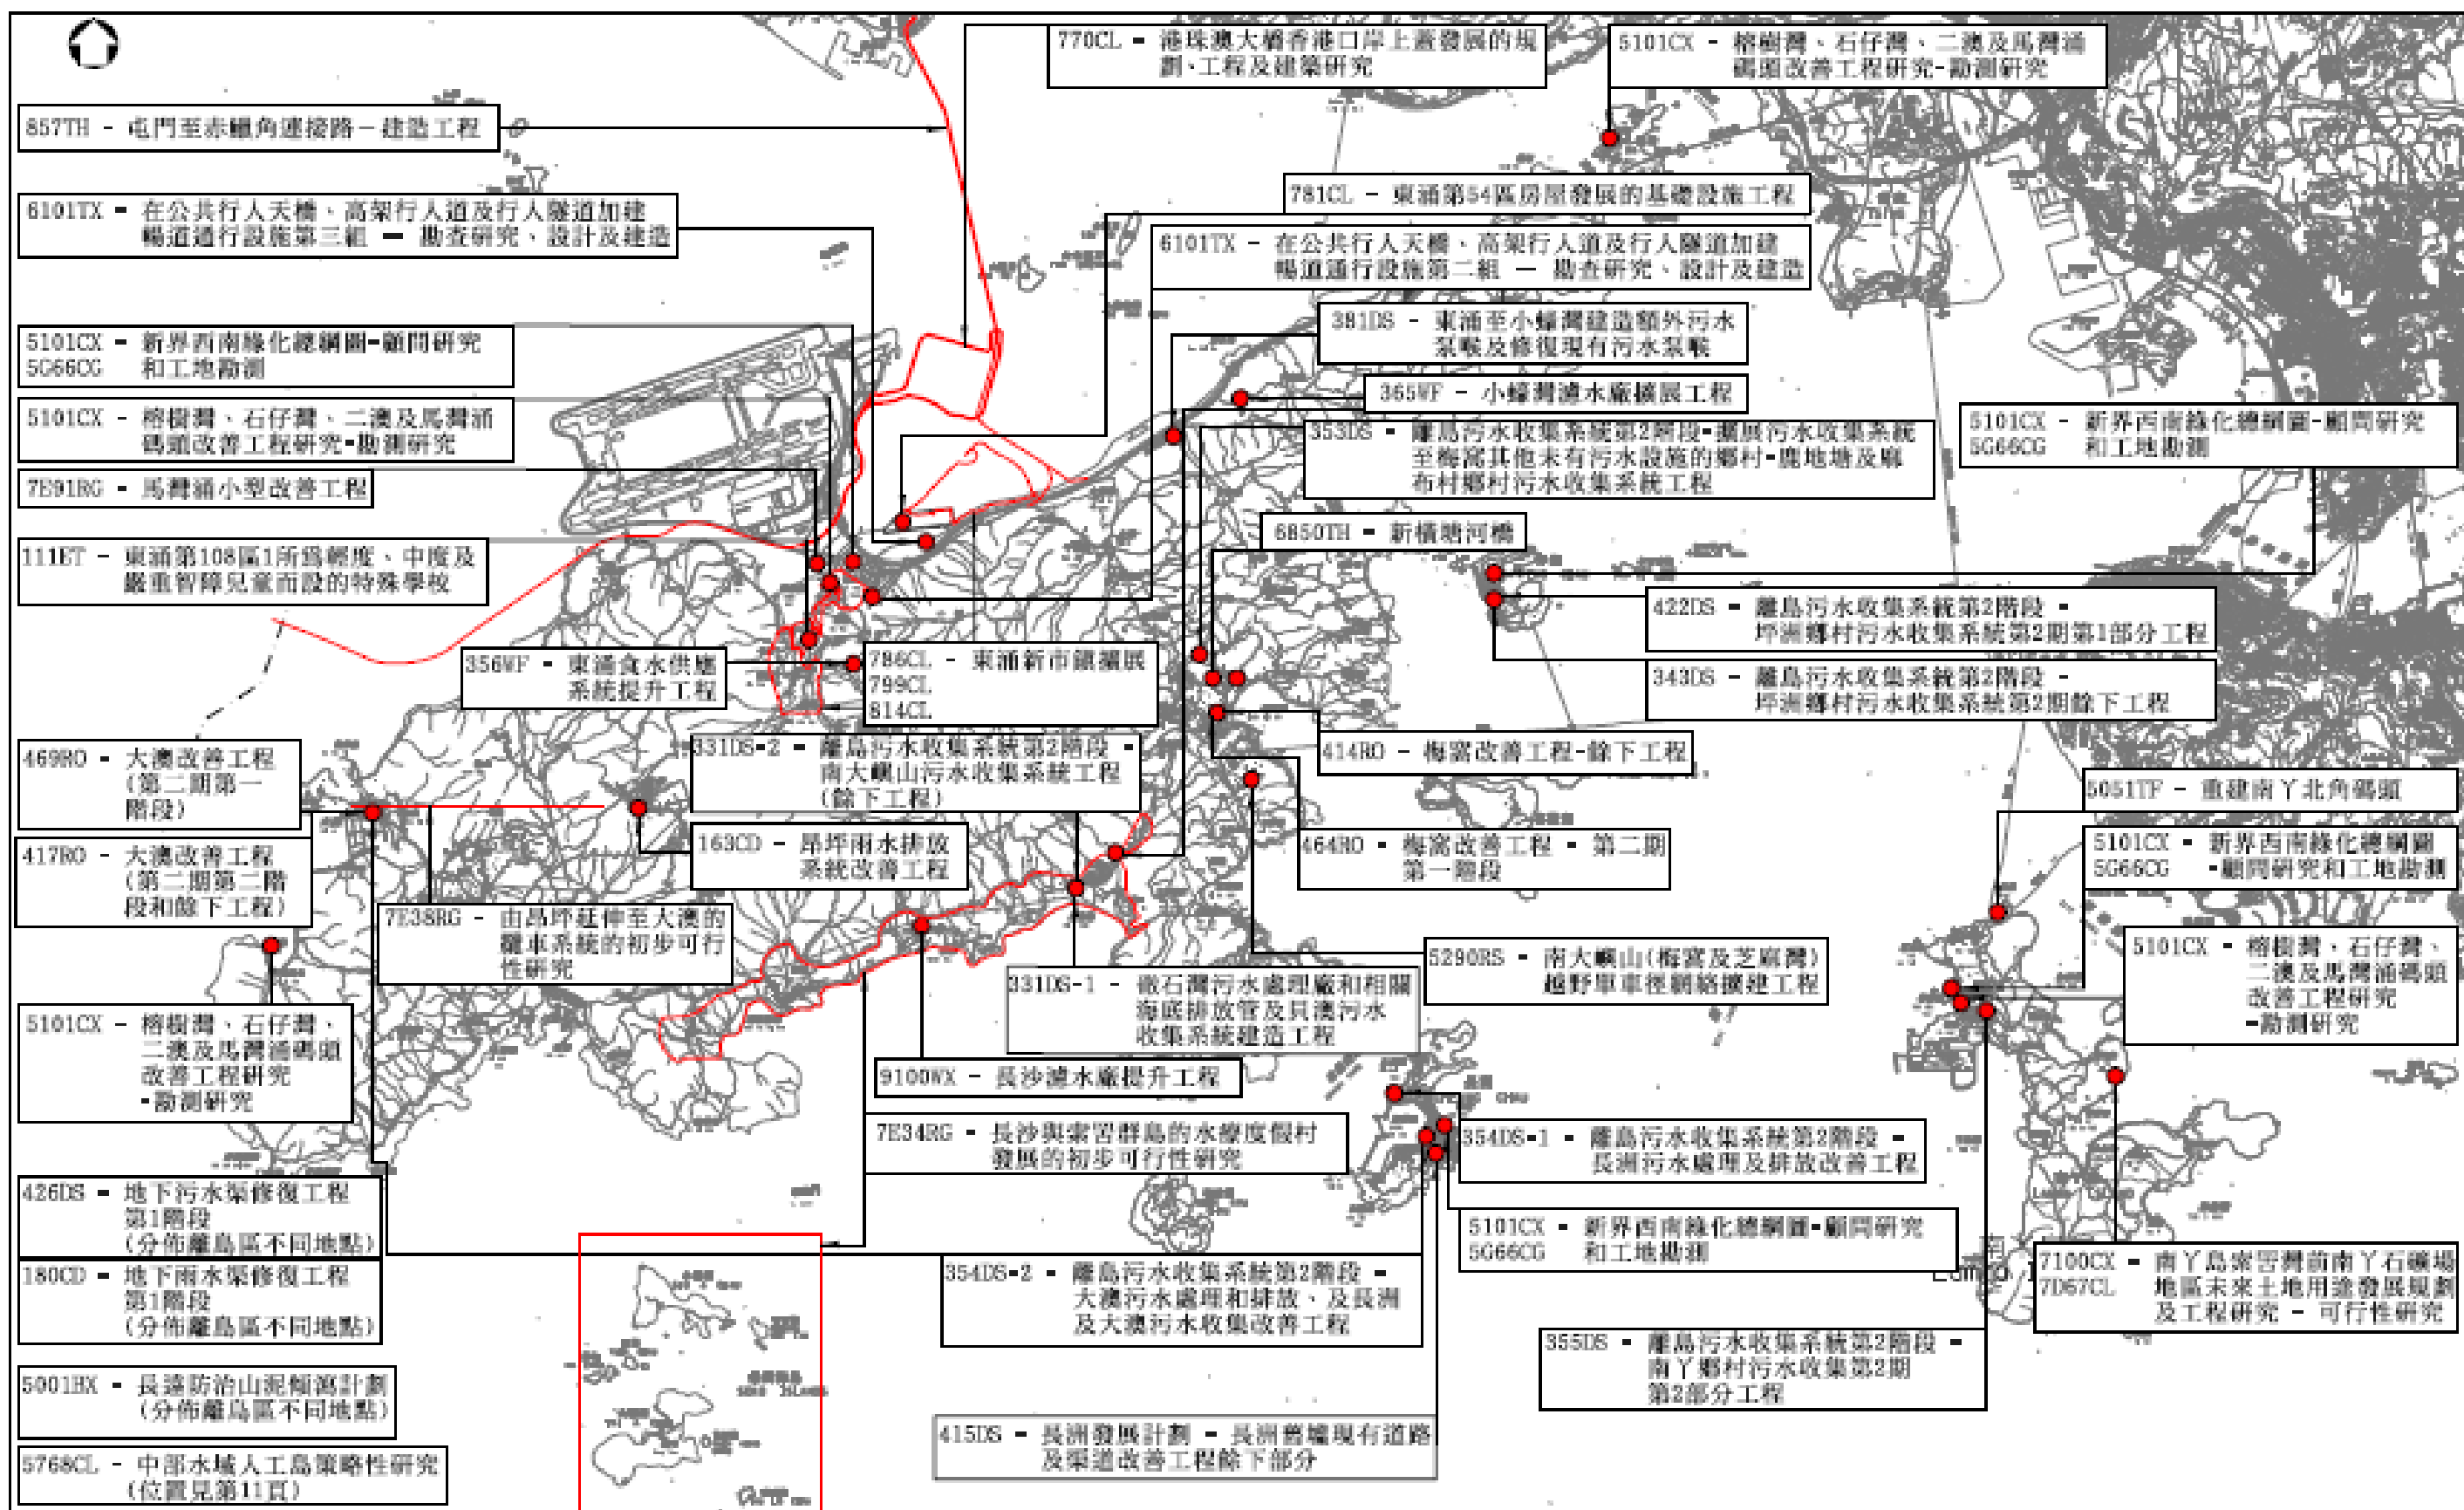
(7) 其他

工程編號及級別	工程名稱	預計費用（百萬元）	決策科首長及負責部門/機構	動工日期（月/年）	竣工日期（月/年）	工程內容／備註	照片/圖則
5001BX D	長遠防治山泥傾瀉計劃	1,013.0 （長遠防治山泥傾瀉計劃於2019/20年度的預算）	發展局局長 土木工程拓展署	2010 年	持續進行	我們已為離島區156個人造斜坡及17幅天然山坡完成了防治山泥傾瀉工程。 現時離島區有17個人造斜坡及10幅天然山坡正進行防治山泥傾瀉工程， 人造斜坡資料如下： ➤ 5個位於大嶼山東灣頭路的斜坡編號10SW-C/C318，10SW-C/C321，10SW-C/C322，10SW-C/CR320及10SW-C/CR324； ➤ 1個位於大嶼山羌山道的斜坡編號13NW-B/C337； ➤ 1個位於大嶼山銀鑛灣路的斜坡編號10SW-C/FR24； ➤ 1個位於大嶼山窩田的斜坡編號10SW-C/C241； ➤ 1個位於大嶼山大澳道的斜坡編號13NW-B/C190； ➤ 1個位於南丫島北角舊村的斜坡編號14NE-B/R122； ➤ 1個位於南丫島榕樹壟新村的斜坡編號14NE-B/R73； ➤ 1個位於坪洲涌仔村的斜坡編號10SW-B/CR107； ➤ 1個位於長洲贊端路的斜坡編號14NW-D/CR11； ➤ 1個位於長洲北社新村的斜坡編號14NW-D/R40； ➤ 1個位於長洲大石口村的斜坡編號14NW-D/R70； ➤ 1個位於長洲喜士路的斜坡編號14NW-D/R130；及 ➤ 1個位於長洲龍仔村的斜坡編號14NW-D/R78。	

(7) 其他

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長 及負責 部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容／備註	照片/圖則
						天然山坡資料如下： ➤ 1幅位於大嶼山羌山道對上的天然山坡編號13NW-B/SA6； ➤ 3幅位於大嶼山橫塘對上的天然山坡編號10SW-A/SA1，10SW-A/SA2 及 10SW-C/SA1； ➤ 1幅位於大嶼山石壁對上的天然山坡編號13NW-B/SA4； ➤ 1幅位於大嶼山鹿湖對上的天然山坡編號9SW-D/SA7； ➤ 1幅位於大嶼山橫坑村對上的天然山坡編號9SW-D/SA1； ➤ 2幅位於南丫島索罟灣對上的天然山坡編號15NW-C/SA2 及 15NW-C/SA1；及 ➤ 1幅位於南丫島大山東村對上的天然山坡編號14NE-B/SA1。 土木工程拓展署並計劃在未來一年為離島區7個人造斜坡及1 幅天然山坡展開防治山泥傾瀉工程，相關工程將於2020年第一季展開，預計於2020年第四季完成。	

(8) 附錄



drawing title

離島區主要工程項目進度報告2020 - 工程項目位置圖

項目編號 Item no.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

比例 8:22 | 8

1 : 100 000

圖則編號 drawing no.
SLO-Z0474

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818

可持續大嶼辦事處
SUSTAINABLE LANTAU OFFICE



土木工程拓展署
CIVIL ENGINEERING AND
DEVELOPMENT DEPARTMENT

50-20474-100

43 #20MM X 25MM
