

葵青區工程計劃及進度報告（截至2023年12月31日）

- | | |
|-----------|----------|
| 1) 社區設施項目 | C1 |
| 2) 土木工程項目 | E1 – E17 |

土木工程拓展署
西拓展處
2024 年 1 月

葵青區社區設施項目計劃及進度報告
社區設施項目
- C1-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責機構	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計	進度/ 備註
沒有						

葵青區土木工程項目計劃及進度報告
(截至2023年12月31日止)

-E1-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責機構	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/備註
(總目705 分目5001BX/D)	長遠防治山泥傾瀉計劃		土木工程拓 展署			
	<u>合約號碼 GE/2018/01</u>			(2019 年第二季) 2019 年第二季	(2023 年第四季) 2023 年第四季	合約已展開。
	11NW-A/DF 7 11NW-A/DF 8 11NW-A/DF 7a 11NW-A/DF 7b 11NW-A/DF 8a 11NW-A/DF 8b (位於青山公路 -葵涌段對上的天然山坡)	43				防治山泥傾瀉工程正進行中。 防治山泥傾瀉工程正進行中。 防治山泥傾瀉工程正進行中。 防治山泥傾瀉工程正進行中。 防治山泥傾瀉工程正進行中。 防治山泥傾瀉工程正進行中。
	<u>合約號碼 GE/2019/23</u>			(2020 年第二季) 2020 年第二季	(2023 年第四季) 2024 年第四季	合約已展開。
	10NE-B/C 239 (位於青衣西路)	11.9				防治山泥傾瀉工程已完成。
	<u>合約號碼 GE/2020/07</u>			(2021 年第三季) 2021 年第三季	(2025 年第一季) 2025 年第一季	合約已展開。
	7SW-C/R 385 (位於下葵涌村)	待定				防治山泥傾瀉工程將展開。
	10NE-B/FR 171 (位於青衣路)	待定				防治山泥傾瀉工程將展開。
	11NW-A/FR 321 (位於新葵街近下葵涌村 57 號屋)	待定				防治山泥傾瀉工程將展開。

葵青區土木工程項目計劃及進度報告

(截至2023年12月31日止)

-E2-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責機構	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/備註
	<u>合約號碼 GE/2020/09</u> 11NW-A/HP 4 11NW-A/HP 27 11NW-A/HP 4a 11NW-A/HP 11a 11NW-A/HP 11c 11NW-A/HP 11d 11NW-A/HP 27a 11NW-A/HP 27b (位於九華徑新村的天然山坡) 11NW-A/HP 27c (位於九華徑新村的天然山坡)	32.0 43.2		(2021 年第三季) 2021 年第三季	(2024 年第四季) 2025 年第二季	合約已展開。 防治山泥傾瀉工程正進行中。 防治山泥傾瀉工程正進行中。 防治山泥傾瀉工程正進行中。 防治山泥傾瀉工程正進行中。 防治山泥傾瀉工程正進行中。 防治山泥傾瀉工程正進行中。 防治山泥傾瀉工程正進行中。 防治山泥傾瀉工程正進行中。 防治山泥傾瀉工程已完成。
	<u>合約號碼 GE/2020/10</u> 7SW-C/F 8 (位於全完中學東面) 10NE-B/CR 212 (位於青衣東食水配水庫) 11NW-A/FR 85 (位於九華徑食水抽水站) 11NW-A/FR 208 (位於九華徑泵房上村)	3.83 2.03 4.65 0.97		(2021 年第二季) 2021 年第二季	(2024 年第四季) 2024 年第四季	合約已展開。 防治山泥傾瀉工程正進行中。 防治山泥傾瀉工程正進行中。 防治山泥傾瀉工程正進行中。 防治山泥傾瀉工程正進行中。
	<u>合約號碼 GE/2020/19</u> 7SW-C/C 910(荃灣德士古道) 7SW-C/FR 86 (位於葵涌北食水配水庫)	7.2		2023 年第三季	2027 年第二季	合約已展開。 防治山泥傾瀉工程將展開。 防治山泥傾瀉工程正進行中。

葵青區土木工程項目計劃及進度報告
(截至2023年12月31日止)

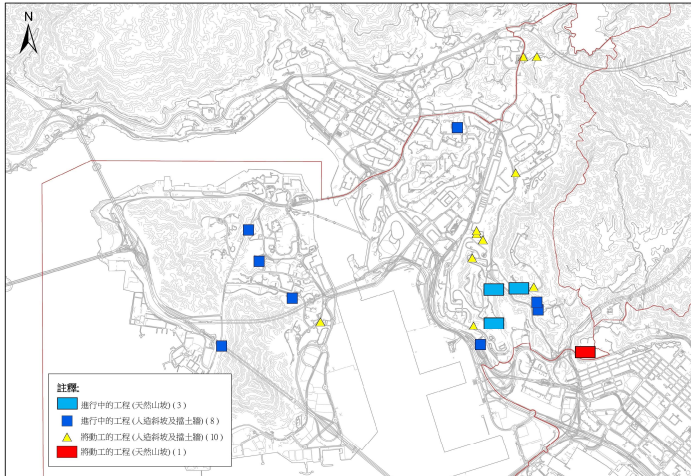
-E3-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責機構	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/備註
	<u>合約號碼 GE/2021/05</u> 11NW-A/C 383 (位於葵涌道)	1.65		(2021 年第二季) 2021 年第二季	(2024 年第四季) 2024 年第四季	合約已展開。 防治山泥傾瀉工程已完成。
	<u>合約號碼 GE/2021/11</u> 7SW-C/FR 440 (位於石籬探奇遊樂場)	3.06		(2022 年第二季) 2022 年第二季	(2025 年第四季) 2025 年第四季	合約已展開。 防治山泥傾瀉工程正進行中。
	7SW-C/FR 578 (位於職業訓練局葵涌大樓)	3.87				防治山泥傾瀉工程正進行中。
	<u>合約號碼 GE/2021/22</u> 11NW-A/DF 6 (前稱為 11NW-A/SA3) (位於呈祥道 - 蝴蝶谷食水主配水庫對下的天然山坡)	待定		(2022 年第四季) 2022 年第四季	(2026 年第二季) 2026 年第二季	合約已展開。 防治山泥傾瀉工程將展開。
	11NW-A/DF 6a (前稱為 11NW-A/SA3) (位於呈祥道 - 蝴蝶谷食水主配水庫對下的天然山坡)	待定				防治山泥傾瀉工程將展開。
	11NW-A/C 259 (華景山路近華員徑)	待定				防治山泥傾瀉工程將展開。
	<u>合約號碼 GE/2022/03</u> 7SW-C/CR 485 (和宜合道下老圍抽水站)	3.73		(2022 年第三季) 2022 年第三季	(2026 年第一季) 2026 年第一季	合約已展開。 防治山泥傾瀉工程正進行中。

葵青區土木工程項目計劃及進度報告

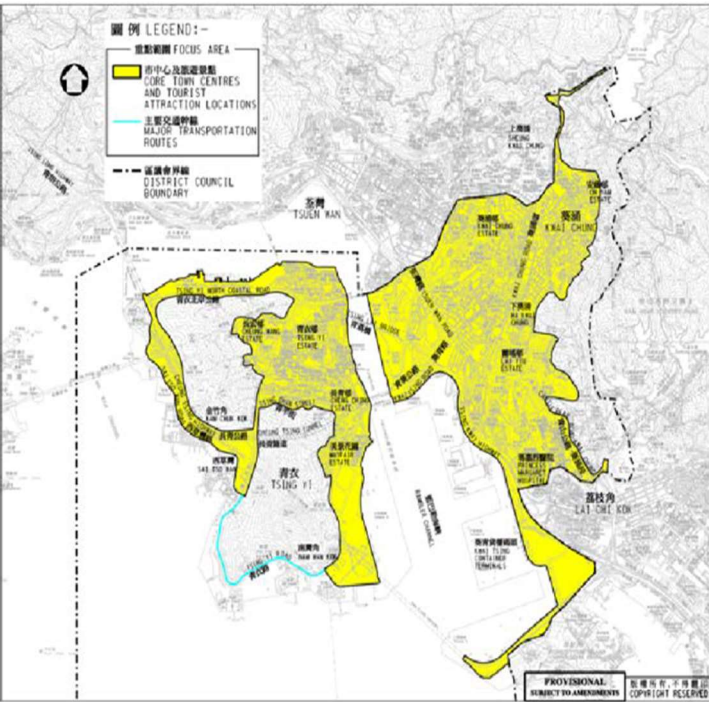
(截至2023年12月31日止)

-E4-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責機構	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/備註
	<u>合約號碼 GE/2022/26</u> 7SW-C/C 202 (位於青山公路) 7SW-C/C 205 (位於青山公路)	待定 待定		2023 年第二季 2023 年第二季	2026 年第二季 2026 年第二季	合約已展開。 防治山泥傾瀉工程將展開。 防治山泥傾瀉工程將展開。
						

葵青區土木工程項目計劃及進度報告 (截至2023年12月31日止)

-E5-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責機構	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/ 備註
負責機構: 土木工程拓展署						
5052CG/甲級	新界西南及東北綠化總綱圖 - 優先綠化工程	66.8 (葵青區的費用)	土木工程拓展署	(2020年12月) 2020年12月	(2023年年底) 2023年12月	葵青區的綠化總綱圖工程包括在葵青區內種植和護養樹木及灌木，建造相關花槽，並進行園景美化以及附屬工程，包括設置灌溉設施。綠化工程已於2023年12月大致完成。現正進行植物護養工作及安排分批移交植物至保養部門跟進日常護養工作。 

葵青區土木工程項目計劃及進度報告

(截至2023年12月31日止)

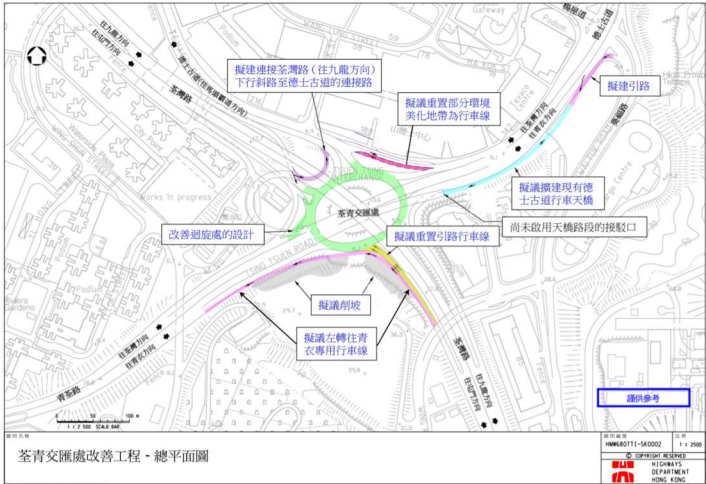
-E6-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責機構	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/ 備註
負責機構: 渠務署						
4438DS/甲級	九龍西部及荃灣鄉村污水收集系統 - 第1 期	104.1	渠務署	(2020年7月) 2020年7月	(2024年) 2024年第二季	此項工程包括在葵涌及荃灣建造8個旱季截流器，其中有 2 個旱季截流器位於葵青區內。是項工程已於 2020 年 7 月展開，已於2023年年底大致完成，而餘下測試及運作工序亦預計將於2024年第二季完成。
4391DS/丙級	九龍西部及荃灣鄉村污水收集系統 - 第2期	待定	渠務署	待定	待定	此項工程主要為九龍西部及荃灣鄉郊地區提供污水收集系統。此項工程會包括在九龍西部及荃灣未有敷設污水渠的九個鄉村/地區提供污水收集系統，其中有兩個鄉村/地區位於葵青區內，工程的設計工作現正進行中。
4389DS/甲級	九龍西部及荃灣污水系統改善工程 - 第 2 期	2,285.5	渠務署	(2020年7月) 2020年7月	(2026年 第二季) 2026年 第二季	此項工程主要是改善九龍西部及荃灣現有污水收集系統，其中包括改善葵青區內約 3.9 公里之現有污水渠。工程已於2020年7月展開，預計在 2026 年第二季完成。
4358DS/甲級	老圍, 川龍及九華徑舊村鄉村污水收集系統	168.0	渠務署	(2022年8月) 2022年8月	(2025年) 2025年	工程在葵青區內為九華徑舊村提供污水收集系統。工程已於2022年8月展開，預計在 2025 年完成。

葵青區土木工程項目計劃及進度報告

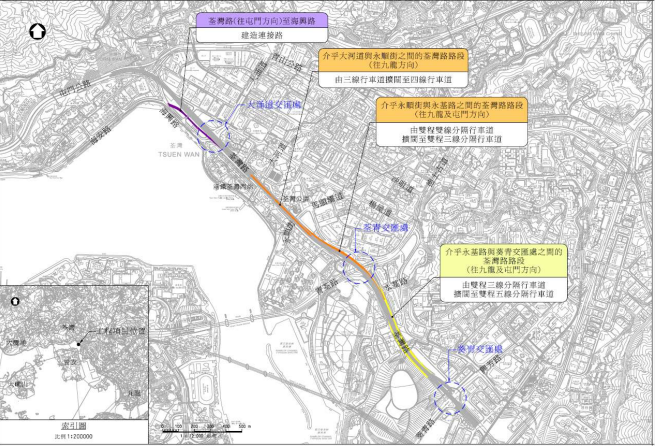
(截至2023年12月31日止)

-E7-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責機構	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/ 備註
負責機構: 路政署						
6087TI	荃青交匯處改善工程	檢討中	路政署	檢討中	檢討中	工程主要包括於荃灣路(往屯門方向)引路建造左轉往青衣的專用行車線、擴建現有德士古道行車天橋、建造連接荃灣路(往九龍方向)下行斜路至德士古道的連接路、擴闊德士古道近山德士中心附近的行車線及改善迴旋處的設計。 路政署已就工程的建造合約進行招標，相關的標書評審工作已大致完成。路政署爭取於2024年上半年就工程計劃向立法會財務委員會申請撥款。當撥款申請獲得通過，路政署將盡快展開工程。  荃青交匯處改善工程 - 總平面圖

葵青區土木工程項目計劃及進度報告 (截至2023年12月31日止)

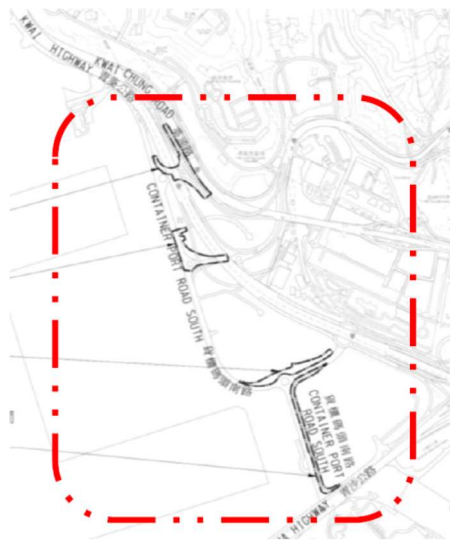
-E8-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責機構	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/ 備註
877TH	荃灣路擴闊及相關路口改善工程	檢討中	路政署	檢討中	檢討中	擬議荃灣路擴闊及相關路口改善工程計劃已於2023年2月16日獲得葵青區議會轄下交通及運輸委員會的支持。隨後路政署於2023年8月根據《道路(工程、使用及補償)條例》(第370章)為擬議工程計劃刊憲，而擬議工程計劃亦已在2023年11月根據《道路(工程、使用及補償)條例》(第370章)獲授權進行。路政署的工程顧問現正進行勘查研究的餘下工作。  

葵青區土木工程項目計劃及進度報告

(截至2023年12月31日止)

-E9-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責機構	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/ 備註
856TH/甲級	連接葵青交匯處上斜路至葵涌道的天橋	472	路政署	(2021年6月) 2021年6月	(2025年年中) 2025年年中	工程於2021年6月展開，預計在 2025 年年中完成。 工程旨在紓緩葵青交匯處上斜路交通擠塞的情況，主要包括建造一條單線行車橋連接荃灣路南行快線到葵涌道，擴闊連接葵青交匯處上斜路至葵涌道一段荃灣路南行線，以及其他附屬工程。行車橋的地基及橋墩工程現正進行中。此外，新建橫跨葵涌道的行人天橋(編號NF530)工程已大致完成，並已開放供公眾使用。而鄰近的現有行人天橋(編號NF303)已於2023年12月28日起永久封閉及即將拆卸。
866TH/丙級	葵涌貨櫃碼頭南路及青衣青衣路道路改善工程	檢討中	路政署	檢討中	檢討中	此項工程計劃主要優化現存迴旋處及周邊道路的運作效率，以改善該區的交通情況。 

葵青區土木工程項目計劃及進度報告

(截至2023年12月31日止)

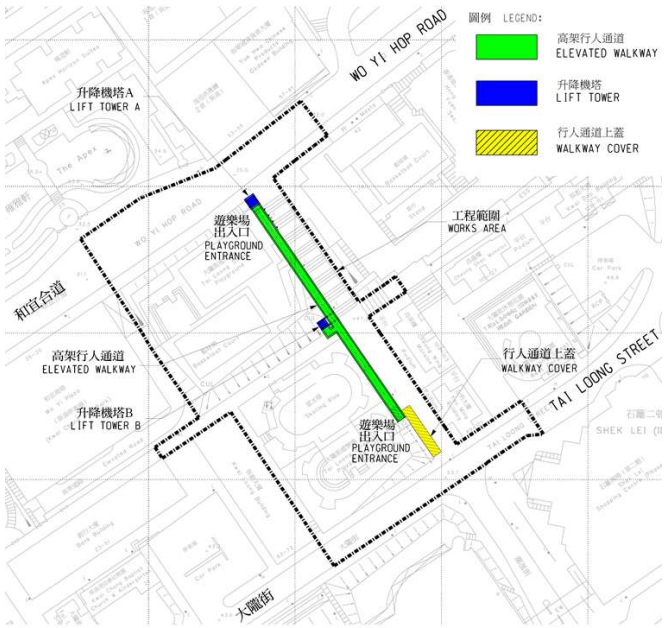
-E10-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責機構	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/ 備註
178TB/甲級	葵涌青山公路至工業街升降機及行人通道系統	585	路政署	(2019年12月) 2019年12月	(2023年第四季) 2023年第四季	工程計劃是建造一組升降機及行人通道系統，連接石籬區、青山公路葵涌段和工業街，為區內提供一條便利舒適的行人通道，亦為長者和殘疾人士提供一條安全的無障礙通道。主體工程已於2019 年12月19日展開，並於 2023 年第四季完成，2024年1月開放給市民使用。
197TB/甲級	興盛路至大窩口道行人通道系統	192.5	路政署	(2023年第三季) 2023年第三季	(2026年第三季) 2026年第三季	工程計劃是建造一條行人通道系統，連接興盛路至大窩口道，為區內提供一條便利舒適的行人通道。工程計劃已於2023 年第三季展開建造。
202TB/丙級	荔景山路至麗祖路升降機及行人通道系統	待定	路政署	待定	待定	工程計劃是建造一條行人通道系統，連接荔景山路至麗祖路，為區內提供一條便利舒適的行人通道。工程計劃已於2021年12月17日至2022年2月15日根據《道路(工程、使用及補償)條例》(第370章)完成刊憲，期間並未收到反對意見，並在2022年3月獲授權進行。路政署委聘的工程顧問現正進行詳細設計工作。

葵青區土木工程項目計劃及進度報告

(截至2023年12月31日止)

-E11-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責機構	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/ 備註
203TB/甲級	葵涌大隴街至和宜合道升降機及行人通道系統	135.3	路政署	(2022年8月) 2022年8月	(2025年第三季) 2025年第三季	工程計劃是建造一組升降機及行人通道系統，連接和宜合道及大隴街，為區內居民提供一條舒適便捷的行人通道，亦為行動不便的人士、長者及使用嬰兒車的家長提供一條安全的無障礙行人通道。路政署工程合約已於2022年8月展開。地基工程已經大致完成，現正進行橋墩工程。 
213TB/丙級	葵涌石蔭路至大白田街自動扶梯系統	待定	路政署	待定	待定	工程計劃在現有連接葵涌石蔭路至大白田街的樓梯，擬建上有上蓋的自動扶梯系統。工程計劃已於2023年4月13日諮詢葵青區議會交通及運輸委員會，並獲得議員支持。路政署委聘的工程顧問現正進行初步設計工作，並籌備工程刊憲及相關準備工作。

葵青區土木工程項目計劃及進度報告

(截至2023年12月31日止)

-E12-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責機構	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/ 備註
總目706 分目6100TX	由華星街至青山公路(葵涌段)自動扶梯系統	待定	路政署	待定	待定	工程計劃在現有連接華星街及青山公路(葵涌段)的行人斜道上，擬建有上蓋的自動扶梯。工程計劃已於2022年10月13日諮詢葵青區議會交通及運輸委員會，並獲得議員支持。工程計劃已於2023年6月9日根據《道路(工程、使用及補償)條例》(第370章)獲授權進行，工程顧問公司正繼續進行詳細設計工作。
總目706 分目6100TX	於青衣連接青衣路及青衣航運路的新道路	37.2	路政署	(2022年12月) 2022年12月	(2024年12月) 2024年12月	此項工程主要包括興建一條新道路連接青衣路及青衣航運路。 路政署已於2022年2月批出工程合約，原預計於2022年2月開展相關工程。然而，路政署於2022年3月收到地政總署的通知，相關土地已緊急轉交前食物及衛生局作興建臨時醫院的用途。醫務衛生局已於2022年12月交回相關土地，地政總署亦於同月轉交路政署。 相關工程已於2022年12月開展。 

葵青區土木工程項目計劃及進度報告

（截至2023年12月31日止）

-E13-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責機構	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/ 備註
總目706 分目6100TX	葵青區亨美街行人通道加建上蓋	待定	路政署	待定	待定	交通及運輸委員會於2019年9月通過支持於青衣長亨邨巴士總站及青衣長宏邨巴士總站的行人通道加建上蓋工程。近長亨邨巴士總站的第一階段加建上蓋工程已於2021年完成，而近長宏邨巴士總站於亨美街的第二階段加建上蓋工程將於亨美街小巴站遷移後開展。路政署已於2023年1月為第二階段的加建上蓋工程完成地區諮詢，現正進行相關的招標工作。工程項目預計將於2024年第三季展開。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨青敬路近安泊樓的行人天橋（結構編號：K&T02）加建升降機工程	15.4	路政署	(2020年6月) 2020年6月	(2022年12月) 2022年12月	工程合約於2020年年中展開，升降機已於2022年12月24日開放予公眾使用。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨青康路近長康邨第二商場的行人天橋（結構編號：K&T01）加建升降機工程	33.5	路政署	(2020年6月) 2020年6月	(2024年) 2024年第四季	工程合約於2020年年中展開，現正進行地基工程。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨涌美路近上高灘街的行人天橋（結構編號：NF123）加建升降機工程	52.0	路政署	(2023年第三季) 2023年第三季	(2027年第一季) 2027年第一季	路政署工程合約已於2023年7月展開。1號升降機已完成探坑挖掘及鑽探工程以獲取相關的設計資料，現正進行升降機設計工作。2號升降機正在與相關部門申請臨時交通措施以進行前期的探坑挖掘及鑽探工程。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨涌美路近長康邨的行人天橋（結構編號：NF124）加建升降機工程	51.8	路政署	(2023年第三季) 2023年第三季	(2027年第一季) 2027年第一季	路政署工程合約已於2023年7月展開。現正與相關部門申請臨時交通措施以進行前期的探坑挖掘及鑽探工程。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨青康路近青盛苑的行人天橋（結構編號：NF125）加建升降機工程	23.5	路政署	(2021年12月) 2021年12月	(2024年9月) 2024年9月* *現正就完工日期進行檢視	路政署工程合約已於2021年12月展開。1號升降機已完成打樁及地基工程，現正進行升降機塔建造工程。2號升降機現正進行探坑挖掘工程。

葵青區土木工程項目計劃及進度報告

(截至2023年12月31日止)

-E14-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責機構	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/ 備註
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨青衣西路近青華苑的行人天橋（結構編號：NF126）加建升降機工程	26.4	路政署	(2021 年 12 月) 2021 年 12 月	(2024 年 9 月) 2024 年 9 月* *現正就完工日期進行檢視	路政署工程合約已於2021年12月展開。1號升降機現正進行探坑挖掘工程。2號升降機已完成探坑挖掘工程，現正進行打樁工程。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨楓樹窩路近清心街（結構編號：NF213）加建升降機工程	26.9	路政署	(2021 年 12 月) 2021 年 12 月	(2025 年 3 月) 2025 年 3 月	路政署工程合約已於2021年12月展開。1號升降機已完成樓梯拆卸工程，現正進行探坑挖掘的前期準備工作。2號升降機已完成樓梯拆卸工程，現正進行鑽探工程的前期準備工作。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨楓樹窩路近青衣鄉事委員會的行人天橋（結構編號：NF215）加建升降機工程	24.9	路政署	(2021 年 12 月) 2021 年 12 月	(2024 年 3 月) 2024 年 6 月* *現正就完工日期進行檢視	路政署工程合約已於2021年12月展開。1號升降機現正進行地下設施改道工程。2號升降機已完成打樁及地基工程，現正進行升降機塔建造工程。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨興芳路及葵富路的行人天橋（結構編號：NF225）加建升降機工程	46.6	路政署	(2023年第三季) 2023年第三季	(2027年第一季) 2027年第一季	路政署工程合約已於2023年7月展開。1號升降機已完成探坑挖掘及鑽探工程以獲取相關的設計資料，現正進行升降機設計工作。2號升降機現正與房屋署商討安排在葵芳邨內進行前期的探坑挖掘及鑽探工程。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨興芳路近葵益道的行人天橋（結構編號：NF233）加建升降機工程	44.0	路政署	(2023年第三季) 2023年第三季	(2027年第一季) 2027年第一季	路政署工程合約已於2023年7月展開。現正申請挖掘准許證以進行地下設施探測工作。預計於2024年年初進行前期的探坑挖掘及鑽探工程。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨安捷街近安蔭商場的行人天橋（結構編號：NF275）加建升降機工程	20.1	路政署	(2021 年 12 月) 2021 年 12 月	(2025 年 3 月) 2025 年 3 月	路政署工程合約已於2021年12月展開。現正進行探坑挖掘及地下設施改道工作。現正進行地下設施改道工作及興建臨時過路設施，並準備開展斜坡工程及探坑挖掘。

葵青區土木工程項目計劃及進度報告

（截至2023年12月31日止）

-E15-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責機構	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/ 備註
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨青衣鄉事會路近青衣分區警署的行人天橋（結構編號：NF292）加建升降機工程	20.9	路政署	(2021 年 12 月) 2021 年 12 月	(2025 年 3 月) 2025 年 3 月	路政署工程合約已於2021年12月展開。現正進行樓梯拆卸工作，並準備開展鑽探及探坑挖掘工程的前期工作。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨青衣青敬路近青衣公園的行人天橋（結構編號：NF322）加建升降機工程	43.7	路政署	(2023年第三季) 2023年第三季	(2027年第一季) 2027年第一季	路政署工程合約已於2023年7月展開。1號及2號升降機現正進行探坑挖掘工程。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨青敬路近宏福花園的行人天橋（結構編號：NF323）加建升降機工程	21.5	路政署	(2021 年 12 月) 2021 年 12 月	(2024 年 3 月) 2024 年 9 月* *現正就完工日期進行檢視	路政署工程合約已於2021年12月展開。探坑挖掘工程已完成，現正進行打樁及地基工程的前期準備工作
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 青衣青綠街近青衣市區診所的行人天橋（結構編號：NF325）加建升降機工程	21.1	路政署	(2021 年 12 月) 2021 年 12 月	(2024 年 3 月) 2024 年 6 月* *現正就完工日期進行檢視	路政署工程合約已於2021年12月展開。臨時遷移現有電錶箱的工程已完成，現正進行樓梯拆卸工程。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨青山公路 - 葵涌段的大窩交匯處的高架行人道（結構編號：N423）加建升降機工程	43.7	路政署	(2023年第三季) 2023年第三季	(2027年第一季) 2027年第一季	路政署工程合約已於2023年7月展開。1號升降機現正進行地下鑽探工程。2號升降機現正進行探坑挖掘工程的前期準備工作。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨青敬路近長安邨安湖樓的行人天橋（結構編號：K&T03）加建升降機工程	25.0	路政署	(2023年第三季) 2023年第三季	(2027年第一季) 2027年第一季	路政署工程合約已於2023年7月展開。1號升降機現正進行探坑挖掘工程。

葵青區土木工程項目計劃及進度報告

(截至2023年12月31日止)

-E16-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責機構	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/ 備註
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨葵仁路近新都會廣場的行人天橋 (結構編號: K&T04) 加建升降機工程	25.1	路政署	(2023年第三季) 2023年第三季	(2027年第一季) 2027年第一季	路政署工程合約已於2023年7月展開。現正申請挖掘准許證以進行地下設施探測工作。挖掘准許證預計於2024年1月獲得。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨青敬路連接青衣城及青衣公園的行人天橋 (結構編號: K&T05) 加建升降機工程	24.0	路政署	(2023年第三季) 2023年第三季	(2027年第一季) 2027年第一季	路政署工程合約已於2023年7月展開。1號升降機已完成探坑挖掘及鑽探工程以獲取相關的設計資料, 現正進行升降機設計工作。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨大白田街連接石蔭邨及石蔭東邨的行人天橋 (結構編號: K&T06) 加建升降機工程	26.1	路政署	(2023年第三季) 2023年第三季	(2027年第一季) 2027年第一季	路政署工程合約已於2023年7月展開。1號升降機現正與房屋署商討安排在石蔭東邨內進行前期的探坑挖掘及鑽探工程。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃下的「特別計劃」 橫跨大窩口道連接大窩口商場及大窩口邨富強樓的行人天橋 (結構編號: TWH01)	待定	路政署	待定	待定	交通及運輸委員會於2020年12月選出該行人天橋作為「特別計劃」下優先的推展項目。路政署已完成為行人通道TWH01加建升降機的詳細設計, 預計於2024年第1季為工程進行招標。

葵青區土木工程項目計劃及進度報告

（截至2023年12月31日止）

-E17-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責機構	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/ 備註
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃下的「特別計劃」 橫跨現有道路連接石籬商場一期、石籬 (一) 邨石泰樓及石安樓的行人天橋 (結構編號: SL16)	待定	路政署	待定	待定	交通及運輸委員會於2020年12月選出該行人天橋作為「特別計劃」下優先的推展項目。路政署已完成為行人通道SL16加建升降機的詳細設計，預計於2024年第1季為工程進行招標。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃下的「特別計劃」 橫跨青綠街近青怡花園的行人天橋（結構編號: NF214）	待定	路政署	待定	待定	交通及運輸委員會於2020年12月選出該行人天橋作為「特別計劃」下優先的推展項目。路政署已完成為行人通道NF214加建升降機的詳細設計，預計於2024年第1季為工程進行招標。
負責機構: 水務署						
196 WC/甲級	建設智管網 - 餘下工程	9.9 (葵青區的費用)	水務署	(2021 年 5 月) 2021 年 5 月 (葵青區的工作進度)	(2025年第1季) 2025年第1季 (葵青區的工作進度)	此項工程擬於葵青區建設20個監測區域。 工程於2020年8月3日在全港展開。而位於葵青區內的20個監測區域當中，有12個經已完成建設，預計其餘於葵青區內的監測區域會於2025年第1季前相繼完成。
