

葵青區工程計劃及進度報告（截至2025年8月31日）

- | | |
|-----------|----------|
| 1) 社區設施項目 | C1 |
| 2) 土木工程項目 | E1 – E16 |

土木工程拓展署
西拓展處
2025年9月

葵青區社區設施項目計劃及進度報告
(截至2025年8月31日止)

-C1-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責部門	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/備註
191GK / A	青衣青康路社區會堂、普通科門診診所及母嬰健康院	1,033.2	建築署委託房委會進行設計和建造工程	(2020年第四季) 2020年第四季	(2029年內) 2029年內	合約已展開。 地基工程進行中。
114MH / A	瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建計劃	5,539.9	建築署委托醫院管理局進行設計、興建及工程管理	(2024年第一季) 2024年3月12日	(2028年第一季) 2028年第一季	合約已展開。 結構及屋宇裝備工程進行中。
34NB / A	葵涌火葬場重置火化爐及相關工程	500.4	建築署	(2024年第三季) 2024年第三季	(2028年第一季) 2028年第一季	合約已展開。 地基工程進行中。

葵青區土木工程項目計劃及進度報告
(截至2025年8月31日止)

-E1-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責部門	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/備註
總目705 分目5001BX/D	長遠防治山泥傾瀉計劃		土木工程拓 展署			
	<u>合約號碼 GE/2018/01</u>			(2022年第二季) 2022年第二季	(2025年第四季) 2025年第四季	合約已展開。
	(位於青山公路-葵涌段對上的天然山坡 11NW-A/SA1) 包括: 11NW-A/DF7 11NW-A/DF8 11NW-A/DF7a 11NW-A/DF7b 11NW-A/DF8a 11NW-A/DF8b	43				防治山泥傾瀉工程正進行中。
	<u>合約號碼 GE/2020/07</u>			(2021年第三季) 2021年第三季	(2026年第二季) 2026年第二季	合約已展開。
	10NE-B/FR171 (位於青衣路)	10.90				防治山泥傾瀉工程正進行中。
	11NW-A/FR321 (位於新葵街近下葵涌村 57號屋)	0.19				防治山泥傾瀉工程正進行中。
10NE-B/C149 (位於藍田村)	2.80			防治山泥傾瀉工程正進行中。		
7SW-C/CR1419 (位於建村街)	3.59			防治山泥傾瀉工程正進行中。		

葵青區土木工程項目計劃及進度報告
(截至2025年8月31日止)

-E2-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責部門	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/備註
總目705 分目5001BX/D	合約號碼 GE/2021/11	6.59	土木工程拓 展署	(2022年第二季) 2022年第二季	(2025年第三季) 2025年第四季	合約已展開。
	11NW-A/CR90 (位於葵涌華瑤路燈柱 U59385 後)					防治山泥傾瀉工程正進行中。
	合約號碼 GE/2021/22	8.74		(2022年第四季) 2022年第四季	(2025年第四季) 2025年第四季	合約已展開。
	(位於呈祥道 - 蝴蝶谷食水主配水庫對下 的天然山坡 11NW-A/SA3)包括 11NW-A/DF6 11NW-A/DF6a					防治山泥傾瀉工程正進行中。
	11NW-A/C259 (位於華景山路近華員徑)			18.90		
	合約號碼 GE/2022/03	3.74		(2022年第三季) 2022年第三季	(2026年第一季) 2026年第一季	合約已展開。
7SW-C/CR 485(位於和宜合道下老圍抽水 站)				防治山泥傾瀉工程正進行中。		
11NW-A/C 206 (位於荔景山路荔枝角海 水抽水站)	3.58				防治山泥傾瀉工程正進行中。	

葵青區土木工程項目計劃及進度報告

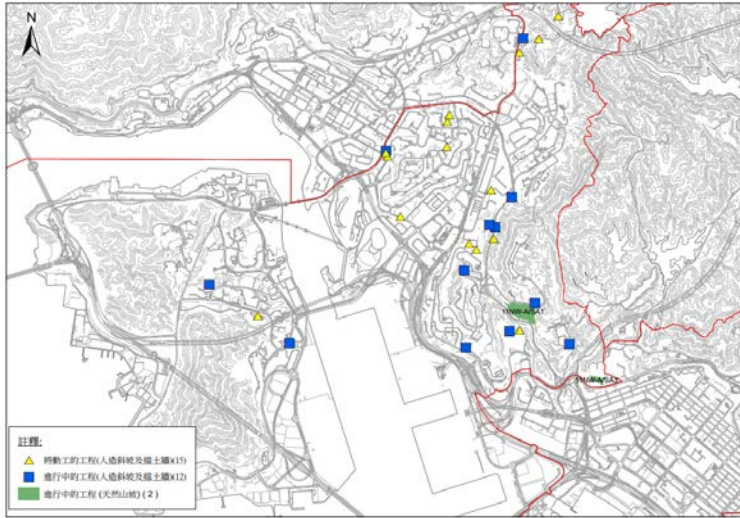
(截至2025年8月31日止)

-E3-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責部門	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/備註
總目705 分目5001BX/D	合約號碼 GE/2022/15		土木工程拓 展署	(2023年第四季) 2023年第四季	(2026年第二季) 2026年第二季	合約已展開。
	11NW-A/CR239 (位於九華徑村 10-14 號屋前)	待定				防治山泥傾瀉工程將展開。
	7SW-C/C 912 (位於葵福路)	待定				防治山泥傾瀉工程將展開。
	7SW-C/CR 911 (位於葵福路)	2.73				防治山泥傾瀉工程正進行中。
	7SW-C/C 1526 (位於城門隧道以北鄉村地區入口)	3.58		防治山泥傾瀉工程正進行中。		
	11NW-A/C 148 (位於荔枝角九華徑村養正學校)	5.03		防治山泥傾瀉工程正進行中。		
	合約號碼 GE/2022/24			(2024年第一季) 2024年第一季	(2027年第三季) 2027年第三季	合約已展開。
	7SW-C/CR 441(位於伍若瑜夫人健康院北面)	待定				防治山泥傾瀉工程將展開。
7SW-C/C237(位於葵青大連排道)	3.18	防治山泥傾瀉工程正進行中。				
7SW-C/R 193 (位於葵盛游泳池)	待定	防治山泥傾瀉工程將展開。				
11NW-A/C 546 (位於鄰舍輔導會怡菁山莊)	2.03	防治山泥傾瀉工程正進行中。				
總目705 分目5001BX/D	合約號碼 GE/2022/26			(2023年第二季) 2023年第二季	(2025年第四季) 2025年第四季	合約已展開。
	7SW-C/C205 (位於青山公路)	5.02				防治山泥傾瀉工程已完成。

葵青區土木工程項目計劃及進度報告 (截至2025年8月31日止)

-E4-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責部門	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/備註
	7SW-C/C206 (位於青山公路)	12.43	土木工程拓 展署	(2023年第三季) 2024年第三季	(2027年第四季) 2027年第一季	防治山泥傾瀉工程正進行中。
	合約號碼 <u>GE/2023/14</u>					
	7SW-C/CR 520 (位於大窩口道南遊樂場)	5.26				防治山泥傾瀉工程正進行中。 

葵青區土木工程項目計劃及進度報告
(截至2025年8月31日止)

-E5-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責部門	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/備註
B867CL/甲級	青衣西路的工地平整及基礎設施工程	727.10	土木工程 拓展署	2024年8月	2029年第二季	工程包括在青衣西路旁平整約3公頃工地，並建造相關的護土牆和斜坡；建造1條行人天橋，橫跨青衣西路(包括相關的升降機設施)；在青衣西路近青康路建造1個交通燈號控制的路口，以接駁公營房屋發展項目的道路；以及進行相關的附屬工程。 工程已於2024年8月展開，預計在2029年完成。
B871CL/甲級	荃灣國瑞路公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程－第二期	119.20	土木工程 拓展署	2024年6月	2027年第四季	工程範圍包括－ (a) 興建一條橫跨青山公路－葵涌段的行人天橋及相關的升降機設施； (b) 擴闊國瑞路一段由安全貨倉至新豐中心之間的現有雙線不分隔行車道，當中包括取消現有近昇柏山的斑馬線並加設交通燈號控制過路處；及 (c) 進行相關附屬工程，包括排水、排污、供水和環境美化工程。 整項基礎設施工程預計於2027年第四季完成。

葵青區土木工程項目計劃及進度報告
(截至2025年8月31日止)

-E6-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責部門	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/備註
負責部門: 渠務署						
4465DS/甲級	九龍西部及荃灣鄉村污水收集系統 - 第2期 (第1部分)	198.7	渠務署	(待定) 2025年7月	(待定) 2029年	此項工程主要為九龍西部及荃灣鄉郊地區提供污水收集系統。此項工程會包括在九龍西部及荃灣未有敷設污水渠的四個鄉村/地區提供污水收集系統，其中有一個地區位於葵青區內。工程已於2025年7月展開，預計在2029年完成。
4391DS/丙級	九龍西部及荃灣鄉村污水收集系統 - 第2期 (第2部分)	待定	渠務署	待定	待定	此項工程主要為九龍西部及荃灣鄉郊地區提供污水收集系統。此項工程會包括在九龍西部及荃灣未有敷設污水渠的五個鄉村提供污水收集系統，其中有一個鄉村位於葵青區內，工程的設計工作現正進行中。
4389DS/甲級	九龍西部及荃灣污水系統改善工程 - 第2期	2,285.5	渠務署	(2020年7月) 2020年7月	(2026年第二季) 2026年第二季	此項工程主要是改善九龍西部及荃灣現有污水收集系統，當中包括改善葵青區內約3.9公里之現有污水渠。工程已於2020年7月展開，預計在2026年第二季完成。 其中區內石文徑、大隴街、藍田街後巷、禾塘咀街、工業街、打磚坪街及葵福路的污水渠工程已經完成。新葵街、梨貝街、青山公路-葵青段、梨木道、貨櫃碼頭路、葵泰路及荔景山路的污水渠工程正進行中。
4358DS/甲級	老圍, 川龍及九華徑舊村鄉村污水收集系統	168.0	渠務署	(2022年8月) 2022年8月	(2025年) 2025年	工程在葵青區內為九華徑舊村提供污水收集系統。工程已於2022年8月展開，預計在2025年第四季完成。

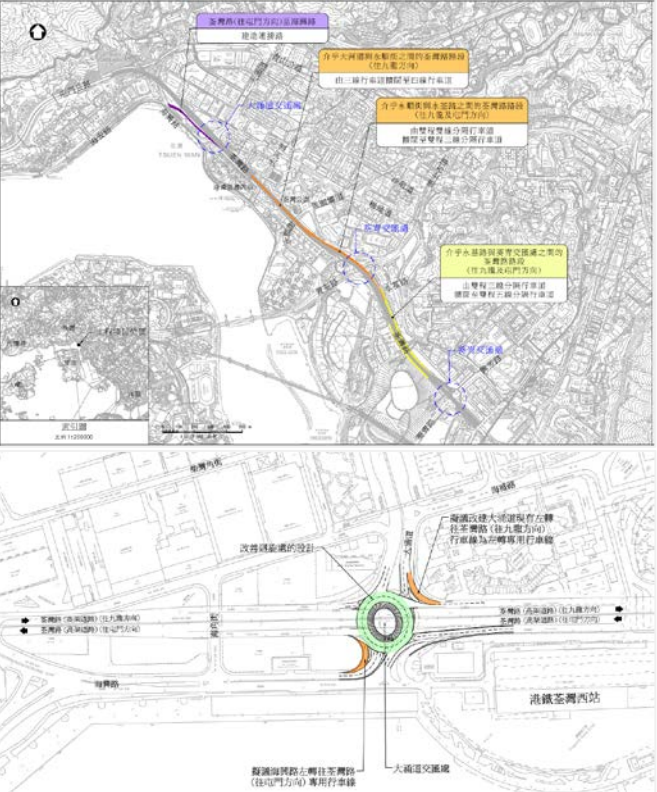
葵青區土木工程項目計劃及進度報告 (截至2025年8月31日止)

-E7-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責部門	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/備註
負責部門: 路政署						
6087TI	荃青交匯處改善工程	581.4	路政署	2024年4月	2027年	<p>工程主要包括於荃灣路(往屯門方向)引路建造左轉往青衣的專用行車線、擴建現有德士古道行車天橋、建造連接荃灣路(往九龍方向)下行斜路至德士古道的連接路、擴闊德士古道近山德士中心附近的行車線及改善迴旋處的設計。</p> <p>工程的建造合約已於2024年4月展開，預計於2027年完工。</p> <div style="text-align: center;">  <p>荃青交匯處改善工程 - 總平面圖</p> </div>

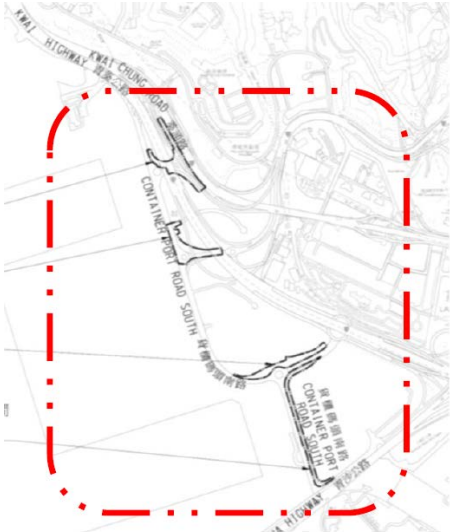
葵青區土木工程項目計劃及進度報告 (截至2025年8月31日止)

-E8-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責部門	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/備註
877TH	荃灣路擴闊及相關路口改善工程	檢討中	路政署	檢討中	檢討中	<p>擬議荃灣路擴闊及相關路口改善工程計劃已於2023年2月16日獲得葵青區議會轄下交通及運輸委員會的支持。隨後路政署於2023年8月根據《道路(工程、使用及補償)條例》(第370章)為擬議工程計劃刊憲，而擬議工程計劃亦已在2023年11月根據《道路(工程、使用及補償)條例》(第370章)獲授權進行。路政署的工程顧問現正進行勘查研究的餘下工作。</p> 

葵青區土木工程項目計劃及進度報告
(截至2025年8月31日止)

-E9-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責部門	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/備註
856TH/甲級	連接葵青交匯處上斜路至葵涌道的天橋	472	路政署	(2021年6月) 2021年6月	(2025年年中) 2026年年中	<p>工程於2021年6月展開。工程旨在紓緩葵青交匯處上斜路交通擠塞的情況，主要包括建造一條單線行車橋連接荃灣路南行快線到葵涌道，及另一條行車橋以擴闊連接葵青交匯處上斜路至葵涌道一段荃灣路南行線，以及其他附屬工程。當中包括新建橫跨葵涌道的行人天橋(編號NF530)及增設的兩組升降機已先後於2023年下旬及2024年1月完成及開放供公眾使用。而鄰近舊有行人天橋(編號NF303)的主橋已於2024年下旬完成拆卸工程。此外，兩條行車橋的地基、橋墩及橋身建造工程現正進行中，預計於2026年年內陸續完成。</p>
866TH/丙級	葵涌貨櫃碼頭南路及青衣青衣路道路改善工程	檢討中	路政署	檢討中	檢討中	<p>此項工程計劃主要優化現存迴旋處及周邊道路的運作效率，以改善該區的交通情況。</p> 

葵青區土木工程項目計劃及進度報告

(截至2025年8月31日止)

-E10-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責部門	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/備註
197TB/甲級	興盛路至大窩口道行人通道系統	192.5	路政署	(2023年第三季) 2023年第三季	(2026年第三季) 2026年第三季	工程計劃是建造一條行人通道系統，連接興盛路至大窩口道，為區內提供一條便利舒適的行人通道。工程計劃已於2023年第三季展開建造。
202TB/乙級	荔景山路至麗祖路升降機及行人通道系統	待定	路政署	待定	待定	工程計劃是建造一條行人通道系統，連接荔景山路至麗祖路，為區內提供一條便利舒適的行人通道。工程計劃已於2022年2月15日根據《道路(工程、使用及補償)條例》(第370章)完成刊憲。路政署會按既定程序向立法會財務委員會申請工程撥款，預計工程計劃可於2026年第三季展開。

葵青區土木工程項目計劃及進度報告
(截至2025年8月31日止)

-E11-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責部門	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/備註
203TB/甲級	葵涌大隴街至和宜合道升降機及行人通道系統	135.3	路政署	(2022年8月) 2022年8月	(2025年第三季) 2025年7月25日	<p>工程計劃是建造一組升降機及行人通道系統，連接和宜合道及大隴街，為區內居民提供一條舒適便捷的行人通道，亦為行動不便的人士、長者及使用嬰兒車的家長提供一條安全的無障礙行人通道。升降機及行人通道系統已於2025年7月25日完成及正式開放於予公眾使用。</p>  <p>圖例 LEGEND:</p> <ul style="list-style-type: none"> 高架行人通道 ELEVATED WALKWAY 升降機塔 LIFT TOWER 行人通道上蓋 WALKWAY COVER <p>Map labels include: 升降機塔A LIFT TOWER A, 升降機塔B LIFT TOWER B, 遊樂場出入口 PLAYGROUND ENTRANCE, 和宜合道 WO YI HOP ROAD, 大隴街 TAI LOONG STREET, 工程範圍 WORKS AREA, 石籬二街 SHEK LEI (II).</p>

葵青區土木工程項目計劃及進度報告

(截至2025年8月31日止)

-E12-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責部門	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/備註
213TB/丙級	葵涌石蔭路至大白田街自動扶梯系統	待定	路政署	待定	待定	<p>工程計劃在現有連接葵涌石蔭路至大白田街的樓梯，擬建有上蓋的自動扶梯系統。工程計劃已於2023年4月13日諮詢葵青區議會交通及運輸委員會，並獲得議員支持。路政署會按既定程序，並因應最新的發展情況，包括政策發展及政府財政狀況等，適當調整推展進程。</p> <p>運輸署及路政署現正就葵青區議會交通運輸委員會建議將擬建項目改為興建雙向扶手電梯的意見進行技術可行性評估，包括審視興建雙向扶手電梯所涉及的額外工程費用，以及檢視更改設計後的工程成本效益等。</p>
總目706 分目6100TX	由華星街至青山公路(葵涌段)自動扶梯系統	待定	路政署	待定	待定	<p>工程計劃在現有連接華星街及青山公路(葵涌段)的行人斜道上，擬建有上蓋的自動扶梯。工程計劃已於2022年10月13日諮詢葵青區議會交通及運輸委員會，並獲得議員支持。工程計劃已於2023年6月9日根據《道路(工程、使用及補償)條例》(第370章)獲授權進行，工程顧問公司正繼續進行詳細設計工作。</p>
總目706 分目6100TX	葵青區亨美街行人通道加建上蓋	7.5	路政署	(2024年第四季) 2024年12月	(2026年第四季) 2026年第二季	<p>路政署已於2024年8月批出相關工程合約，運輸署亦於2024年12月完成搬遷位於亨美街小巴士站的工作。相關工程已於2024年12月開展，現正進行上蓋的地基工程。</p>
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨涌美路近上高灘街的行人天橋 (結構編號：NF123) 加建升降機工程	52.0	路政署	(2023年第三季) 2023年第三季	(2027年第一季) 2027年第三季	<p>路政署工程合約已於2023年7月展開。1號升降機現正進行地基工程。2號升降機現正準備臨時交通安排的申請，獲批後將進行斜坡工程。</p>
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨涌美路近長康邨的行人天橋 (結構編號：NF124) 加建升降機工程	51.8	路政署	(2023年第三季) 2023年第三季	(2027年第一季) 2026年第三季	<p>路政署工程合約已於2023年7月展開。1號升降機現正進行地下管線改道工程。2號升降機現正進行電路安裝工作。</p>

葵青區土木工程項目計劃及進度報告 (截至2025年8月31日止)

-E13-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責部門	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/備註
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨青康路近青盛苑的行人天橋 (結構編號：NF125) 加建升降機工程	23.5	路政署	(2021年12月) 2021年12月	(2024年第四季) 2025年第四季	路政署工程合約已於2021年12月展開。1號升降機已完成機電設施安裝工程，現正進行安裝升降機及還原路面工程。2號升降機已完成升降機塔的主體結構，現正進行升降機塔玻璃及百葉窗安裝工程及護土牆建造的前期工程。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨青衣西路近青華苑的行人天橋 (結構編號：NF126) 加建升降機工程	26.4	路政署	(2021年12月) 2021年12月	(2024年第四季) 2025年第四季	路政署工程合約已於2021年12月展開。1號升降機已完成升降機塔的主體結構工程，現正進行升降機塔的鋼結構工程。2號升降機已完成升降機塔的主體結構工程，現正進行升降機塔玻璃及百葉窗安裝工程。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨楓樹窩路近清心街 (結構編號：NF213) 加建升降機工程	26.9	路政署	(2021年12月) 2021年12月	(2025年第二季) 2026年第二季	路政署工程合約已於2021年12月展開。1號升降機已完成升降機塔混凝土結構及樓梯的樁帽工程，現正進行供電電箱工程。2號升降機已完成樓梯迷你樁工程，現正進行樓梯樁帽挖掘工程。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨興芳路及葵富路的行人天橋 (結構編號：NF225) 加建升降機工程	46.6	路政署	(2023年第三季) 2023年第三季	(2027年第一季) 2027年第一季	路政署工程合約已於2023年7月展開。1號升降機已完成打樁工程，現正準備開展升降機塔樁帽工程。2號升降機的樹木移除申請、地基設計、挖掘和側向支撐設計已獲相關部門批准，隨後將展開樹木移除及打樁工程。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨興芳路近葵益道的行人天橋 (結構編號：NF233) 加建升降機工程	44.0	路政署	(2023年第三季) 2023年第三季	(2027年第一季) 2026年第三季	路政署工程合約已於2023年7月展開。1號升降機現正進行地基工程。2號升降機現正進行地基工程。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨楓樹窩路近青衣鄉事委員會的行人天橋 (結構編號：NF215) 加建升降機工程	24.9	路政署	(2021年12月) 2021年12月	(2025年第二季) 2024年第四季	路政署工程合約已於2021年12月展開。兩部升降機已於2024年12月31日開放予公眾使用。

葵青區土木工程項目計劃及進度報告

(截至2025年8月31日止)

-E14-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責部門	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/備註
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨安捷街近安蔭商場的行人天橋 (結構編號：NF275) 加建升降機工程	20.1	路政署	(2021年12月) 2021年12月	(2025年第一季) 2026年第三季	路政署工程合約已於2021年12月展開。 整項工程主要可以分為兩部分，分別是升降機塔及升降機連接平台的建造。 升降機塔方面，承建商已完成升降機塔樁帽工程。現正進行升降機塔主體工程。 至於升降機連接平台方面，承建商已完成地基工程，現正開展升降機連接平台的樁帽工程。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨青衣青敬路近青衣公園的行人 天橋(結構編號：NF322) 加建升降 機工程	43.7	路政署	(2023年第三季) 2023年第三季	(2027年第一季) 2025年第四季	路政署工程合約已於2023年7月展開。1號升降機已完成升降機塔及連接平台主體結構的吊裝工序，現正準備開展玻璃/鋁板及百葉窗的安裝工程。2號升降機準備開展升降機塔及連接平台主體結構的吊裝工序。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨青敬路近宏福花園的行人天橋 (結構編號：NF323) 加建升降機工程	21.5	路政署	(2021年12月) 2021年12月	(2024年第四季) 2025年第四季	路政署工程合約已於2021年12月展開。承建商現正安裝玻璃及百葉窗工程及樓梯重建工程，準備展開安裝升降機及相關機電工程。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 青衣青綠街近青衣市區診所的行人 天橋(結構編號：NF325) 加建升降 機工程	21.1	路政署	(2021年12月) 2021年12月	(2024年第四季) 2025年第三季	路政署工程合約已於2021年12月展開。升降機塔玻璃及百葉窗工程已完成，現正進行安裝升降機及還原路面的前期準備工作。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨青山公路 - 葵涌段的大窩交匯處 的高架行人道(結構編號：N423) 加建升降機工程	43.7	路政署	(2023年第三季) 2023年第三季	(2027年第一季) 2025年第四季	路政署工程合約已於2023年7月展開。1號升降機已完成樁帽工程，現正進行建造升降機塔的主體結構及連接橋的支撐柱工程。2號升降機已完成升降機塔的主體結構及護土牆，現正進行安裝升降機工程。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨青衣鄉事會路近青衣分區警署 的行人天橋(結構編號：NF292) 加 建升降機工程	20.9	路政署	(2021年12月) 2021年12月	(2025年第一季) 2026年第三季	路政署工程合約已於2021年12月展開。升降機塔打樁工程及集水坑已完成，現正進行樁帽工程。

葵青區土木工程項目計劃及進度報告

(截至2025年8月31日止)

-E15-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責部門	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/備註
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨青敬路近長安邨安湖樓的行人 天橋(結構編號: K&T03) 加建升降 機工程	25.0	路政署	(2023年第三季) 2023年第三季	(2027年第一季) 2027年第一季	路政署工程合約已於2023年7月展開。1號升降機現正進行地下設施改道工程。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨葵仁路近新都會廣場的行人天 橋(結構編號: K&T04) 加建升降機 工程	25.1	路政署	(2023年第三季) 2023年第三季	(2027年第一季) 2026年第二季	路政署工程合約已於2023年7月展開。1號升降機現正進行地下設施改道工程。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨青敬路連接青衣城及青衣公園 的行人天橋(結構編號: K&T05) 加 建升降機工程	24.0	路政署	(2023年第三季) 2023年第三季	(2027年第一季) 2024年第四季	路政署工程合約已於2023年7月展開。1號升降機已開放使用。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃 橫跨大白田街連接石蔭邨及石蔭東 邨的行人天橋(結構編號: K&T06) 加建升降機工程	26.1	路政署	(2023年第三季) 2023年第三季	(2027年第一季) 2026年第二季	路政署工程合約已於2023年7月展開。1號升降機現正進行電車泊位的臨時搬遷工作，完成後將開展地基工程。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃下的「特別 計劃」 橫跨大窩口道連接大窩口商場及大 窩口邨富強樓的行人天橋(結構編 號: TWH01)	14.8	路政署	(2024年第三季) 2024年第三季	(2027年第二季) 2027年第二季	路政署工程合約已於2024年8月展開。承建商已完成地基探土和移除樹木工作，現與地下公用設施代表商討改道工程。
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃下的「特別 計劃」 橫跨現有道路連接石籬商場一期、 石籬(一)邨石泰樓及石安樓的行人 天橋(結構編號: SL16)	14.9	路政署	(2024年第三季) 2024年第三季	(2028年第一季) 2028年第一季	路政署工程合約已於2024年8月展開。承建商已完成地基探土工作，已與業權人代表取得共識進一步擴大工地圍封範圍以進行探坑挖掘，確認現有的地下公用設施及其所需的遷移和改道工程。

葵青區土木工程項目計劃及進度報告

(截至2025年8月31日止)

-E16-

工程編號/ 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	負責部門	動工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	完工日期 (前訂計劃) 最新估計/ 實際日期	進度/備註
總目706 分目6101TX	「人人暢道通行」計劃下的「特別計劃」 橫跨青綠街近青怡花園的行人天橋 (結構編號：NF214)	29.2	路政署	(2024年第三季) 2024年第三季	(2027年第二季) 2027年第二季	路政署工程合約已於2024年8月展開。承建商已圍封工地和正進行探坑挖掘，以確認現有的地下公用設施及其所需的遷移和改道工程。
