

深水埗區議會交通運輸委員會會議
運輸署 / 路政署過去兩個月內完成、正在施工或規劃中的區域交通改善工程項目及時間表 (截至2025年09月16日)

項目	地點	擬建的交通改善工程項目	動工日期	預計完工日期	詳細備註	完工相片(已完工項目) / 圖則編號(未完工項目)	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
1	汝州街與石硤尾街交界	擴闊行人過路處 (「香港好·易行」計劃)	2025年6月初	2025年8月底	工程已於2025年8月完成		余威豪先生 (2399 2479)	李志豪先生 (2707 7421)
2	郝德傑道	增設避車處	2025年6月中	2025年9月中	工程已於2025年8月完成		潘澄先生 (2399 2478)	李志豪先生 (2707 7421)
3	大埔道近爾登豪庭	髹上道路標記	2025年7月中	2025年8月底	工程已於2025年8月完成		潘澄先生 (2399 2478)	李志豪先生 (2707 7421)

深水埗區議會交通運輸委員會會議


運輸署 / 路政署過去兩個月內完成、正在施工或規劃中的區域交通改善工程項目及時間表 (截至2025年09月16日)

項目	地點	擬建的交通改善工程項目	動工日期	預計完工日期	詳細備註	完工相片(已完工項目) / 圖則編號(未完工項目)	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
4	福榮街近東沙島街	增設欄杆	2025年7月初	2025年9月中	工程已於2025年8月完成		余威豪先生 (2399 2479)	李志豪先生 (2707 7421)
5	南昌街近大坑西街	調整觸覺引路帶走線	2025年7月初	2025年8月底	工程已於2025年8月完成		余威豪先生 (2399 2479)	李志豪先生 (2707 7421)
6	月輪街近荔枝角道	更換欄杆	2025年7月初	2025年7月底	工程已於2025年7月完成		潘澄先生 (2399 2478)	吳麗玲女士 (2707 7332)

深水埗區議會交通運輸委員會會議

運輸署 / 路政署過去兩個月內完成、正在施工或規劃中的區域交通改善工程項目及時間表 (截至2025年09月16日)

項目	地點	擬建的交通改善工程項目	動工日期	預計完工日期	詳細備註	完工相片(已完工項目) / 圖則編號(未完工項目)	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
7	幸福街近發祥街	增設行人過路處	2025年7月中	2025年10月底	工程已於2025年9月完成		潘澄先生 (2399 2478)	吳儷羚女士 (2707 7332)
8	荔灣道近百老匯街	增設殘疾人士專用泊車位	2025年7月底	2025年10月底	工程已於2025年8月完成		潘澄先生 (2399 2478)	吳儷羚女士 (2707 7332)
9	保安道近昌華街	過路處髹上紅褐色道路標記	2025年10月初	2025年10月底	工程規劃中	K240951.01	潘澄先生 (2399 2478)	吳儷羚女士 (2707 7332)
10	興華街西近荔盈街的高架天橋橋底	增設咪錶位及電單車泊車位	2025年9月初	2026年3月初	工程進行中	K201025.02	潘澄先生 (2399 2478)	吳儷羚女士 (2707 7332)

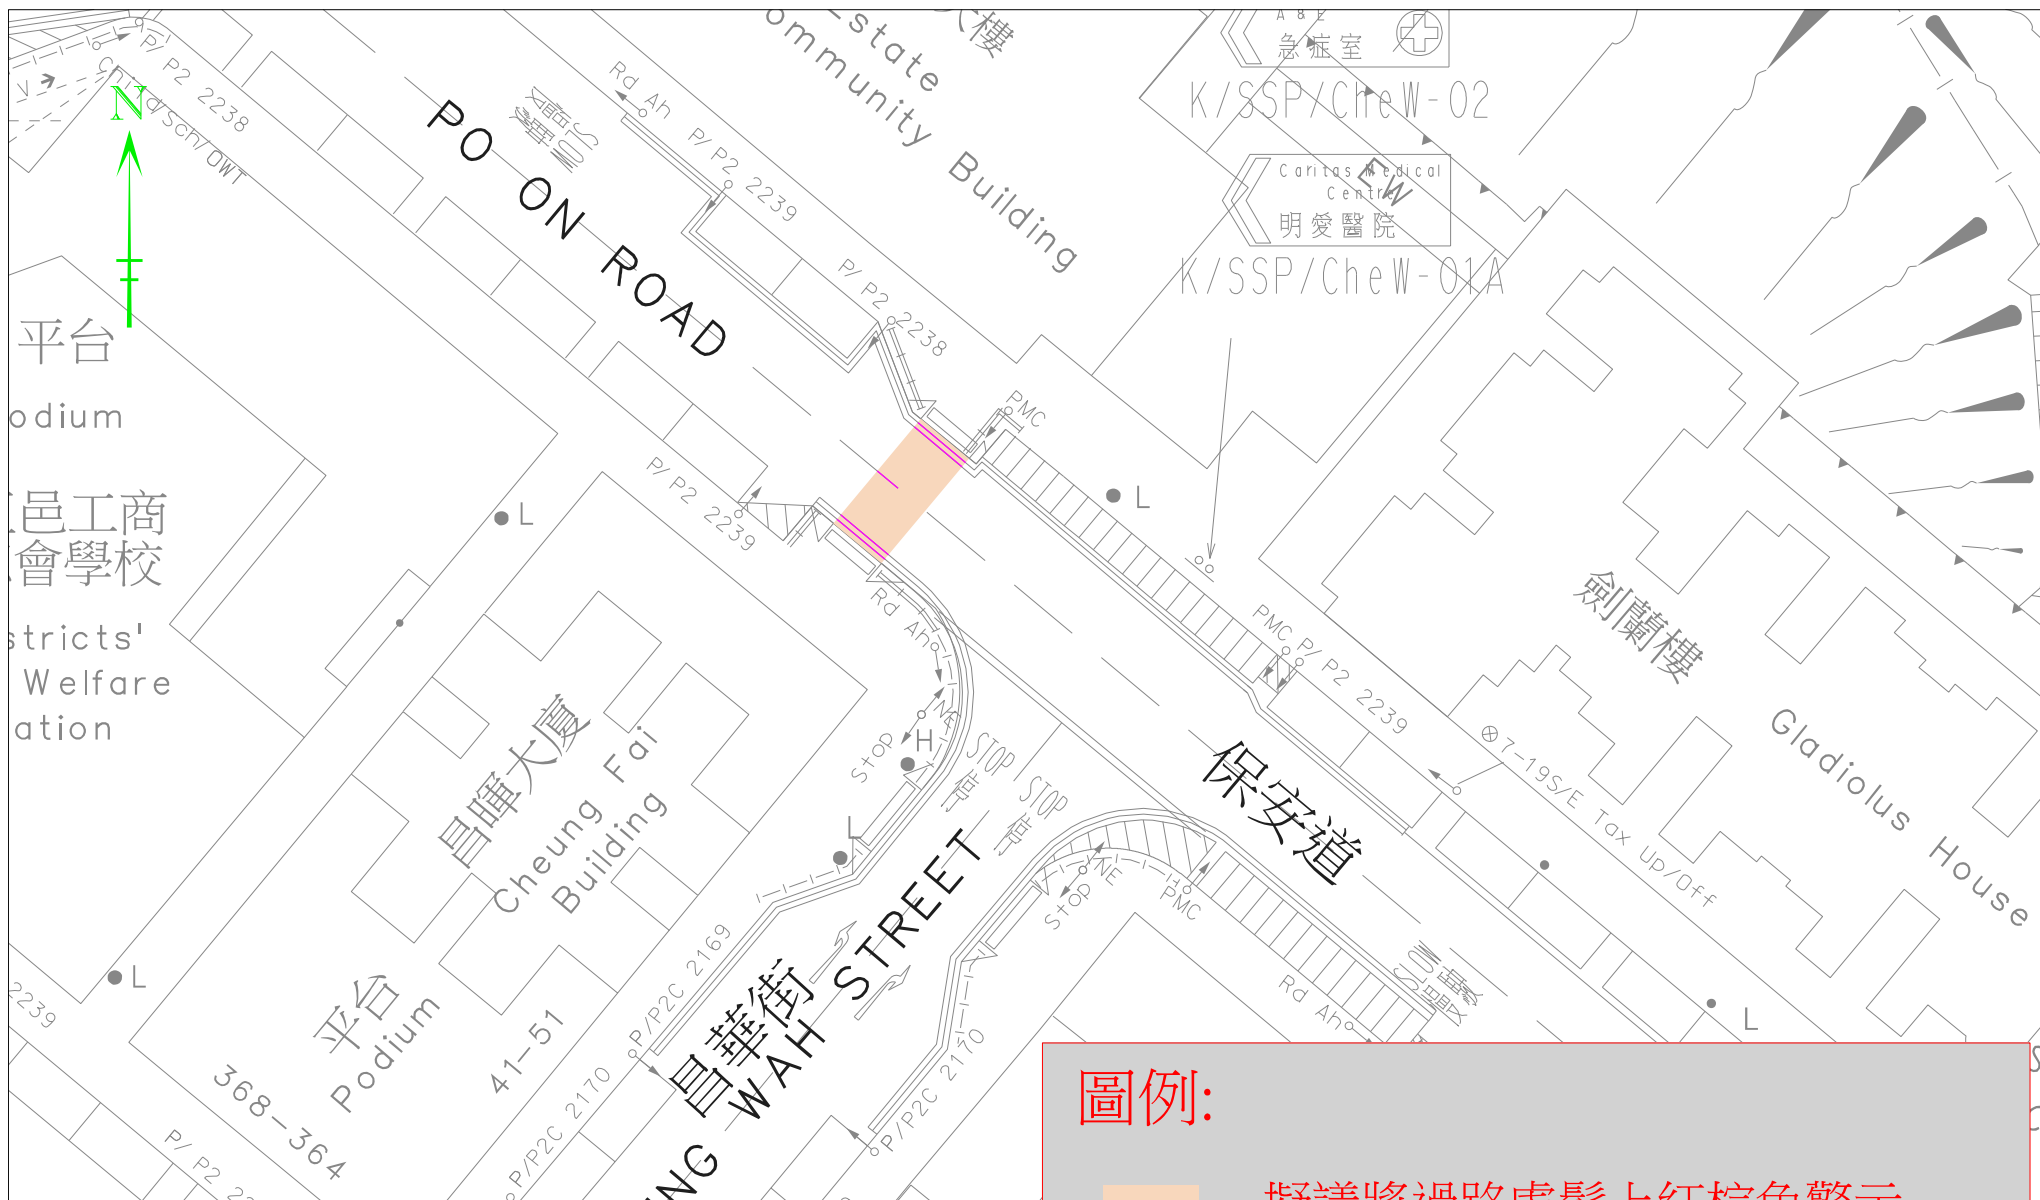

項目9: 保安道近昌華街
過路處髹上紅褐色道路標記

圖例:

擬議將過路處髹上紅棕色警示

擬議於紅棕色警示上重髹道路標記

