

屯門區議會(2024-2027 年)
地區設施及工程委員會第八次會議
(2025 年 3 月 18 日)



主要工程項目進度報告

土木工程拓展署
西拓展處
2025 年 3 月

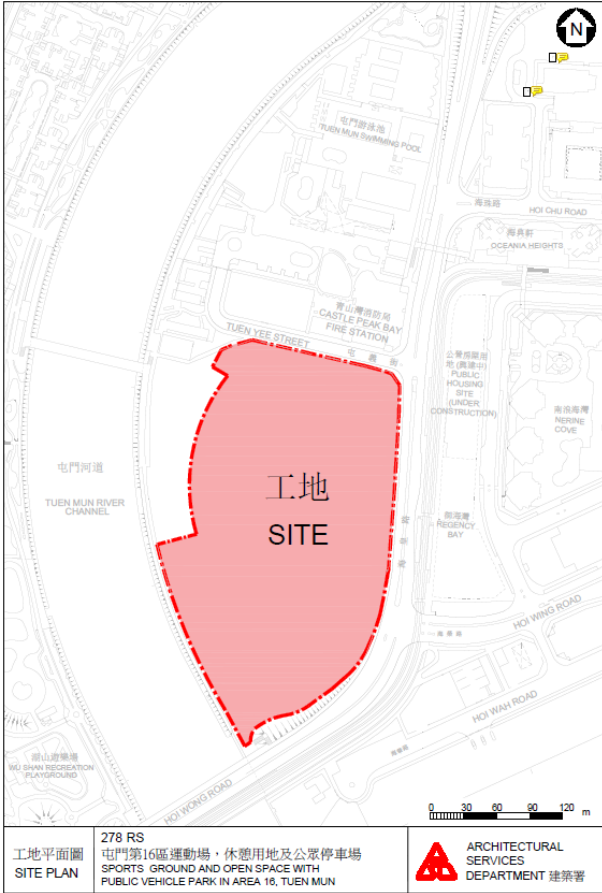
屯門區主要工程項目進度報告（截至 2025 年 2 月 15 日止）

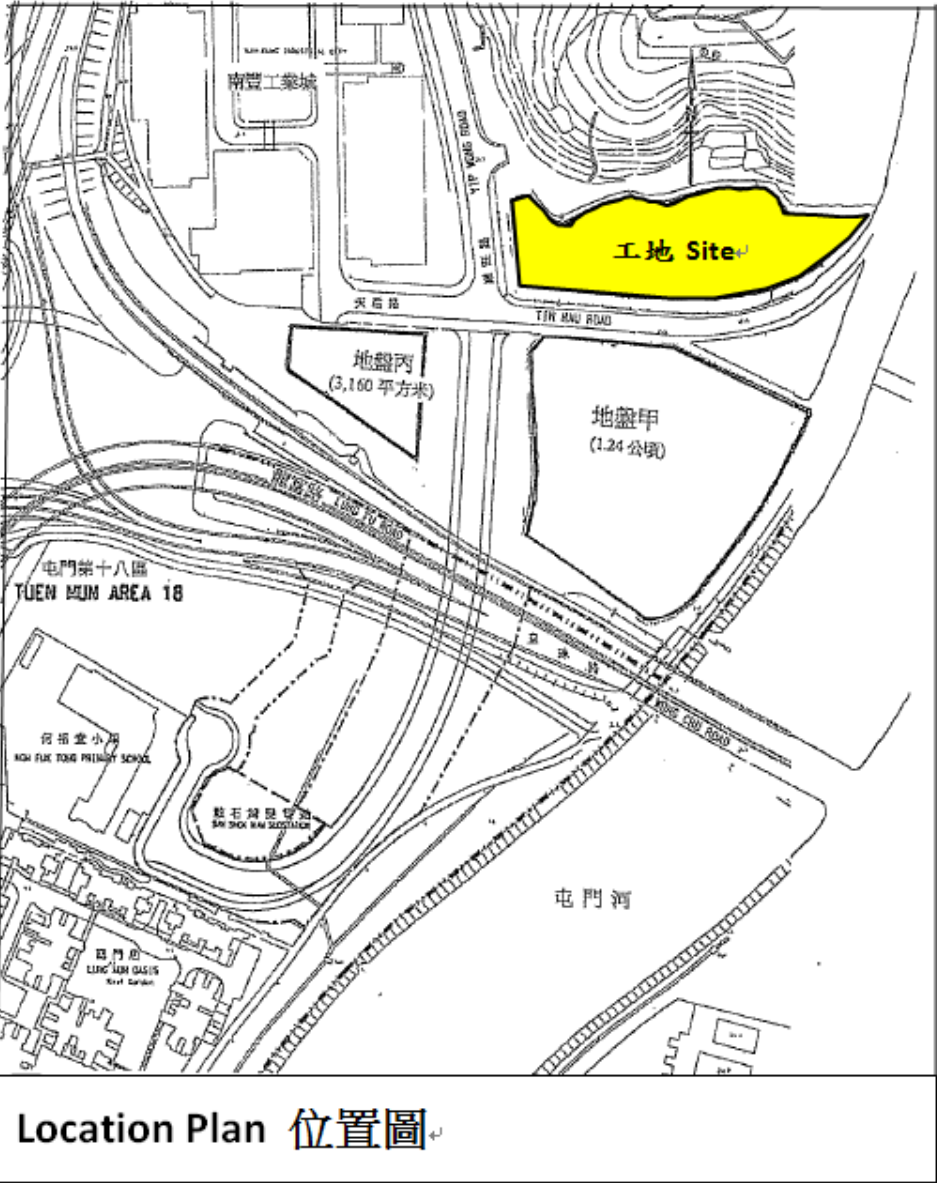
<u>目錄</u>	<u>頁數</u>
(1) 康樂及文化設施項目	3
(2) 道路工程項目	11
(3) 渠務工程項目	12
(4) 水務工程項目	16
(5) 其它工程項目	17

(1) 康樂及文化設施項目

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
第一階段 不適用 (小型建築工程)	第一階段 屯門第 27 區 工地乙二休憩 用地	25	第一階段 康樂及文化 事務署、 建築署	第一階段 (08/2021) 08/2021	第一階段 (08/2023) (工程項目已整體 大致完成，預計 於 2025 年中開 放供市民使用)	屯門區議會轄下的地區設施管理委員會(地委會)於2019年4月2日支持工程計劃修訂的擬建設施及分階段推行工程計劃，以讓市民可盡早使用部分設施。第一階段先由康文署推展，在工地乙二興建休憩設施，包括燈塔(觀賞性質)及觀景台、園景及洗手間設施。第二階段由運輸署負責推展，計劃在工地甲和工地乙一興建公眾停車場和靜態休憩設施，如園景、兒童遊樂處、健身角、太極廣場及海濱長廊、設有避雨亭的休憩處及輔助設施等。	
第二階段 3029TP/C	第二階段 屯門第 27 區 (工地甲及乙一)休憩用地及公眾停車場	待定	第二階段 運輸署、 康樂及文化 事務署、 建築署	第二階段 檢討中	第二階段 檢討中	康文署於2021年2月9日及4月2日就第一階段工程(乙二休憩用地)概念設計徵詢地委會意見，地委會支持沒有燈塔的設計方案，工程計劃已於2021年8月展開，現時工程項目已整體大致完成，預計於2025年中開放供市民使用。 運輸署及康文署亦已於2020年6月2日就第二階段工程計劃的擬建設施取得地委會的支持。第二階段工程需向城市規劃委員會申請規劃許可方能推展，建築署現正檢視早前已完成的技術可行性研究，並進行概念設計。待相關初步設計及技術研究完成後，我們會再徵詢委員的意見。	

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
不適用 (小型建築工程)	屯門第 6 區休憩用地公園建造工程	29.5	康樂及文化事務署、 建築署	(12/2022) 12/2022	(12/2024) 04/2026	為能在工程計劃用地提供更多類型的康樂設施予附近的居民及學生使用，康文署於 2018 年 4 月 10 日就更新的工程擬建設施諮詢地委會的意見，並於 2018 年 8 月 21 日向地委會報告進展。更新的工程擬建設施包括一個多用途硬地球場（可作一個 7 人足球場或兩個 5 人足球場或兩個手球場）及有蓋座位、健身設施、園景及輔助設施。 康文署於 2022 年 8 月 9 日就工程設計徵詢地環會意見並獲支持，工程已於 2022 年 12 月展開。在施工過程中，勘測結果顯示，政府雨水井的接入口與項目工地相距較遠，而且因沿路的地面及地下條件複雜，排水管道鋪設亦太貼近輕便鐵路路軌，增加施工難度，所以地下雨水排水管道需要途經附近學校停車場的地底(一個相對可行的方案)，施工期可能因而延長。康文署於 2024 年 11 月 19 日向地區設施及工程委員會報告進度及介紹最新的概念設計，項目獲委員支持。另外，項目正在申請額外款項，工程設計亦會稍作修改。	

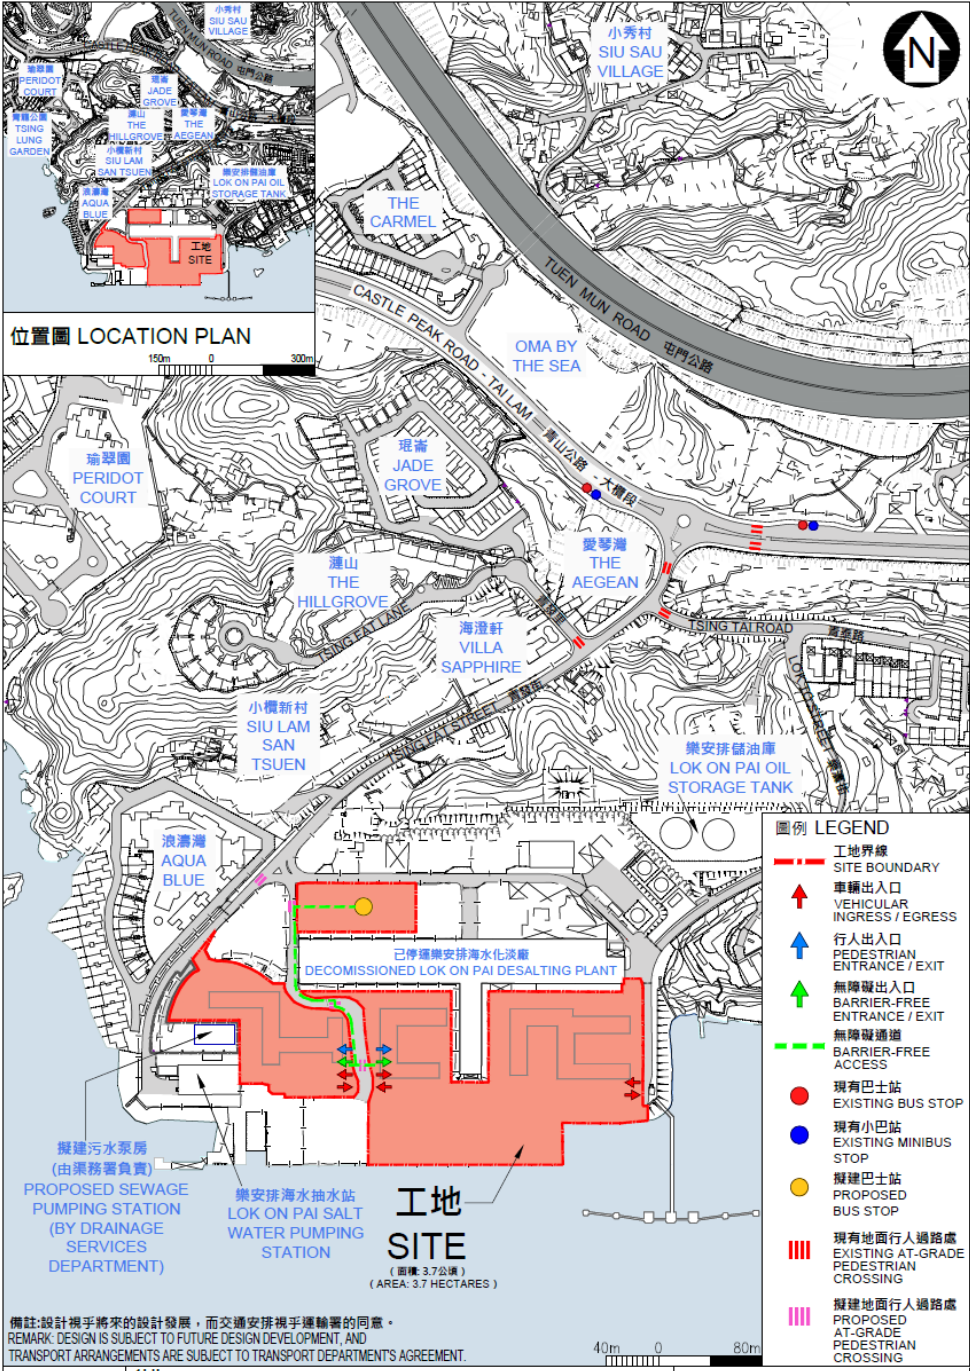
工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
3278RS/B	屯門第16區運動場、休憩用地及公眾停車場	待定	康樂及文化事務署、運輸署、建築署	檢討中	檢討中	工程擬建設施包括一條 400 米長的 8 線全天候跑道以及熱身區，一個 11 人天然草地場及一個 7 人天然草地場可作田徑及足球活動場地、一個設有 5 000 個座位的有蓋看台、休憩用地及輔助設施等。按照 2018 年施政報告中提出「一地多用」的原則，運輸署建議於工程計劃中增建公眾停車場，提供約 500 個泊車位，以切合該區的泊車需求。康文署及運輸署於 2019 年 2 月 12 日就增建公眾停車場諮詢地委會的意見，並獲得地委會支持。 康文署及運輸署於 2022 年 10 月 11 日就工程計劃的規劃概念徵詢地環會的意見並獲支持。 工程項目用地現時用作一系列用途，包括九巴車廠、城巴車廠、建造業議會屯門訓練及測驗中心及收費公眾停車場。其中在搬遷兩間巴士車廠方面，之前數個潛在選址均因為其他互相競爭的用地需求或技術限制而未能落實。相關政府部門以及巴士公司正積極商討處理方案，盡早落實兩間巴士車廠的重置方案，致力減少對工程計劃時間表的影響。	

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
3030TP/C	屯門第17區休憩用地及公眾停車場	待定	運輸署、康樂及文化事務署、建築署	檢討中	檢討中	康文署及運輸署於2019年4月及6月就工程計劃修訂的擬建範圍和設施諮詢地委會，並獲支持。修訂的擬建設施包括公眾停車場、一個多用途硬地球場(可作一個五人足球場或一個手球場)及50個座位、一個滑板場、一個籃球場及輔助設施。康文署及運輸署現正籌劃有關工程計劃，待初步設計完成後，會再徵詢委員的意見。	

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
75MC/A	屯門第 29 區西社區健康中心暨安老院舍	1,046.40	建築署、房屋署	(2019 年第 2 季) 06/2019	(2024 年) 07/2025	擬議工程的範圍包括建造以下佔地約 7500 平方米的社區健康中心暨安老院舍、附屬設施和附屬工程： (a) 1 所附有裝修的社區健康中心 (b) 1 所設有 100 個宿位的安老院舍 (c) 附屬設施，包括機電房、升降機及大堂、水電錶房、停車位及上落客貨車位等；以及 (d) 附屬工程，包括相關排水工程、排污工程、道路工程、斜坡鞏固工程及屯門西北游泳池停車場範圍內的改建工程。 項目工程已於 2019 年 6 月展開。整體工程現已完成 87.07%。按目前計劃，項目預計於 2025 年 7 月完成。	

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
2HL/A	推展「簡約公屋」項目 - 屯門第3A區	1,661.2 (費用只包括建築及相關工程，不包括由其他部門負責之基建工程)	房屋局、建築署	(2023 年第 4 季) 12/2023	(2025 年第 4 季) 2025 年第 4 季	項目將提供約 1 900 個「簡約公屋」單位及相關的社區配套設施。 項目工程已於 2023 年 12 月展開並按計劃推展。預計最早於 2025 年第四季完工。	位置圖 LOCATION PLAN 圖例 LEGEND - 工地界線 SITE BOUNDARY - 車輛出入口 VEHICULAR INGRESS / EGRESS - 行人出入口 PEDESTRIAN ENTRANCE / EXIT - 無障礙出入口 BARRIER-FREE ENTRANCE / EXIT - 無障礙通道 BARRIER-FREE ACCESS - 現有巴士站 EXISTING BUS STOP - 現有小巴站 EXISTING MINIBUS STOP - 有蓋行人天橋 COVERED PEDESTRIAN FOOTBRIDGE - 現有地面行人過路處 EXISTING AT-GRADE PEDESTRIAN CROSSING 備註：設計視乎將來的設計發展，而交通安排視乎運輸署的同意。 REMARK: DESIGN IS SUBJECT TO FUTURE DESIGN DEVELOPMENT, AND TRANSPORT ARRANGEMENTS ARE SUBJECT TO TRANSPORT DEPARTMENT'S AGREEMENT. 工地平面圖 SITE PLAN 1HL 推展「簡約公屋」項目 - 屯門第3A區 IMPLEMENTATION OF LIGHT PUBLIC HOUSING - TUEN MUN AREA 3A ARCHITECTURAL SERVICES DEPARTMENT 建築署

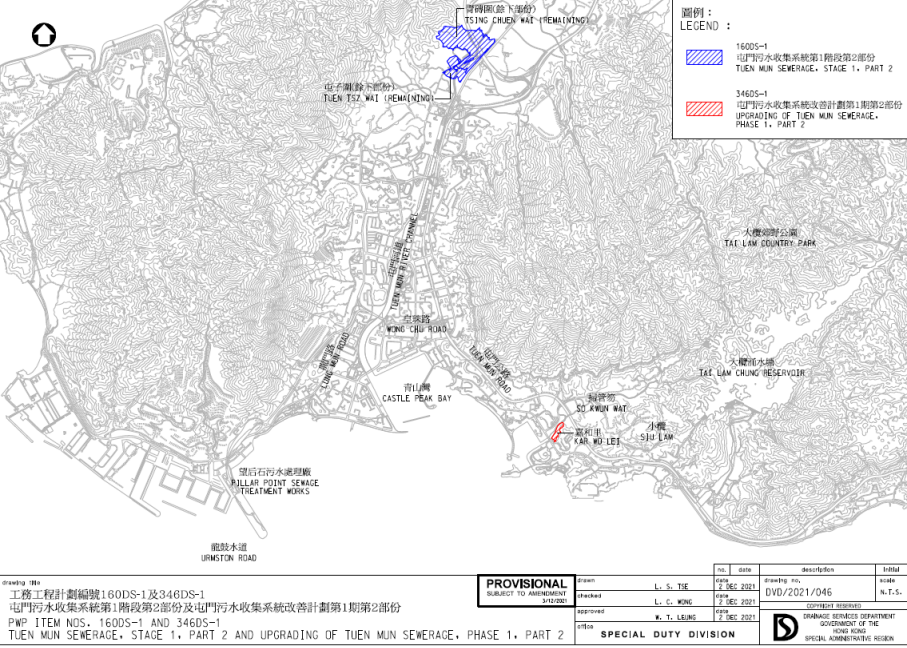
工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
1HL/A	推展「簡約公屋」項目 - 屯門第 54 區	4,226.2 (費用只包括建築及相關工程，不包括由其他部門負責之基建工程)	房屋局、建築署	(2024 年第二季) 03/2024	(第一期: 最早於 2026 年第三季完工 第二期: 最早於 2026 年第四季完工) (第一期: 最早於 2026 年第三季完工 第二期: 最早於 2026 年第四季完工)	項目將提供約 5 620 個「簡約公屋」單位及相關的社區配套設施。 項目工程已於 2024 年 3 月展開並按計劃推展。第一期及第二期分別預計最早於 2026 年第三季及 2026 年第四季完工。	

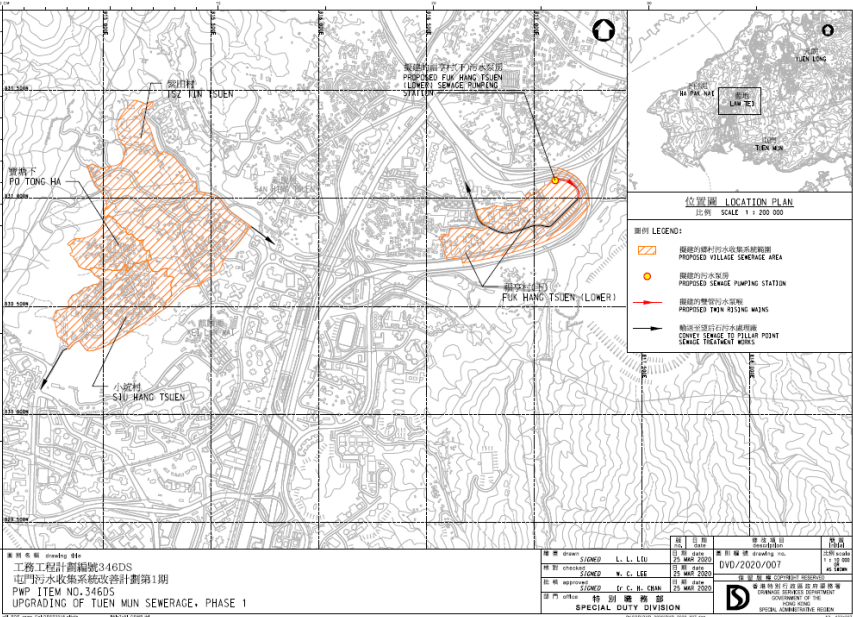
工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
1HL/A	推展「簡約公屋」項目- 小欖樂安排	3,124.8 (費用只包括建築及相關工程，不包括由其他部門負責之基建工程)	房屋局、建築署	(2024 年第二季) 04/2024	(2026 年第三季) 2026 年第三季	項目將提供約 4 200 個「簡約公屋」單位及相關的社區配套設施。 項目工程已於 2024 年 4 月展開並按計劃推展。預計最早於 2026 年第三季完工。	 位置圖 LOCATION PLAN 圖例 LEGEND --- 工地界線 SITE BOUNDARY ↑ 車輛出入口 VEHICULAR INGRESS / EGRESS ↑ 行人出入口 PEDESTRIAN ENTRANCE / EXIT ↑ 無障礙出入口 BARRIER-FREE ENTRANCE / EXIT --- 無障礙通道 BARRIER-FREE ACCESS ● 現有巴士站 EXISTING BUS STOP ● 现有小巴站 EXISTING MINIBUS STOP ● 擬建巴士站 PROPOSED BUS STOP - 現有地面行人過路處 EXISTING AT-GRADE PEDESTRIAN CROSSING - 擬建地面行人過路處 PROPOSED AT-GRADE PEDESTRIAN CROSSING 工地 SITE (面積: 3.7 公頃) (AREA: 3.7 HECTARES) 備註:設計視乎將來的設計發展, 而交通安排視乎運輸署的同意。 REMARK: DESIGN IS SUBJECT TO FUTURE DESIGN DEVELOPMENT, AND TRANSPORT ARRANGEMENTS ARE SUBJECT TO TRANSPORT DEPARTMENT'S AGREEMENT. 1HL 推展「簡約公屋」項目- 小欖樂安排 IMPLEMENTATION OF LIGHT PUBLIC HOUSING - LOK ON PAI, SIU LAM ARCHITECTURAL SERVICES DEPARTMENT 建築署

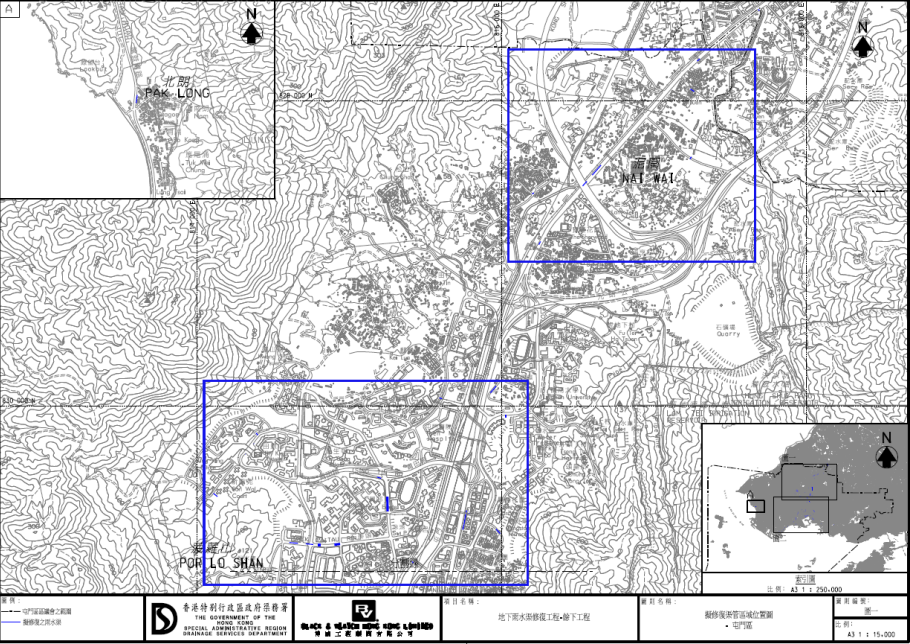
(2) 道路工程項目

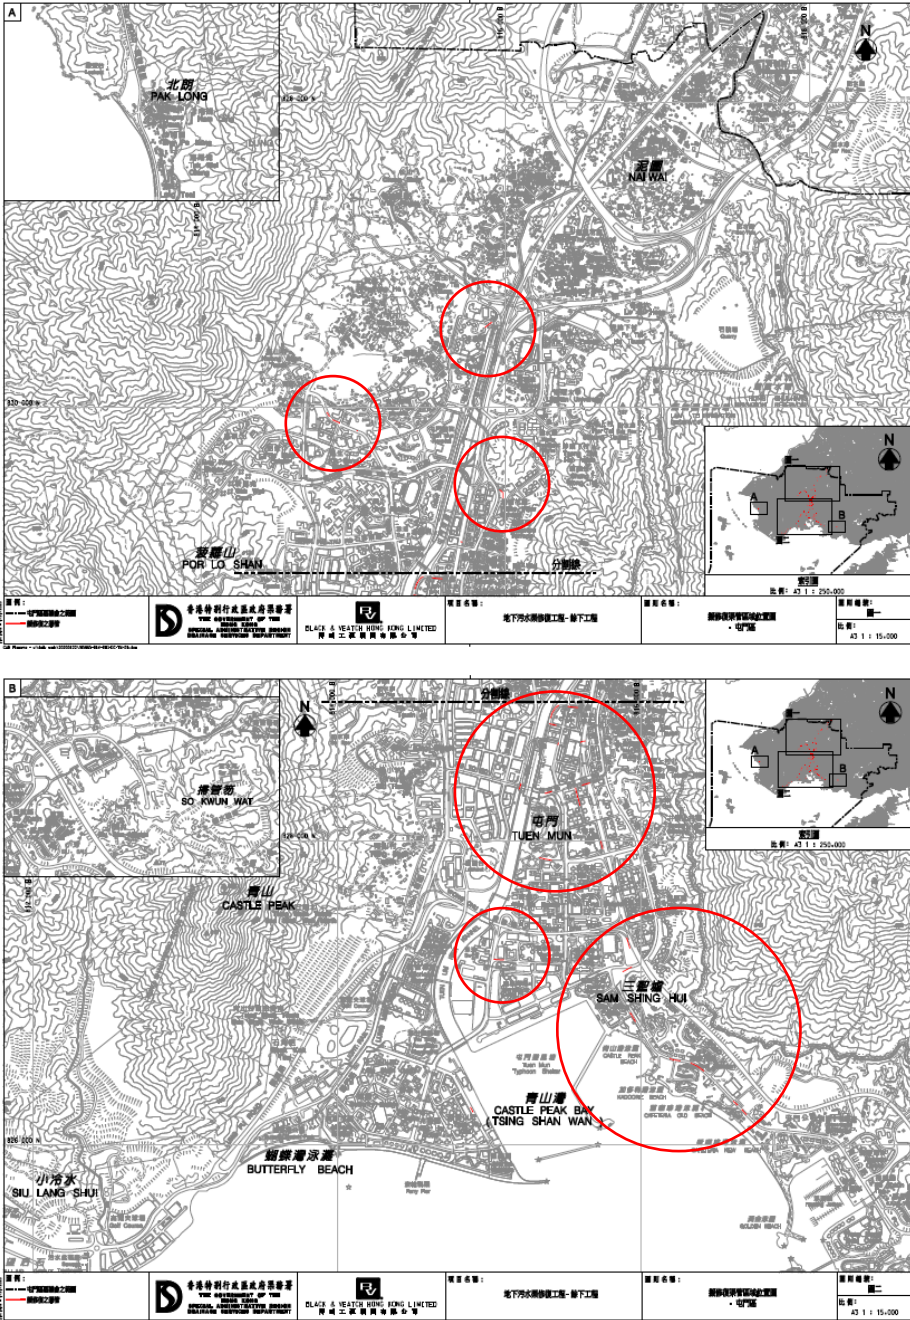
工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首 長及負責 部門/機構	(原訂計劃動工 日期) 最新估計/實際 日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日 期) 最新估計/實際日 期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
853TH/A	青山公路青山灣 段擴闊工程	755.2	路政署	(11/2020) 11/2020	(最快於 2024 年) 8/2024	路政署在 2020 年年中按程序為本工程計劃向立法會申請撥款，並於 2020 年 7 月 10 日獲得立法會財務委員會批准撥款。路政署為工程合約展開招標後，已於 2020 年 11 月 30 日開展工程，以盡快改善青山公路青山灣段的交通情況。擴闊工程已於 2024 年 8 月大致完成。	

(3) 渠務工程項目

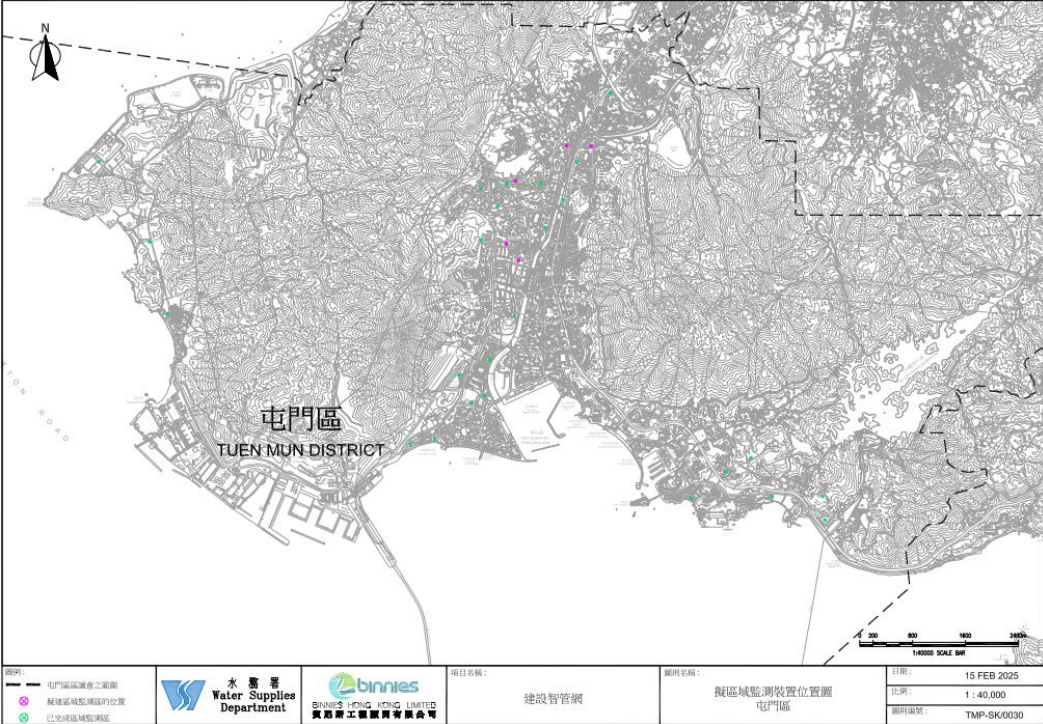
工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首 長及負責 部門/機構	(原訂計劃動工 日期) 最新估計/實際 日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日 期) 最新估計/實際日 期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
4160DS/C	屯門污水收集系 統工程－第 1 階 段	檢討中	渠務署	檢討中	檢討中	工程主要包括為青磚圍及屯子圍敷設公共 污水收集系統。現正檢視工程的設計和時間 表。	

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
4435DS/A	屯門北部鄉村污水收集系統	431.2	渠務署	(1/2021) 1/2021	(12/2024) 12/2024	此工程項目主要在福亨村(下)興建一所污水泵房及相關壓力污水管道，為小坑村、福亨村(下)、紫田村及寶塘下敷設公共污水收集系統，將此地區所產生的污水輸送到望后石污水處理廠處理和排放，以避免流入屯門河道。工程合約(DC/2020/07)已於 2021 年 1 月開始，相關工程已完成超過 95%，整項工程已於 2024 年第 4 季大致完成。	

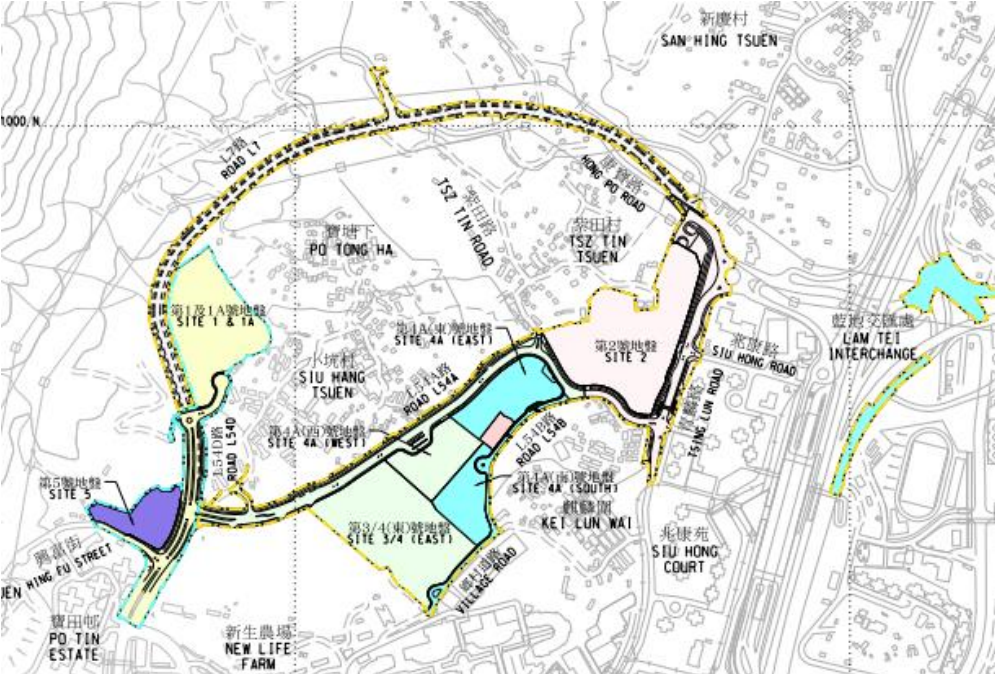
工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
4172CD/A	地下雨水渠修復工程-餘下工程	702.7	渠務署	(06/2021) 06/2021	(2025 年第 4 季) 2025 年第 4 季	餘下工程會為屯門、中西區、灣仔、東區、南區、離島、元朗、北區、大埔、沙田、觀塘及西貢區修復約 19 公里長的地下雨水渠。當中，會為屯門區內長約 1.2 公里的地下污水渠及雨水渠進行修復工程。 工程合約(DC/2020/09)已於 2021 年 6 月 28 日開始，相關的渠管修復工程分別已完成約 78%，進度合乎預期，整項工程預計於 2025 年第四季完成。	

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
4414DS/A	地下污水渠修復工程-餘下工程	306.4	環境及生態局 渠務署	(09/2023) 09/2023	(09/2027) 09/2027	餘下工程包括修復位於中西區、灣仔區、東區、南區、離島區、屯門區、元朗區、北區、大埔區、沙田區、觀塘區及西貢區共約 4.9 公里長的地下污水渠。當中，會為屯門區內約 1.4 公里長的地下污水渠進行修復。 工程合約(DC/2023/10)已於 2023 年 9 月 6 日開始，相關的渠管修復工程分別已完成約 28%，整項工程預計於 2027 年第三季完成。	

(4) 水務工程項目

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長 及負責 部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
196WC/A	建設智管網－餘下工程	1,236.0	水務署	(2020 年第 3 季) 2020 年第 3 季	(最快於 2024 年) 2025 年第 1 季	工程項目包括在屯門區建造約 30 個監測區域。 截至 2025 年 2 月 15 日，屯門區已有 25 個監測區域完成建造。整項工程包括屯門區內餘下的監測區域預計會於 2025 年第 1 季前相繼完成。	

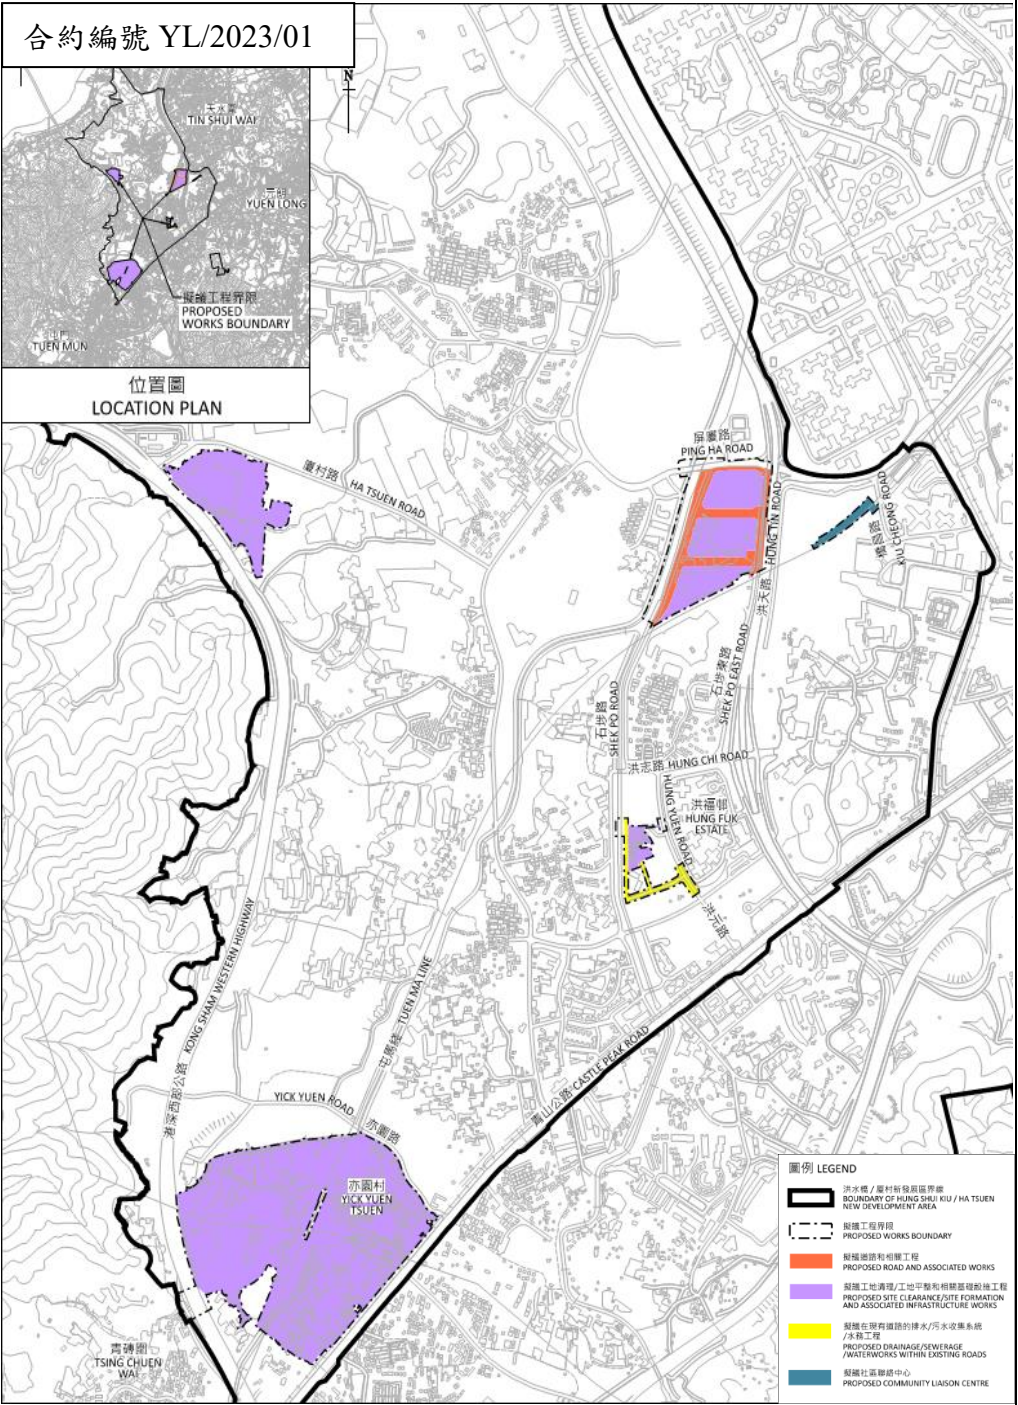
(5) 其它工程项目

工程編號及級別	工程名稱	預計費用（百萬元）	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
請參閱“工程內容/備註”欄	屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程第 1 期及第 2 期	請參閱“工程內容/備註”欄	土木工程拓展署	(09/2011) 09/2011	請參閱“工程內容/備註”欄	屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程分兩期進行。 第 1 期 第 1 階段：工程主要包括第 1 及 1A 號工地的土地平整及相關基建工程。工程已於 2015 年 11 月展開，有關工程已於 2020 年 6 月大致完成，而接駁新發展區至現有交通網絡的新地區幹道(興貴街伸延部分)亦已於 2020 年 11 月起開放給公眾人士使用。(788CL/A 號工程計劃) 第 2 階段：請參閱 666CL 號工程計劃的進度報告。 第 2 期 第 1 階段：第 2 號工地的土地平整及相關基建工程已於 2011 年 9 月展開。平整後的土地已於 2013 年 10 月交予房屋署進行房屋工程。其餘周邊的基建工程，包括青麟路、紫田路的擴闊工程及相關的隔音屏障和行人天橋工程也於 2016 年年底大致完成。(744CL/A 號工程計劃) 第 2 階段：工程包括在屯門第 54 區鄰近紫田路興建一個污水泵房及相關污水管道。工程已於 2012 年 10 月展開，相關之泵房的機電工程及污水管道建造工程已於 2016 年年中完成。(755CL/A 號工程計劃)	 圖例 LEGEND: - 第1期工程範圍 LIMITS OF PHASE 1 WORKS - 第2期工程範圍 LIMITS OF PHASE 2 WORKS - 第1期第1階段工程範圍 (7788CL) LIMITS OF PHASE 1 STAGE 1 WORKS (7788CL) - 第1期第2階段工程範圍 (7666CL) LIMITS OF PHASE 1 STAGE 2 WORKS (7666CL) - 第2期第1階段工程範圍 (7744CL) LIMITS OF PHASE 2 STAGE 1 WORKS (7744CL) - 第2期第2階段工程範圍 (7755CL) LIMITS OF PHASE 2 STAGE 2 WORKS (7755CL) - 第2期第3及第4A階段工程範圍 (7789CL) LIMITS OF PHASE 2 STAGES 3 AND 4A WORKS (7789CL) - 第2期第4B階段工程範圍 (7844CL) LIMITS OF PHASE 2 STAGE 4B WORKS (7844CL) - 第2期第4C階段工程範圍 (7861CL-4C) LIMITS OF PHASE 2 STAGE 4C WORKS (7861CL-4C) - 根據屯門分區計劃大綱圖而預留的 L7 路走廊 RESERVED ROAD L7 ACCORDING TO TUEN MUN OUTLINE ZONING PLAN

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長 及負責 部門/機構	(原訂計劃動工 日期) 最新估計/實際 日期 (月/年)	(原訂計劃竣 工日期) 最新估計/實 際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
						第 3 及 4A 階段:工程主要包括第 3/4(東)號工地及第 4A(西) 號工地的土地平整及相關基建工程。工程已於 2015 年 11 月展開,有關工程已於 2020 年 6 月大致完成,而接駁新發展區至現有交通網絡的新地區幹道(欣寶路)亦已於 2020 年 11 月起開放給公眾人士使用。(789CL/A 號工程計劃) 第 4B 階段:請參閱 844CL 號工程計劃的進度報告。	
666CL/A 844CL/A	屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程第 1 期第 2 階段及第 2 期第 4B 階段 (屯門第 54 區鄰近紫田路及興富街工地平整及基礎建設工程)	312.5	土木工程 拓展署	(2021 第 1 季) 12/2020	(12/2024) 9/2024 (已完成)	工程主要包括第 4A(東)號工地、第 4A(南)號工地及第 5 號工地的土地平整及相關基建工程。工程合約已於 2020 年 12 月展開,其中第 4A(南)號工地及第 5 號工地的土地平整工程及藍地交匯處改善工程已於 2023 年大致完成。第 4A(東)號工地的土地平整工程亦已於 2024 年初完成。而餘下的相關基礎設施工程已於 2024 年 9 月完成。	

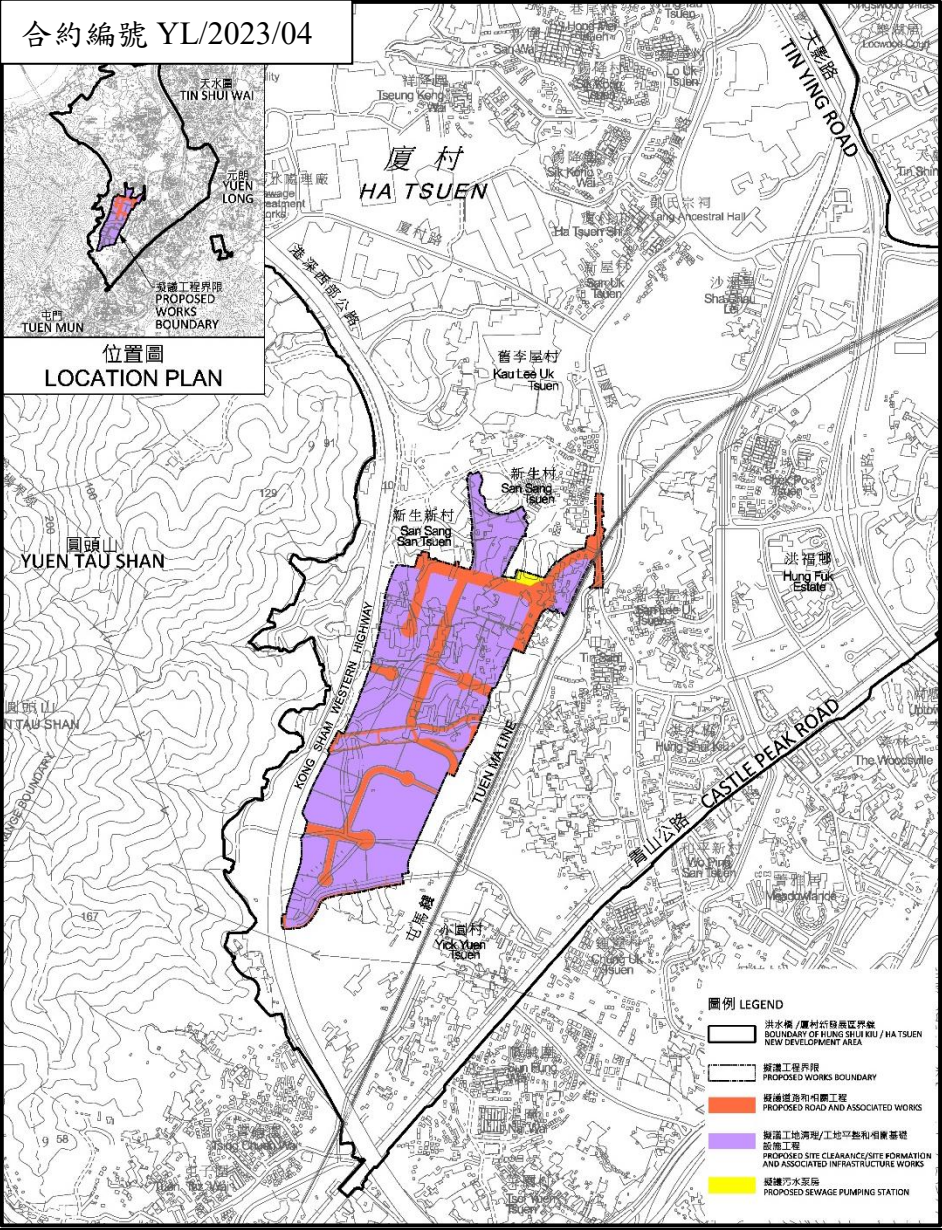
工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
總目 711 分目 811CL 第一期 (857CL/A)	屯門中公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程	968.4	土木工程拓展署	(06/2021) 06/2021	(09/2024) 09/2024	此工程項目是為配合屯門中公營房屋發展計劃的入伙時間表，當中涉及五幅用地，分別位於天后路、湖山路、恆富街、顯發里及屯興路。土木工程拓展署現正分兩期推展有關的工地平整和基礎設施工程。 第一期工程配合分別位於天后路、湖山路、恆富街及顯發里的公營房屋發展。 湖山路的工地平整及基礎設施工程(合約編號 CV/2020/11)於 2021 年 6 月展開。工地平整工程已於 2023 年 2 月完成，而基礎設施工程亦已於 2024 年 6 月大致完成。 另外，為配合於天后路、恆富街及顯發里公營房屋發展的基礎設施工程(合約編號 CV/2021/01)於 2021 年 8 月展開，而工程亦已於 2024 年 9 月大致完成，現正進行移交維修部門前最後的路面工程。	合約編號 CV/2020/11  湖山路的工地平整及基礎設施工程 合約編號 CV/2021/01  天后路近業旺路公營房屋發展項目的基礎設施工程

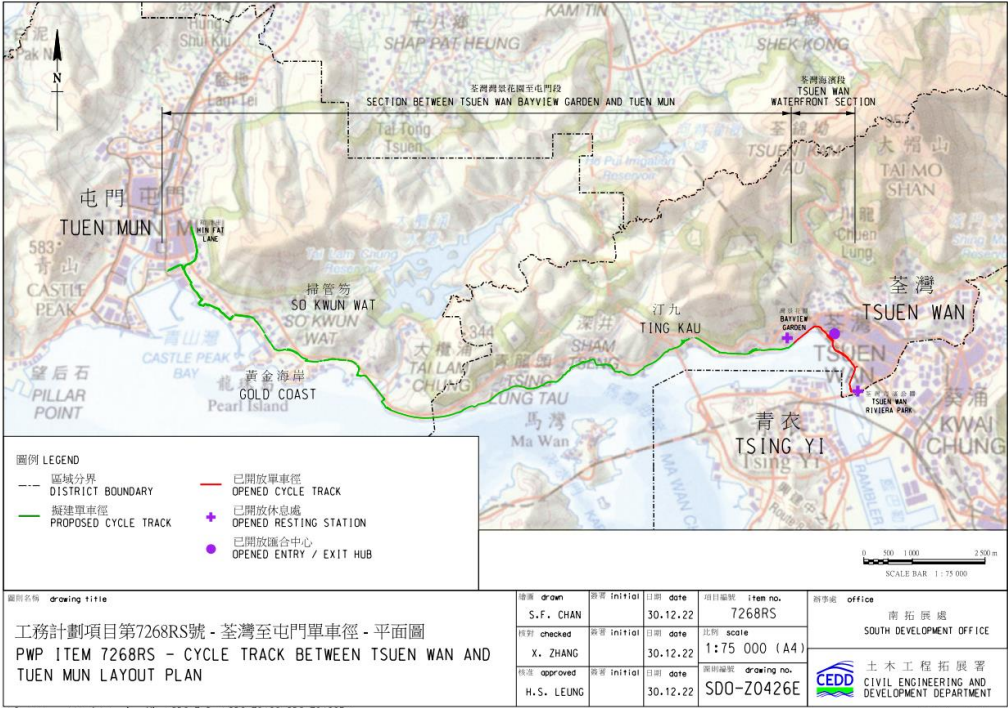
工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長 及負責 部門/機構	(原訂計劃動工 日期) 最新估計/實際 日期 (月/年)	(原訂計劃竣 工日期) 最新估計/實 際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
第二期 (811CL/A)		599.0		(07/2023) 07/2023	(03/2028) 03/2028	第二期工程配合位於屯興路的公營房屋發展。 屯興路的工地平整及基礎設施工程(合約編號 CV/2023/04)於 2023 年 7 月展開，相關的土地清理、土地勘探及清拆構築物等工作已於 2024 年 10 月完成。現階段正進行工地平整，工程預計會於 2028 年大致完成。	合約編號 CV/2021/01  青山公路－青山灣段近顯發里公營房屋發展項目的道路改善工程 合約編號 CV/2023/04 

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
總目 707 分目 787CL 及 829CL	洪水橋／厦村新發展區第二期發展(前期工程第三期及第二階段工程)－工地平整和基礎設施	25,946.8	土木工程拓展署	(06/2024) 06/2024	(12/2032) 12/2032	洪水橋／厦村新發展區分 3 期推展，即第一期發展、第二期發展及餘下發展。第一期發展的建造工程已在 2020 年 7 月展開。第二期發展的建造工程土拓署亦已於 2024 年上半年陸續展開。 第二期發展的擬議工程包括 — (i) 工地清理及平整工程(包括土力工程及土地除污工程)，以供應土地發展公私營房屋、工商業設施、政府、機構或社區設施和休憩用地等，以及進行道路及基礎設施工程； (ii) 在港深西部公路下興建 1 條主要幹路、6 條區域幹路及行車道、相關行人路、單車徑、行車通道和設施等； (iii) 進行其他基礎設施工程，包括排水、污水收集及供水系統、河道活化工程，並建造相關河畔長廊等；以及 (iv) 就上述工程實施環境監察及審核計劃。 第二期發展工程將會分為七個工程合約。 第一個工程合約(合約編號 YL/2023/01)，相關的工地平整和基礎設施工程已於 2024 年 6 月展開並預計會在 2028 年大致完成。	合約編號 YL/2023/01 

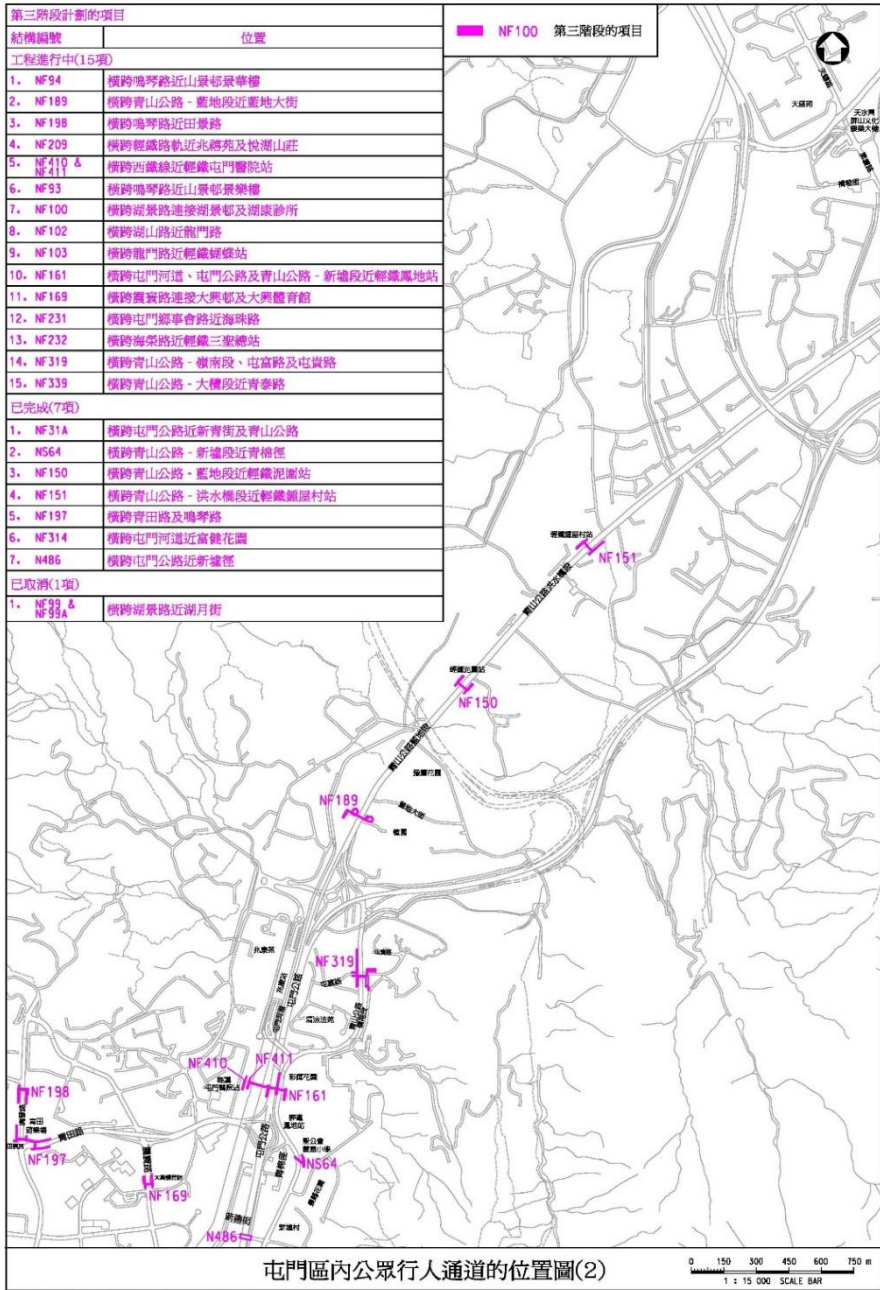
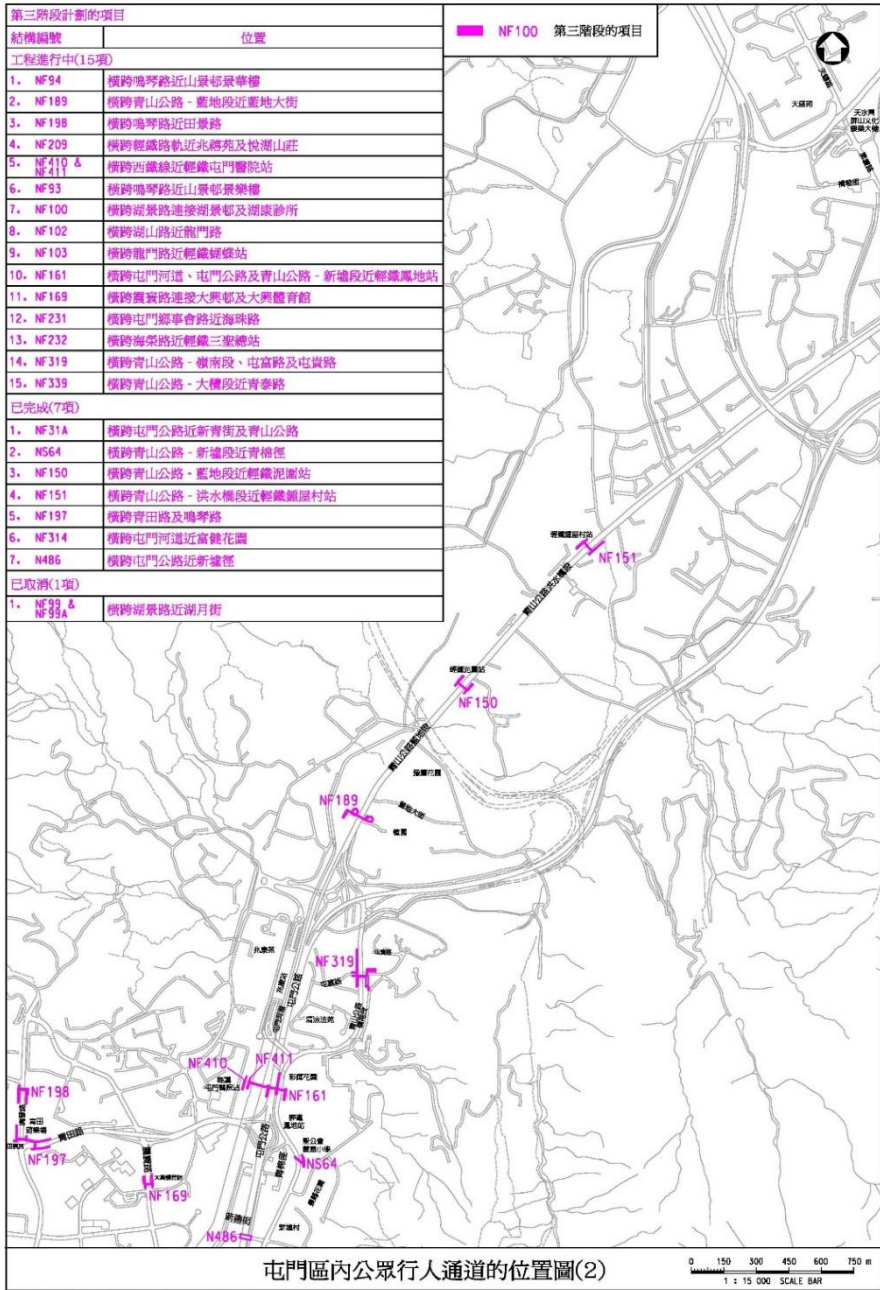
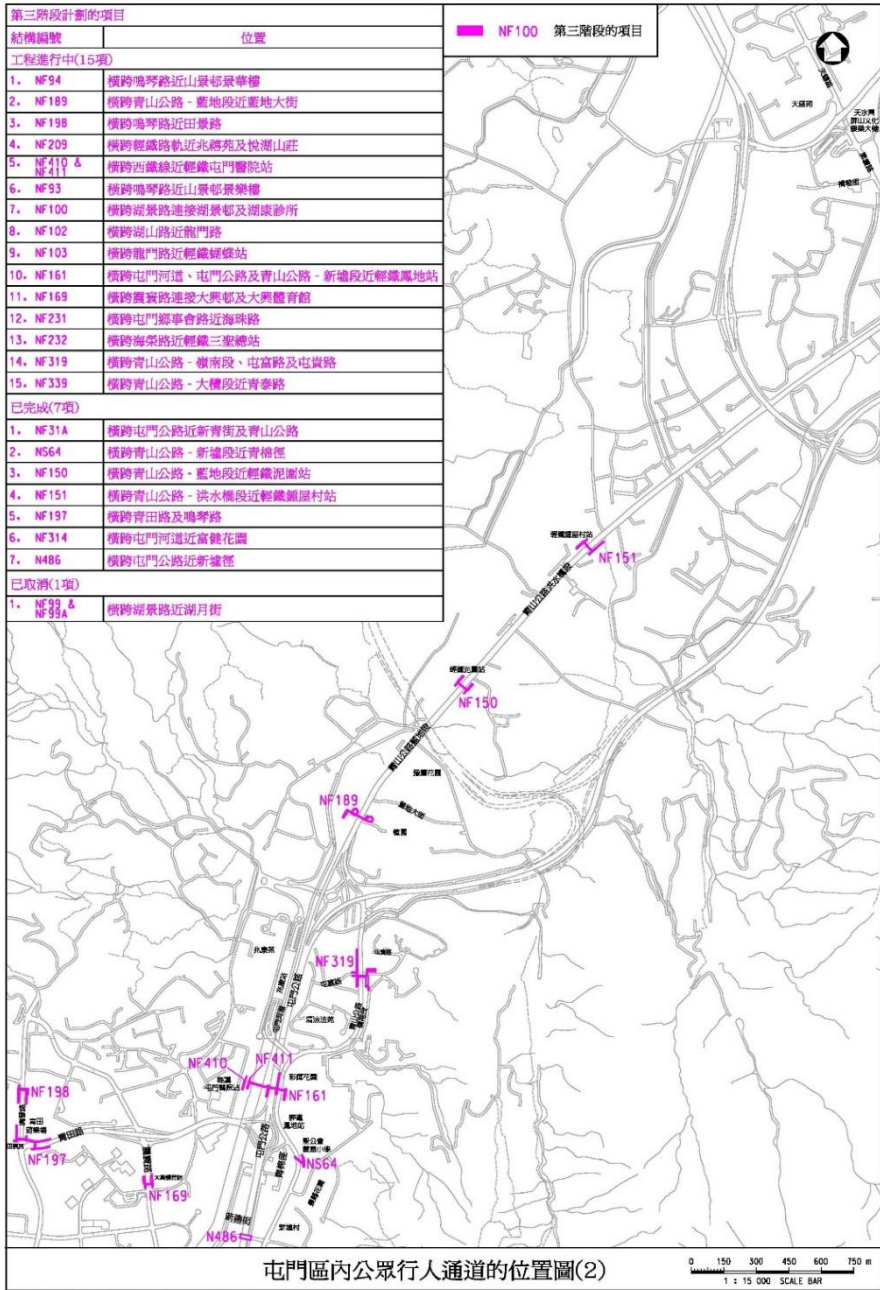
工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長 及負責 部門/機構	(原訂計劃動工 日期) 最新估計/實際 日期 (月/年)	(原訂計劃竣 工日期) 最新估計/實 際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
						第二個工程合約(合約編號 YL/2023/02)，相關的工地平整和基礎設施工程已於 2024 年 6 月展開並預計會在 2029 年大致完成。	合約編號 YL/2023/02 圖例 LEGEND - 邊界 / 鄉村發展區邊界 BOUNDARY OF HUNG SHUI KUI / HA TSUEN NEW DEVELOPMENT AREA - 擬議工程界線 PROPOSED WORKS BOUNDARY - 擬議工地清理及/或中區及相關基礎設施工程 PROPOSED SITE CLEARANCE, SITE FORMATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE WORKS - 擬議供水貯水庫及相關工程 PROPOSED FRESH WATER SERVICE RESERVOIR AND ASSOCIATED WORKS - 擬議供水淨水廠及相關工程 PROPOSED FRESH WATER AND FLUSHING WATER PLANTS

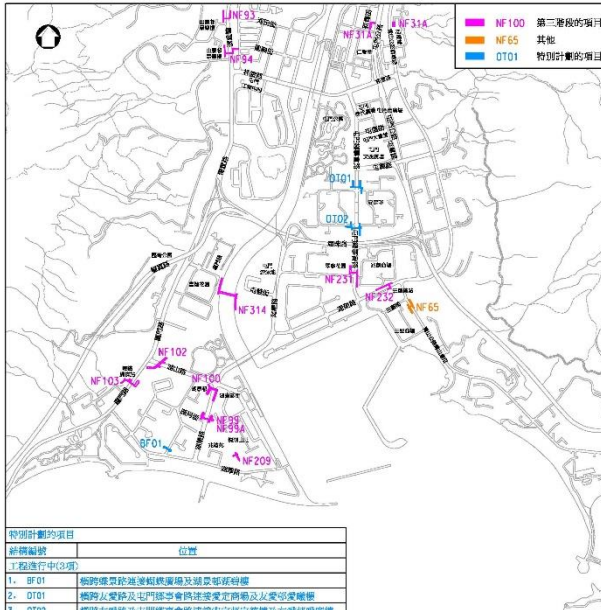
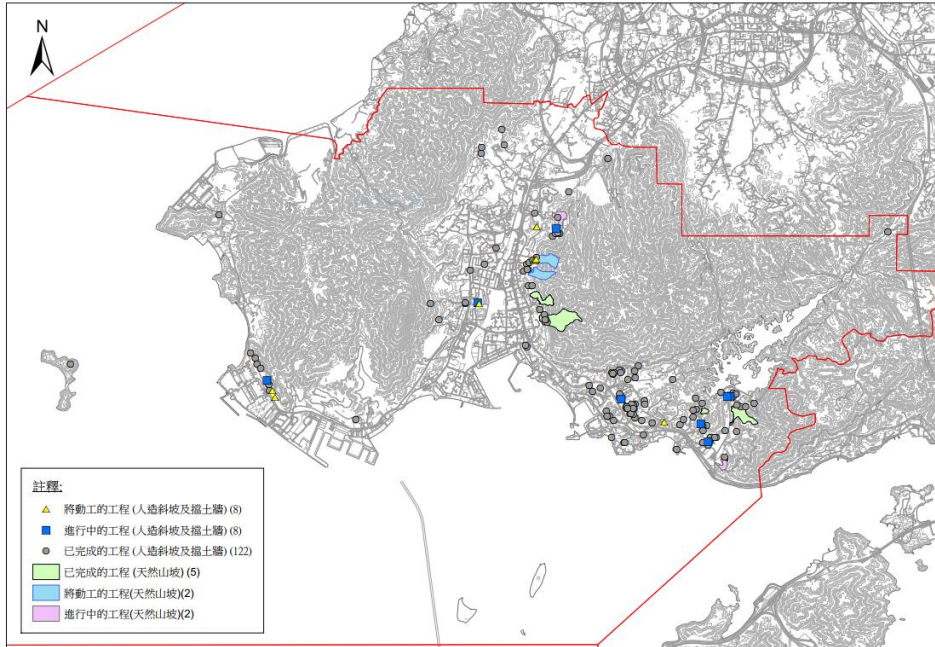
工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
						而其中近洪水橋／厦村新發展區市中心的工地平整及基礎設施工程為第三個工程合約(合約編號 YL/2023/03)，相關合約已於 2024 年 10 月展開並預計會在 2032 年大致完成。	

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
						另外介乎田厦路及港深西部通道之間的工地平整及基礎設施工程為第四個工程合約(合約編號 YL/2023/04)，相關合約已於 2024 年 9 月展開並預計會在 2030 年大致完成。	合約編號 YL/2023/04 

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
不適用	臨時建築廢物篩選分類設施 2022 – 2025	233	環境及生態局局長 土木工程拓展署	(05/2022) 05/2022	(05/2025) 05/2025	合約(CV/2022/02)範圍包括在屯門第 38 區營運一所臨時建築廢物篩選分類設施，該設施的主要功能是從混合建築廢物中將惰性建築廢物如沙泥等篩選出來，循環再用。有關合約的營運期由 2022 年 5 月至 2025 年 5 月。 緊接合約 (CV/2022/02) 的新合約 (CV/2024/02)預計於 2025 年 5 月繼續於屯門第 38 區營運臨時建築廢物篩選分類設施，有關合約的營運期至 2028 年 5 月。	
268RS/B	荃灣至屯門單車徑	檢討中	土木工程拓展署	計劃分階段動工，施工時間表在檢討中	檢討中	荃灣海濱段已於 2021 年 7 月開通。餘下的荃灣灣景花園至屯門段單車徑正在規劃中。	

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片																																												
總目 706 分目 6101TX /D	“人 人 暢 道 通 行”計劃	約 680 (工程進行中)	路政署	請參閱“工程內容/備註”欄	請參閱“工程內容/備註”欄	「人人暢道通行」計劃現按既定時間表全力展開。 在 2012 年 8 月宣布新政策前，運輸及房屋局已應平等機會委員會的建議，推展在公共行人通道加裝無障礙通道設施的「原有計劃」。在屯門區的所有 9 個項目已經完工。 至於計劃推出後市民的新建議項目(即「擴展計劃」)，全港 18 區的區議會已於 2013 年上半年各選出 3 個地點作為優先項目，並進行技術可行性研究。屯門區的所有 3 個項目已經完工。 就「人人暢道通行」計劃的第二階段，屯門區議會轄下的交通及運輸委員會已於 2017 年 5 月揀選 3 條現有行人通道，。當中結構編號 NF196 及 NF342 的升降機已開放予公眾使用。至於結構編號 NF98，該行人天橋加建升降機工程位於屯門南延線項目範圍內。經協調後，工程合約已於 2023 年 1 月展開。 路政署已於 2019 年 9 月底聘請顧問並展開了第三階段推展項目的技術可行性研究，其中 22 條行人通道加建升降機的初步設計及研究結果已分別於 2020 年 6 月、2020 年 10 月及 2021 年 10 月向區議會報告，並獲區議會支持推展。上述 22 條行人通道的加建升降機工程分別於 2021 年 7 月及 2022 年 12 月開展。在 2024 年，有 7 個項目已完成，當中結構編號 NF31A、NS64、NF150、NF151、NF197、NF314 及 N486 的升降機已開放予公眾使用。	<table><tr><th>原有計劃的項目</th><th>位置</th></tr><tr><td colspan="2">已開放給公眾使用 (9項)</td></tr><tr><td>1. NS99</td><td>橫過青雲路近樂旺路</td></tr><tr><td>2. NS108</td><td>橫跨由青雲路至阜珠路的連接路</td></tr><tr><td>3. NF114</td><td>橫跨青雲路近香港專業教育學院（屯門分校）</td></tr><tr><td>4. NF100A</td><td>橫跨湖景路連接湖景邨及湖康診所近湖康街</td></tr><tr><td>5. NF101</td><td>橫跨嶺山路近湖景路</td></tr><tr><td>6. NF407</td><td>於屯門公路連接天橋N874近兆康西鐵站南面的公共運輸交匯處</td></tr><tr><td>7. NF31</td><td>橫跨屯門公路及青山公路 - 新墟段近何福堂輕鐵站</td></tr><tr><td>8. NF127</td><td>橫跨屯門鄉事會路由屯門公園至屯匯街及屯門文娛廣場</td></tr><tr><td>9. NF206</td><td>橫跨屯門鄉事會路由屯門公園至屯匯街及屯門文娛廣場</td></tr><tr><td colspan="2">擴展計劃的項目</td></tr><tr><td colspan="2">已開放給公眾使用 (3項)</td></tr><tr><td>1. NF315</td><td>橫跨龍門路近龍門輕鐵站</td></tr><tr><td>2. NF174</td><td>橫跨屯門公路連接青杏徑及新和里</td></tr><tr><td>3. NS42</td><td>橫跨屯興路近屯門公路</td></tr><tr><td colspan="2">第二階段計劃的項目</td></tr><tr><td colspan="2">已開放給公眾使用 (2項)</td></tr><tr><td>1. NF196</td><td>橫跨鳴琴路近仁愛堂陳黃淑芳紀念中學</td></tr><tr><td>2. NF342</td><td>橫跨鳴琴路近寶田邨</td></tr><tr><td colspan="2">工程進行中 (1項)</td></tr><tr><td>1. NF98</td><td>橫跨湖景路近兆龍苑商場</td></tr></table>	原有計劃的項目	位置	已開放給公眾使用 (9項)		1. NS99	橫過青雲路近樂旺路	2. NS108	橫跨由青雲路至阜珠路的連接路	3. NF114	橫跨青雲路近香港專業教育學院（屯門分校）	4. NF100A	橫跨湖景路連接湖景邨及湖康診所近湖康街	5. NF101	橫跨嶺山路近湖景路	6. NF407	於屯門公路連接天橋N874近兆康西鐵站南面的公共運輸交匯處	7. NF31	橫跨屯門公路及青山公路 - 新墟段近何福堂輕鐵站	8. NF127	橫跨屯門鄉事會路由屯門公園至屯匯街及屯門文娛廣場	9. NF206	橫跨屯門鄉事會路由屯門公園至屯匯街及屯門文娛廣場	擴展計劃的項目		已開放給公眾使用 (3項)		1. NF315	橫跨龍門路近龍門輕鐵站	2. NF174	橫跨屯門公路連接青杏徑及新和里	3. NS42	橫跨屯興路近屯門公路	第二階段計劃的項目		已開放給公眾使用 (2項)		1. NF196	橫跨鳴琴路近仁愛堂陳黃淑芳紀念中學	2. NF342	橫跨鳴琴路近寶田邨	工程進行中 (1項)		1. NF98	橫跨湖景路近兆龍苑商場
原有計劃的項目	位置																																																		
已開放給公眾使用 (9項)																																																			
1. NS99	橫過青雲路近樂旺路																																																		
2. NS108	橫跨由青雲路至阜珠路的連接路																																																		
3. NF114	橫跨青雲路近香港專業教育學院（屯門分校）																																																		
4. NF100A	橫跨湖景路連接湖景邨及湖康診所近湖康街																																																		
5. NF101	橫跨嶺山路近湖景路																																																		
6. NF407	於屯門公路連接天橋N874近兆康西鐵站南面的公共運輸交匯處																																																		
7. NF31	橫跨屯門公路及青山公路 - 新墟段近何福堂輕鐵站																																																		
8. NF127	橫跨屯門鄉事會路由屯門公園至屯匯街及屯門文娛廣場																																																		
9. NF206	橫跨屯門鄉事會路由屯門公園至屯匯街及屯門文娛廣場																																																		
擴展計劃的項目																																																			
已開放給公眾使用 (3項)																																																			
1. NF315	橫跨龍門路近龍門輕鐵站																																																		
2. NF174	橫跨屯門公路連接青杏徑及新和里																																																		
3. NS42	橫跨屯興路近屯門公路																																																		
第二階段計劃的項目																																																			
已開放給公眾使用 (2項)																																																			
1. NF196	橫跨鳴琴路近仁愛堂陳黃淑芳紀念中學																																																		
2. NF342	橫跨鳴琴路近寶田邨																																																		
工程進行中 (1項)																																																			
1. NF98	橫跨湖景路近兆龍苑商場																																																		

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片																																																													
						就「人人暢道通行」計劃的特別計劃，屯門區議會轄下的交通及運輸委員會已於2020年12月揀選3條現有行人通道，而路政署已於2022年1月底聘請顧問並展開了特別計劃推展項目的技術可行性研究。其中行人通道編號BF01加建升降機的初步設計及研究結果已於2022年5月向區議會報告，並獲區議會支持推展，路政署已於2023年1月開展建造工程合約。而行人通道編號OT01及OT02加建升降機的初步設計及研究結果亦已於2023年8月以傳閱方式向區議會報告，並獲區議會支持推展，路政署已於2024年8月開展建造工程合約。	<table><tr><th colspan="2">第三階段計劃的項目</th><th rowspan="3">NF100 第三階段的項目</th></tr><tr><th>結構編號</th><th>位置</th></tr><tr><td colspan="3">工程進行中(15項)</td></tr><tr><td>1. NF94</td><td>橫跨鳴琴路近山景邨景華樓</td><td rowspan="25"></td></tr><tr><td>2. NF189</td><td>橫跨青山公路－藍地段近重地大街</td></tr><tr><td>3. NF198</td><td>橫跨鳴琴路近田景路</td></tr><tr><td>4. NF209</td><td>橫跨輕鐵路軌近兆麟苑及悅湖山莊</td></tr><tr><td>5. NF410 & NF411</td><td>橫跨西鐵線近輕鐵屯門醫院站</td></tr><tr><td>6. NF93</td><td>橫跨鳴琴路近山景邨景華樓</td></tr><tr><td>7. NF100</td><td>橫跨經景路連接福景邨及湖康診所</td></tr><tr><td>8. NF102</td><td>橫跨湖山路近龍門路</td></tr><tr><td>9. NF103</td><td>橫跨龍門路近輕鐵綠楊站</td></tr><tr><td>10. NF161</td><td>橫跨屯門河、屯門公路及青山公路－新墟段近輕鐵鳳凰站</td></tr><tr><td>11. NF169</td><td>橫跨廣賓路連接大興邨及大興體育館</td></tr><tr><td>12. NF231</td><td>橫跨屯門鄉事會路近海珠路</td></tr><tr><td>13. NF232</td><td>橫跨海榮路近輕鐵三聖總站</td></tr><tr><td>14. NF319</td><td>橫跨青山公路－嶺南段、屯富路及屯貴路</td></tr><tr><td>15. NF339</td><td>橫跨青山公路－大橋段近青泰路</td></tr><tr><td colspan="3">已完成(7項)</td></tr><tr><td>1. NF31A</td><td>橫跨屯門公路近新青街及青山公路</td></tr><tr><td>2. NS64</td><td>橫跨青山公路－新墟段近青楊徑</td></tr><tr><td>3. NF150</td><td>橫跨青山公路－藍地段近輕鐵泥圍站</td></tr><tr><td>4. NF151</td><td>橫跨青山公路－洪水橋段近輕鐵泥圍村站</td></tr><tr><td>5. NF197</td><td>橫跨青田路及鳴琴路</td></tr><tr><td>6. NF314</td><td>橫跨屯門河近富健花園</td></tr><tr><td>7. N486</td><td>橫跨屯門公路近新墟徑</td></tr><tr><td colspan="3">已取消(1項)</td></tr><tr><td>1. NF99 & NF99A</td><td>橫跨經景路近湖月街</td></tr></table> 屯門區內公眾行人通道的位置圖(2) 0 150 300 450 600 750 m 1 : 15 000 SCALE BAR	第三階段計劃的項目		NF100 第三階段的項目	結構編號	位置	工程進行中(15項)			1. NF94	橫跨鳴琴路近山景邨景華樓		2. NF189	橫跨青山公路－藍地段近重地大街	3. NF198	橫跨鳴琴路近田景路	4. NF209	橫跨輕鐵路軌近兆麟苑及悅湖山莊	5. NF410 & NF411	橫跨西鐵線近輕鐵屯門醫院站	6. NF93	橫跨鳴琴路近山景邨景華樓	7. NF100	橫跨經景路連接福景邨及湖康診所	8. NF102	橫跨湖山路近龍門路	9. NF103	橫跨龍門路近輕鐵綠楊站	10. NF161	橫跨屯門河、屯門公路及青山公路－新墟段近輕鐵鳳凰站	11. NF169	橫跨廣賓路連接大興邨及大興體育館	12. NF231	橫跨屯門鄉事會路近海珠路	13. NF232	橫跨海榮路近輕鐵三聖總站	14. NF319	橫跨青山公路－嶺南段、屯富路及屯貴路	15. NF339	橫跨青山公路－大橋段近青泰路	已完成(7項)			1. NF31A	橫跨屯門公路近新青街及青山公路	2. NS64	橫跨青山公路－新墟段近青楊徑	3. NF150	橫跨青山公路－藍地段近輕鐵泥圍站	4. NF151	橫跨青山公路－洪水橋段近輕鐵泥圍村站	5. NF197	橫跨青田路及鳴琴路	6. NF314	橫跨屯門河近富健花園	7. N486	橫跨屯門公路近新墟徑	已取消(1項)			1. NF99 & NF99A	橫跨經景路近湖月街
第三階段計劃的項目		NF100 第三階段的項目																																																																		
結構編號	位置																																																																			
工程進行中(15項)																																																																				
1. NF94	橫跨鳴琴路近山景邨景華樓																																																																			
2. NF189	橫跨青山公路－藍地段近重地大街																																																																			
3. NF198	橫跨鳴琴路近田景路																																																																			
4. NF209	橫跨輕鐵路軌近兆麟苑及悅湖山莊																																																																			
5. NF410 & NF411	橫跨西鐵線近輕鐵屯門醫院站																																																																			
6. NF93	橫跨鳴琴路近山景邨景華樓																																																																			
7. NF100	橫跨經景路連接福景邨及湖康診所																																																																			
8. NF102	橫跨湖山路近龍門路																																																																			
9. NF103	橫跨龍門路近輕鐵綠楊站																																																																			
10. NF161	橫跨屯門河、屯門公路及青山公路－新墟段近輕鐵鳳凰站																																																																			
11. NF169	橫跨廣賓路連接大興邨及大興體育館																																																																			
12. NF231	橫跨屯門鄉事會路近海珠路																																																																			
13. NF232	橫跨海榮路近輕鐵三聖總站																																																																			
14. NF319	橫跨青山公路－嶺南段、屯富路及屯貴路																																																																			
15. NF339	橫跨青山公路－大橋段近青泰路																																																																			
已完成(7項)																																																																				
1. NF31A	橫跨屯門公路近新青街及青山公路																																																																			
2. NS64	橫跨青山公路－新墟段近青楊徑																																																																			
3. NF150	橫跨青山公路－藍地段近輕鐵泥圍站																																																																			
4. NF151	橫跨青山公路－洪水橋段近輕鐵泥圍村站																																																																			
5. NF197	橫跨青田路及鳴琴路																																																																			
6. NF314	橫跨屯門河近富健花園																																																																			
7. N486	橫跨屯門公路近新墟徑																																																																			
已取消(1項)																																																																				
1. NF99 & NF99A	橫跨經景路近湖月街																																																																			

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片																																																																								
							<table><caption>第三階段計劃的項目</caption><tr><th>計劃編號</th><th>位置</th></tr><tr><td colspan="2">工程進行中(15項)</td></tr><tr><td>1. NF 94</td><td>橫街海寧路近山屋修業樓</td></tr><tr><td>2. NF 189</td><td>橫街青山公路 - 龍地設計園地大樓</td></tr><tr><td>3. NF 198</td><td>橫街海寧路近山屋</td></tr><tr><td>4. NF 209</td><td>橫街龍地設計園地及後園山屋</td></tr><tr><td>5. NF 217</td><td>橫街龍地設計園地北門樓前</td></tr><tr><td>6. NF 93</td><td>橫街海寧路近山屋修業樓</td></tr><tr><td>7. NF 100</td><td>橫街海寧路海寧樓及海寧樓前</td></tr><tr><td>8. NF 102</td><td>橫街青山公路近海門路</td></tr><tr><td>9. NF 103</td><td>橫街海門路近龍地樓前</td></tr><tr><td>10. NF 161</td><td>橫街海門路、海門公路及青山公路 - 新龍地近龍地樓前</td></tr><tr><td>11. NF 168</td><td>橫街龍地設計園地大樓及大樓前</td></tr><tr><td>12. NF 231</td><td>橫街海門路近海寧樓及海寧樓前</td></tr><tr><td>13. NF 232</td><td>橫街龍地設計園地三座樓前</td></tr><tr><td>14. NF 319</td><td>橫街青山公路 - 橫街、龍地路及電管處</td></tr><tr><td>15. NF 339</td><td>橫街青山公路 - 大龍路近龍地樓前</td></tr><tr><td colspan="2">已取消(7項)</td></tr><tr><td>1. NF 314</td><td>橫街海門公路近海寧樓及青山公路</td></tr><tr><td>2. NF 64</td><td>橫街青山公路 - 新龍地近龍地樓前</td></tr><tr><td>3. NF 150</td><td>橫街青山公路 - 龍地設計園地大樓前</td></tr><tr><td>4. NF 151</td><td>橫街青山公路 - 海寧樓近龍地樓前</td></tr><tr><td>5. NF 197</td><td>橫街海寧路及海寧路</td></tr><tr><td>6. NF 314</td><td>橫街海門路近龍地樓前</td></tr><tr><td>7. NF 486</td><td>橫街海門公路近龍地樓前</td></tr><tr><td colspan="2">已取消(1項)</td></tr><tr><td>1. NF 314</td><td>橫街海寧路近龍地樓前</td></tr><tr><td colspan="2">取消</td></tr><tr><td colspan="2">計劃編號</td><td>位置</td></tr><tr><td colspan="2">1. NF 65</td><td>橫街青山公路 - 青山公路近二座樓</td></tr></table><table><caption>特別計劃的項目</caption><tr><th>計劃編號</th><th>位置</th></tr><tr><td colspan="2">工程進行中(3項)</td></tr><tr><td>1. DT 01</td><td>橫街海寧路海寧樓及海寧樓前</td></tr><tr><td>2. DT 01</td><td>橫街海寧路及海門路近海寧樓及海寧樓前</td></tr><tr><td>3. DT 02</td><td>橫街海寧路及海門路近海寧樓及海寧樓前</td></tr></table> 屯門區內公眾行人通道的位置圖(3)	計劃編號	位置	工程進行中(15項)		1. NF 94	橫街海寧路近山屋修業樓	2. NF 189	橫街青山公路 - 龍地設計園地大樓	3. NF 198	橫街海寧路近山屋	4. NF 209	橫街龍地設計園地及後園山屋	5. NF 217	橫街龍地設計園地北門樓前	6. NF 93	橫街海寧路近山屋修業樓	7. NF 100	橫街海寧路海寧樓及海寧樓前	8. NF 102	橫街青山公路近海門路	9. NF 103	橫街海門路近龍地樓前	10. NF 161	橫街海門路、海門公路及青山公路 - 新龍地近龍地樓前	11. NF 168	橫街龍地設計園地大樓及大樓前	12. NF 231	橫街海門路近海寧樓及海寧樓前	13. NF 232	橫街龍地設計園地三座樓前	14. NF 319	橫街青山公路 - 橫街、龍地路及電管處	15. NF 339	橫街青山公路 - 大龍路近龍地樓前	已取消(7項)		1. NF 314	橫街海門公路近海寧樓及青山公路	2. NF 64	橫街青山公路 - 新龍地近龍地樓前	3. NF 150	橫街青山公路 - 龍地設計園地大樓前	4. NF 151	橫街青山公路 - 海寧樓近龍地樓前	5. NF 197	橫街海寧路及海寧路	6. NF 314	橫街海門路近龍地樓前	7. NF 486	橫街海門公路近龍地樓前	已取消(1項)		1. NF 314	橫街海寧路近龍地樓前	取消		計劃編號		位置	1. NF 65		橫街青山公路 - 青山公路近二座樓	計劃編號	位置	工程進行中(3項)		1. DT 01	橫街海寧路海寧樓及海寧樓前	2. DT 01	橫街海寧路及海門路近海寧樓及海寧樓前	3. DT 02	橫街海寧路及海門路近海寧樓及海寧樓前
計劃編號	位置																																																																														
工程進行中(15項)																																																																															
1. NF 94	橫街海寧路近山屋修業樓																																																																														
2. NF 189	橫街青山公路 - 龍地設計園地大樓																																																																														
3. NF 198	橫街海寧路近山屋																																																																														
4. NF 209	橫街龍地設計園地及後園山屋																																																																														
5. NF 217	橫街龍地設計園地北門樓前																																																																														
6. NF 93	橫街海寧路近山屋修業樓																																																																														
7. NF 100	橫街海寧路海寧樓及海寧樓前																																																																														
8. NF 102	橫街青山公路近海門路																																																																														
9. NF 103	橫街海門路近龍地樓前																																																																														
10. NF 161	橫街海門路、海門公路及青山公路 - 新龍地近龍地樓前																																																																														
11. NF 168	橫街龍地設計園地大樓及大樓前																																																																														
12. NF 231	橫街海門路近海寧樓及海寧樓前																																																																														
13. NF 232	橫街龍地設計園地三座樓前																																																																														
14. NF 319	橫街青山公路 - 橫街、龍地路及電管處																																																																														
15. NF 339	橫街青山公路 - 大龍路近龍地樓前																																																																														
已取消(7項)																																																																															
1. NF 314	橫街海門公路近海寧樓及青山公路																																																																														
2. NF 64	橫街青山公路 - 新龍地近龍地樓前																																																																														
3. NF 150	橫街青山公路 - 龍地設計園地大樓前																																																																														
4. NF 151	橫街青山公路 - 海寧樓近龍地樓前																																																																														
5. NF 197	橫街海寧路及海寧路																																																																														
6. NF 314	橫街海門路近龍地樓前																																																																														
7. NF 486	橫街海門公路近龍地樓前																																																																														
已取消(1項)																																																																															
1. NF 314	橫街海寧路近龍地樓前																																																																														
取消																																																																															
計劃編號		位置																																																																													
1. NF 65		橫街青山公路 - 青山公路近二座樓																																																																													
計劃編號	位置																																																																														
工程進行中(3項)																																																																															
1. DT 01	橫街海寧路海寧樓及海寧樓前																																																																														
2. DT 01	橫街海寧路及海門路近海寧樓及海寧樓前																																																																														
3. DT 02	橫街海寧路及海門路近海寧樓及海寧樓前																																																																														
總目 705 分目 5001BX	長遠防治山泥傾瀉計劃	1,045 (長遠防治山泥傾瀉計劃於2024/25年度的預算費用)	土木工程拓展署	(2010) 2010	(持續進行) 持續進行	在長遠防治山泥傾瀉計劃下，我們已為屯門區 122 個人造斜坡及擋土牆，以及 5 個天然山坡（山坡編號為 6SW-A/SA1、6SW-A/SA2、6SW-D/SA1、6SW-D/SA2 及 6SW-D/SA3）完成了防治山泥傾瀉工程。 現時屯門區有 8 個人造斜坡及擋土牆，以及 2 個天然山坡（山坡編號為 6SW-A/SA3、6SW-D/SA4）正進行防治山泥傾瀉工程，這些工程預計於 2026 年第 2 季完成，斜坡資料如下： 合約編號: GE/2021/16(合約已展開，預計於 2026 年第 1 季完成。) 1 個位於屯門掃管笏的斜坡，編號 6SW-C/C171。	 註釋: ▲ 將動工的工程(人造斜坡及擋土牆)(8) ■ 進行中的工程(人造斜坡及擋土牆)(8) ● 已完成的工程(人造斜坡及擋土牆)(122) ■ 已完成的工程(天然山坡)(5) ■ 將動工的工程(天然山坡)(2) ■ 進行中的工程(天然山坡)(2) 屯門區的長遠防治山泥傾瀉工程																																																																								

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長 及負責 部門/機構	(原訂計劃動工 日期) 最新估計/實際 日期 (月/年)	(原訂計劃竣 工日期) 最新估計/實 際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
						● 1 個位於屯門虎地的天然山坡編號 6SW-A/SA3。 ● 1 個位於屯門大欖胡屋的天然山坡編號 6SW-D/SA4。 合約編號: GE/2022/03 (合約已展開，預計於 2025 年第 2 季完成。) ● 1 個位於洪祥路西面的斜坡，編號 5SE-B/C203。 ● 1 個位於屯門虎地上村西面的斜坡，編號 6SW-A/FR80。 合約編號: GE/2022/09 (合約已展開，預計於 2025 年第 1 季完成。) ● 1 個位於屯門龍門路的斜坡，編號 5SE-C/C56。 ● 1 個位於大欖懲教所的斜坡，編號 6SW-D/C441。 ● 1 個位於大欖懲教所的斜坡，編號 6SW-D/FR185。 合約編號: GE/2022/15 (合約已展開，預計於 2027 年第 2 季完成。) ● 1 個位於屯門聯安新村的斜坡，編號 6SW-D/C844。 ● 1 個位於小欖精神病治療中心的斜坡，編號 6SW-D/C651。 土木工程拓展署並計劃在未來一年為屯門區 8 個人造斜坡及擋土牆展和 2 個天然山坡開防治山泥傾瀉工程，相關工程將於 2026 年第 3 季完成。	
