

荃灣區議會 2023-2024 年度 會議日期：2023 年 5 月 30 日



荃灣區主要工程項目進度報告

土木工程拓展署
西拓展處
2023 年 5 月

荃灣區主要工程項目進度報告 (截至 2023 年 4 月 30 日止)

目錄

頁數

- (1) 港口及填海工程
- (2) 道路工程
- (3) 渠務工程
- (4) 水務工程
- (5) 其它工務工程

3
4
6
8
9

1. 荃灣區港口及填海工程項目

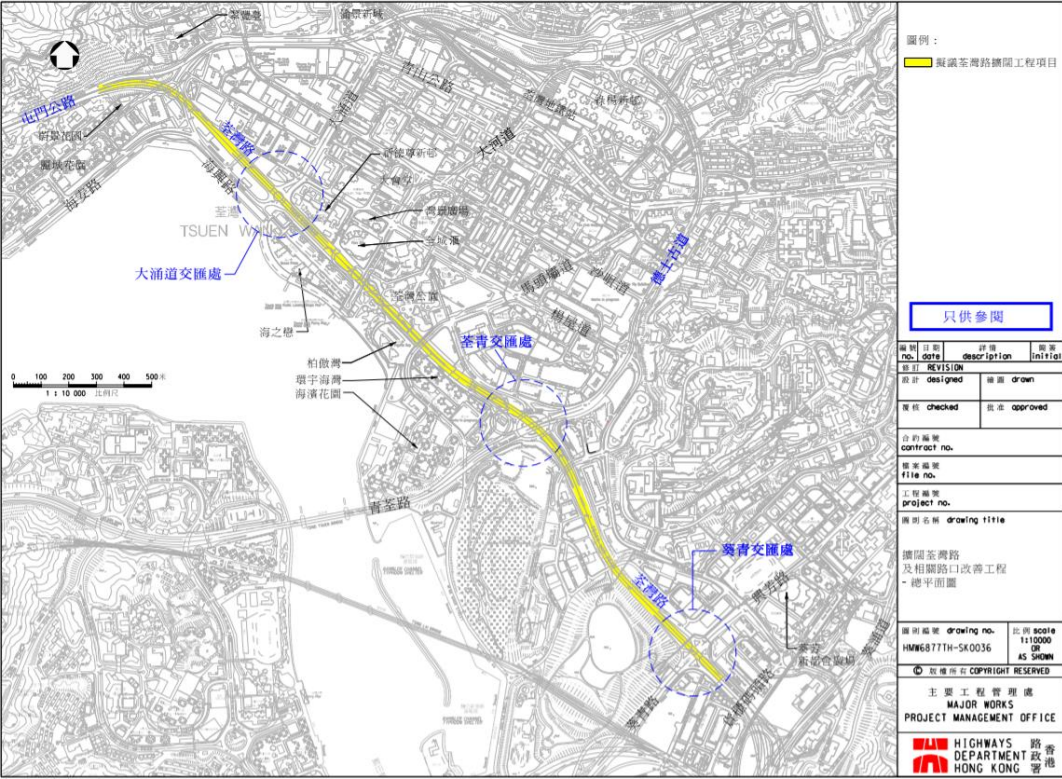
截至 2023 年 4 月 30 日

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首 長及負責 部門/機構	動工日期 最新估計/實際 日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日 期 (原訂計劃)	工程內容／備註	照片
56TF/A	石仔灣碼頭改 善工程	57.5	土木工程 拓展署	2022 年 12 月 15 日 (2022 年年尾)	2026 年年頭 (2026 年年頭)	土木工程拓展署已於 2019 年 5 月 6 日諮詢荃灣區議會交通及運輸委員會對馬灣石仔灣碼頭的改善工程的意見，委員普遍支持有關工程計劃。 石仔灣碼頭改善工程已經於 2022 年 7 月 8 日獲得立法會批出撥款，工程合約亦已於 2022 年 12 月 15 日展開。	

2. 荃灣區道路工程項目

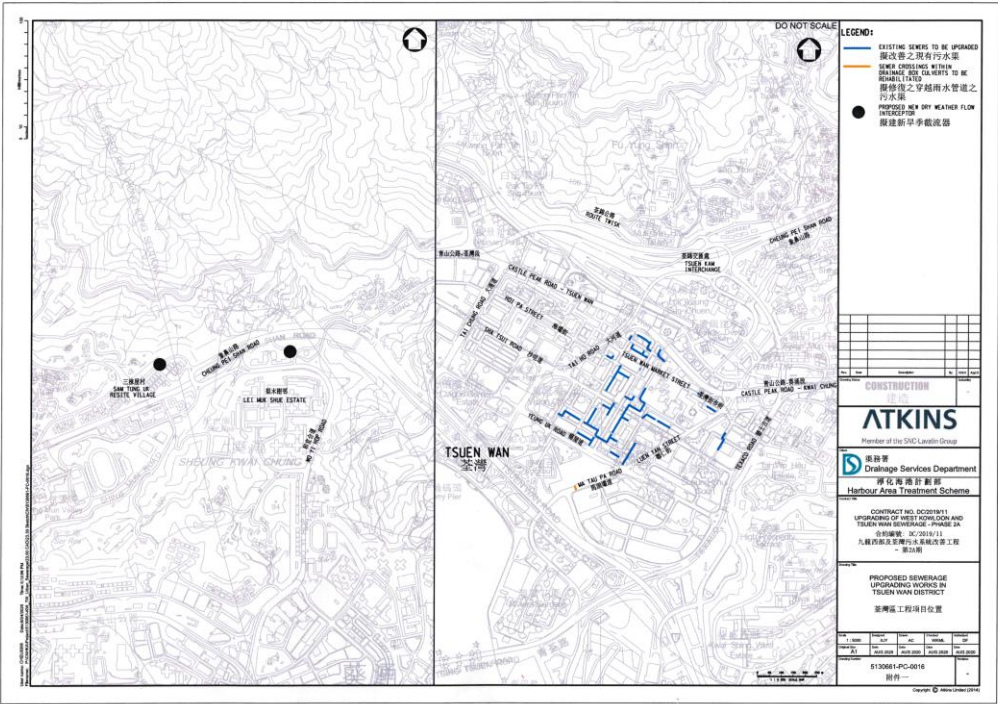
截至 2023 年 4 月 30 日

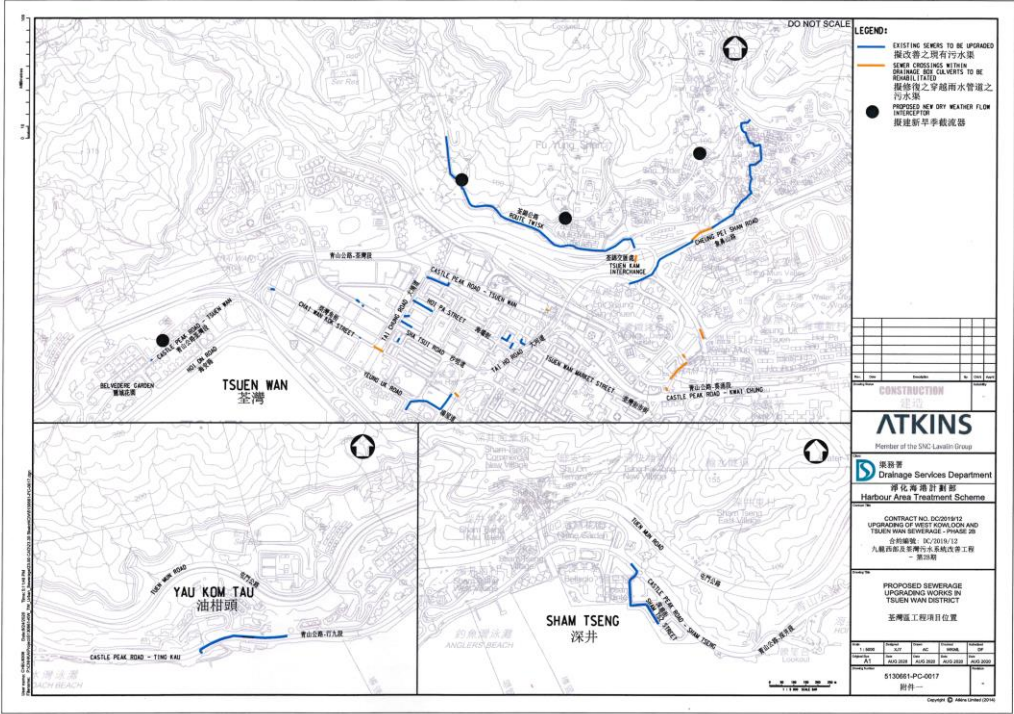
工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首 長及負責 部門/機構	動工日期 最新估計/實際 日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日 期 (原訂計劃)	工程內容／備註	照片
6087TI	荃青交匯處改善工程	檢討中	路政署	檢討中 (檢討中)	檢討中 (檢討中)	工程主要包括於荃灣路(往屯門方向)引路建造左轉往青衣的專用行車線、擴建現有德士古道行車天橋、建造連接荃灣路(往九龍方向)下行斜路至德士古道的連接路、擴闊德士古道近山德士中心附近的行車線及改善迴旋處的設計。 路政署的工程顧問正進行詳細設計，預計於未來數月完成有關工作，並於2023年下半年為建造工程進行招標。	

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首 長及負責 部門/機構	動工日期 最新估計/實際 日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日 期 (原訂計劃)	工程內容／備註	照片
877TH	擴闊荃灣路及 相關路口改善 工程	檢討中	路政署	檢討中 (檢討中)	檢討中 (檢討中)	路政署就荃灣路擴闊及相關路口改善工程的勘察研究工作已大致完成，擬議工程計劃於2023年2月20日獲得交通及運輸委員會的支持。路政署預計於2023年下半年根據《道路(工程、使用及補償)條例》(第370章)為擬議工程計劃刊憲。	

3. 荃灣區渠務工程項目

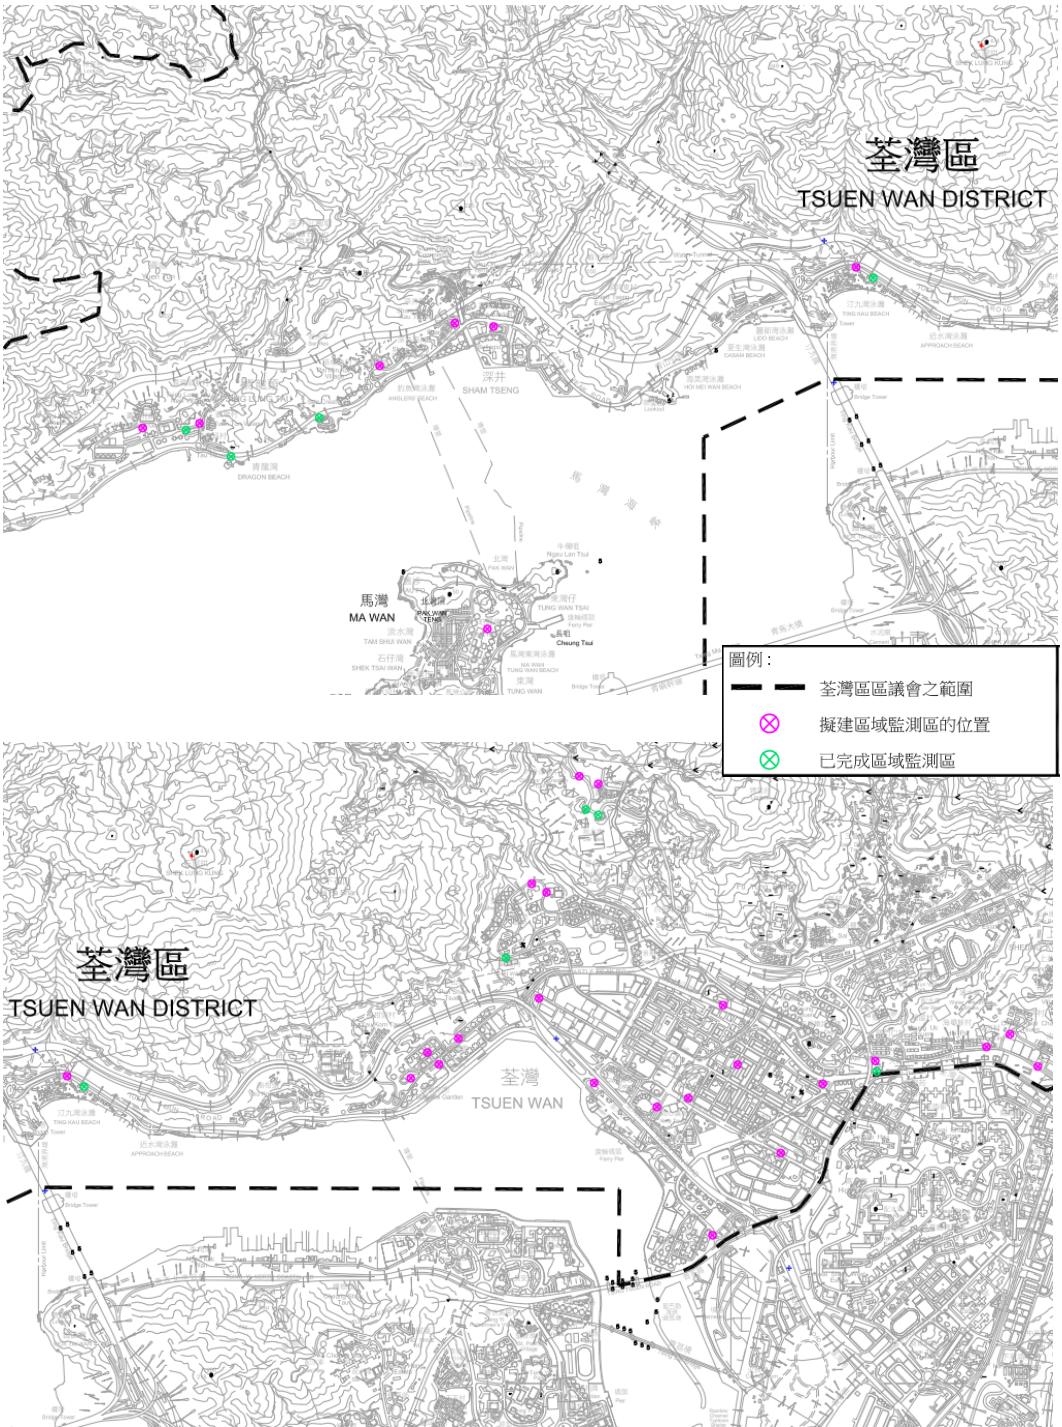
截至 2023 年 4 月 30 日

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期 最新估計/實際日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日期 (原訂計劃)	工程內容／備註	照片
389DS	九龍西部及荃灣污水系統改善工程 - 第 2 期	508.2	渠務署	2020 年 7 月 (2020 年 7 月)	2026 年第 2 季 (2026年第2季)	工程主要建造長約 2.3 公里的無壓污水渠、1 個位置的現有污水渠進行修復工程、新建 2 個旱季截流器以及其他附屬工程。	
438DS	九龍西部及荃灣鄉村污水收集系統					工程已於 2020 年 7 月 20 日展開，其中荃灣海壩街後巷，兆和街近千色店，河背街後巷，荃樂街後巷，鹹田街後巷的污水渠工程已經完成。	
工程合約編號 DC/2019/11	九龍西部及荃灣污水系統改善工程 - 第 2A 期					荃灣大陂坊後巷的污水渠工程正進行中並預計 2023 年 5 月完成。三陂坊後巷近河背街段及四陂坊後巷近恆生荃灣大廈段的污水渠工程已於 2023 年 1 月完成；而荃灣二陂坊近沙咀道後巷及三陂坊近沙咀道後巷的污水渠工程已展開，並預計於 2023 年第 4 季完成。 此外，位於荃灣三棟屋路及和宜合里的旱季截流器建造工程已分別於 2021 年 5 月及 2021 年 9 月展開，並預計分別於 2023 年第 2 季及 2023 年第 4 季完成。	

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期 最新估計/實際日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日期 (原訂計劃)	工程內容／備註	照片
389DS	九龍西部及荃灣污水系統改善工程 - 第2期	357.8	渠務署	2020 年 11 月 (2020 年 11 月)	2026 年第 2 季 (2026 年第 2 季)	工程主要建造長約4.8公里的無壓污水渠、9個位置的現有污水渠進行修復工程、新建4個旱季截流器以及其他附屬工程。 工程已於 2020 年 11 月 6 日展開，預計於 2026 年第 2 季完成。其中荃灣福來里馬路，曹公坊馬路，香車街近曹公坊後巷，香車街近海壩街後巷，亨和街近芙蓉街後巷和柴灣角街近柴灣角街公廁的污水渠工程已經完成。 青山公路-汀九段的污水渠工程已於 2021 年 6 月展開，並預計於 2024 年第 2 季完成；荃灣老圍的污水渠工程已於 2021 年 7 月展開，並預計於 2025 年第 1 季完成；荃錦公路的污水渠工程已於 2021 年 8 月展開，並預計於 2025 年第 1 季完成；而荃灣路德圍的污水渠改善工程已於 2022 年 1 月展開，並預計分別於 2024 年第 1 季完成。 此外，荃灣新村和芙蓉山路的旱季截流器建造工程已經完成；荃灣發業里和光板田村的旱季截流器建造工程已分別於 2022 年 6 月及 2022 年 10 月展開，並預計於 2023 年第 3 季完成。	

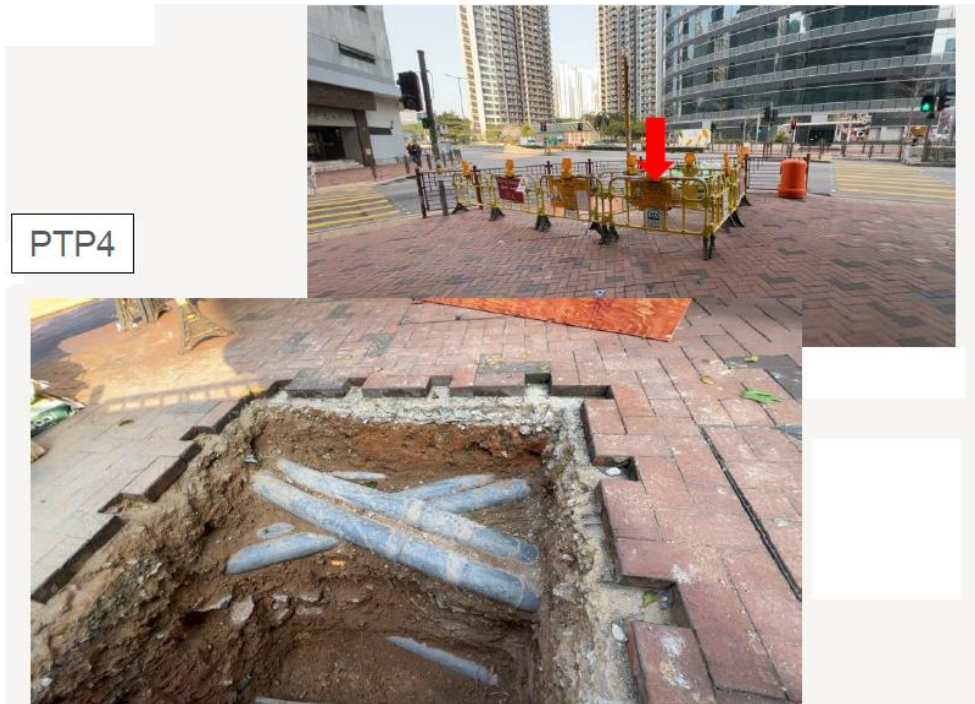
4. 荃灣區水務工程項目

截至 2023 年 4 月 30 日

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期 最新估計/實際日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日期 (原訂計劃)	工程內容／備註	照片
196WC	建設智管網－餘下工程	11.3 (荃灣區的費用)	水務署	2020年8月 (2020年8月)	2025年第1季 (2024年第1季)	工程項目包括在荃灣區建造約37個監測區域。 截至2023年4月30日，荃灣區已有8個監測區域完成建造。礙於較早前受疫情影響，大部分需要暫停食水供應才可進行設立監測區域的工程須暫緩以確保市民獲供應食水維持環境衛生。隨着疫情緩和，整項工程包括荃灣區內餘下的監測區域預計會於2025年第1季前相繼完成。	

5. 荃灣區其它工程項目

截至 2023 年 4 月 30 日

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首 長及負責 部門/機構	動工日期 最新估計/實際 日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日 期 (原訂計劃)	工程內容／備註	照片
162TB (橋 A)	荃灣行人天橋 網絡擴充工程	169.0 (橋 A)	路政署	2008年12月 (2004年2月) (橋 A)	2013年4月 (2007年5月) (橋 A)	路政署獲運輸署委託，在青山公路與大河道（行人天橋A）、大涌道與海盛路（行人天橋B）、關門口街與聯仁街（行人天橋C）、連接荃灣廣場、灣景廣場及毗鄰環境美化地帶（行人天橋D）、以及馬頭壩道與永順街（行人天橋E）各興建一座行人天橋。	
145TB (橋 B 及 C)		檢討中 (橋 B，C 及E)		檢討中 (檢討中) (橋 B，C 及 E)	檢討中 (檢討中) (橋 B，C 及 E)		
164TB (橋 D)		101.2 (橋 D)		2016年 9月 (2016 年 12 月) (橋 D)	2019 年 11 月 (2020 年 5 月) (橋 D)	行人天橋A（工務計劃項目第162TB號)已建成，並全面開通。	
196TB (橋 E)						行人天橋B（工務計劃項目第145TB號)項目於2021年7月15日根據《道路（工程、使用及補償）條例》（第370章）獲授權進行。項目現時處於詳細設計階段，項目顧問安排前期工程在沿線多個地點勘測地下公用設施的最新位置，以減低主體工程期間的潛在問題。路政署在2022年12月初連同運輸署向行人配套及公共運輸服務發展小組就項目進度作詳細匯報，預計詳細設計會於2023年年中完成，及後會盡快安排向立法會申請撥款及工程招標。 行人天橋C（工務計劃項目第145TB號)及行人天橋E（工務計劃項目第196TB號）項目的工程顧問合約於2019年12月展開。路政署於2020年6月5日在荃灣區	
							

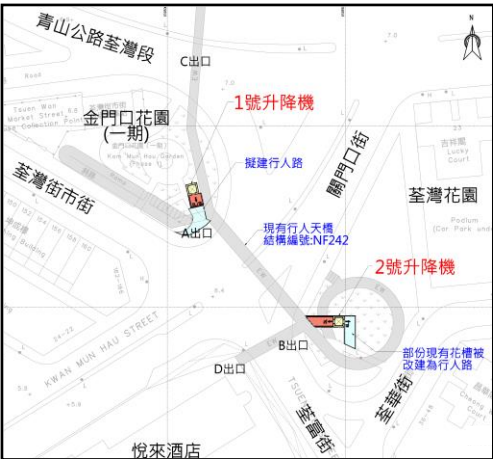
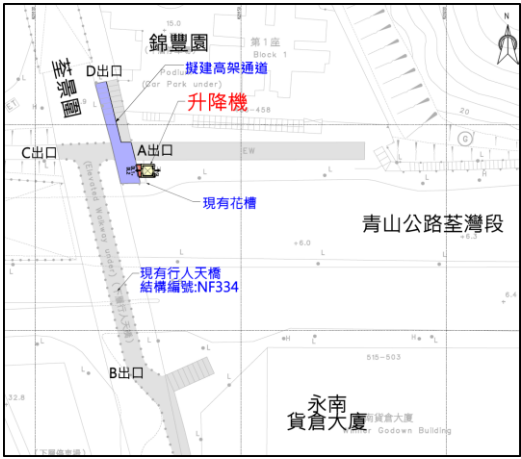
行人天橋 B 大涌道一段的三維效果圖

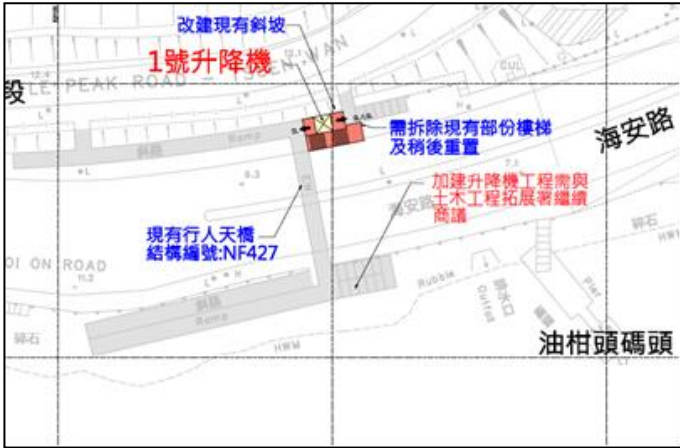
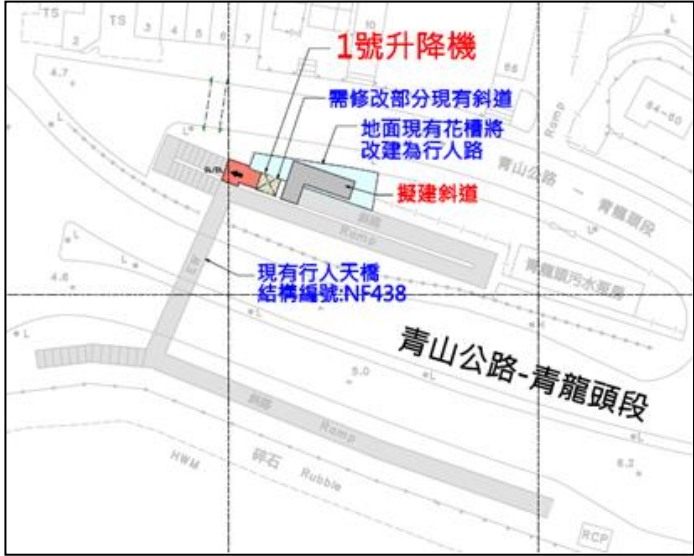
行人天橋 E 沿線進行土地勘測工作

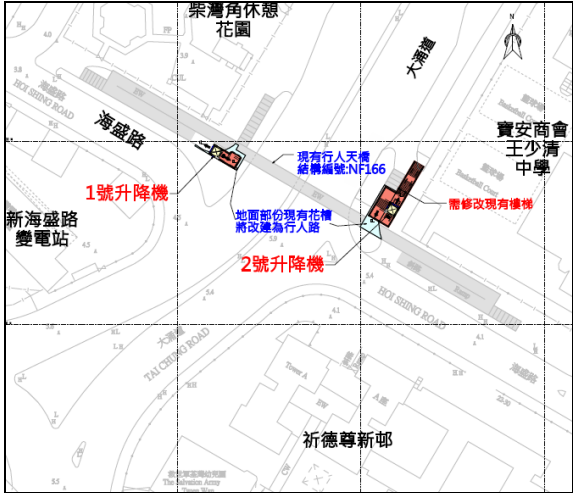
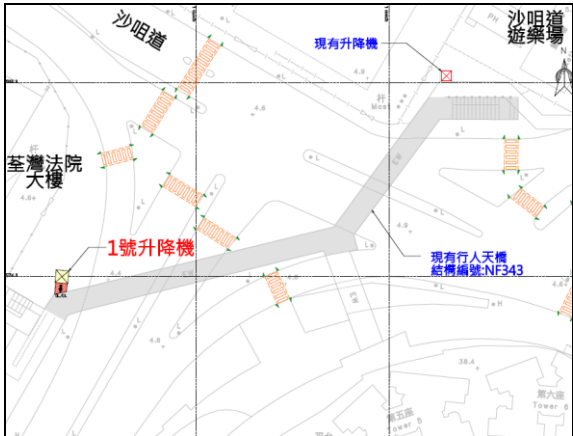
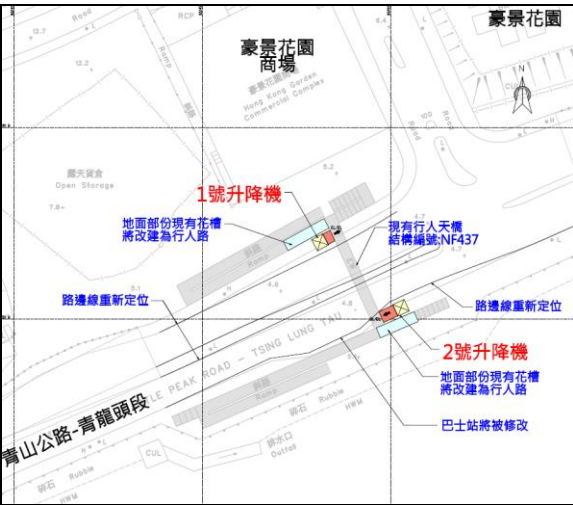
行人天橋 B 大涌道一段的三維效果圖

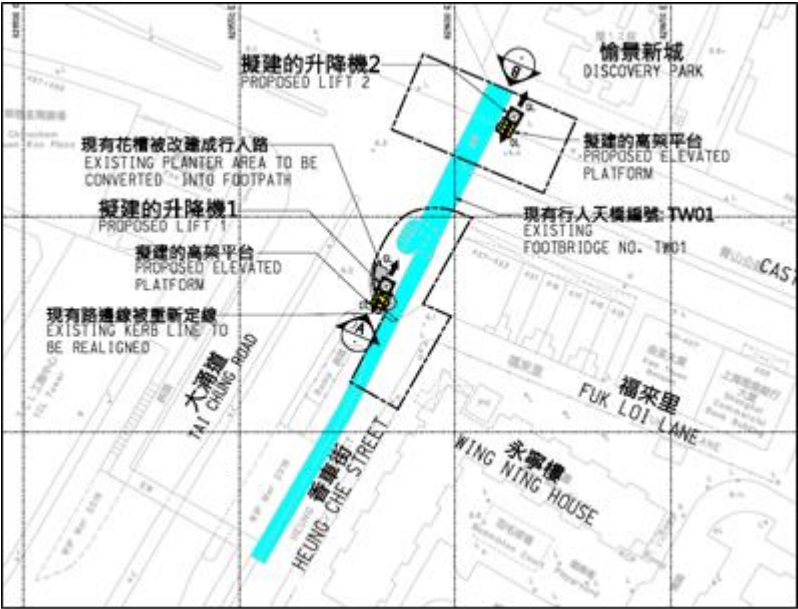
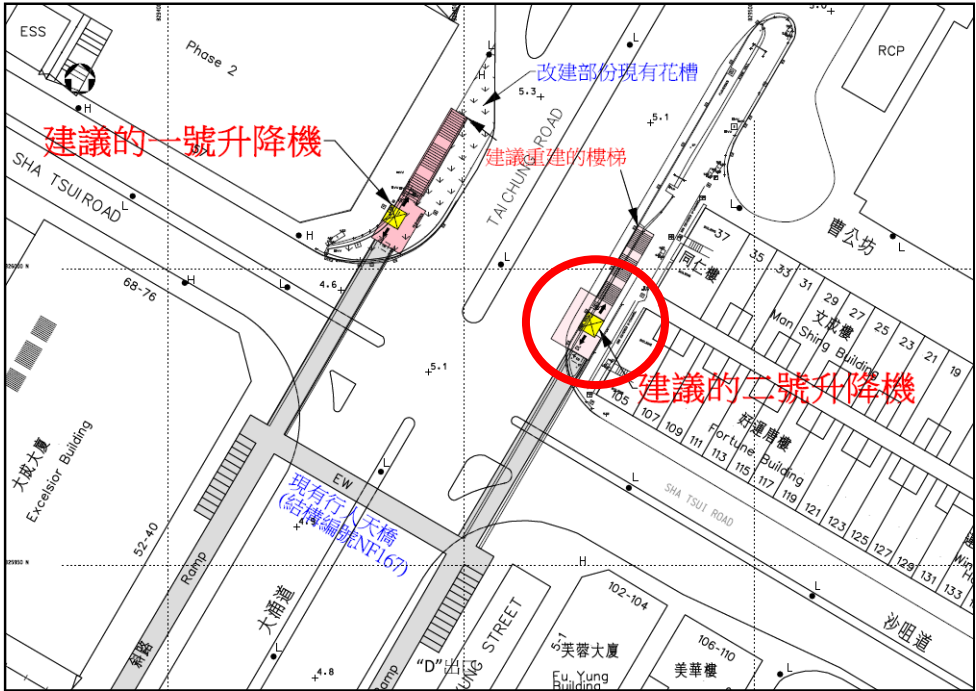
行人天橋 E 沿線進行土地勘測工作

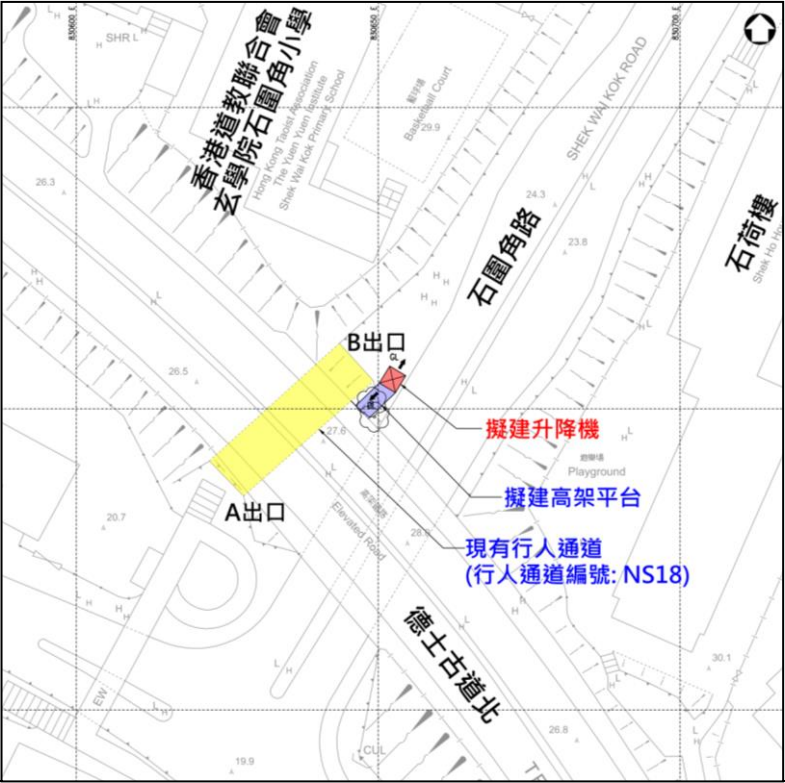
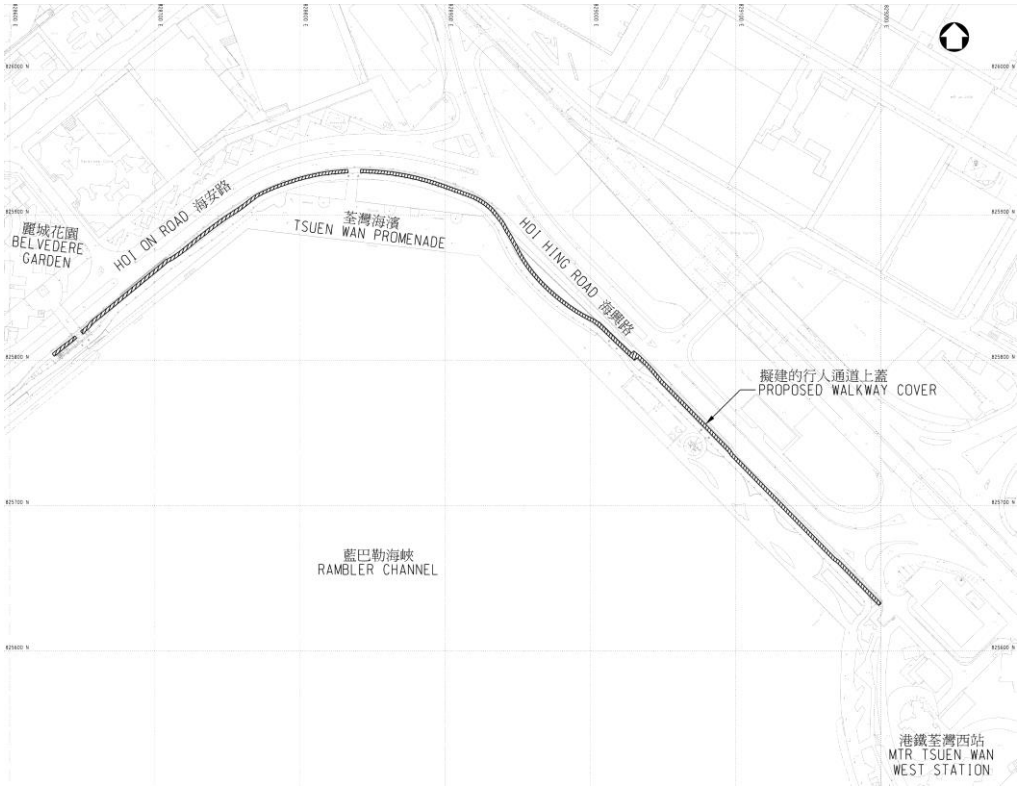
工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首 長及負責 部門/機構	動工日期 最新估計/實際 日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日 期 (原訂計劃)	工程內容／備註	照片
						議會交通及運輸委員會轄下的行人配套發展小組會議上報告有關天橋的不同走線及方案，並分別於2020年年底及2021年中旬舉行了「荃灣南行人通道改善項目」的第一及第二階段公眾諮詢活動，收集當區議員及項目沿線屋苑的意見。及後，路政署於2021年10月與陸靈中議員、時任荃灣區議會林錫添議員及運輸署代表就項目各個路段的不同方案所收到的意見作初步討論。路政署的項目顧問於2022年6月第五波疫情回落後，在廣泛復工和復課的條件下進行了人流統計，並現正分析交通及人流數據以進行交通評估，以檢視當區的人流及項目的成效。及後，路政署連同運輸署於2022年12月7日向行人配套及公共運輸服務發展小組詳細匯報公眾諮詢及初步的人流數據分析結果，並與小組成員深入討論項目各方案（包括行人天橋和有蓋行人通道方案）的不同走綫、設計考慮及限制，小組成員於上述會議中最後決定先推展行人天橋E。項目顧問隨即安排土地勘測工作並於今年4月完成，現正檢視相關勘測結果以確認行人天橋的技術可行性，並研究行人天橋與沿綫屋苑連接的相關安排。 行人天橋 D (工務計劃項目第164TB號) 已建成，並全面開通。	

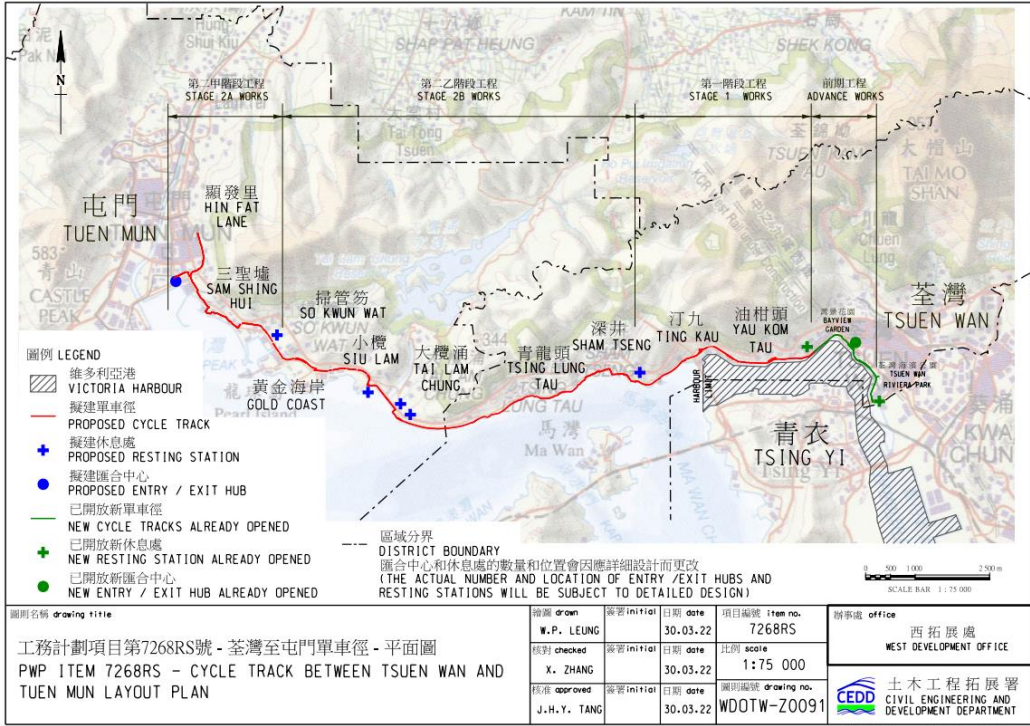
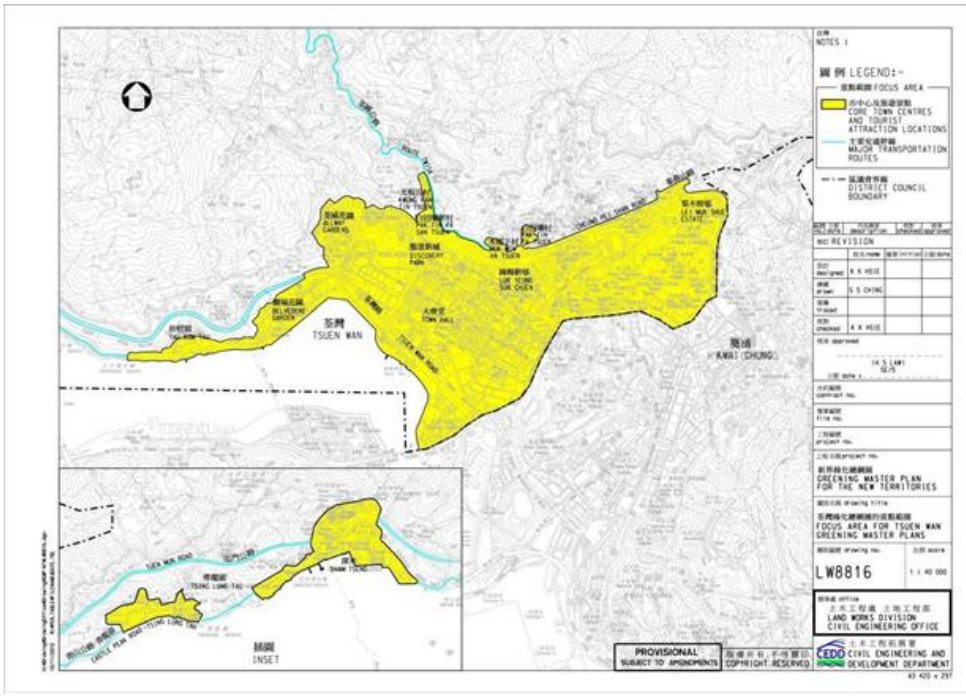
工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期 最新估計/實際日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日期 (原訂計劃)	工程內容／備註	照片	
6101TX/D	為行人天橋、高架行人道及行人隧道提供暢道通行設施-第三組第一份合約	56.6 (荃灣區的費用)	路政署	2019年8月 (2019年8月)	2022年8月 (2022年第4季) 2022年12月 (2023年第3季) (NF 334)	工程主要為荃灣區的下列2條行人天橋加建升降機設施: 1. 橫跨關門口街及青山公路近金門口花園的行人天橋（結構編號：NF242）；及 2. 橫跨青山公路近荃景圍及沙咀道的行人天橋（結構編號：NF334）。 NF242 - 兩部新建升降機已分別於2022年7月及8月完成並開放予公眾使用。 NF334 - 新建升降機已於2022年12月完成並開放予公眾使用。		
6101TX/D	為行人天橋、高架行人道及行人隧道提供暢道通行設施-第三組第二份合約	15.6 (荃灣區的費用)	路政署	2020年6月 (2020年年中)	2022年12月 (2023年第3季)	工程主要為荃灣區橫跨美環街連接荃景圍體育館及愉景新城的行人天橋(結構編號：TW03)加建升降機設施。 新建升降機已於2022年12月完成並開放予公眾使用。		

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首 長及負責 部門/機構	動工日期 最新估計/實際 日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日 期 (原訂計劃)	工程內容／備註	照片
6101TX/D	在行人天橋、 高架行人道及 行人隧道加建 人人暢道通行 設施 - 第五組 第三份合約	52.56 (荃灣區的 費用)	路政署	2023年1月 (2023年1月)	2026年4月 (2026年第2季) (NF 427) 2025年10月 (2025年第4季) (NF 438) 2026年4月 (2026年第2季) (NF 439)	工程主要為荃灣區的下列3條行人天橋加建升降機設施: 1. - 橫跨海安路近油柑頭碼頭：NF427) ； 2. - 橫跨青山公路 - 青龍頭段近龍如路及青龍頭村(結構編號：NF438) ；及 3. - 橫跨青山公路 - 青龍頭段近浪翠園第3期(結構編號：NF439)。 工程合約已於2023年1月展開，現正進行前期準備工作。	  

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首 長及負責 部門/機構	動工日期 最新估計/實際 日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日 期 (原訂計劃)	工程內容／備註	照片
6101TX/D	為行人天橋、 高架行人道及 行人隧道提供 暢道通行設施 - 第六組第一 份合約	74.0 (荃灣區的 費用)	路政署	2021年7月	2024年7月 (2024年第3季) (NF 166) 2023年10月 (2023年第4季) (NF 343) 2024年4月 (2024年第2季) (NF 437)	工程主要為荃灣區的下列3條行人天橋加建升降機設施: 1. - 橫跨大涌道近海盛路的行人天橋(結構編號：NF166) ； 2. - 橫跨大河道及沙咀道交界處的行人天橋(結構編號：NF343) ；及 3. - 橫跨青山公路 - 青龍頭段近豪景花園的行人天橋(結構編號：NF437)。 工程合約已於2021年7月展開。 NF166 - 現正進行升降機塔地基工程。 NF343 - 現正進行升降機塔建造工程。 NF437 - 現正進行地下管線繞道工作。	  

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首 長及負責 部門/機構	動工日期 最新估計/實際 日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日 期 (原訂計劃)	工程內容／備註	照片
6101TX/D	為行人天橋、 高架行人道及 行人隧道提供 暢道通行設施 - 第六組第二 份合約	26.61 (荃灣區的 費用)	路政署	2022年12月	2026年第2季 (2026年第2季) (TW 01)	工程主要為荃灣區橫跨青山公 路-荃灣段近愉景新城的行人天 橋(結構編號：TW01)加建升降 機設施: 工程合約已於2022年12月展 開，現正進行前期準備工作。	
6101TX/D	在行人天橋、 高架行人道及 行人隧道加建 行人暢道通行 設施 - 第七組 第一份合約	41.33 (荃灣區的 費用)	路政署	2021年12月 (2021年12月)	2024年12月 (2024年12月)	工程為荃灣區的下列2條行人 天橋加建升降機設施: 1. - 橫跨大涌道及沙嘴道的行 人天橋(結構編號：NF167) (在 近好運唐樓的出口加建2號升 降機)； 2. - 橫跨德士道北近石圍角路 的行人隧道(結構編號：NS18)； 工程合約已於2021年12月展開。 NF167 - 現正進行前期準備工 作。 NS18 - 現正進行地基打樁工程。	

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首 長及負責 部門/機構	動工日期 最新估計/實際 日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日 期 (原訂計劃)	工程內容／備註	照片
							 A detailed map of the Shek Wan area. It shows the proposed pedestrian walkway (NS18) in blue, running along the coast. A yellow rectangular area is marked with 'A出口' (Exit A) and a red square with 'B出口' (Exit B). A red line indicates the '擬建升降機' (Proposed Lift) and a blue line indicates the '擬建高架平台' (Proposed Elevated Platform). The map also shows '現有行人通道 (行人通道編號: NS18)' (Existing Pedestrian Walkway (Walkway Number: NS18)). Other landmarks include '香港道教聯合會玄學院石圍角小學' (Hong Kong Taoist Association The Yuen Yuen Kuo Primary School), '石圍角路' (Shek Wan Kok Road), '石荷樓' (Shek Ho Lok), and '德士古道北' (Desford Road North).
6100TX/D	荃灣海興路及海安路行人通道上蓋的建造工程	47.4	路政署	2022年第二季 (2022年第二季)	2024年第四季 (2024年第四季)	於荃灣區海興路及海安路興建一條約700米長的行人通道上蓋，以及進行附屬工程，包括相關道路、渠務、水管、公用設施及公共照明工程等。 工程合約已於2022年6月展開，現正進行地基挖掘及建造工程。	 A map of the Tsuen Wan Promenade area. It shows the '擬建的行人通道上蓋' (Proposed Walkway Cover) in blue, running along the coast. The map also shows '麗城花園 BELVEDERE GARDEN', '荃灣海濱 TSUEN WAN PROMENADE', 'HOI ON ROAD 海興路', 'HOI HING ROAD 海安路', '藍巴勒海峽 RAMBLER CHANNEL', and '港鐵荃灣西站 MTR TSUEN WAN WEST STATION'.

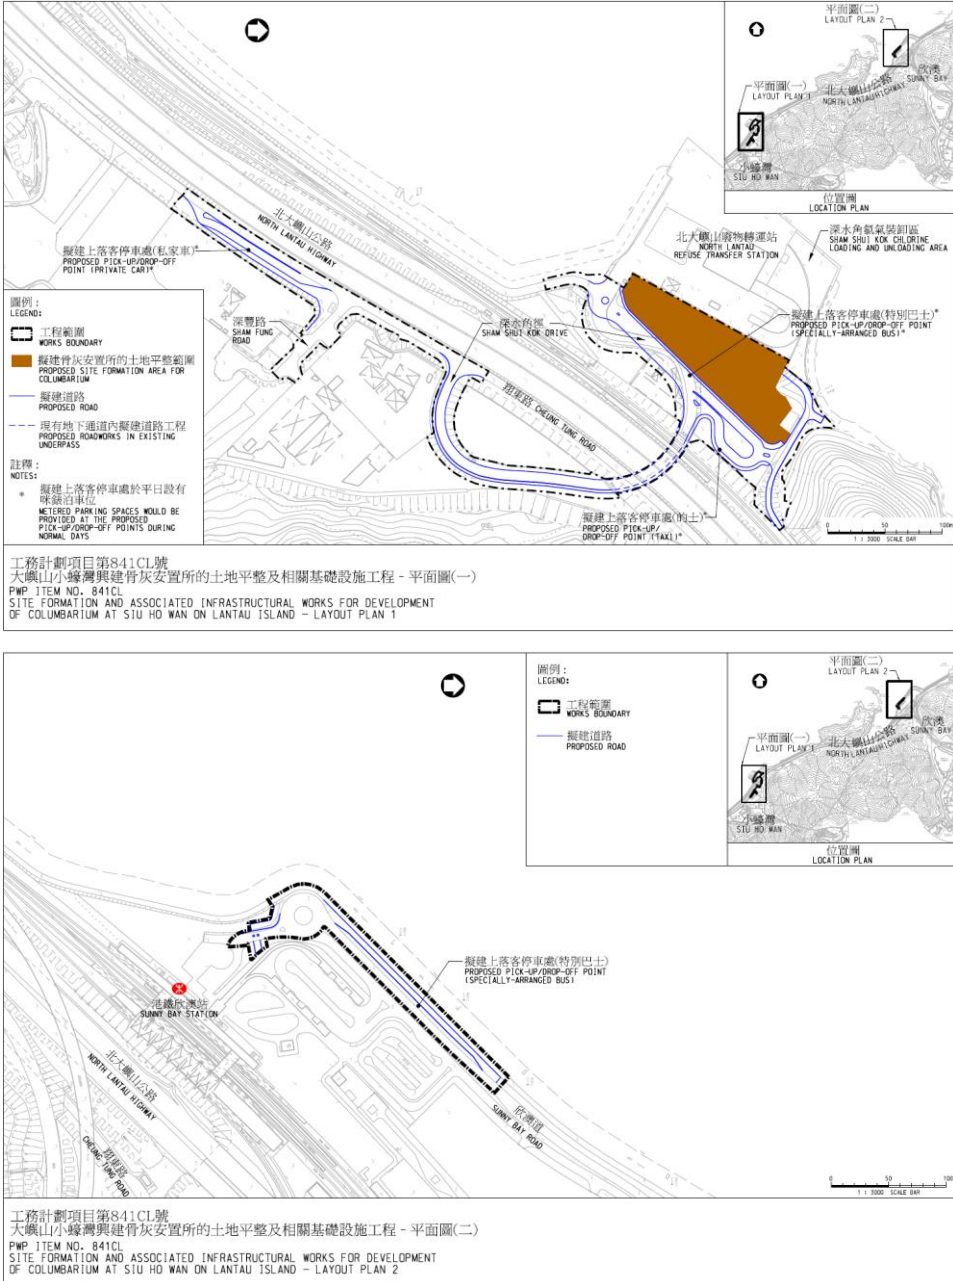
工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首 長及負責 部門/機構	動工日期 最新估計/實際 日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日 期 (原訂計劃)	工程內容／備註	照片
268RS	荃灣至屯門單車徑	140.9 (前期工程) 檢討中 (第一及第 二階段工 程)	土木工程 拓展署	2018年9月 (2018年9月) 檢討中 (檢討中)	2021年6月 (2020年第4季) 檢討中 (檢討中)	前期工程(即荃灣海濱公園至灣景花園)已於 2021 年 7 月全面開通。 土木工程拓展署於 2022 年 12 月就第一及第二乙階段工程計劃(由灣景花園至掃管笏段)完成了為期兩個月的公眾參與活動。現時正整理和分析在活動中所收到的意見,以進一步檢視荃灣灣景花園至掃管笏段單車徑項目的推展方向。	 圖例 LEGEND 維多利亞港 VICTORIA HARBOUR 擬建單車徑 PROPOSED CYCLE TRACK 擬建休息處 PROPOSED RESTING STATION 擬建匯合中心 PROPOSED ENTRY / EXIT HUB 已開放新單車徑 NEW CYCLE TRACKS ALREADY OPENED 已開放新休息處 NEW RESTING STATION ALREADY OPENED 已開放新匯合中心 NEW ENTRY / EXIT HUB ALREADY OPENED 區域分界 DISTRICT BOUNDARY (THE ACTUAL NUMBER AND LOCATION OF ENTRY / EXIT HUBS AND RESTING STATIONS WILL BE SUBJECT TO DETAILED DESIGN) 圖則名稱 drawing title 工務計劃項目第7268RS號 - 荃灣至屯門單車徑 - 平面圖 PWP ITEM 7268RS - CYCLE TRACK BETWEEN TSUEN WAN AND TUEN MUN LAYOUT PLAN 繪圖 drawn W.P. LEUNG 校對 checked X. ZHANG 核准 approved J.H.Y. TANG 簽署 initiation 日期 date 30.03.22 30.03.22 30.03.22 項目編號 item no. 7268RS 比例 scale 1:75 000 圖則編號 drawing no. WDOTW-Z0091 辦事處 office 西拓展處 WEST DEVELOPMENT OFFICE 土木工程拓展署 CIVIL ENGINEERING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT
52CG	新界西南綠化總綱圖 - 優先綠化工程	53.5 (荃灣區的 費用)	土木工程 拓展署	2020 年 12 月 (2020 年年底)	2023 年年底 (2023 年年底)	荃灣區的綠化總綱圖主要為區內市中心、主要交通幹道及旅遊景點推展綠化措施以美化環境。 工程合約已於 2020 年 12 月展開。綠化工程已陸續動工,其中 27 個位置的種植工作已經完成。綠化工程將繼續按計劃分批進行。	 圖例 LEGEND:- 綠化總綱圖 FOCUS AREA 核心區 CORE TOWN CENTRES AND TOURIST ATTRACTION LOCATIONS 主要交通幹道 MAJOR TRANSPORTATION ROUTES 區議會界線 DISTRICT COUNCIL BOUNDARY 新界綠化總綱圖 GREENING MASTER PLAN FOR THE NEW TERRITORIES 荃灣區綠化總綱圖的焦點範圍 FOCUS AREA FOR TSUEN WAN GREENING MASTER PLANS LW8816 1:1 40 000 PROVISIONAL SUBJECT TO APPROVALS 圖則名稱 drawing title 新界綠化總綱圖 GREENING MASTER PLAN FOR THE NEW TERRITORIES 荃灣區綠化總綱圖的焦點範圍 FOCUS AREA FOR TSUEN WAN GREENING MASTER PLANS LW8816 1:1 40 000 繪圖 drawn 校對 checked 核准 approved 簽署 initiation 日期 date 30.03.22 30.03.22 30.03.22 項目編號 item no. 7268RS 比例 scale 1:75 000 圖則編號 drawing no. WDOTW-Z0091 辦事處 office 西拓展處 WEST DEVELOPMENT OFFICE 土木工程拓展署 CIVIL ENGINEERING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首 長及負責 部門/機構	動工日期 最新估計/實際 日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日 期 (原訂計劃)	工程內容／備註	照片
5001BX/D	長遠防治山泥 傾瀉計劃	1,042 (長遠防治 山泥傾瀉 計劃於 2023/24年 度的預算 費用)	土木工程 拓展署	2010 年 (2010 年)	持續進行 (持續進行)	在長遠防治山泥傾瀉計劃下，土木工程拓展署已為荃灣區154個人造斜坡及6個天然山坡完成了防治山泥傾瀉工程。 現時荃灣區有34個人造斜坡正在進行防治山泥傾瀉工程的人造斜坡資料如下： 合約編號: GE/2019/10 (合約已展開，預計於 2023 年第 4 季完成。) ● 1個位於城門郊野公園遊客中心的人造斜坡，編號7SW-A/C 208； ● 2個位於城門引[水道 N 段的人造斜坡，編號7SW-A/CR 201 及7SW-A/CR 209 合約編號: GE/2020/02 (合約已展開，預計於 2023 年第 3 季完成。) ● 2個位於老圍路傳耀臺的人造斜坡，編號7SW-C/C 1243及7SW-C/F 225； ● 1個位於荃灣顯達路的人造斜坡，編號7SW-C/F 156 合約編號: GE/2020/03 (合約已展開，預計於 2024 年第 1 季完成。) ● 1個位於深井舊村的人造斜坡，編號6SE-C/C62； ● 1個位於深井村屋的人造斜坡，編號6SE-C/C 157； ● 3個位於深井新村的人造斜坡，編號6SE-C/C279，6SE-C/C709及6SE-C/CR729； ● 2個位於城門引[水道的人造斜坡，編號 7SW-A/F 5及7SW-A/F7； ● 1個位於和宜合交匯處的人造斜坡，編號7SW-A/F 86	

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首 長及負責 部門/機構	動工日期 最新估計/實際 日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日 期 (原訂計劃)	工程內容／備註	照片
						合約編號: GE/2020/04 (合約已展開，預計於 2023 年第 4 季完成。) ● 2個位於荃錦公路的人造斜坡，編號6SE-B/F 126及6SE-B/FR 3； ● 2個位於荃灣城門引水道的人造斜坡，編號7SW-A/CR 110及7SW-A/CR 138； ● 1個位於西樓角村的人造斜坡，編號7SW-C/C736 合約編號: GE/2020/10 (合約已展開，預計於 2024 年第 4 季完成。) ● 1個位於北大嶼山公路的人造斜坡，編號10NE-A/C 108 合約編號: GE/2021/01 (合約已展開，預計於 2026 年第 2 季完成。) ● 1個位於大嶼山收費廣場行政大樓附近的人造斜坡，編號10NW-B/C15 合約編號: GE/2021/05 (合約已展開，預計於 2024 年第 4 季完成。) ● 1個位於荃灣老圍路的人造斜坡，編號6SE-C/R31； ● 1個位於大欖涌引水道的人造斜坡，編號6SE-D/C242； ● 1個位於荃灣老圍路的人造斜坡，編號7SW-C/R166 合約編號: GE/2021/11 (合約已展開，預計於 2025 年第 4 季完成。) ● 1個位於荃灣濾水廠員工宿舍的人造斜坡，編號7SW-C/C1459 合約編號: GE/2021/16 (合約已展開，預計於 2026 年第 1 季完成。) ● 1個位於光板田新村的人造斜坡，編號6SE-D/C628； ● 1個位於荃灣西超高食水配水庫的人造斜坡，編號6SE-B/C205	

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首 長及負責 部門/機構	動工日期 最新估計/實際 日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日 期 (原訂計劃)	工程內容／備註	照片
						● 1個位於荃灣青龍頭新村的人造斜坡，編號6SE-C/C105； ● 1個位於深井東村的人造斜坡，編號6SE-C/C365； ● 1個位於荃灣青龍頭新村豪景花園附近的人造斜坡，編號6SE-C/C533； ● 3個位於麗都灣泳灘的人造斜坡，編號6SE-C/C489, 6SE-C/C646及6SE-C/CR488； ● 1個位於圓玄學院西北面的人造斜坡，編號7SW-A/C391。 土木工程拓展署並計劃在未來一年為荃灣區另外 2 個人造斜坡展開防治山泥傾工程，相關工程預計於 2026 年第 1 季完成。	

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首 長及負責 部門/機構	動工日期 最新估計/實際 日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日 期 (原訂計劃)	工程內容／備註	照片
註釋: ● 已完成的工程 (人造斜坡及擋土牆) (154) ■ 已完成的工程 (天然山坡) (6) ■ 進行中的工程 (人造斜坡及擋土牆) (34) ▲ 將動工的工程 (人造斜坡及擋土牆) (2)							

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首 長及負責 部門/機構	動工日期 最新估計/實際 日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日 期 (原訂計劃)	工程內容／備註	照片
841CL	在大嶼山小蠔灣興建骨灰安置所的土地平整及相關基礎設施工程	182.0	土木工程 拓展署	2022 年 2 月 (2021 年 12 月)	2025 年年初 (2025 年年初)	841CL 號工程計劃的工程範圍包括：在小蠔灣進行土地平整工程，以進行骨灰安置所發展計劃；擴闊深水角徑一段現有路段；設置停車處及行人路以作上落客用途；以及進行相關附屬工程。 本項目的工程合約已於 2022 年 2 月展開，預計於 2025 年年初完成。	 工務計劃項目第841CL號 大嶼山小蠔灣興建骨灰安置所的土地平整及相關基礎設施工程 - 平面圖(一) PWP ITEM NO. 841CL SITE FORMATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURAL WORKS FOR DEVELOPMENT OF COLUMBARIUM AT SIU HO WAN ON LANTAU ISLAND - LAYOUT PLAN 1 工務計劃項目第841CL號 大嶼山小蠔灣興建骨灰安置所的土地平整及相關基礎設施工程 - 平面圖(二) PWP ITEM NO. 841CL SITE FORMATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURAL WORKS FOR DEVELOPMENT OF COLUMBARIUM AT SIU HO WAN ON LANTAU ISLAND - LAYOUT PLAN 2

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首 長及負責 部門/機構	動工日期 最新估計/實際 日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日 期 (原訂計劃)	工程內容／備註	照片
356EP	荃灣荃灣西站 (TW7) 發 展 項 目 1 所設有 30 間課室的小學	392.8	教育局 建築署	2021 年 9 月 30 日 (2021 年第三季)	2024 年第三季 (2024 年第三季)	工程計劃為在荃灣荃灣西站 (TW7)發展項目(即荃灣永順街) 興建一所設 30 間課室的小學， 以重置中華基督教會全完第一 小學。	
476RO	荃灣海濱公園 及荃灣公園改 善工程－第一 期發展計劃	308.1	文化體育 及旅遊局 建築署	2023 年 2 月 1 日 (2023 年第一季)	2025 年第四季 (2025 年第四季)	工程計劃為荃灣海濱公園進行 改善工程。 本項目的工程合約已於 2023 年 2 月展開，預計於 2025 年第四季 完成。	
