


2025 年荃灣區議會

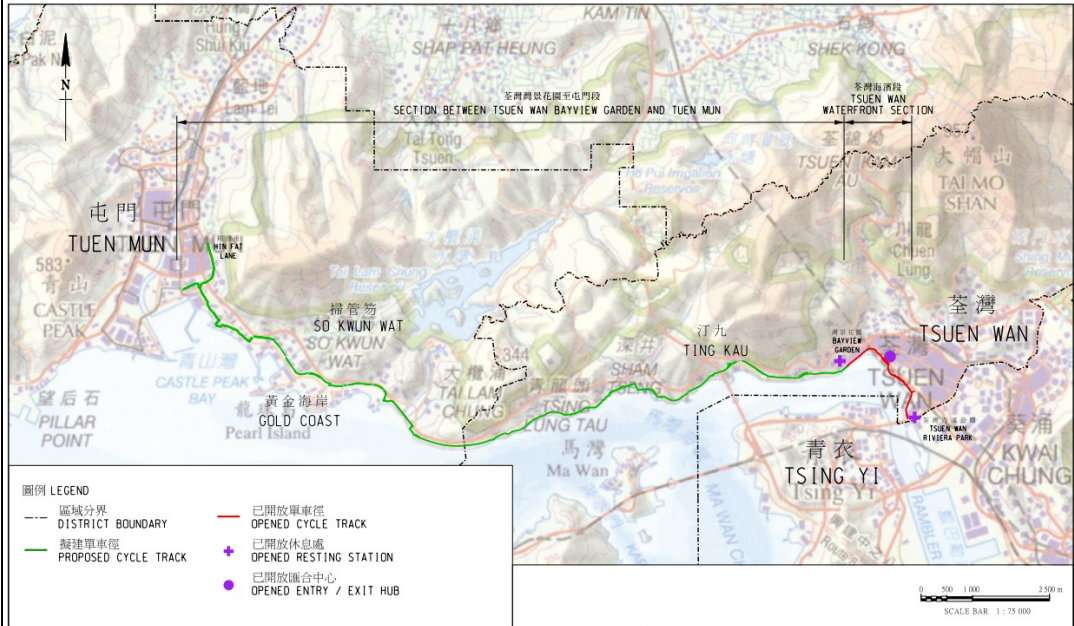

荃灣區地區工作計劃

土木工程拓展署
西拓展處
2025 年 3 月

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首 長及負責 部門/機構	動工日期 最新估計/實際 日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日 期 (原訂計劃)	2025-2026 年度工作計劃	照片																										
56TF/A	石仔灣碼頭改善工程	57.5	土木工程 拓展署	2022 年 12 月 15 日 (2022 年年尾)	2025 年年尾 (2026 年年頭)	工程包括拆卸現有石仔灣碼頭，及原址重建附設浮動平台、上蓋、照明系統、長椅、太陽能電池板、Wi-Fi 裝置及飲水機等輔助設施的新碼頭。 目前石仔灣碼頭的結構已大致完成，現在進行餘下的工作包括安裝上蓋及輔助設施。																											
268RS	荃灣至屯門單車徑	檢討中 (荃灣灣景花園至屯門段)	土木工程 拓展署	檢討中 (檢討中)	檢討中 (檢討中)	荃灣海濱段已於 2021 年 7 月開通。餘下的荃灣灣景花園至屯門段單車徑正在規劃中。	 圖例 LEGEND - 區域分界 DISTRICT BOUNDARY - 擬建單車徑 PROPOSED CYCLE TRACK - 已開放單車徑 OPENED CYCLE TRACK - 已開放休息處 OPENED RESTING STATION - 已開放匯合中心 OPENED ENTRY / EXIT HUB 圖則名稱 drawing title 工務計劃項目第7268RS號 - 荃灣至屯門單車徑 - 平面圖 PWP ITEM 7268RS - CYCLE TRACK BETWEEN TSUEN WAN AND TUEN MUN LAYOUT PLAN <table><tr><td>繪圖 draw</td><td>校對 checked</td><td>核實 approved</td><td>繪圖 initial</td><td>校對 initial</td><td>核實 initial</td><td>日期 date</td><td>日期 date</td><td>日期 date</td><td>項目編號 item no.</td><td>比例 scale</td><td>圖則編號 drawing no.</td><td>辦事處 office</td></tr><tr><td>S.F. CHAN</td><td>X. ZHANG</td><td>H.S. LEUNG</td><td></td><td></td><td></td><td>30.12.22</td><td>30.12.22</td><td>30.12.22</td><td>7268RS</td><td>1:75 000 (A4)</td><td>SDO-Z0426E</td><td>南拓展處 SOUTH DEVELOPMENT OFFICE</td></tr></table> 土木 工程 拓展 署 CIVIL ENGINEERING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT	繪圖 draw	校對 checked	核實 approved	繪圖 initial	校對 initial	核實 initial	日期 date	日期 date	日期 date	項目編號 item no.	比例 scale	圖則編號 drawing no.	辦事處 office	S.F. CHAN	X. ZHANG	H.S. LEUNG				30.12.22	30.12.22	30.12.22	7268RS	1:75 000 (A4)	SDO-Z0426E	南拓展處 SOUTH DEVELOPMENT OFFICE
繪圖 draw	校對 checked	核實 approved	繪圖 initial	校對 initial	核實 initial	日期 date	日期 date	日期 date	項目編號 item no.	比例 scale	圖則編號 drawing no.	辦事處 office																					
S.F. CHAN	X. ZHANG	H.S. LEUNG				30.12.22	30.12.22	30.12.22	7268RS	1:75 000 (A4)	SDO-Z0426E	南拓展處 SOUTH DEVELOPMENT OFFICE																					

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首 長及負責 部門/機構	動工日期 最新估計/實際 日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日 期 (原訂計劃)	2025-2026 年度工作計劃	照片
5001BX/D	長遠防治山泥 傾瀉計劃	1,300 (長遠防治 山泥傾瀉 計劃於 2025/26年 度的預算 費用)	土木工程 拓展署	2010 年 (2010 年)	持續進行 (持續進行)	在長遠防治山泥傾瀉計劃下，土木工程拓展署已為荃灣區194個人造斜坡及6個天然山坡完成了防治山泥傾瀉工程。 現時荃灣區有17個人造斜坡正在進行防治山泥傾瀉工程。人造斜坡資料如下： 合約編號: GE/2020/03 (合約已展開，預計於 2026 年第 1 季完成。) ● 1個位於城門引水道的人造斜坡，編號 7SW-A/F7； 合約編號: GE/2021/16 (合約已展開，預計於 2025 年第 1 季完成。) ● 1個位於荃錦公路的人造斜坡，編號6SE-B/FR92 ● 1個位於深井消防局的人造斜坡，編號6SE-C/C300 ● 1個位於深井新村近1-18號屋的人造斜坡，編號6SE-C/FR 22 ● 1個位於深井消防局暨救護站的人造斜坡，編號6SE-C/FR 94 ● 1個位於青山公路-嘉御龍庭的人造斜坡，編號6SE-D/FR 63 合約編號: GE/2021/22 (合約已展開，預計於2026年第1季完成。) ● 1個位於涌村中葵涌村 7 - 12 號屋後的人造斜坡，編號 7SW-C/C1121 ● 1個位於涌村中葵涌村 2 - 6 號屋後的人造斜坡，編號 7SW-C/C1134 合約編號: GE/2022/02 (合約已展	

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首 長及負責 部門/機構	動工日期 最新估計/實際 日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日 期 (原訂計劃)	2025-2026 年度工作計劃	照片
						開，預計於2026年第1季完成。) ● 1個位於大欖涌M段的人造斜坡，編號6SE-D/C242 合約編號: GE/2022/03 (合約已展開，預計於2025年第2季完成。) ● 1個位於深井東村休憩處的人造斜坡，編號6SE-C/CR354 ● 1個位於荃灣老圍村的人造斜坡，編號7SW-A/CR429 合約編號: GE/2022/15 (合約已展開，預計於 2026 年第 2 季完成。) ● 1個位於曹公潭戶外康樂中心的人造斜坡，編號6SE-B/CR382 ● 1個位於荃灣流芳園附近的人造斜坡，編號7SW-C/C356 合約編號: GE/2022/24 (合約已展開，預計於 2027 年第 3 季完成。) ● 1個位於葵涌重置鄉村的人造斜坡，編號7SW-C/R375 合約編號: GE/2023/14 (合約已展開，預計於 2027 年第 1 季完成。) ● 1個位於老圍的人造斜坡，編號7SW-A/C108 ● 1個位於大窩口楊屋村的人造斜坡，編號7SW-C/C1386 ● 1個位於大窩口楊屋村的人造斜坡，編號7SW-C/C1387 土木工程拓展署並計劃在未來一年為荃灣區另外12個人造斜坡展開防治山泥傾工程，相關工程預計於2027年第1季完成。	

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首 長及負責 部門/機構	動工日期 最新估計/實際 日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日 期 (原訂計劃)	2025-2026 年度工作計劃	照片
841CL	在大嶼山小蠔灣興建骨灰安置所的土地平整及相關基礎設施工程	182.0	土木工程 拓展署	2022 年 2 月 (2021 年 12 月)	2025 年年中 (2025 年年初)	841CL 號工程計劃的工程範圍包括：在小蠔灣進行土地平整工程，以進行骨灰安置所發展計劃；擴闊深水角徑一段現有路段；設置停車處及行人路以作上落客用途；以及進行相關附屬工程。 本項目的工程合約已於 2022 年 2 月展開。土地平整工程已大致完成，現正進行相關基礎設施工程，預計於 2025 年年中完成。	工務計劃項目第841CL號 大嶼山小蠔灣興建骨灰安置所的土地平整及相關基礎設施工程 - 平面圖(一) PWP ITEM NO. 841CL SITE FORMATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURAL WORKS FOR DEVELOPMENT OF COLUMBARIUM AT SIU HO WAN ON LANTAU ISLAND - LAYOUT PLAN 1 工務計劃項目第841CL號 大嶼山小蠔灣興建骨灰安置所的土地平整及相關基礎設施工程 - 平面圖(二) PWP ITEM NO. 841CL SITE FORMATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURAL WORKS FOR DEVELOPMENT OF COLUMBARIUM AT SIU HO WAN ON LANTAU ISLAND - LAYOUT PLAN 2

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首 長及負責 部門/機構	動工日期 最新估計/實際 日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日 期 (原訂計劃)	2025-2026 年度工作計劃	照片
871CL	荃灣國瑞路公 營房屋發展的 工地平整及基 礎設施工程－ 第二期	119.2	土木工程 拓展署	2024 年 6 月	2027 年第 4 季	871CL 號工程計劃的工程範圍包括－ (a) 興建一條橫跨青山公路－葵涌段的行人天橋及相關的升降機設施； (b) 擴闊國瑞路一段由安全貨倉至新豐中心之間的現有雙線不分隔行車道；及 (c) 進行相關附屬工程，包括排水、排污、供水和環境美化工程。 於 2025-2026 年度，土木工程拓展署會繼續進行基礎設施工程，預計於 2027 年第 4 季完成。	
