



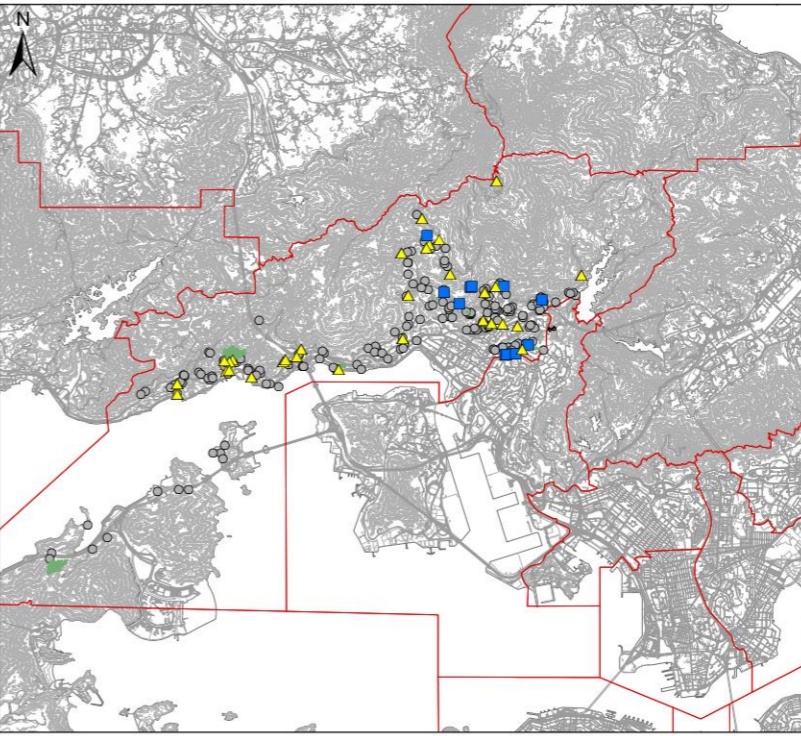
2026 年荃灣區議會



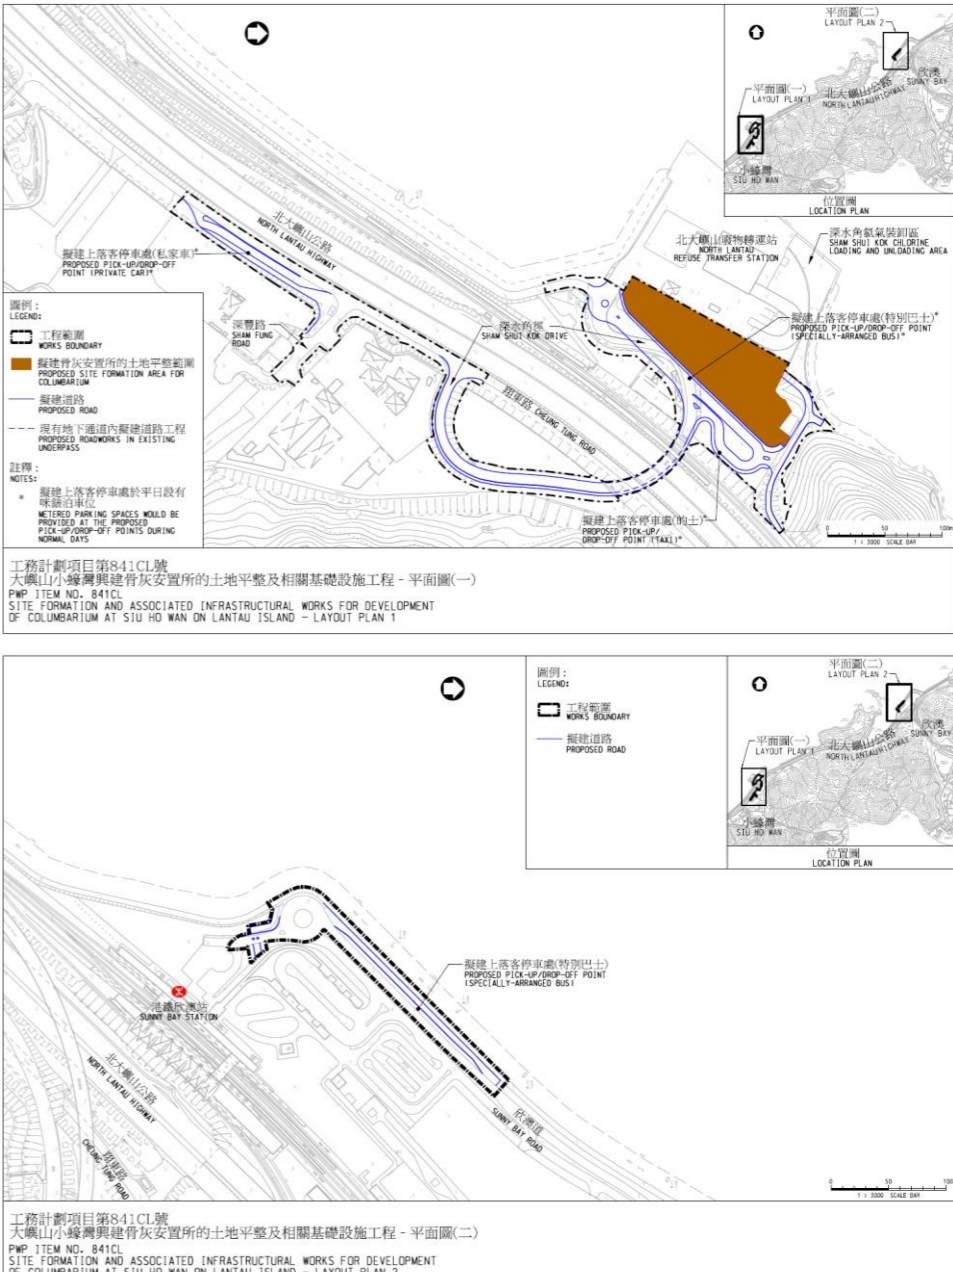
荃灣區地區工作計劃

土木工程拓展署
西拓展處
2026 年 5 月

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期 最新估計/實際日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日期 (原訂計劃)	2026-2027 年度工作計劃	照片
56TF/A	石仔灣碼頭改善工程	57.5	土木工程拓展署	2022年12月 (2022年年尾)	2025年10月 (2026年年頭)	新的石仔灣碼頭已於2025年12月23日啟用。	
268RS/A	荃灣至屯門單車徑	檢討中 (荃灣灣景花園至屯門段)	土木工程拓展署	檢討中 (檢討中)	檢討中 (檢討中)	<p>工程範圍包括興建一條連貫荃灣至屯門的單車徑及相關的輔助設施。前期工程合約(即荃灣海濱公園至荃灣灣景花園段)已在2021年7月全面開通。</p> <p>就餘下的荃灣灣景花園至屯門段單車徑而言,政府現階段正暫緩推展有關項目,並會適時檢視項目的推展時間表。</p>	 <p>drawing title 荃灣至屯門單車徑 CYCLE TRACK BETWEEN TSUEN WAN AND TUEN MUN</p> <p>item no. office N. T. S. EAST DEVELOPMENT OFFICE</p> <p>drawing no. CEDD 土木工程拓展署 EDD-Z0001 CIVIL ENGINEERING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT</p>

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期 最新估計/實際日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日期 (原訂計劃)	2026-2027 年度工作計劃	照片
5001BX/D	長遠防治山泥傾瀉計劃	1,389 (長遠防治山泥傾瀉計劃於2026/27年度的預算費用)	土木工程拓展署	2010 年 (2010 年)	持續進行 (持續進行)	<p>在長遠防治山泥傾瀉計劃下，土木工程拓展署已為荃灣區210個人造斜坡及6個天然山坡完成了防治山泥傾瀉工程。</p> <p>現時荃灣區有11個人造斜坡正在進行防治山泥傾瀉工程。人造斜坡資料如下：</p> <p>合約編號: GE/2020/03 (合約已展開，預計於 2027 年第 4 季完成。)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1個位於城門引水道的人造斜坡，編號 7SW-A/F7； <p>合約編號: GE/2020/07 (合約已展開，預計於 2026 年第 3 季完成。)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1個位於國瑞路公園的人造斜坡，編號7SW-C/FR188 ● 1個位於國瑞路公園的人造斜坡，編號7SW-C/FR 563 <p>合約編號: GE/2021/11(合約已展開，預計於 2026 年第 3 季完成。)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1個位於荃錦公路響石墳場的人造斜坡，編號7SW-A/F25 ● 1個位於荃錦公路響石墳場的人造斜坡，編號7SW-A/F26 <p>合約編號: GE/2022/09 (合約已展開，預計於 2026 年第 4 季完成。)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1個位於荃灣光板田新村的人造斜坡，編號6SE-B/CR234 ● 1個位於 荃灣城門引水道附近的人造斜坡，編號 6SE-B/CR246 <p>合約編號: GE/2022/15 (合約已展開，預計於 2026 年第 2 季完成。)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1個位於中葵涌村39座南面的人造斜坡，編號7SW-C/C 1132 	 <p>註釋:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 進行中的工程 (人造斜坡及壙土壙) (1) ● 將動工的工程 (人造斜坡及壙土壙) (5) ● 已完成的工程 (天然山坡) (6) ● 已完成的工程 (人造斜坡及壙土壙) (210) ● 將動工的工程 (天然山坡)(1) <p>工程項目: 長遠防治山泥傾瀉計劃</p> <p>圖則編號: SK-01</p> <p>日期: 2026年5月</p> <p>CEDD 土力工程處 土木工程拓展署</p>

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首 長及負責 部門/機構	動工日期 最新估計/實際 日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日 期 (原訂計劃)	2026-2027 年度工作計劃	照片
						<ul style="list-style-type: none"> ● 1個位於國瑞路公園的人造斜坡，編號7SW-C/CR1265 合約編號: GE/2024/11 (合約已展開，預計於2027年第2季完成。) <ul style="list-style-type: none"> ● 1個位於荃灣和宜合村的人造斜坡，編號7SW-A/C444 合約編號: GE/2025/02 (合約已展開，預計於2027年第4季完成。) <ul style="list-style-type: none"> ● 1個位於荃灣川龍燈柱編號V3841以西25米的人造斜坡，編號6SE-B/C389 土木工程拓展署並計劃在未來一年為荃灣區另外30個人造斜坡及1個天然山坡展開防治山泥傾工程，相關工程預計於2028年第2季完成。	

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期 最新估計/實際日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日期 (原訂計劃)	2026-2027 年度工作計劃	照片
841CL	在大嶼山小蠔灣興建骨灰安置所的土地平整及相關基礎設施工程	182.0	土木工程拓展署	2022年2月 (2021年12月)	2025年年中 (2025年年初)	<p>841CL 號工程計劃的工程範圍包括：在小蠔灣進行土地平整工程，以進行骨灰安置所發展計劃；擴闊深水角徑一段現有路段；設置停車處及行人路以作上落客用途；以及進行相關附屬工程。</p> <p>本項目的工程合約已於 2022 年 2 月展開。土地平整工程已經完成，而相關基礎設施工程，亦已於 2025 年中大致完成。</p>	 <p>工務計劃項目第841CL號 大嶼山小蠔灣興建骨灰安置所的土地平整及相關基礎設施工程 - 平面圖(一) PWP ITEM NO. 841CL SITE FORMATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURAL WORKS FOR DEVELOPMENT OF COLUMBARIUM AT SIU HO WAN ON LANTAU ISLAND - LAYOUT PLAN 1</p> <p>工務計劃項目第841CL號 大嶼山小蠔灣興建骨灰安置所的土地平整及相關基礎設施工程 - 平面圖(二) PWP ITEM NO. 841CL SITE FORMATION AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURAL WORKS FOR DEVELOPMENT OF COLUMBARIUM AT SIU HO WAN ON LANTAU ISLAND - LAYOUT PLAN 2</p>

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期 最新估計/實際日期 (原訂計劃)	竣工日期 最新估計/實際日期 (原訂計劃)	2026-2027 年度工作計劃	照片
871CL	荃灣國瑞路公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程－第二期	119.2	土木工程拓展署	2024年6月	2027年第4季	<p>871CL 號工程計劃的工程範圍包括－</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 興建一條橫跨青山公路－葵涌段的行人天橋及相關的升降機設施； (b) 擴闊國瑞路一段由安全貨倉至新豐中心之間的現有雙線不分隔行車道；及 (c) 進行相關附屬工程，包括排水、排污、供水和環境美化工程。 <p>於 2026-2027 年度，土木工程拓展署會繼續進行基礎設施工程，預計於 2027 年第 4 季完成。</p>	
