

工務計劃 編號及 級別	負責部門	工程說明	估計費用 〔百萬元〕	工程計劃				備註／工程計劃延誤原因
				開工日期		完成日期		
				上次報告	今次報告	上次報告	今次報告	
總目706 分目6101TX	路政署	<u>運輸</u> 人人暢道通行計劃 為橫跨告士打道與分域街的行人天橋 (結構編號：HF145)提供無障礙通道設施	57.50	已開始	已開始	一號升降機: 已完成	一號升降機: 已完成	一號升降機（近捷利中心）: 已於2021年12月啓用
						二號升降機: 2024年 第2季	二號升降機: 2024年 第2季	二號升降機（近告士打道內街）: 該項工程已於2021年11月展開，預計於2024年第2季完成。
677CL 甲	土木工程 拓展署	<u>土木工程</u> 土地發展 合約編號SD/2019/03「西園景平台及其他道路工程」	279.00	已開始	已開始	2026年	2026年	工程主要包括於灣仔北進行西園景平台的建造工程，以及其他有關道路工程。 有關工程預計於2026年完成。
	土木工程 拓展署	<u>公眾安全</u> 長遠防治山泥傾瀉計劃 合約號碼GE/2018/01 位於大坑道上方的天然山坡 天然山坡編號：11SE-C/SA1	6.50	19 年 第 2 季	19 年 第 2 季	24 年 第 4 季	25 年 第 3 季	合約已展開。 工程進行中。 工程範圍主要包括安裝泥釘及柔性防護網。
		位於大坑道 48189 號燈柱附近 斜坡編號：11SE-C/F 217	3.2					工程進行中。工程將納入與11SE-C/SA1工程一併進行。
		位於大坑道 48194 號燈柱附近 斜坡編號：11SE-C/F 218	2.8					工程進行中。工程將納入與11SE-C/SA1工程一併進行。
		位於布力徑 斜坡編號：11SE-C/F 31	待定					工程將動工。工程範圍主要包括安裝泥釘。

工務計劃 編號及 級別	負責部門	工程說明	估計費用 〔 百萬元 〕	工程計劃				備註／工程計劃延誤原因
				開工日期		完成日期		
				上次報告	今次報告	上次報告	今次報告	
	土木工程 拓展署	合約號碼GE/2020/08 位於黃泥涌煤氣調壓站 斜坡編號：11SE-C/F 95	1.10	21 年 第 1 季	21 年 第 1 季	25 年 第 4 季	25 年 第 4 季	合約已展開。 工程進行中。工程範圍主要包括安裝泥釘。
		合約號碼GE/2021/01 位於灣仔峽道休憩處 斜坡編號：11SW-D/F 98	待定	22 年 第 4 季	22 年 第 4 季	26 年 第 2 季	26 年 第 2 季	合約已展開。 工程將動工。工程範圍主要包括安裝泥釘。
		合約號碼GE/2021/11 位於何東中學 斜坡編號：11SE-A/C 104	待定	22 年 第 2 季	22 年 第 2 季	25 年 第 4 季	25 年 第 4 季	合約已展開。 工程將動工。工程範圍主要包括安裝泥釘。
		位於大坑道 斜坡編號：11SE-A/CR 105	待定					工程將動工。工程範圍主要包括安裝泥釘。
		位於司徒拔道東區二號食水配水庫 斜坡編號：11SW-D/C 378	待定					工程將動工。工程範圍主要包括安裝泥釘。
		合約號碼GE/2022/03 位於萬茂臺遊樂場 斜坡編號：11SW-B/CR 234	待定	-	22 年 第 3季	-	26 年 第 1季	合約已展開。 工程進行中。工程範圍主要包括安裝泥釘。
		位於萬茂臺遊樂場 斜坡編號：11SW-B/R 614	待定					工程將動工。工程範圍主要包括安裝泥釘。
		合約號碼GE/2022/05 位於香港山頂道 斜坡編號：11SW-D/C 589	待定	-	22 年 第 4季	-	27 年 第 2季	合約已展開。 工程將動工。工程範圍主要包括安裝泥釘。
		合約號碼GE/2022/06 位於馬己仙峽道 斜坡編號：11SW-D/FR 104	待定	23年 第 1 季	23年 第 1 季	26年 第 2 季	26年 第 2 季	合約已展開。 工程將動工。工程範圍主要包括安裝泥釘。
		位於寶雲道 26715 號燈柱附近 斜坡編號：11SW-D/R 606	待定					工程進行中。工程範圍主要包括安裝泥釘。

灣仔區交通及運輸工程概覽

工務計劃 編號及 級別	負責部門	工程說明	估計費用 〔百萬元〕	工程計劃				備註／工程計劃延誤原因	
				開工日期		完成日期			
				上次報告	今次報告	上次報告	今次報告		
196WC 甲	水務署	水務供應 水務工程 智管網之水壓管理及區域監測裝置建造工程 - 餘下工程 (合約編號：13/WSD/19)	424.28	已開始	已開始	25年 第 1 季	25年 第 1 季	工程項目包括在灣仔區建造25個監測區域。 截至2024年3月31日，水務署已在灣仔區建立6個監測區域。	
100WX 丁	水務署	風險為本水管改善工程-香港及離島 (合約編號：2/WSD/21)	547	已開始	已開始	25 年 第 1 季	25 年 第 1 季		
		軍器廠街		已開始	已開始	24 年 第 3 季	24 年 第 3 季		更換食水管工程範圍位於告士打道與軒尼詩道之間的軍器廠街南行線，工程主要分三階段進行。 (i)位於行車天橋下的工程已完工。 (ii)位於告士打道與駱克道之間，為避免影響軍器廠街日間的交通，工程將會改為夜間進行，預計於2024年第 1 季展開。 (iii)位於駱克道與軒尼詩道之間，更換食水管鋪設及接駁工程已完成。 整項工程預計於2024年第3季完成。
		軒尼詩道(近菲林明道交界)		24年第 1 季	24年第 2 季	24年第 2 季	24年第 2 季		為避免影響軒尼詩道的交通，更換食水管工程將會採用無坑挖掘方法進行。因工程位於交通繁忙路段，工程需安排夜間進行。因應工程安排改動，現正等候更新的建築噪音許可證審批。工程預計於2024年第1季展開，並於2024年第2季完成。
		灣仔道、莊士頓道及克街之間		已開始	已開始	24 年 第 2 季	已完成		更換鹹水管工程已於2024年第 1季完成。

灣仔區交通及運輸工程概覽

工務計劃 編號及 級別	負責部門	工程說明	估計費用 〔 百萬元 〕	工程計劃				備註／工程計劃延誤原因
				開工日期		完成日期		
				上次報告	今次報告	上次報告	今次報告	
100WX 丁	水務署	香港與離島及新界西風險為本小型水管改善工程 (合約編號:12/WSD/20)	174.83	已開始	已開始	24 年 第 2 季	24 年 第 2 季	更換食水管及鹹水管之前期工程已完成。根據挖掘探洞記錄，後巷地方狹窄及地下佈滿喉管設施，確定無法在該位置敷設新水管，現正研究能否優化其他合約已敷設的食水管，作可行的解決方案。
		譚臣道後巷	已開始	已開始	23年 第 4 季	24年第 2 季		
		加路連山道	已開始	已開始	24 年 第 1 季	24 年 第 2 季	食水管更換工程已於24年1月完成。更換鹹水管工程進行中，預計於24年第1季完成。	
172CD 甲	渠務署	渠務工程 合約編號DC/2020/09「地下雨水渠修復工程 - 第三階段」	373.23					一段約3米的地下雨水渠修復工程。預計不牽涉掘路工程。因工程圍封範圍需要改動，工程展開日期已修正，預計將於2024年第3季展開。
		綿發街	24 年 第 3 季	24 年 第 3 季	24 年 第 3 季	24 年 第 3 季		
		昌明街	24 年 第 3 季	24 年 第 3 季	24 年 第 3 季	24 年 第 3 季	一段約24米的地下雨水渠修復工程。預計不牽涉掘路工程。因工程圍封範圍需要改動，工程展開日期已修正，預計將於2024年第3季展開。	




工務計劃 編號及 級別	負責部門	工程說明	估計費用 〔百萬元〕	工程計劃				備註／工程計劃延誤原因
				開工日期		完成日期		
				上次報告	今次報告	上次報告	今次報告	
4100DX 丁	渠務署	合約編號DC/2020/08「污水渠及雨水渠結構改善工程(2020) - 香港島、觀塘、西貢及大埔」 告士打道近大新金融中心	115.24	已開始	已開始	24 年 第1季	已完成	一段約60米的地下污水渠修復工程已於2024年2月完工。
		合約編號DC/2021/01「敷設置富道雨水渠及新界及市區小型渠務改善工程」 寶雲道	11.00	已開始	已開始	24 年 第 4 季	24 年 第 4 季	工程進行中。工程範圍主要包括沿寶雲道鋪設長約850米雨水渠。施工前期勘察工作進行中，工程預計將於2024年第4季完工。
4414DS 甲	渠務署	合約編號DC/2023/10「地下污水渠修復工程 - 第四階段」 銅鑼灣道近大坑道交界	306.40	-	24 年 第 2 季	-	24 年 第 2 季	工程將動工。一段約25米的地下雨水渠修復工程。施工前期勘察工作進行中，工程將於2024年第2季完工。
		其他機構的掘路工程						有關除政府部門外的其他機構在灣仔區的掘路工程，請參閱路政署提供的附件。

除政府部門外的其他機構在灣仔區的掘路工程 (5.4.2024)

編號	開始日期	完工日期	機構	地點	附近
1276269	22/09/2023	22/04/2024	GAS	告士打道	維園道
1334069	12/02/2024	22/04/2024	HTL	軒尼詩道	波斯富街
1335064	08/04/2024	23/04/2024	HEC	黃泥涌道	厚德里
1201978	14/07/2023	25/04/2024	HEC	棉花路	聖保祿醫院
1326895	25/01/2024	25/04/2024	HKC	藍塘道	雲地利道
1337405	14/02/2024	27/04/2024	HEC	太原街	門牌編號 22
1263971	24/10/2022	29/04/2024	HEC	愛群道	皇后大道東
1288764	15/07/2023	30/04/2024	HEC	棉花路	門牌編號 3
1281800	06/11/2023	30/04/2024	HEC	灣仔道	廣生行大廈
1332640	20/03/2024	02/05/2024	WTT	永興街	興發街
1336799	25/03/2024	03/05/2024	HEC	成和道	成和坊
1337711	22/02/2024	06/05/2024	HEC	怡和街後巷	糖街
1337771	23/02/2024	09/05/2024	HEC	黃泥涌道	門牌編號 161 - 171
1338039	29/02/2024	13/05/2024	HEC	景隆街	門牌編號 6
1337589	19/02/2024	14/05/2024	HEC	成和道	門牌編號 16 - 18
1333574	13/03/2024	14/05/2024	WTT	博覽道東	金紫荊廣場
1278756	08/05/2023	15/05/2024	HEC	謝斐道	門牌編號 173
1327659	14/08/2023	16/05/2024	OTH	春園街	堅尼地道
1332641	11/03/2024	16/05/2024	WTT	藍塘道	載德街
1338279	06/03/2024	20/05/2024	HEC	交加街	門牌編號 8 - 12
1337127	01/02/2024	22/05/2024	HEC	告士打道	維多利亞公園
1337712	22/02/2024	23/05/2024	HEC	盧押道	街燈編號 36011
1301846	08/05/2023	27/05/2024	HEC	謝斐道	駱克道
1327678	19/02/2024	27/05/2024	HEC	告士打道	街燈編號 39793
1334710	01/03/2024	27/05/2024	OTH	山光道	街燈編號 14846
1329733	19/02/2024	28/05/2024	HEC	新村街	門牌編號 17A - 25
1337875	26/02/2024	29/05/2024	HEC	怡和街	門牌編號 9 - 15
1338462	12/03/2024	29/05/2024	HEC	琉璃街	門牌編號 3 - 7
1228538	22/05/2023	31/05/2024	GAS	黃泥涌道	皇后大道東
1337511	02/04/2024	31/05/2024	OTH	捷船街	街燈編號 49242
1334391	10/04/2024	04/06/2024	OTH	司徒拔道	門牌編號 1
1336730	22/01/2024	08/06/2024	HEC	告士打道	樂聲大廈
1338755	19/03/2024	12/06/2024	HEC	茂蘿街	門牌編號 7
1318371	29/02/2024	13/06/2024	HEC	告士打道	門牌編號 56
1333331	05/02/2024	18/06/2024	HEC	謝斐道後巷	門牌編號 173 - 175
1331844	29/03/2024	26/06/2024	HEC	交加街	門牌編號 4 - 10
1332544	02/04/2024	26/06/2024	OTH	寶雲道	雲地利道

除政府部門外的其他機構在灣仔區的掘路工程 (5.4.2024)

編號	開始日期	完工日期	機構	地點	附近
1301631	01/04/2024	27/06/2024	HEC	堅尼地道	門牌編號 269
1315263	20/11/2023	03/07/2024	OTH	銅鑼灣道	聖保祿醫院
1321599	17/07/2023	09/07/2024	HEC	堅尼地道	門牌編號 58 - 60
1290395	11/09/2023	09/07/2024	HEC	景光街	毓秀街
1325399	09/01/2024	09/07/2024	GAS	伊榮街	門牌編號 9 - 21
1327008	06/03/2024	27/07/2024	OTH	駱克道	兆安中心
1286379	11/09/2023	19/08/2024	HEC	告士打道	門牌編號 223 - 250
1119863	21/08/2023	21/08/2024	HEC	藍塘道	雲地利道
1290054	04/03/2024	31/08/2024	GAS	謝斐道	馬師道
1264191	16/10/2023	22/10/2024	HEC	莊士敦道	柯布連道
1277133	06/11/2023	25/10/2024	HEC	謝斐道	景隆街
1241528	04/03/2024	31/10/2024	HEC	普善街	山光道
1291819	05/10/2023	05/11/2024	HEC	箕璫坊	蟠龍道
1320074	27/10/2023	12/12/2024	HEC	石水渠街	皇后大道東
1301397	25/03/2024	18/03/2025	HEC	銅鑼灣道	浣紗街
1288539	25/03/2024	12/04/2025	HEC	告士打道	菲林明道
1316174	20/03/2024	17/04/2025	HEC	軒尼詩道	門牌編號 432 - 472
1331431	01/04/2024	13/03/2026	OTH	雲地利道	門牌編號 15

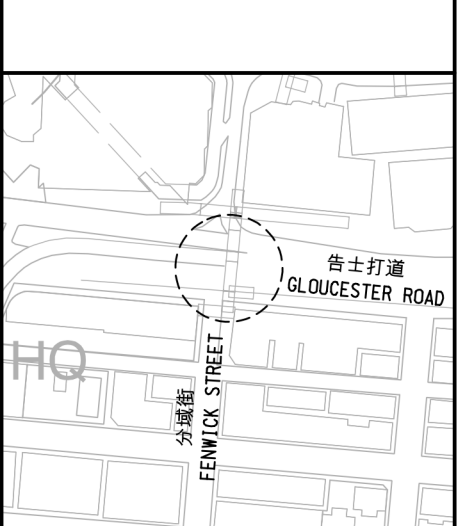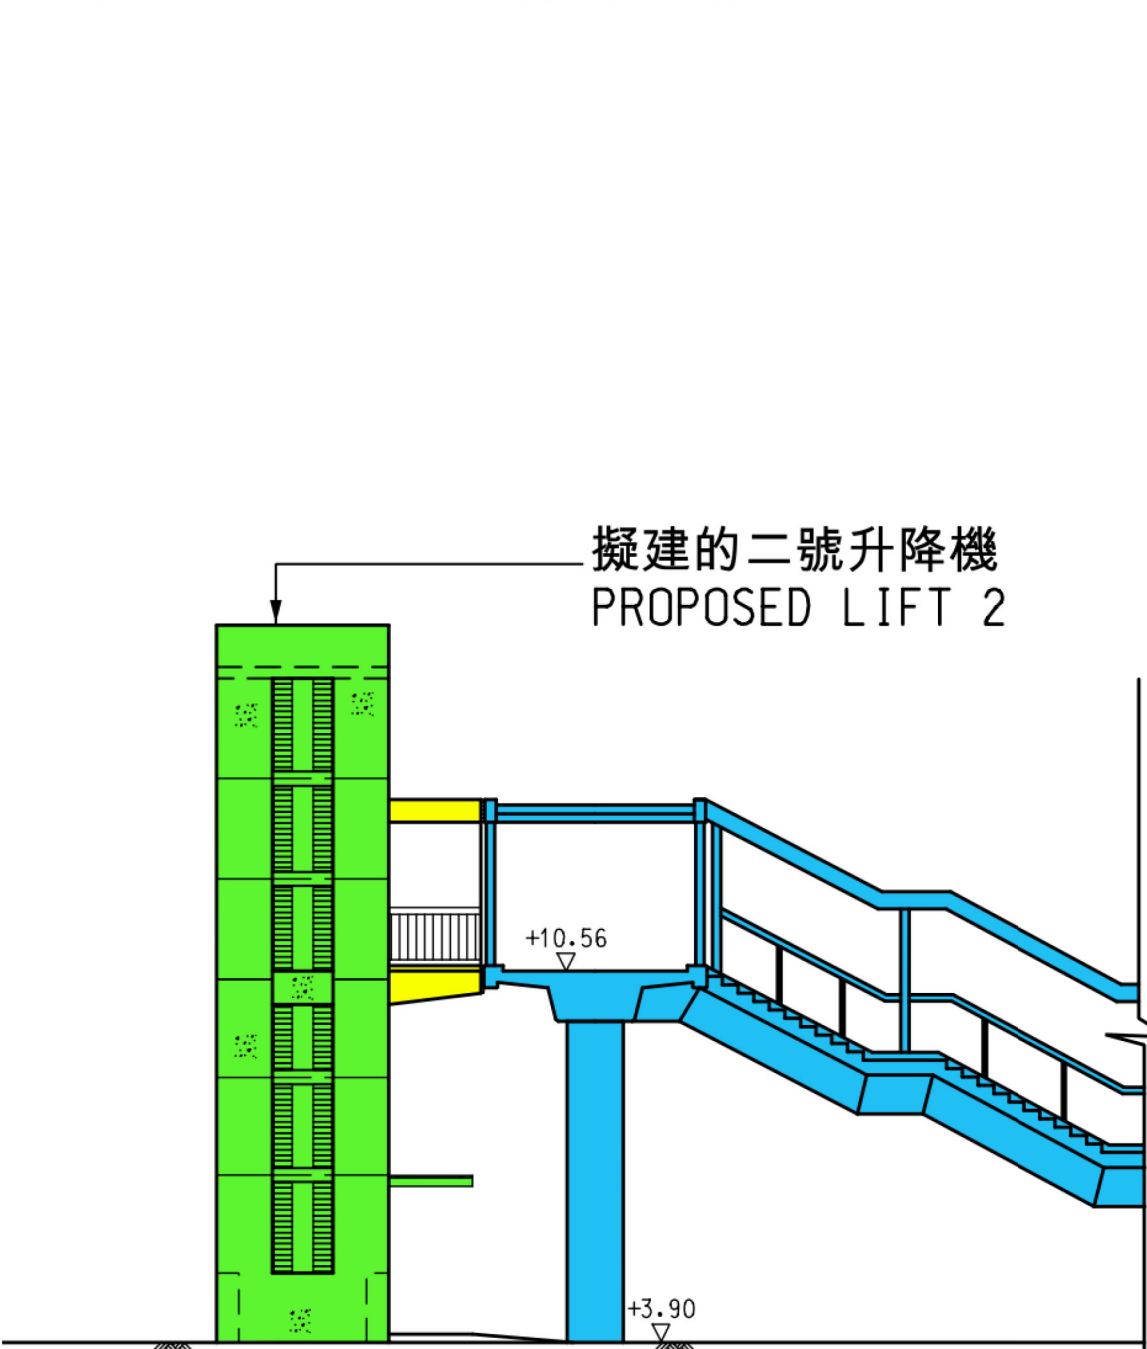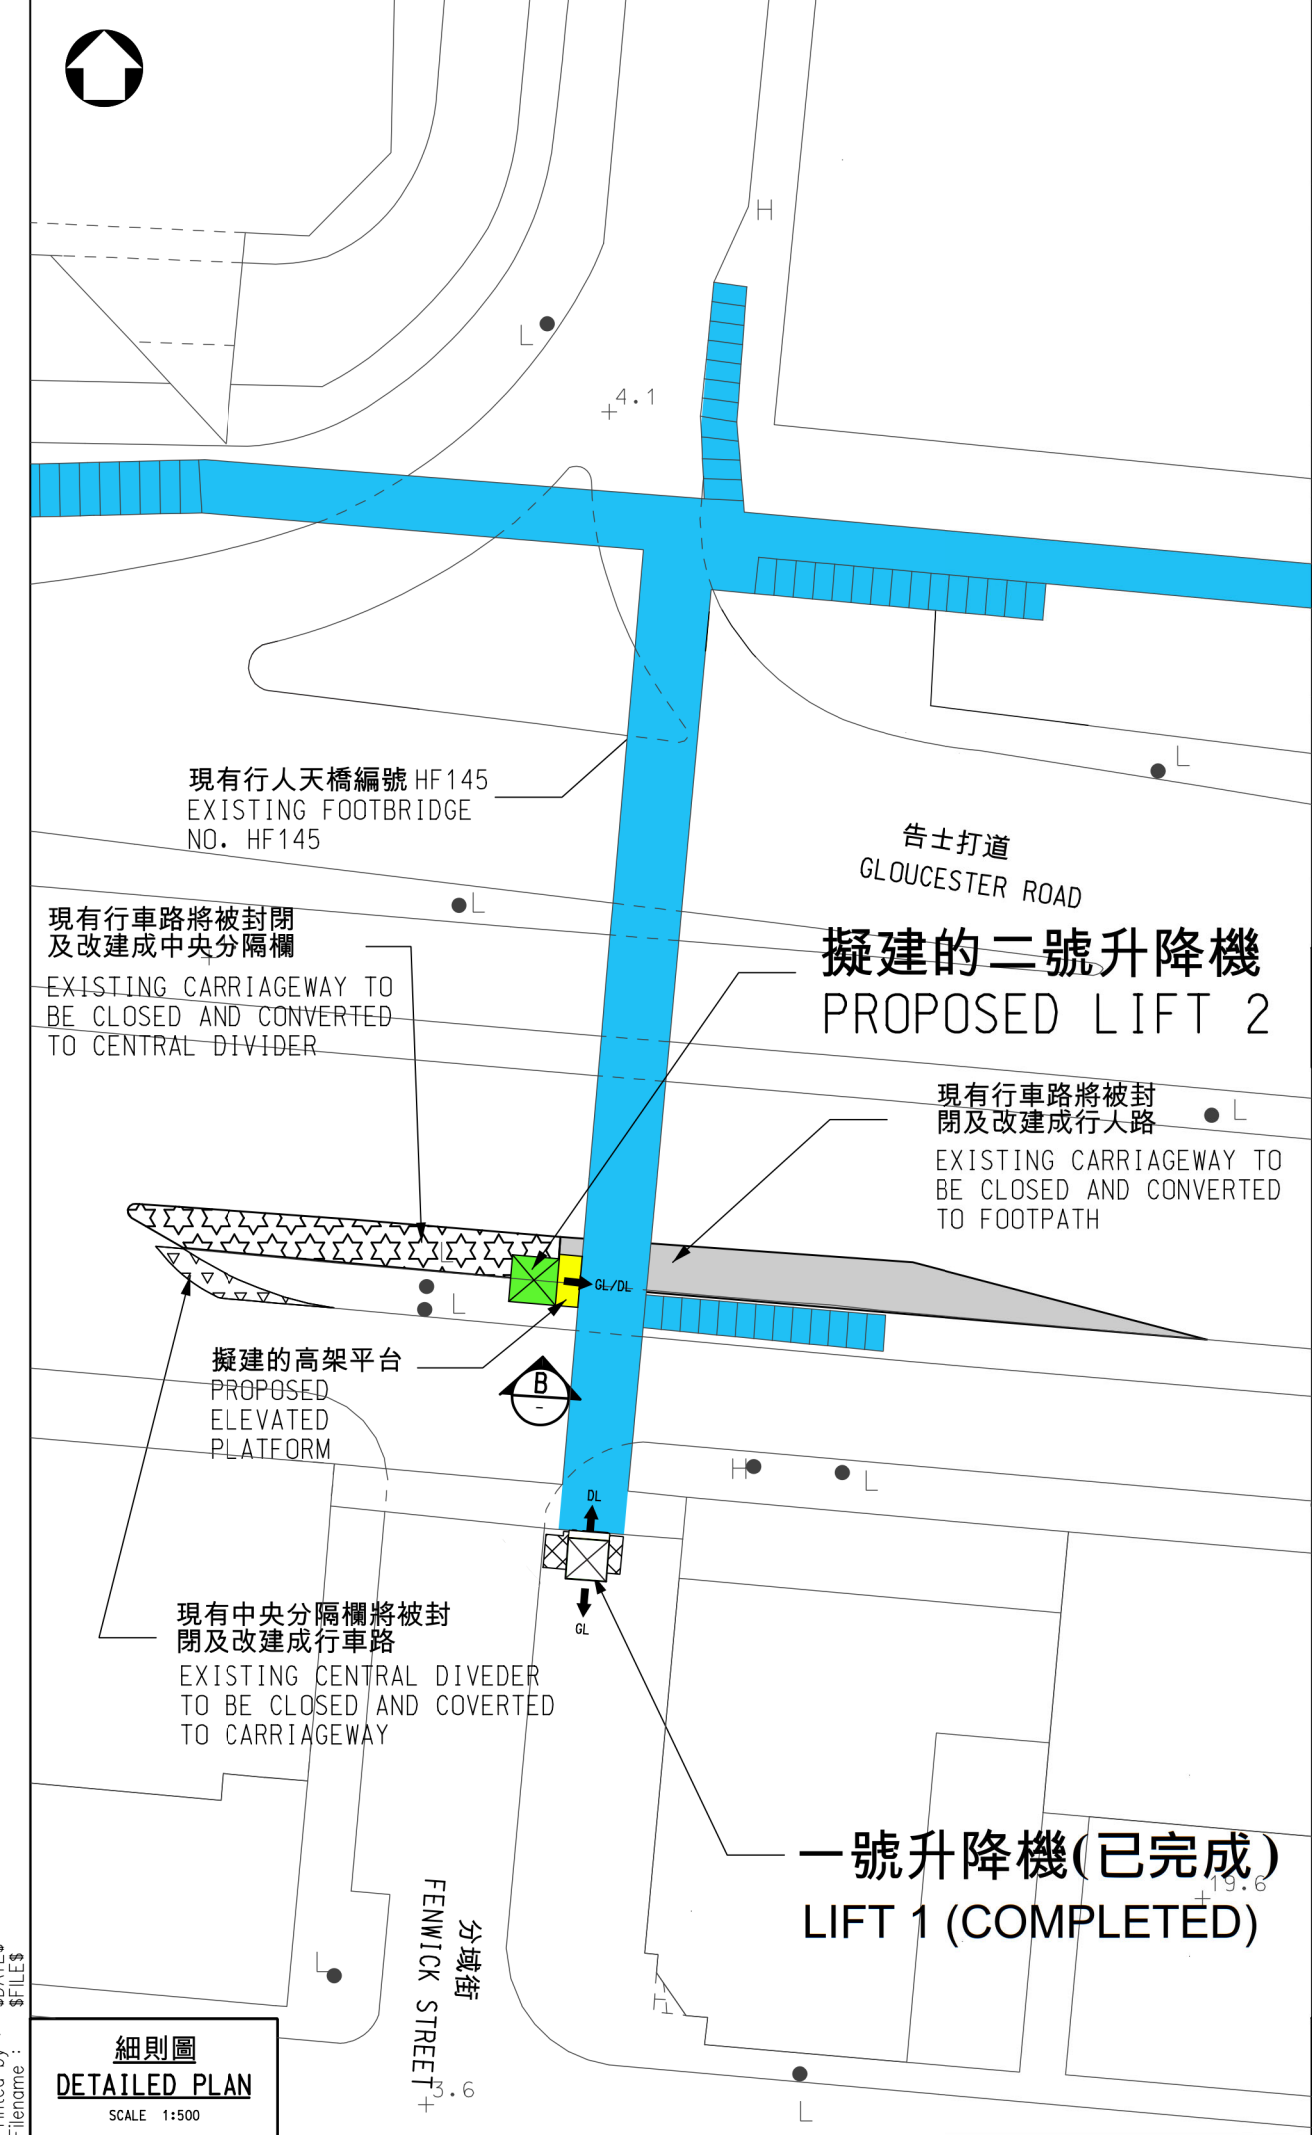

索引圖 KEY PLAN
比例 1:5000

圖例 LEGEND:

- 現有行人天橋編號 HF145
EXISTING FOOTBRIDGE NO. HF145
- 升降機地面出口
LIFT DOOR OPENING AT GROUND LEVEL
- 升降機天橋出口
LIFT DOOR OPENING AT DECK LEVEL
- 擬建的升降機
PROPOSED LIFT
- 擬建的高架平台
PROPOSED ELEVATED PLATFORM
- 現有中央分隔帶將被封閉及改建成行車路
EXISTING CENTRAL DIVIDER TO BE CLOSED AND CONVERTED TO CARRIAGEWAY
- 現有行車路將被封閉及改建成中央分隔欄
EXISTING CARRIAGEWAY TO BE CLOSED AND CONVERTED TO CENTRAL DIVIDER
- 現有行車路將被封閉及改建成行人路
EXISTING CARRIAGEWAY TO BE CLOSED AND CONVERTED TO FOOTPATH
- 現有花槽將被拆卸及改建成行人路
EXISTING PLANTER TO BE DEMOLISHED AND CONVERTED TO FOOTPATH

版本 Rev	說明 Description	By	日期 Date
01	顧問 Consultant		

**PARSONS
BRINCKERHOFF**

項目 Project title
顧問合約編號 CE 37/2011 (HY)
在公共行人天橋，高架行人道及行人隧道加建無障礙通道設施
第三期 (第二組) - 設計及建造
AGREEMENT NO. CE37/2011 (HY)
PROVISION OF BARRIER-FREE ACCESS FACILITIES AT PUBLIC FOOTBRIDGES, ELEVATED WALKWAYS AND SUBWAYS PHASE 3 (PACKAGE 2) - DESIGN AND CONSTRUCTION

圖紙名稱
Drawing title
HF145
橫跨告士打道近分域街
ACROSS GLOUCESTER ROAD NEAR FENWICK STREET

圖紙編號 Drawing no.	日期 Date	審核 Checked	批准 Approved
BFA9/CATD/HF145/0101	-	-	-

比例
Scale 如A3圖示 AS SHOWN ON A3
狀況
Status CAT D PAPER

© 版權所有 COPYRIGHT RESERVED

路政署
HIGHWAYS DEPARTMENT
主要工程管理處
MAJOR WORKS PROJECT MANAGEMENT OFFICE

