

資料截至 15/7/2024

灣仔區交通及運輸工程概覽

工務計劃 編號及 級別	負責部門	工程說明	估計費用 〔百萬元〕	工程計劃				備註／工程計劃延誤原因
				開工日期		完成日期		
				上次報告	今次報告	上次報告	今次報告	
	土木工程 拓展署	合約號碼GE/2020/08 位於黃泥涌煤氣調壓站 斜坡編號：11SE-C/F 95	1.10	21年第1季	21年第1季	25年第4季	25年第4季	合約已展開。 工程進行中。工程範圍主要包括安裝泥釘。
		合約號碼GE/2021/01 位於灣仔峽道休憩處 斜坡編號：11SW-D/F 98	待定	22年第4季	22年第4季	26年第2季	26年第2季	合約已展開。 工程將動工。工程範圍主要包括安裝泥釘。
		合約號碼GE/2021/11 位於何東中學 斜坡編號：11SE-A/C 104	待定	22年第2季	22年第 2季	25年第4季	25年第4季	合約已展開。 工程將動工。工程範圍主要包括安裝泥釘。
		位於大坑道 斜坡編號：11SE-A/CR 105	待定					工程將動工。工程範圍主要包括安裝泥釘。
		位於司徒拔道東區二號食水配水庫 斜坡編號：11SW-D/C 378	待定					工程將動工。工程範圍主要包括安裝泥釘。
		合約號碼GE/2022/03 位於萬茂臺遊樂場 斜坡編號：11SW-B/CR 234	1.30	-	22年第3季	-	26年第1季	合約已展開。 工程進行中。工程範圍主要包括安裝泥釘。
		位於萬茂臺遊樂場 斜坡編號：11SW-B/R 614	待定					工程將動工。工程範圍主要包括安裝泥釘。
		合約號碼GE/2022/05 位於香港山頂道 斜坡編號：11SW-D/C 589	待定	-	22年第4季	-	27年第2季	合約已展開。 工程將動工。工程範圍主要包括安裝泥釘。
		合約號碼GE/2022/06 位於馬己仙峽道 斜坡編號：11SW-D/FR 104	待定	23年第1季	23年第1季	26年第2季	26年第2季	合約已展開。 工程將動工。工程範圍主要包括安裝泥釘。
		位於寶雲道 26715 號燈柱附近 斜坡編號：11SW-D/R 606	2.90					工程進行中。工程範圍主要包括安裝泥釘。

灣仔區交通及運輸工程概覽

工務計劃 編號及 級別	負責部門	工程說明	估計費用 〔百萬元〕	工程計劃				備註／工程計劃延誤原因	
				開工日期		完成日期			
				上次報告	今次報告	上次報告	今次報告		
196WC 甲	水務署	水務供應 水務工程 智管網之水壓管理及區域監測裝置建造工程－餘下工程（合約編號：13/WSD/19）	424.28	已開始	已開始	25年第1季	25年第1季	工程項目包括在灣仔區建造25個監測區域。 截至2024年4月30日，水務署已在灣仔區建立6個監測區域。	
100WX 丁	水務署	風險為本水管改善工程-香港及離島 (合約編號：2/WSD/21)	547	已開始	已開始	25年第1季	25年第1季		
		軍器廠街		已開始	已開始	24年第3季	24年第3季		更換食水管工程範圍位於告士打道與軒尼詩道之間的軍器廠街南行線，工程主要分三階段進行。 (i)位於行車天橋下的工程已完工。 (ii)位於告士打道與駱克道之間，為避免影響軍器廠街日間的交通，工程將會改為夜間進行，預計於2024年第 2 季展開。 (iii)位於駱克道與軒尼詩道之間，更換食水管鋪設及接駁工程已完成。 整項工程預計於2024年第3季完成。
		軒尼詩道(近菲林明道交界)		24年第1季	24年第2季	24年第2季	24年第3季		為避免影響軒尼詩道的交通，更換食水管工程將會採用無坑挖掘方法進行。因工程位於交通繁忙路段，工程需安排夜間進行。因應工程安排改動，現正等候更新的建築噪音許可證審批。工程預計於2024年第2季展開，並於2024年第3季完成。
100WX 丁	水務署	香港與離島及新界西風險為本小型水管改善工程（合約編號:12/WSD/20）	174.83	已開始	已開始	24年第2季	24年第4季		
		譚臣道後巷		已開始	已開始	24年第2季	24年第4季	更換食水管及鹹水管之前期工程已完成。根據挖掘探洞記錄，後巷地方狹窄及地下佈滿喉管設施，確定無法在該位置敷設新水管，現正研究能否優化其他合約已敷設的食水管，作可行的解決方案。	
		加路連山道		已開始	已開始	24年第2季	24年第3季	食水管更換工程已於24年1月完成。更換鹹水管工程進行中，預計於24年第3季完成。	

灣仔區交通及運輸工程概覽

工務計劃 編號及 級別	負責部門	工程說明	估計費用 〔百萬元〕	工程計劃				備註／工程計劃延誤原因
				開工日期		完成日期		
				上次報告	今次報告	上次報告	今次報告	
172CD 甲	渠務署	渠務工程 合約編號DC/2020/09「地下雨水渠修復工程 - 第三階段」	373.23					
		綿發街	24年第3季	24年第3季	24年第3季	24年第3季	一段約3米的地下雨水渠修復工程。預計不牽涉掘路工程。因工程圍封範圍需要改動，工程展開日期已修正，預計將於2024年第3季展開。	
		昌明街	24年第3季	24年第3季	24年第3季	24年第3季	一段約24米的地下雨水渠修復工程。預計不牽涉掘路工程。因工程圍封範圍需要改動，工程展開日期已修正，預計將於2024年第3季展開。	
		桂芳街	-	24年第2季	-	24年第2季	一段約7米的地下雨水渠修復工程。工程正進行前期勘察工作，預計不牽涉掘路工程。	
		天后廟道	-	24年第2季	-	24年第2季	一段約15米的地下雨水渠修復工程。工程正進行前期勘察工作，預計不牽涉掘路工程。	
		山光路	-	24年第2季	-	24年第2季	一段約23米的地下雨水渠修復工程。工程正進行前期勘察工作，工程將牽涉掘路工程。	
4100DX 丁	渠務署	合約編號DC/2020/08「污水渠及雨水渠結構改善工程(2020) - 香港島、觀塘、西貢及大埔」	115.24					
		告士打道近大新金融中心	已開始	已開始	24年第1季	已完成	一段約60米的地下污水渠修復工程已於2024年2月完工。	
		合約編號DC/2021/01「敷設置富道雨水渠及新界及市區小型渠務改善工程」						
		寶雲道	11.00	已開始	已開始	24年第4季	24年第2季	沿寶雲道鋪設的雨水渠工程已大致完成。

灣仔區交通及運輸工程概覽



工務計劃 編號及 級別	負責部門	工程說明	估計費用 〔百萬元〕	工程計劃				備註／工程計劃延誤原因
				開工日期		完成日期		
				上次報告	今次報告	上次報告	今次報告	
4414DS 甲	渠務署	合約編號DC/2023/10「地下污水渠修復工程 - 第四階段」	306.40	-	24年第2季	-	24年第2季	工程將動工。一段約25米的地下雨水渠修復工程。施工前期勘察工作進行中，工程將於2024年第2季完工。
		銅鑼灣道近大坑道交界		-	24年第4季	-	24年第4季	
		<u>其他機構的掘路工程</u>						有關除政府部門外的其他機構在灣仔區的掘路工程，請參閱路政署提供的附件。

除政府部門外的其他機構在灣仔區的掘路工程 (15.7.2024)

編號	開始日期	完工日期	機構	地點	附近
1263971	24/10/2022	01/12/2024	HEC	愛群道	皇后大道東
1327659	14/08/2023	31/08/2024	OTH	春園街	堅尼地道
1119863	21/08/2023	21/08/2024	HEC	藍塘道	雲地利道
1286379	11/09/2023	19/08/2024	HEC	告士打道	門牌編號 223 - 250
1291819	05/10/2023	05/11/2024	HEC	箕璉坊	蟠龍道
1264191	16/10/2023	22/10/2024	HEC	莊士敦道	柯布連道
1320074	27/10/2023	12/12/2024	HEC	石水渠街	皇后大道東
1277133	06/11/2023	25/10/2024	HEC	謝斐道	景隆街
1320311	10/01/2024	31/08/2024	OTH	皇后大道東	蘭杜街
1290054	04/03/2024	31/08/2024	GAS	謝斐道	馬師道
1241528	04/03/2024	31/10/2024	HEC	普善街	山光道
1329634	11/03/2024	06/08/2024	HEC	留仙街	僑興大廈
1316174	20/03/2024	17/04/2025	HEC	軒尼詩道	門牌編號 432 - 472
1301397	25/03/2024	18/03/2025	HEC	銅鑼灣道	浣紗街
1288539	25/03/2024	12/04/2025	HEC	告士打道	菲林明道
1331431	01/04/2024	13/03/2026	OTH	雲地利道	門牌編號 15
1337175	22/04/2024	01/08/2024	HEC	駱克道	門牌編號 142 - 144
1334636	22/04/2024	05/08/2024	HEC	港灣徑	港灣道
1293366	22/04/2024	24/08/2024	GAS	興發街	大坑道
1312129	29/04/2024	29/07/2024	HEC	蘭芳道	門牌編號 2 - 16
1266286	29/04/2024	16/06/2025	HEC	黃泥涌道	街燈編號 32346
1337916	13/05/2024	30/07/2024	CMHK	金鐘道	香港警察總部(東翼)
1338364	13/05/2024	02/08/2024	HEC	山光道	普善街
1325572	14/05/2024	14/01/2025	HEC	告士打道	門牌編號 109 - 111
1337293	15/05/2024	08/08/2024	HEC	大坑道	門牌編號 336 - 338
1313130	20/05/2024	27/08/2024	HEC	春園街	門牌編號 47 - 86
1337351	20/05/2024	09/09/2024	OTH	永祥街	門牌編號 13 - 21
1281659	23/05/2024	28/04/2025	HEC	高士威道	街燈編號 43768
1341625	28/05/2024	20/08/2024	HEC	盧押道	門牌編號 11 - 13
1325867	31/05/2024	19/12/2024	HEC	堅尼地道	街燈編號 20869
1336615	03/06/2024	07/12/2024	HEC	告士打道	門牌編號 123
1324541	10/06/2024	19/09/2024	HEC	灣仔道	街燈編號 44015
1302812	10/06/2024	08/05/2025	HEC	譚臣道	菲林明道
1323857	11/06/2024	07/10/2024	HEC	藍塘道	門牌編號 117
1342344	12/06/2024	05/08/2024	HEC	京士頓街	門牌編號 2 - 4
1339052	17/06/2024	19/08/2024	CMHK	陳東里	靈西街
1339833	17/06/2024	20/08/2024	CMHK	英皇道	水星街

除政府部門外的其他機構在灣仔區的掘路工程 (15.7.2024)

編號	開始日期	完工日期	機構	地點	附近
1328727	17/06/2024	02/09/2024	OTH	勿地臣街	街燈編號 31368
1337114	17/06/2024	06/09/2024	HKC	普樂里	交加里
1334991	17/06/2024	17/10/2024	OTH	軒尼詩道	門牌編號 470 & 472
1309423	17/06/2024	29/10/2024	HEC	聖佛蘭士街	街燈編號 45868
1340832	24/06/2024	03/09/2024	HTL	莊士敦道	門牌編號 2
1335475	24/06/2024	23/09/2024	HEC	堅彌地街	門牌編號 2
1340665	02/07/2024	02/08/2024	HKT	告士打道	街燈編號 43666
1340433	02/07/2024	20/08/2024	OTH	皇后大道東	街燈編號 20294
1331252	02/07/2024	14/05/2025	OTH	銅鑼灣道	街燈編號 17777
1341548	03/07/2024	06/08/2024	HEC	成和道	荷塘道
1304619	04/07/2024	19/09/2024	CMHK	厚德里	司徒拔道
1331487	08/07/2024	07/01/2025	OTH	告士打道	景隆街
1341060	09/07/2024	05/08/2024	HEC	棉花路	門牌編號 2
1299614	09/07/2024	02/10/2025	HEC	堅尼地道	街燈編號 22459
1335637	15/07/2024	14/09/2024	MTR	夏慤道	街燈編號 27253
1342062	16/07/2024	23/08/2024	GAS	黃泥涌道	皇后大道東
1302989	17/07/2024	28/10/2024	HEC	告士打道	門牌編號 250
1340204	22/07/2024	09/01/2025	HEC	灣仔道	街燈編號 46373
1234061	22/07/2024	09/07/2025	HEC	黃泥涌道	山光道
1279989	22/07/2024	31/07/2025	HEC	日善街	崇賢里
1334960	22/07/2024	28/09/2024	OTH	皇后大道東	門牌編號 61

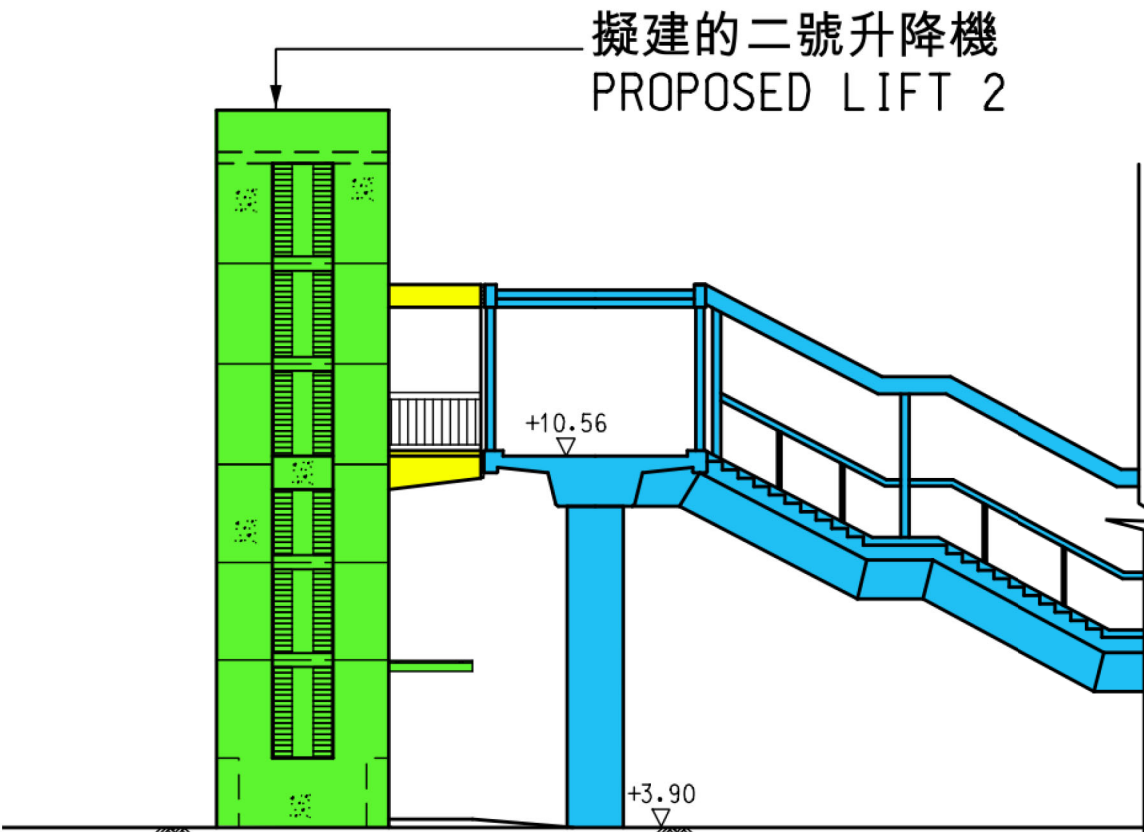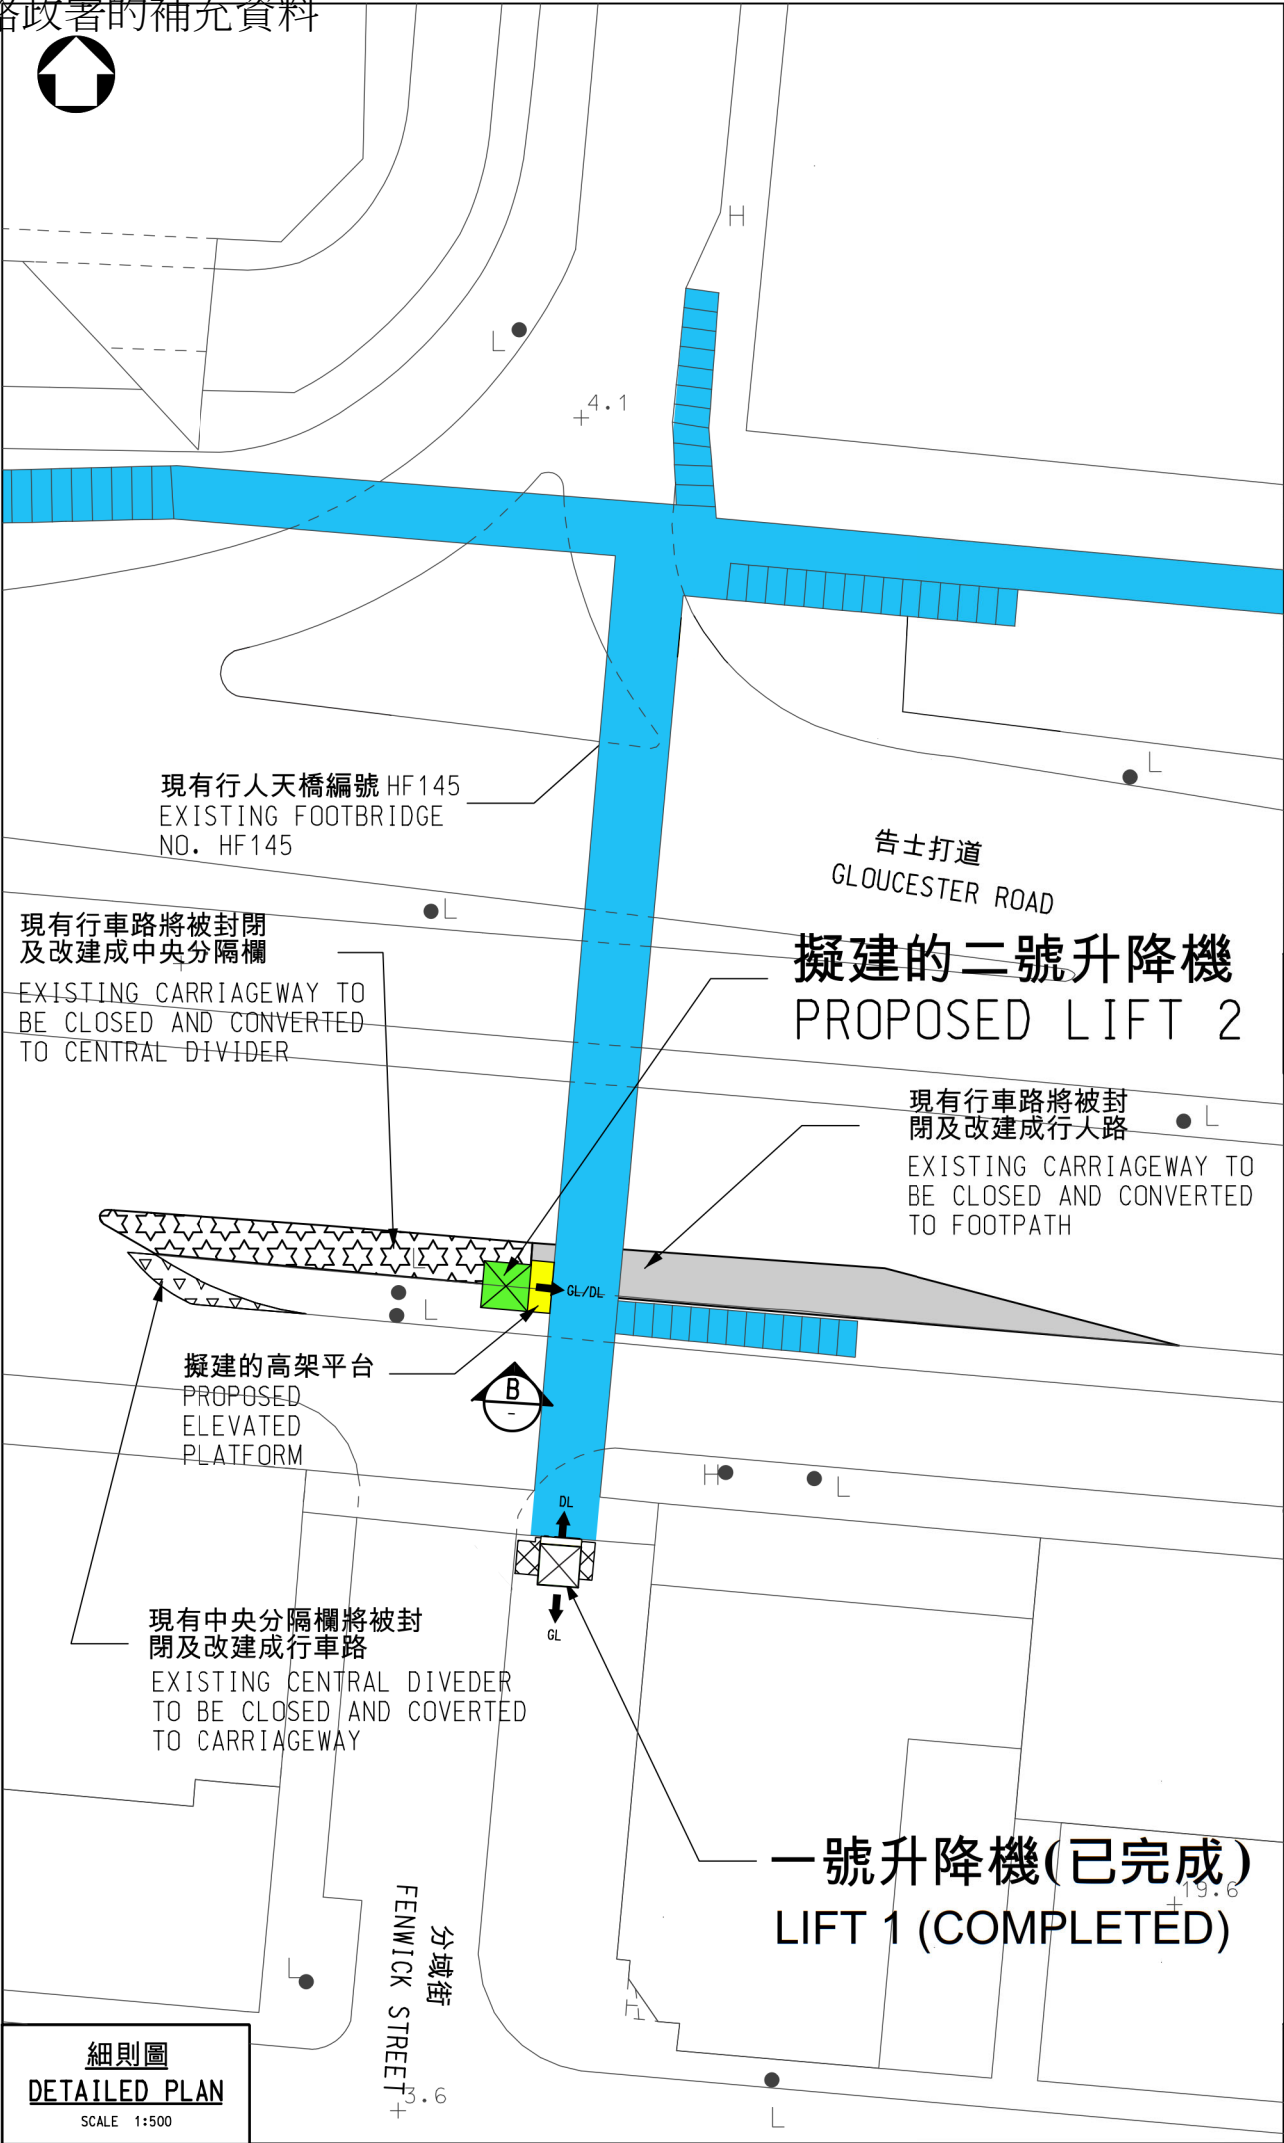

- 圖例 LEGEND:
- 現有行人天橋編號 HF145
EXISTING FOOTBRIDGE NO. HF145
 - 升降機地面出口
LIFT DOOR OPENING AT GROUND LEVEL
 - 升降機天橋出口
LIFT DOOR OPENING AT DECK LEVEL
 - 擬建的升降機
PROPOSED LIFT
 - 擬建的高架平台
PROPOSED ELEVATED PLATFORM
 - 現有中央分隔欄將被封閉及改建成行車路
EXISTING CENTRAL DIVIDER TO BE CLOSED AND CONVERTED TO CARRIAGEWAY
 - 現有行車路將被封閉及改建成中央分隔欄
EXISTING CARRIAGEWAY TO BE CLOSED AND CONVERTED TO CENTRAL DIVIDER
 - 現有行車路將被封閉及改建成行人路
EXISTING CARRIAGEWAY TO BE CLOSED AND CONVERTED TO FOOTPATH
 - 現有花槽將被拆卸及改建成行人路
EXISTING PLANTER TO BE DEMOLISHED AND CONVERTED TO FOOTPATH

版本 Rev	說明 Description	By	日期 Date
顧問 Consultant			
PARSONS BRINCKERHOFF			
項目 Project title			
顧問合約編號 CE 37/2011 (HY)			
在公共行人天橋，高架行人道及行人隧道加建無障礙通道設施			
第三期 (第二組) - 設計及建造			
AGREEMENT NO. CE37/2011 (HY)			
PROVISION OF BARRIER-FREE ACCESS FACILITIES AT PUBLIC FOOTBRIDGES, ELEVATED WALKWAYS AND SUBWAYS PHASE 3 (PACKAGE 2) - DESIGN AND CONSTRUCTION			
圖紙名稱 Drawing title			
HF145 橫跨告士打道近分域街 ACROSS GLOUCESTER ROAD NEAR FENWICK STREET			
圖紙編號 Drawing no.			版本 Rev.
BFA9/CATD/HF145/0101			
繪圖 Drawn	CAD	日期 Date	審核 Checked
		-	-
比例 Scale	如 A3 圖示 AS SHOWN ON A3	狀況 Status	批准 Approved
		CAT D PAPER	-
© 版權所有 COPYRIGHT RESERVED			
路政署 HIGHWAYS DEPARTMENT 主要工程管理處 MAJOR WORKS PROJECT MANAGEMENT OFFICE			



 擬建行人路上蓋
PROPOSED WALKWAY COVER



HIGHWAYS
DEPARTMENT
HONG KONG

路政署
香港

