

灣仔區交通及運輸工程概覽

工務計劃 編號及 級別	負責部門	工程說明	估計費用 〔百萬元〕	工程計劃				備註／工程計劃延誤原因
				開工日期		完成日期		
				上次報告	今次報告	上次報告	今次報告	
總目706 分目6100TX	路政署	<u>運輸</u> <u>有蓋行人通道計劃</u> 合約編號HY/2023/07 連接鄧肇堅醫院的行人通道加建上蓋	17.32	已開始	已開始	2026年	2026年	工程進行中。工程範圍包括於皇后大道東一段連接鄧肇堅醫院的行人通道加建上蓋。
-	路政署	留仙街至天后廟道升降機及行人通道系統	待定	待定	待定	待定	待定	工程項目已於2025年1月24日進行刊憲，並已按既定程序，於本年8月將擬建工程計劃和一個未能調解的反對提交給行政會議秘書處。如工程計劃獲得授權，升降機工程項目將與其他四項推展進度相約的小型工程合併為單一工程合約，並於年底前進行招標。該升降機工程項目預計需時約3年大致完成。
677CL 甲	土木工程 拓展署	<u>土木工程</u> <u>土地發展</u> 合約編號SD/2019/03 「西園景平台及其他道路工程」	279.00	已開始	已開始	2026年	2026年	工程主要包括於灣仔北進行西園景平台的建造工程，以及其他有關道路工程。 有關工程預計於2026年完成。
		<u>公眾安全</u> <u>長遠防治山泥傾瀉計劃</u> 合約號碼GE/2020/06 位於司徒拔道的天然山坡 天然山坡編號：11SW-D/SA14	24.50	24年第4季	24年第4季	26年第2季	26年第3季	合約已展開。 工程進行中。工程範圍主要包括安裝泥釘及柔性防護網。
		合約號碼GE/2021/01 位於灣仔山頂道 37514 號燈柱附近 斜坡編號：11SW-D/F 98	待定	22年第4季	22年第4季	26年第2季	26年第2季	合約已展開。 工程將動工。工程範圍主要包括安裝泥釘。
		位於大坑道上方的天然山坡 天然山坡編號：11SE-C/SA1	6.50					工程進行中。工程範圍主要包括安裝泥釘及柔性防護網。
		位於大坑道 48189 號燈柱附近 斜坡編號：11SE-C/F 217	3.2					工程進行中。工程範圍主要包括安裝泥釘。

灣仔區交通及運輸工程概覽

工務計劃 編號及 級別	負責部門	工程說明	估計費用 〔百萬元〕	工程計劃				備註／工程計劃延誤原因
				開工日期		完成日期		
				上次報告	今次報告	上次報告	今次報告	
	土木工程 拓展署	合約號碼GE/2021/01 位於東區食水配水庫 斜坡編號：11SW-D/C 378	11.70	22年第2季	22年第2季	25年第4季	25年第4季	工程進行中。工程範圍主要包括安裝泥釘。
		合約號碼GE/2022/03 位於大坑道 44583 號燈柱附近 斜坡編號：11SE-A/CR 103	1.78	-	22年第3季	-	26年第1季	工程進行中。工程範圍主要包括安裝泥釘。
		合約號碼GE/2022/05 位於香港山頂道 斜坡編號：11SW-D/C 589	待定	22年第4季	22年第4季	26年第2季	26年第2季	合約已展開。 工程將動工。工程範圍主要包括安裝泥釘。
		合約號碼GE/2022/06 位於馬己仙峽道 斜坡編號：11SW-D/FR 104	待定	23年第1季	23年第1季	26年第2季	26年第2季	合約已展開。 工程將動工。工程範圍主要包括安裝泥釘。
		合約號碼GE/2022/24 位於司徒拔道 24330 號燈柱附近 斜坡編號：11SW-D/C 1162	待定	24年第1季	24年第1季	27年第3季	27年第3季	合約已展開。 工程將動工。工程範圍主要包括安裝泥釘。
		位於馬己仙峽道 斜坡編號：11SW-D/C 2007	待定					工程將動工。工程範圍主要包括安裝泥釘。
		合約號碼GE/2024/02 位於大坑一號食水配水庫 斜坡編號：11SE-C/FR 50	待定	24年第3季	24年第3季	28年第1季	28年第1季	合約已展開。 工程將動工。工程範圍主要包括安裝泥釘。
		位於黃泥涌峽道 斜坡編號：11SE-C/R 111	待定					工程將動工。工程範圍主要包括安裝泥釘。
		位於中峽道 斜坡編號：11SW-D/C 549	待定					工程將動工。工程範圍主要包括安裝泥釘。

灣仔區交通及運輸工程概覽

工務計劃 編號及 級別	負責部門	工程說明	估計費用 〔百萬元〕	工程計劃				備註／工程計劃延誤原因
				開工日期		完成日期		
				上次報告	今次報告	上次報告	今次報告	
100WX 丁	水務署	水務供應 水務工程	768.61					
		香港與離島水管改善定期合約(2024-2029) (合約編號:12/WSD/24)		-	已開始	-	31年第1季	合約已展開。
		分域街		-	26年第1季	-	27年第4季	位於謝斐道和莊士頓道之間的一段分域街鹹水水管將進行更換或修復工程。工程準備工作包括臨時交通措施及掘路許可證申請正在進行中。
172CD	渠務署	港灣道	-	25年第4季	-	26年第4季	灣仔政府大樓與菲林明道之間的一段港灣道食水水管將進行更換或修復工程。工程準備工作包括臨時交通措施及掘路許可證申請正在進行中。	
		渠務工程 合約編號DC/2020/09「地下雨水渠修復工程 - 第三階段」	373.23					
		黃泥涌道	25年第3季	已開始	25年第3季	已完成	一段約32米的地下雨水渠修復工程已完成。	
		白建時道	25年第4季	25年第4季	25年第4季	25年第4季	一段約42米的地下雨水渠修復工程。工程正進行前期勘察工作，工程將牽涉掘路工程。工程展開預計將於2025年第4季展開。	
		金馬麟山道	25年第4季	25年第4季	25年第4季	25年第4季	一段約51米的地下雨水渠修復工程。工程正進行前期勘察工作，工程將牽涉掘路工程。工程展開預計將於2025年第4季展開。	
		堅尼地道	25年第4季	-	25年第4季	-	一段約5米的地下雨水渠修復工程。工程正進行前期勘察工作，工程將不牽涉掘路工程。工程預計將於2025年第4季展開。	
		合約編號DC/2023/10「地下污水渠修復工程 - 第四階段」	306.40					
4414DS 甲	渠務署	分域街	26年第2季	26年第2季	26年第3季	26年第3季	一段約139米的地下污水渠修復工程。工程正進行前期勘察工作，工程將牽涉掘路工程。	
		堅拿道東	25年第3季	已開始	26年第3季	已完成	一段約52米的地下污水渠修復工程已完成。	

灣仔區交通及運輸工程概覽

工務計劃 編號及 級別	負責部門	工程說明	估計費用 〔百萬元〕	工程計劃				備註／工程計劃延誤原因	
				開工日期		完成日期			
				上次報告	今次報告	上次報告	今次報告		
4100DX 丁	渠務署	勿地臣街	299.88	26年第2季	26年第2季	26年第2季	26年第2季	一段約118米的地下污水渠修復工程。工程正進行前期勘察工作，工程有可能牽涉掘路工程。	
		<u>合約編號DC/2023/05「污水渠及雨水渠結構改善工程第1A期」</u>							
		電氣道		25年第2季	已開始	25年第2季	25年第4季		工程範圍主要修復一條約73米的地下雨水渠。其中一段約35米位於電氣道近歌頓道的地下雨水渠已完成修復工程。餘下一段約38米位於電氣道近威非路道的地下雨水渠修復工程現正申請掘路許可證。工程預計將於2025年第4季完成。
		木星街		-	26年第1季	-	26年第1季		一條約130米的位於由木星街至英皇道的地下雨水渠修復工程。工程正進行前期勘察工作。工程預計將於2026年第1季展
		<u>其他機構的掘路工程</u>						有關除政府部門外的其他機構在灣仔區的掘路工程，請參閱路政署提供的附件。	

除政府部門外的其他機構在灣仔區的掘路工程 (10.7.2025)

編號	開始日期	完工日期	機構	地點	附近
1148897	2025/5/5	2026/2/10	HEC	軒尼詩道	街燈編號 43632
1251608	2025/8/25	2026/5/26	GAS	黃泥涌道	街燈編號 14558
1277136	2024/10/21	2025/10/2	HEC	駱克道	波斯富街
1288539	2024/3/25	2025/9/30	HEC	告士打道	近菲林明道
1310369	2025/8/18	2026/1/30	HEC	巴路士街	巴路士街2-4號
1323727	2025/5/12	2026/5/11	GAS	天后廟道	街燈編號 45219
1323743	2024/8/5	2026/2/10	HEC	大坑道	大坑道133號
1325177	2024/9/16	2028/2/15	HEC	堅尼地道	灣仔堅尼地道39-83號
1327008	2024/3/6	2025/10/8	OTH	駱克道	街燈編號 45694
1330681	2025/6/16	2025/10/4	HEC	白建時道	街燈編號 33547, 門牌編號 15
1331431	2024/4/1	2026/3/13	OTH	雲地利道	門牌編號 15
1336917	2025/4/28	2026/3/17	HEC	軒尼詩道	堅拿道東
1336953	2025/4/14	2025/10/11	GAS	堅尼地道	灣仔峽道
1337834	2025/8/4	2026/4/9	OTH	活道	活道13-21號
1340007	2024/10/9	2026/4/30	OTH	恩平道	街燈編號 47496
1342400	2025/8/18	2026/1/3	HEC	金馬麟山道	金馬麟山道5號
1343147	2025/5/12	2025/12/4	GAS	分域街	街燈編號 46220
1343247	2024/10/14	2026/11/23	OTH	畢拉山道	街燈編號 20700
1343830	2024/10/9	2025/12/11	OTH	禮頓道	街燈編號 31396
1347737	2025/7/14	2025/10/23	HEC	捷船街	門牌編號 53
1348158	2025/5/20	2025/9/26	HKC	軒尼詩道	蘭杜街1A-11 & 4號
1348188	2025/8/25	2025/10/18	OTH	皇后大道東	街燈編號 20294
1348665	2025/7/2	2025/9/29	HEC	博覽道	街燈編號 51226
1349615	2025/6/23	2025/11/17	OTH	睦誠道	街燈編號 35244
1350220	2025/9/1	2025/10/16	CMHK	禮頓道	街燈編號 41568
1350491	2025/8/18	2026/2/10	HEC	軒尼詩道	軒尼詩道107號
1351690	2025/9/15	2025/11/12	GAS	愛群道	街燈編號 44622
1352982	2025/9/5	2026/1/19	OTH	大坑道	大坑道341-343號
1353041	2025/7/24	2025/10/20	OTH	銀幕街	英皇道31-33號, 銀幕街18-20號



編號	開始日期	完工日期	機構	地點	附近
1354008	2025/8/18	2025/11/25	HEC	譚臣道	譚臣道76號
1354672	2025/9/8	2025/9/25	HEC	機利臣街	街燈編號 20272
1354788	2025/8/4	2025/10/8	OTH	皇后大道東	皇后大道東50號
1356280	2025/8/27	2025/10/21	CMHK	菲林明道	街燈編號 25914
1356610	2025/8/6	2025/10/31	GAS	告士打道	近加德士油站
1356907	2025/8/18	2025/10/22	HTL	黃泥涌道	跑馬地電車總站外
1356953	2025/8/27	2025/10/24	OTH	英皇道	英皇道31-33號, 銀幕街18-20號
1356986	2025/9/15	2025/9/30	HEC	怡和街	怡和街1-1L號
1357147	2025/7/7	2025/9/26	HEC	怡和街	街燈編號 43944
1357185	2025/8/25	2025/10/4	HKT	興發街	興發街20-56號
1358647	2025/8/8	2025/10/9	HEC	柯布連道	近謝斐道
1359234	2025/8/22	2025/11/12	HEC	銅鑼灣道	銅鑼灣道123號

機構簡稱對照表

OU code	機構名稱
ASD	ARCHITECTURAL SERVICES DEPARTMENTM, GOVERNMENT OF HKSAR
CED	CIVIL ENGINEERING AND DEVE.OPMENT DEPT, GOVERNMENT OF HKSAR
CMHK	CHINA MOBILE HONG KONG COMPANY LIMITED
DSD	DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT, GOVERNMENT OF HKSAR
GAS	HK & CHINA GAS CO. LTD.
HBN	HONG KONG BROADBAND NETWORK LTD.
HCN	HKC NETWORK LIMITED
HEC	THE HONGKONG ELECTRIC CO., LTD
HGC	HGC GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED
HKC	HONG KONG CABLE TELEVISION LIMITED
HKT	PCCW-HKT
HTL	HONG KONG TRAMWAYS, LIMITED
HYD	HIGHWAYS DEPARTMENT, GOVERNMENT OF HKSAR
MIS	MIS
NWT	HKBN ENTERPRISE SOLUTIONS LIMITED
RED	Rediffusion (HK) Ltd. (obsolete)
SLC	XENITH IG HONG KONG LIMITED
TGT	TOWNGAS TELECOMMUNICATIONS FIXED NETWORK LIMITED
VTL	VILLAGE TELEPHONE LIMITED
WSD	WATER SUPPLIES DEPARTMENT, GOVERNMENT OF HKSAR
CLP	CLP POWER HONG KONG LTD.
WTT	HKBN ENTERPRISE SOLUTIONS HK LIMITED
OTH	Others



香港
路政署

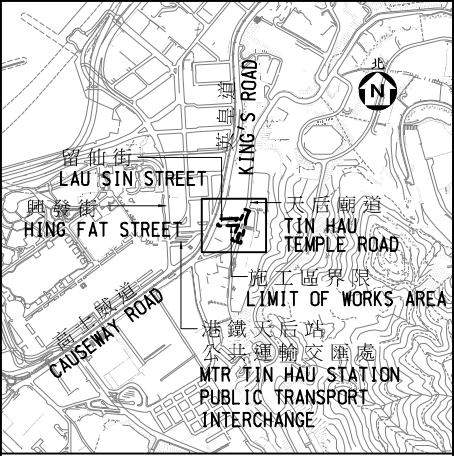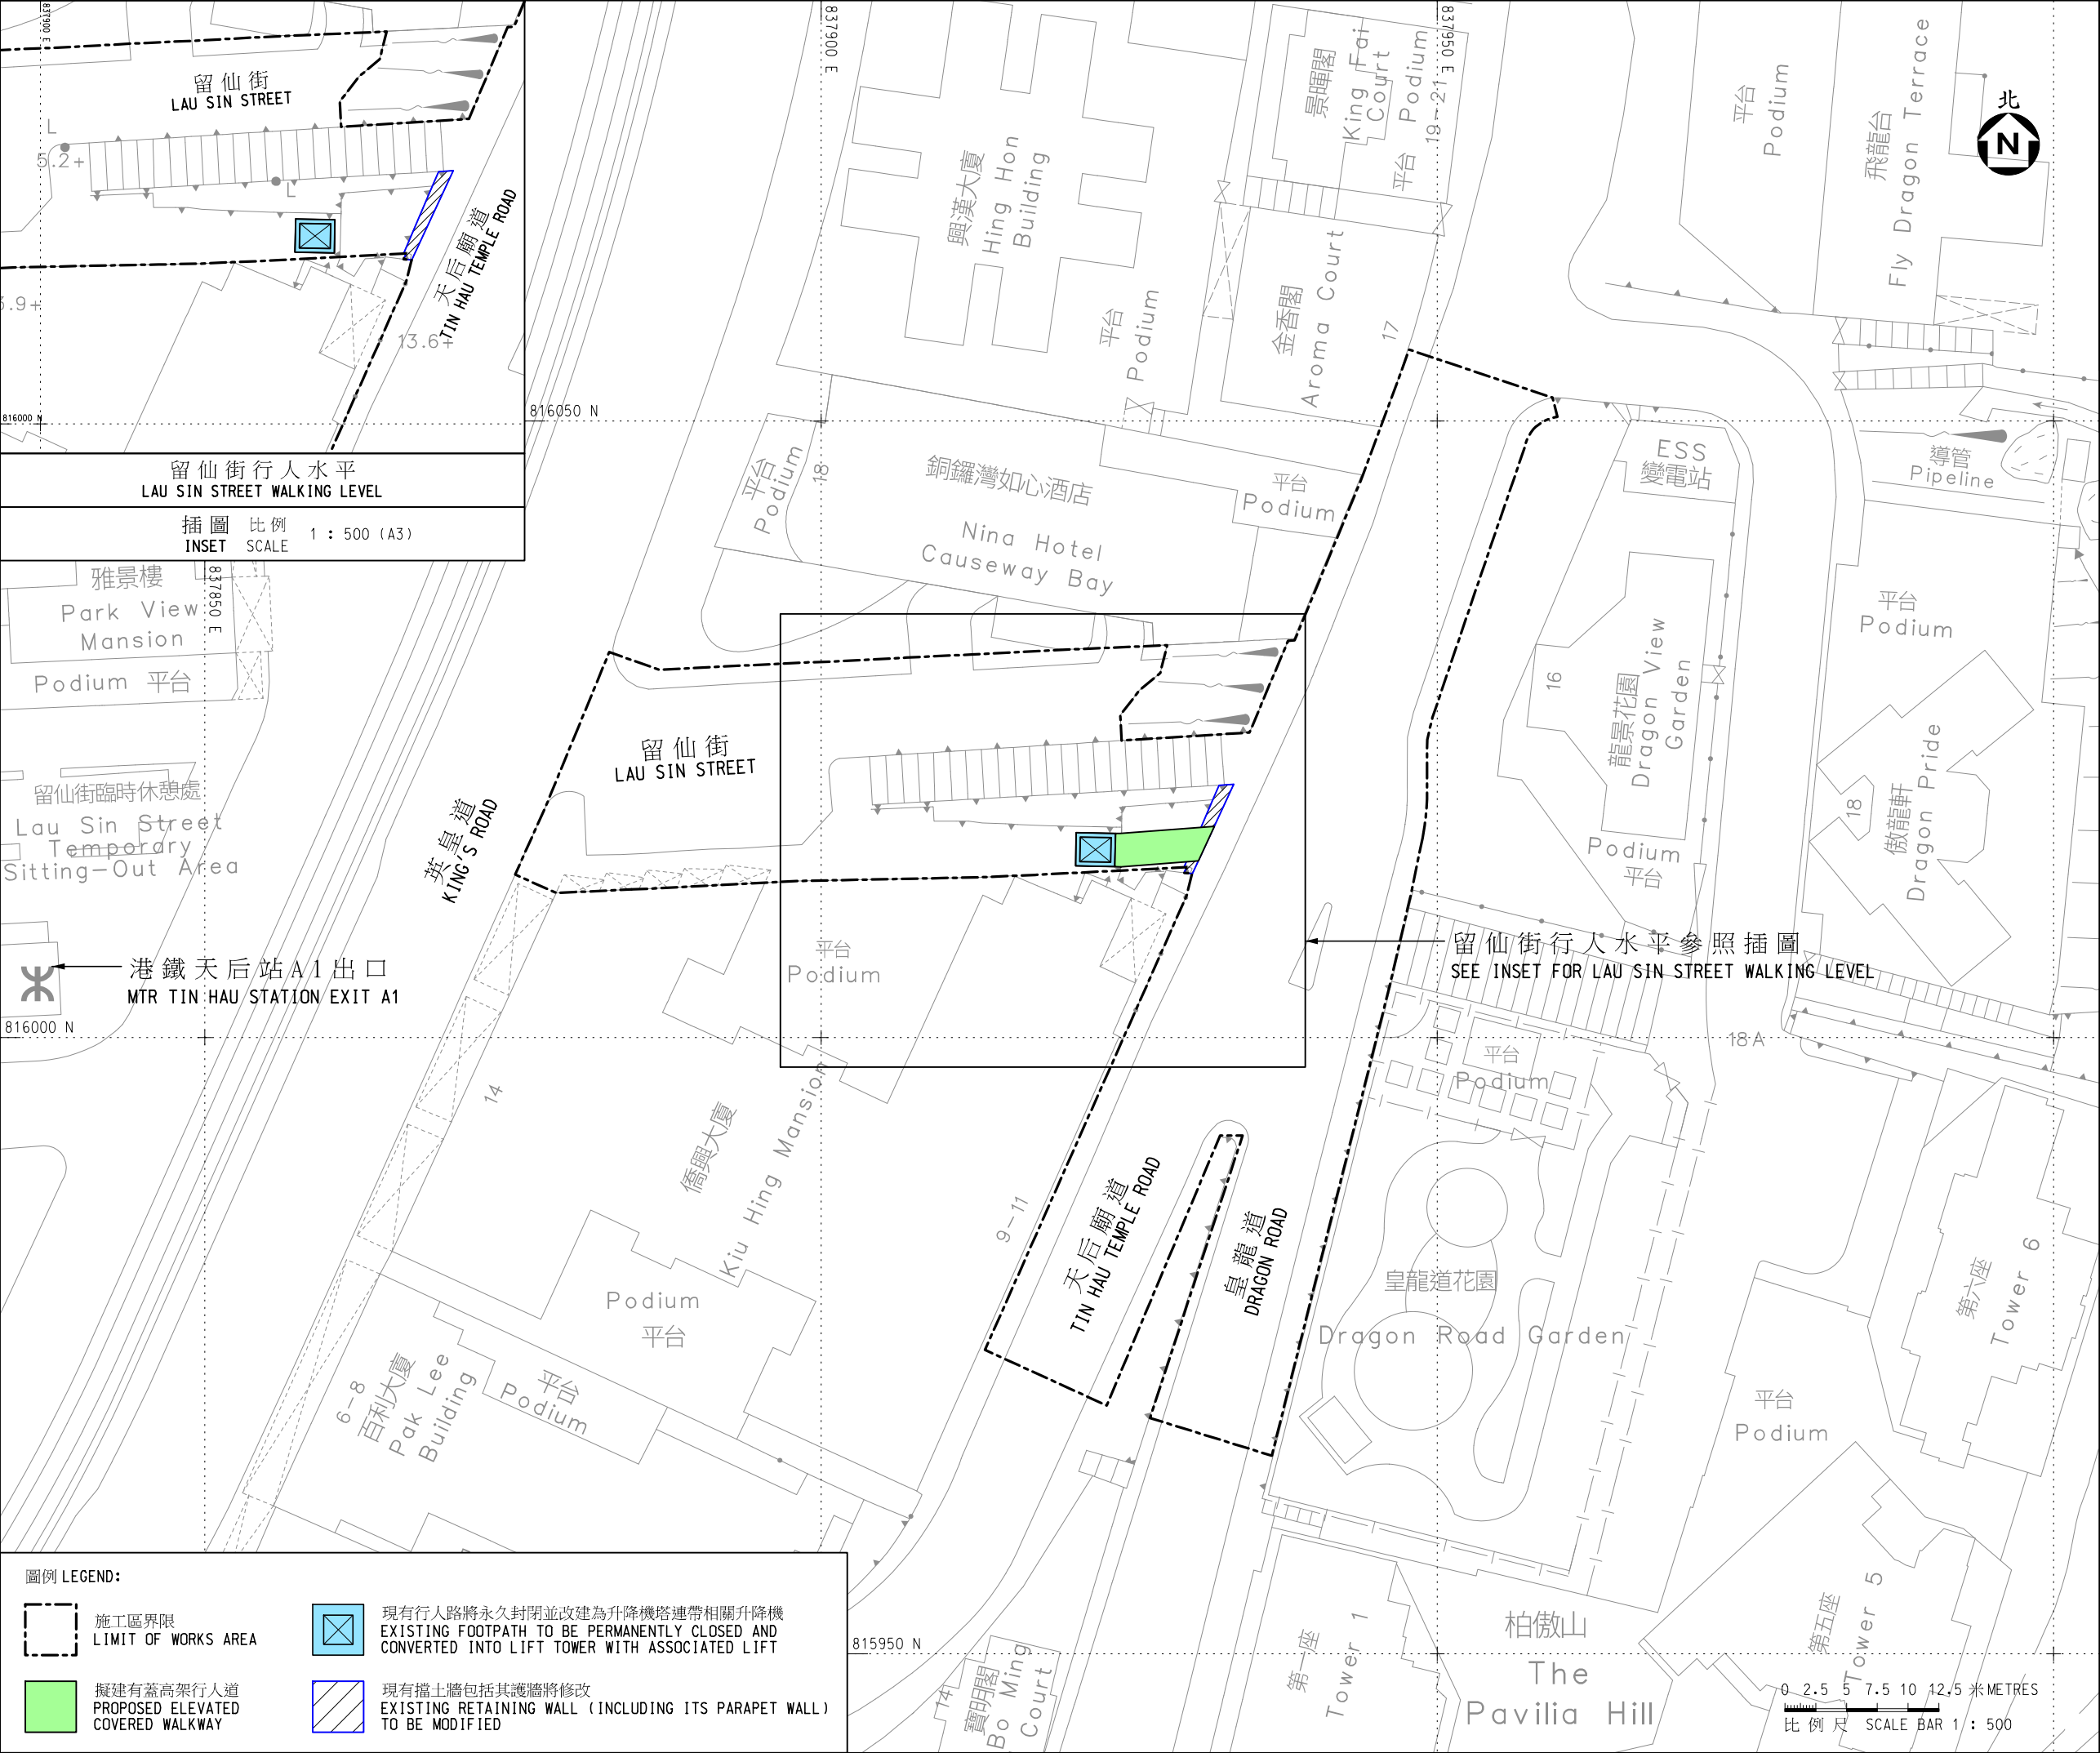

索引圖 KEY PLAN

比例 SCALE 1 : 20000(A3)

註釋 NOTES:

- 除另有指明外，所有量度以米為單位。
ALL DIMENSIONS ARE IN METRES UNLESS OTHERWISE STATED.
- 所有水平均為約數，以米為單位，並在香港主水平基準上。
ALL LEVELS ARE APPROXIMATE VALUES AND IN METRES ABOVE HONG KONG PRINCIPAL DATUM.
- 如有需要，施工區界限內部分現有行車道、行人路和樓梯將分階段暫時封閉。
SECTIONS OF THE EXISTING CARRIAGEWAYS, FOOTPATHS AND STAIRCASE WITHIN THE LIMIT OF WORKS AREA MAY BE TEMPORARILY CLOSED IN PHASES AS AND WHEN REQUIRED.

批註
ENDORSED BY

黃珮玟 Amy WONG

署理運輸及物流局常任秘書長
ACTING PERMANENT SECRETARY
FOR TRANSPORT AND LOGISTICS

日期
DATE

核准
APPROVED BY

吳國亮 Lawrence NG

路政署首席項目統籌2/工程
PRINCIPAL PROJECT COORDINATOR 2/WORKS DATE
HIGHWAYS DEPARTMENT

工程名稱 PROJECT TITLE

工務計劃丁級工程項目
留仙街至天后廟道升降機及行人通道系統
PWP CATEGORY D ITEM
LIFT AND PEDESTRIAN WALKWAY SYSTEM
BETWEEN LAU SIN STREET
AND TIN HAU TEMPLE ROAD

圖則名稱 PLAN TITLE

根據<<道路(工程、使用及補償)條例>>
(第370章)而在憲報公布之圖則
PLAN FOR GAZETTING UNDER ROADS
(WORKS, USE AND COMPENSATION)
ORDINANCE (CHAPTER 370)

圖則編號 PLAN NO.

91853/TH/GAZ/0001

比例 SCALE


1:500 @ A3


版權所有 不得翻印
Copyright Reserved

辦事處
OFFICE

工 程 部
WORKS DIVISION

路 政 署
HIGHWAYS
DEPARTMENT

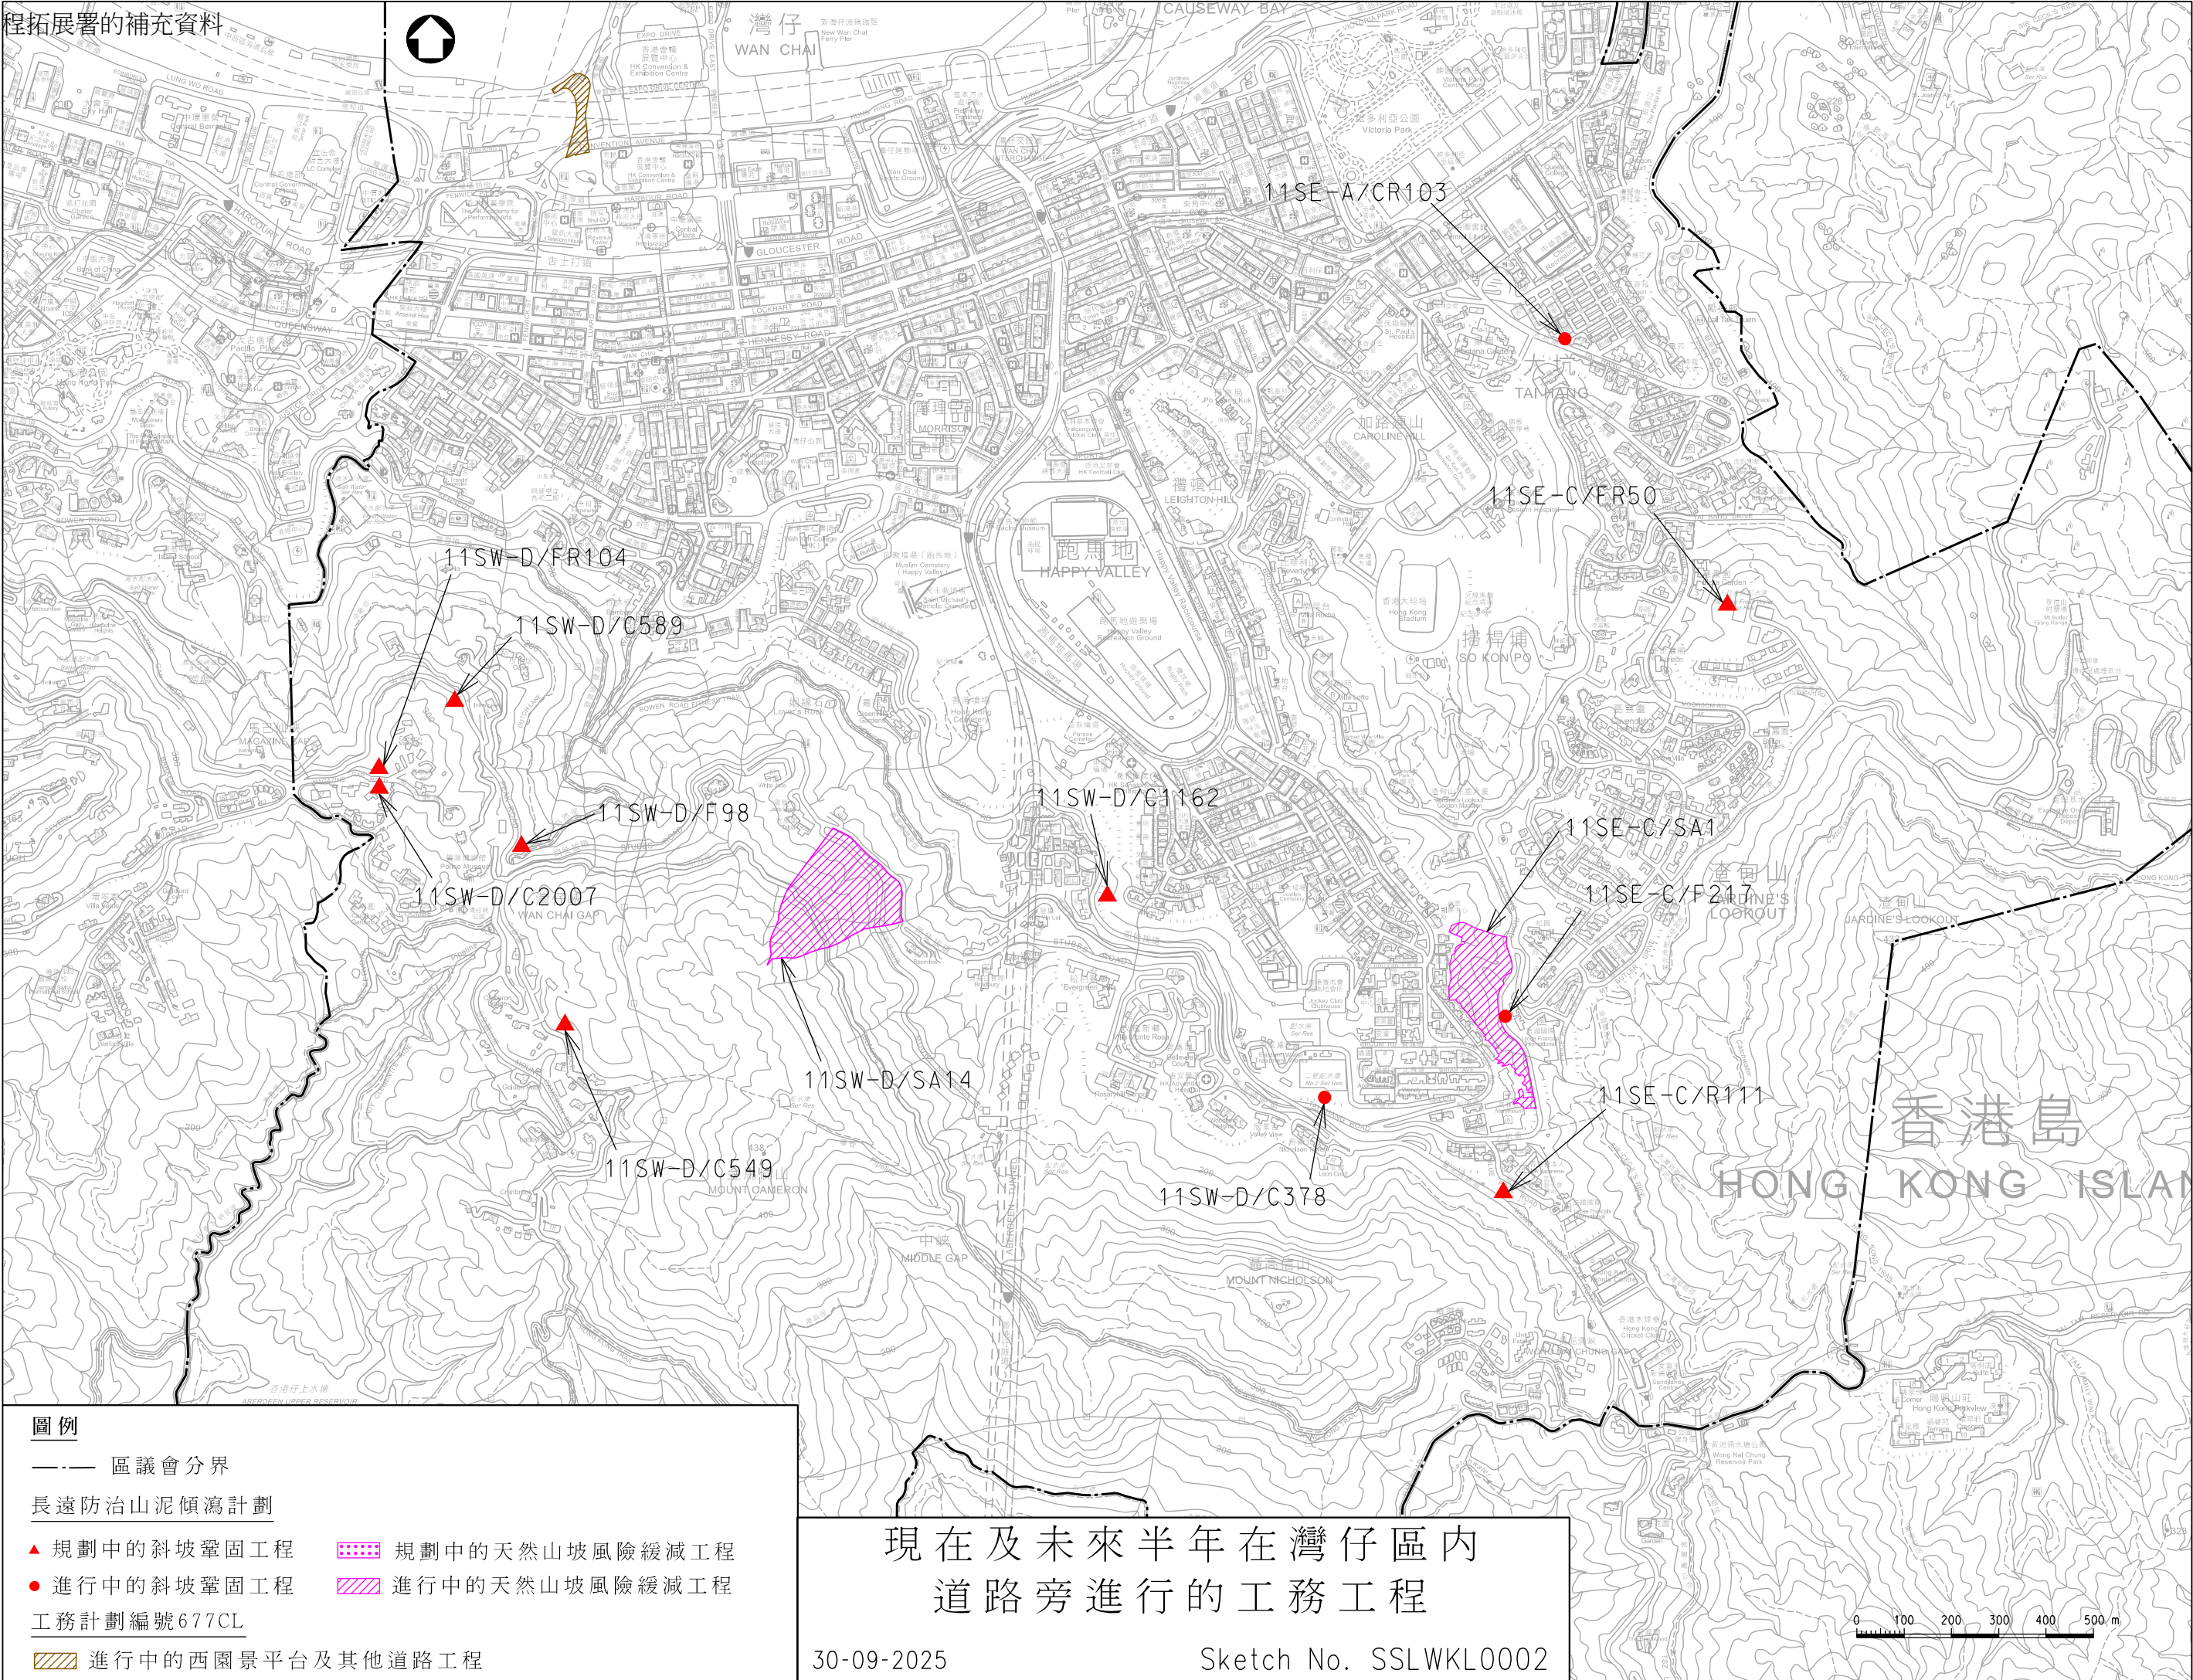

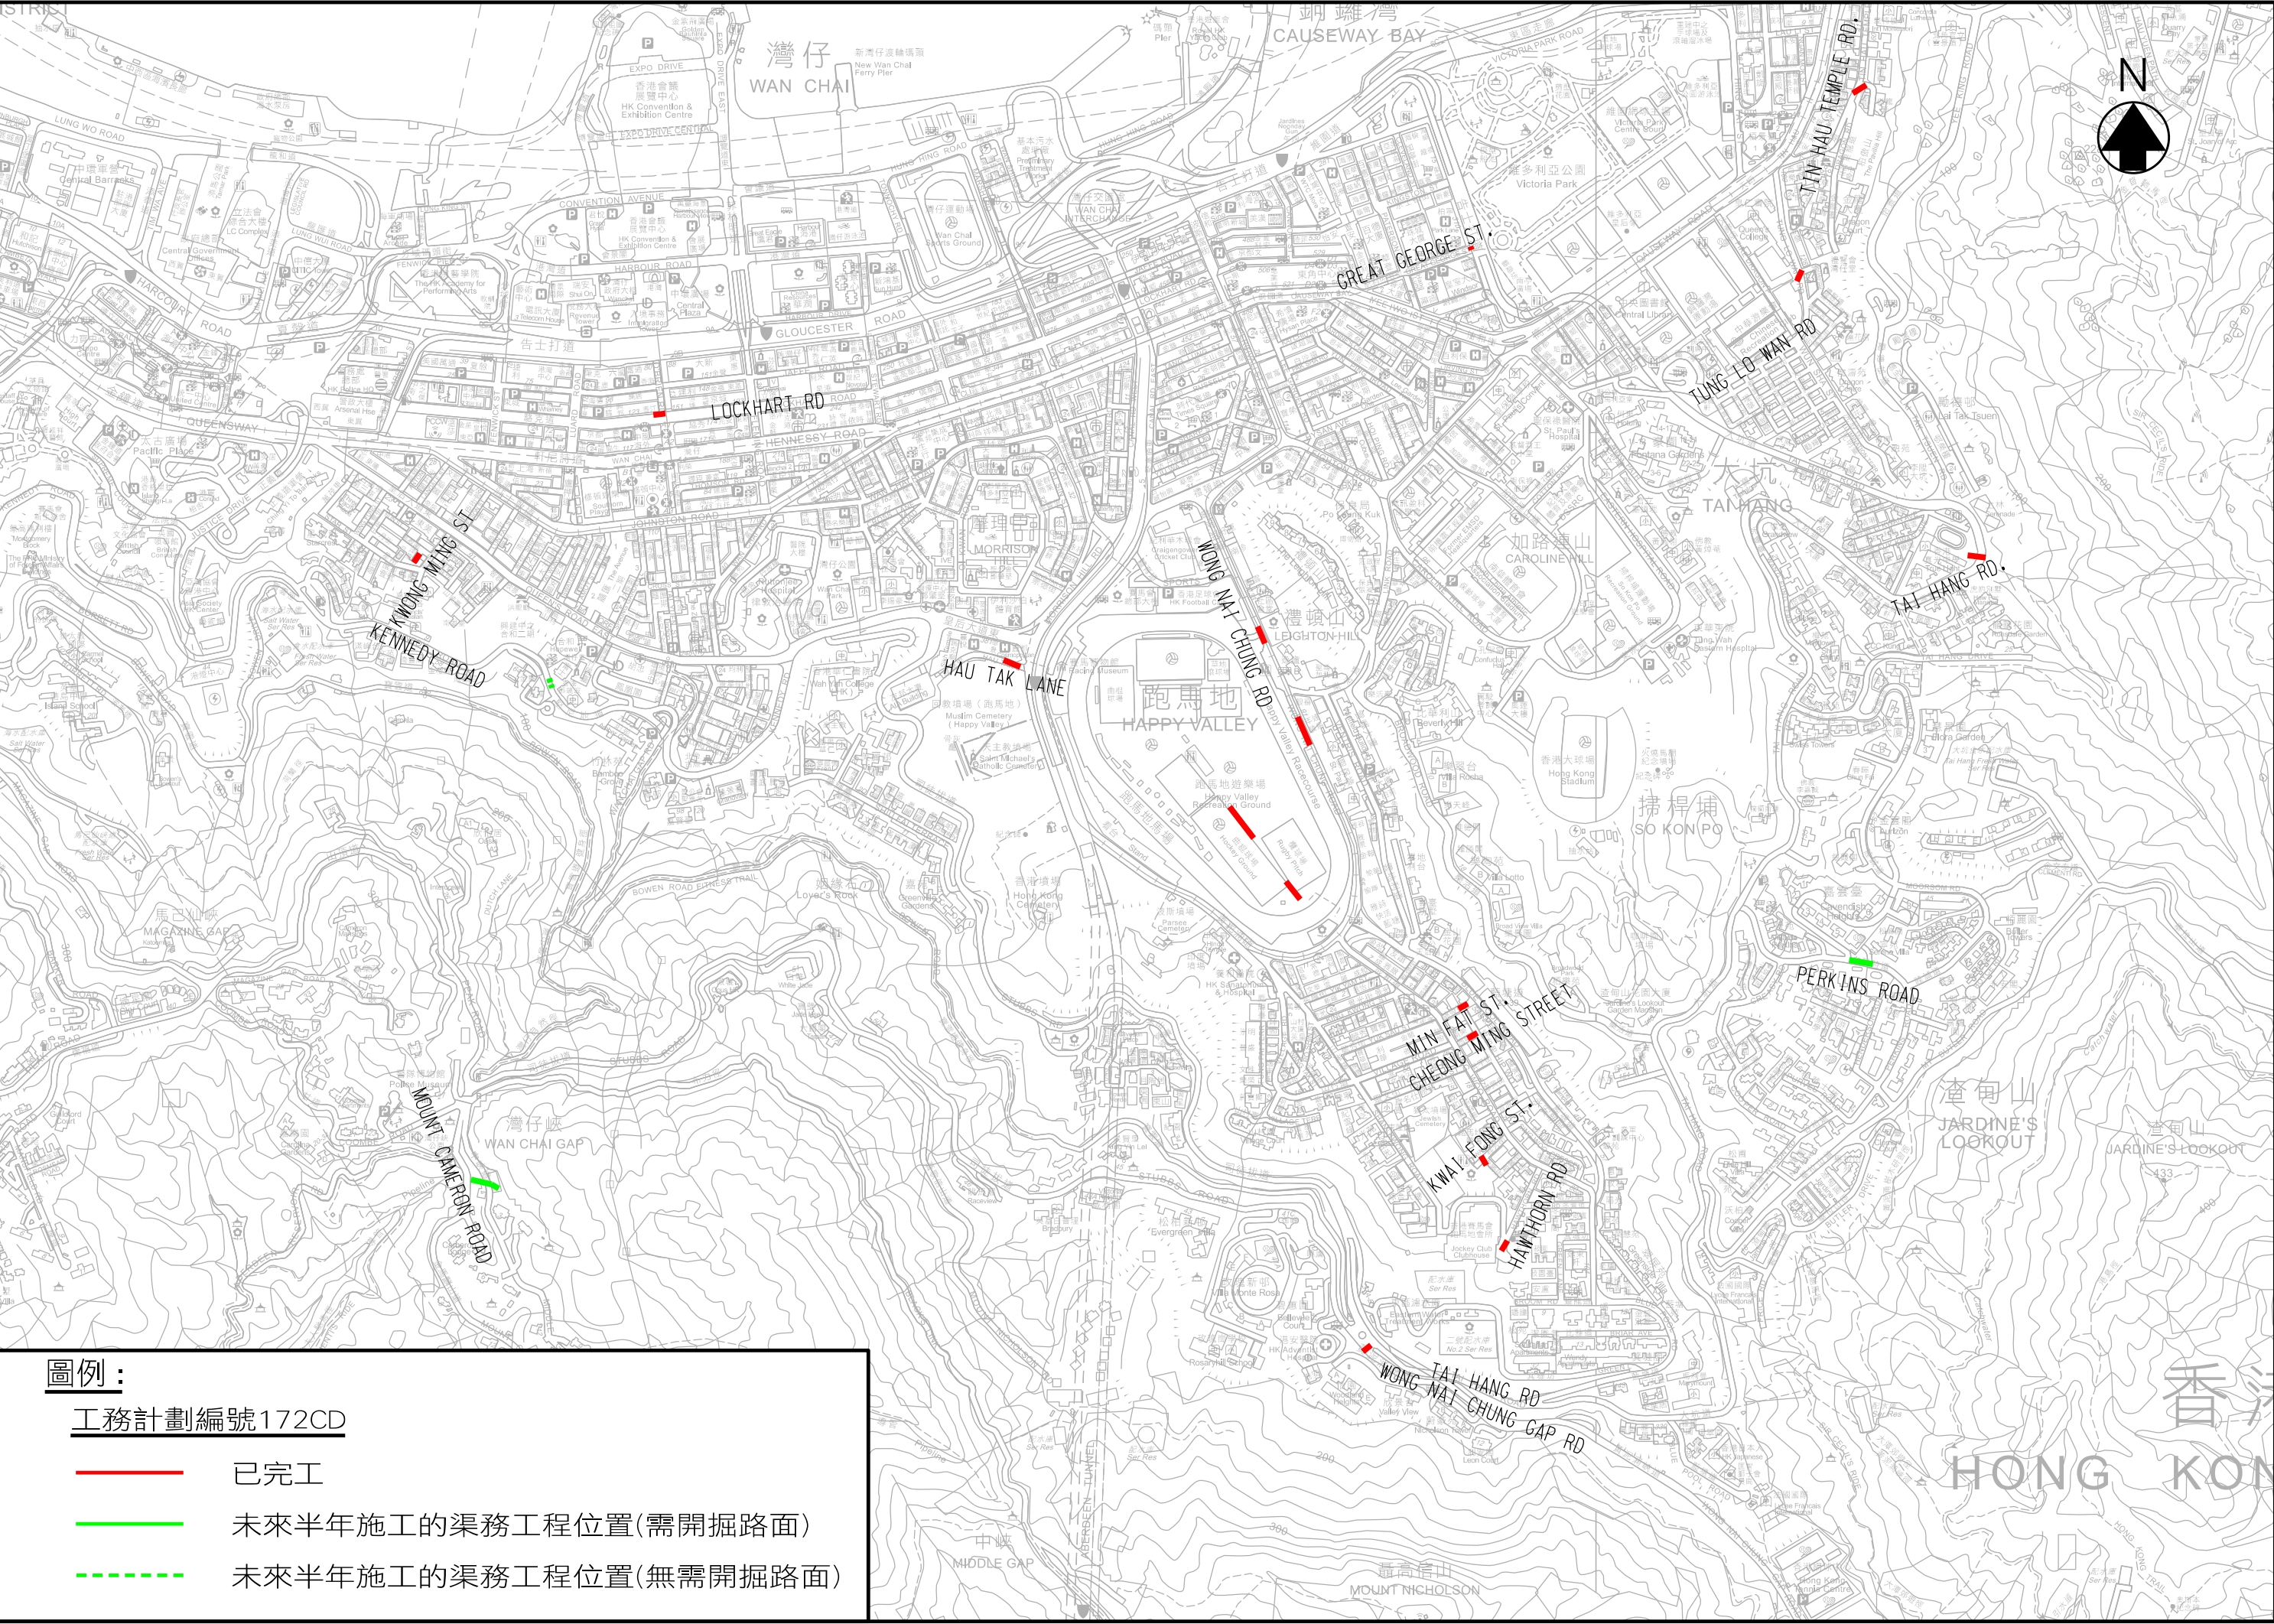

渠務署的補充資料



