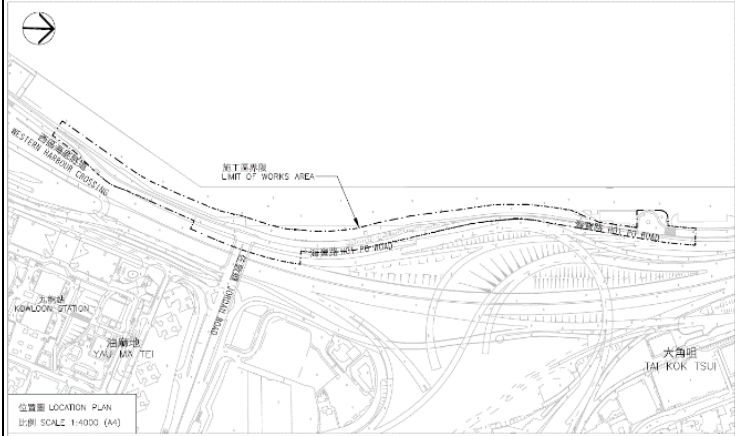
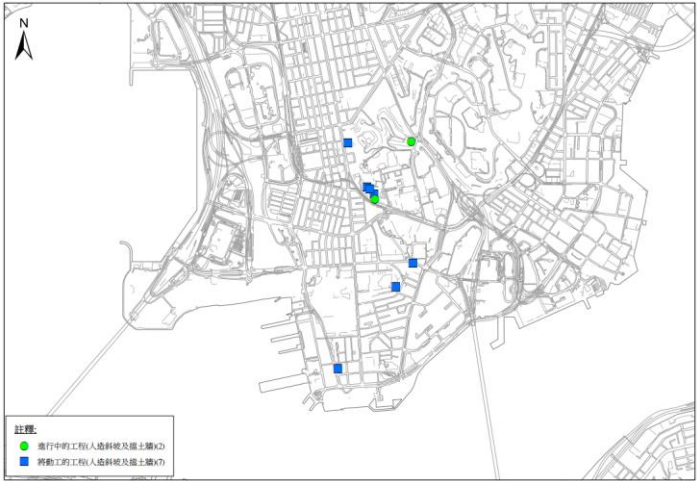


油尖旺區區議會

土木工程拓展署 2025-26 年度主要工程工作計劃

決策局/ 項目編號	工務工程 編號/ 級別	項目	項目預計費用 【百萬元】	工程計劃		2025-2026年度主要工程 工作計劃	照片/圖則
				動工日期	竣工日期		
文化體育及旅遊局 (一)	863CL/甲	西九文化區基礎建設工程第1期－第四組建造工程	425.1	2022年 9月	2029年 (預計)	項目包括在西九文化區藝術公園海旁興建南面登岸設施和為西九文化區2區提供排水、排污及供水系統。南面登岸設施工程已於2022年9月動工，預計於2025年年底完成。而餘下工程則預計在2029年年底分階段大致完成。	圖例 / LEGEND: - 擬議南面登岸設施 - 擬議排水、排污及供水系統 - 擬議排水出口 圖則 / LAYOUT PLAN OF PROPOSED WORKS 項目名稱 / PROJECT TITLE: 工務計劃編號 7754CL(部分) - 西九文化區基礎建設工程第一期 - 第四組建造工程 PWP ITEM NO. 7754CL(PART) - INFRASTRUCTURE WORKS FOR WEST KOWLOON CULTURAL DISTRICT, PHASE 1 - FOURTH CONSTRUCTION PACKAGE 土木工程拓展署 CIVIL ENGINEERING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

決策局/ 項目編號	工務工程 編號/ 級別	項目	項目預計費用 【百萬元】	工程計劃		2025-2026年度主要工程 工作計劃	照片/圖則
				動工日期	竣工日期		
發展局 (三)	7F70TH/ 丁	連接西九文化區與 大角咀行人道	(審視中)	2024年 11月	2026年下 半年 (預計)	項目包括在新油麻地公眾貨物裝卸區和海寶路之間興建一條長約950米的行人通道連接西九文化區與大角咀。工程已於2024年11月起分階段展開，目標於2026年下半年大致完成。	 位置圖 LOCATION PLAN 比例 SCALE 1:4000 (A4) 工程計劃項目第7100CX號 連接西九文化區與大角咀行人道 PWP ITEM NO. 7100CX PEDESTRIAN WALKWAY LINKING WEST KOWLOON CULTURAL DISTRICT AND TAI KOO TSUI

決策局/ 項目編號	工務工程 編號/ 級別	項目	項目預計費用 【百萬元】	工程計劃		2025-2026年度主要工程 工作計劃	照片/圖則
				動工日期	竣工日期		
發展局 (四)	5001BX/ 丁	長遠防治山泥傾瀉計劃	約1,300	2010年 1月	持續進行	在長遠防治山泥傾瀉計劃下，土木工程拓展署已為油尖旺區21個人造斜坡及1個天然山坡完成了防治山泥傾瀉工程。 現時油尖旺區有2個人造斜坡正進行防治山泥傾瀉工程。人造斜坡資料如下： 合約編號：GE/2022/16 (合約已展開，預計於2026年第1季完成。) • 1 個位於勞資審裁處附近的人造斜坡，編號 11NW-D/C 354; • 1 個位於京士柏休憩公園的人造斜坡，編號 11NW-D/C 656 土木工程拓展署並計劃在未來一年為油尖旺區另外7個人造斜坡展開防治山泥傾瀉工程。	 註釋: ● 進行之工程(人造斜坡及掘土牆x2) ■ 將動工的工程(人造斜坡及掘土牆x7)
