

黃大仙區議會  
政府及公用機構工程計劃工作小組

土木工程拓展署工程合約編號 KL/2008/09  
啓德發展計劃 - 啓德機場北面停機坪基礎設施第一期工程

興建橫跨太子道東的兩條行人天橋工程進度報告(6)

1. 目的

這份文件的主要目的是向黃大仙區議會轄下政府及公用機構工程計劃工作小組各成員，匯報興建橫跨太子道東的兩條行人天橋 FB1 和 FB4 的最新工程進度。有關兩條行人天橋的位置和所連接的地區及設施，請參閱附圖 1。

2. 工程進度

行人天橋 FB1

承建商已完成主橋樑的結構工程，現於橋樑上進行上蓋、機電、裝飾及餘下工程，並將於 2012 年 3 月至 5 月於日間非繁忙時段封閉太子道東的個別行車線，以及於 2012 年 6 月間的凌晨時段封閉其中一條靠近譽港灣的東行線，以便配合安裝橋身面板的工序，當中並不牽涉交通改道。

行人天橋 FB4

主要橋樑結構工程已經完成。承建商現正進行橋面上的機電、裝飾及餘下工程，並且於 2011 年 11 月至 4 月於日間非繁忙時段封閉啓東道及太子道東的個別行車線，以便配合安裝橋身面板的工序，當中並不牽涉交通改道。

3. 工程協調

本署工程顧問及承建商會繼續與附近施工的各项工程(包括水務署工程合約編號 26/WSD/06 及渠務署工程合約編號 DC/2008/12 及 DC/2010/03) 舉行定期會議，協調施工上的安


排，並互相配合，以減少在太子道東實施臨時交通改道措施對市民之影響。

另外，我們會繼續向當區區議員以及附近的居民，提供工程資料，並就行人天橋 FB1 及 FB4 該工程的最新進展向工程計劃工作小組匯報。

我們亦已設立了 24 小時熱線電話(電話號碼：5196 6966)，方便市民查詢及收集公眾對工程的意見。

土木工程拓展署  
九龍拓展處  
2012 年 2 月



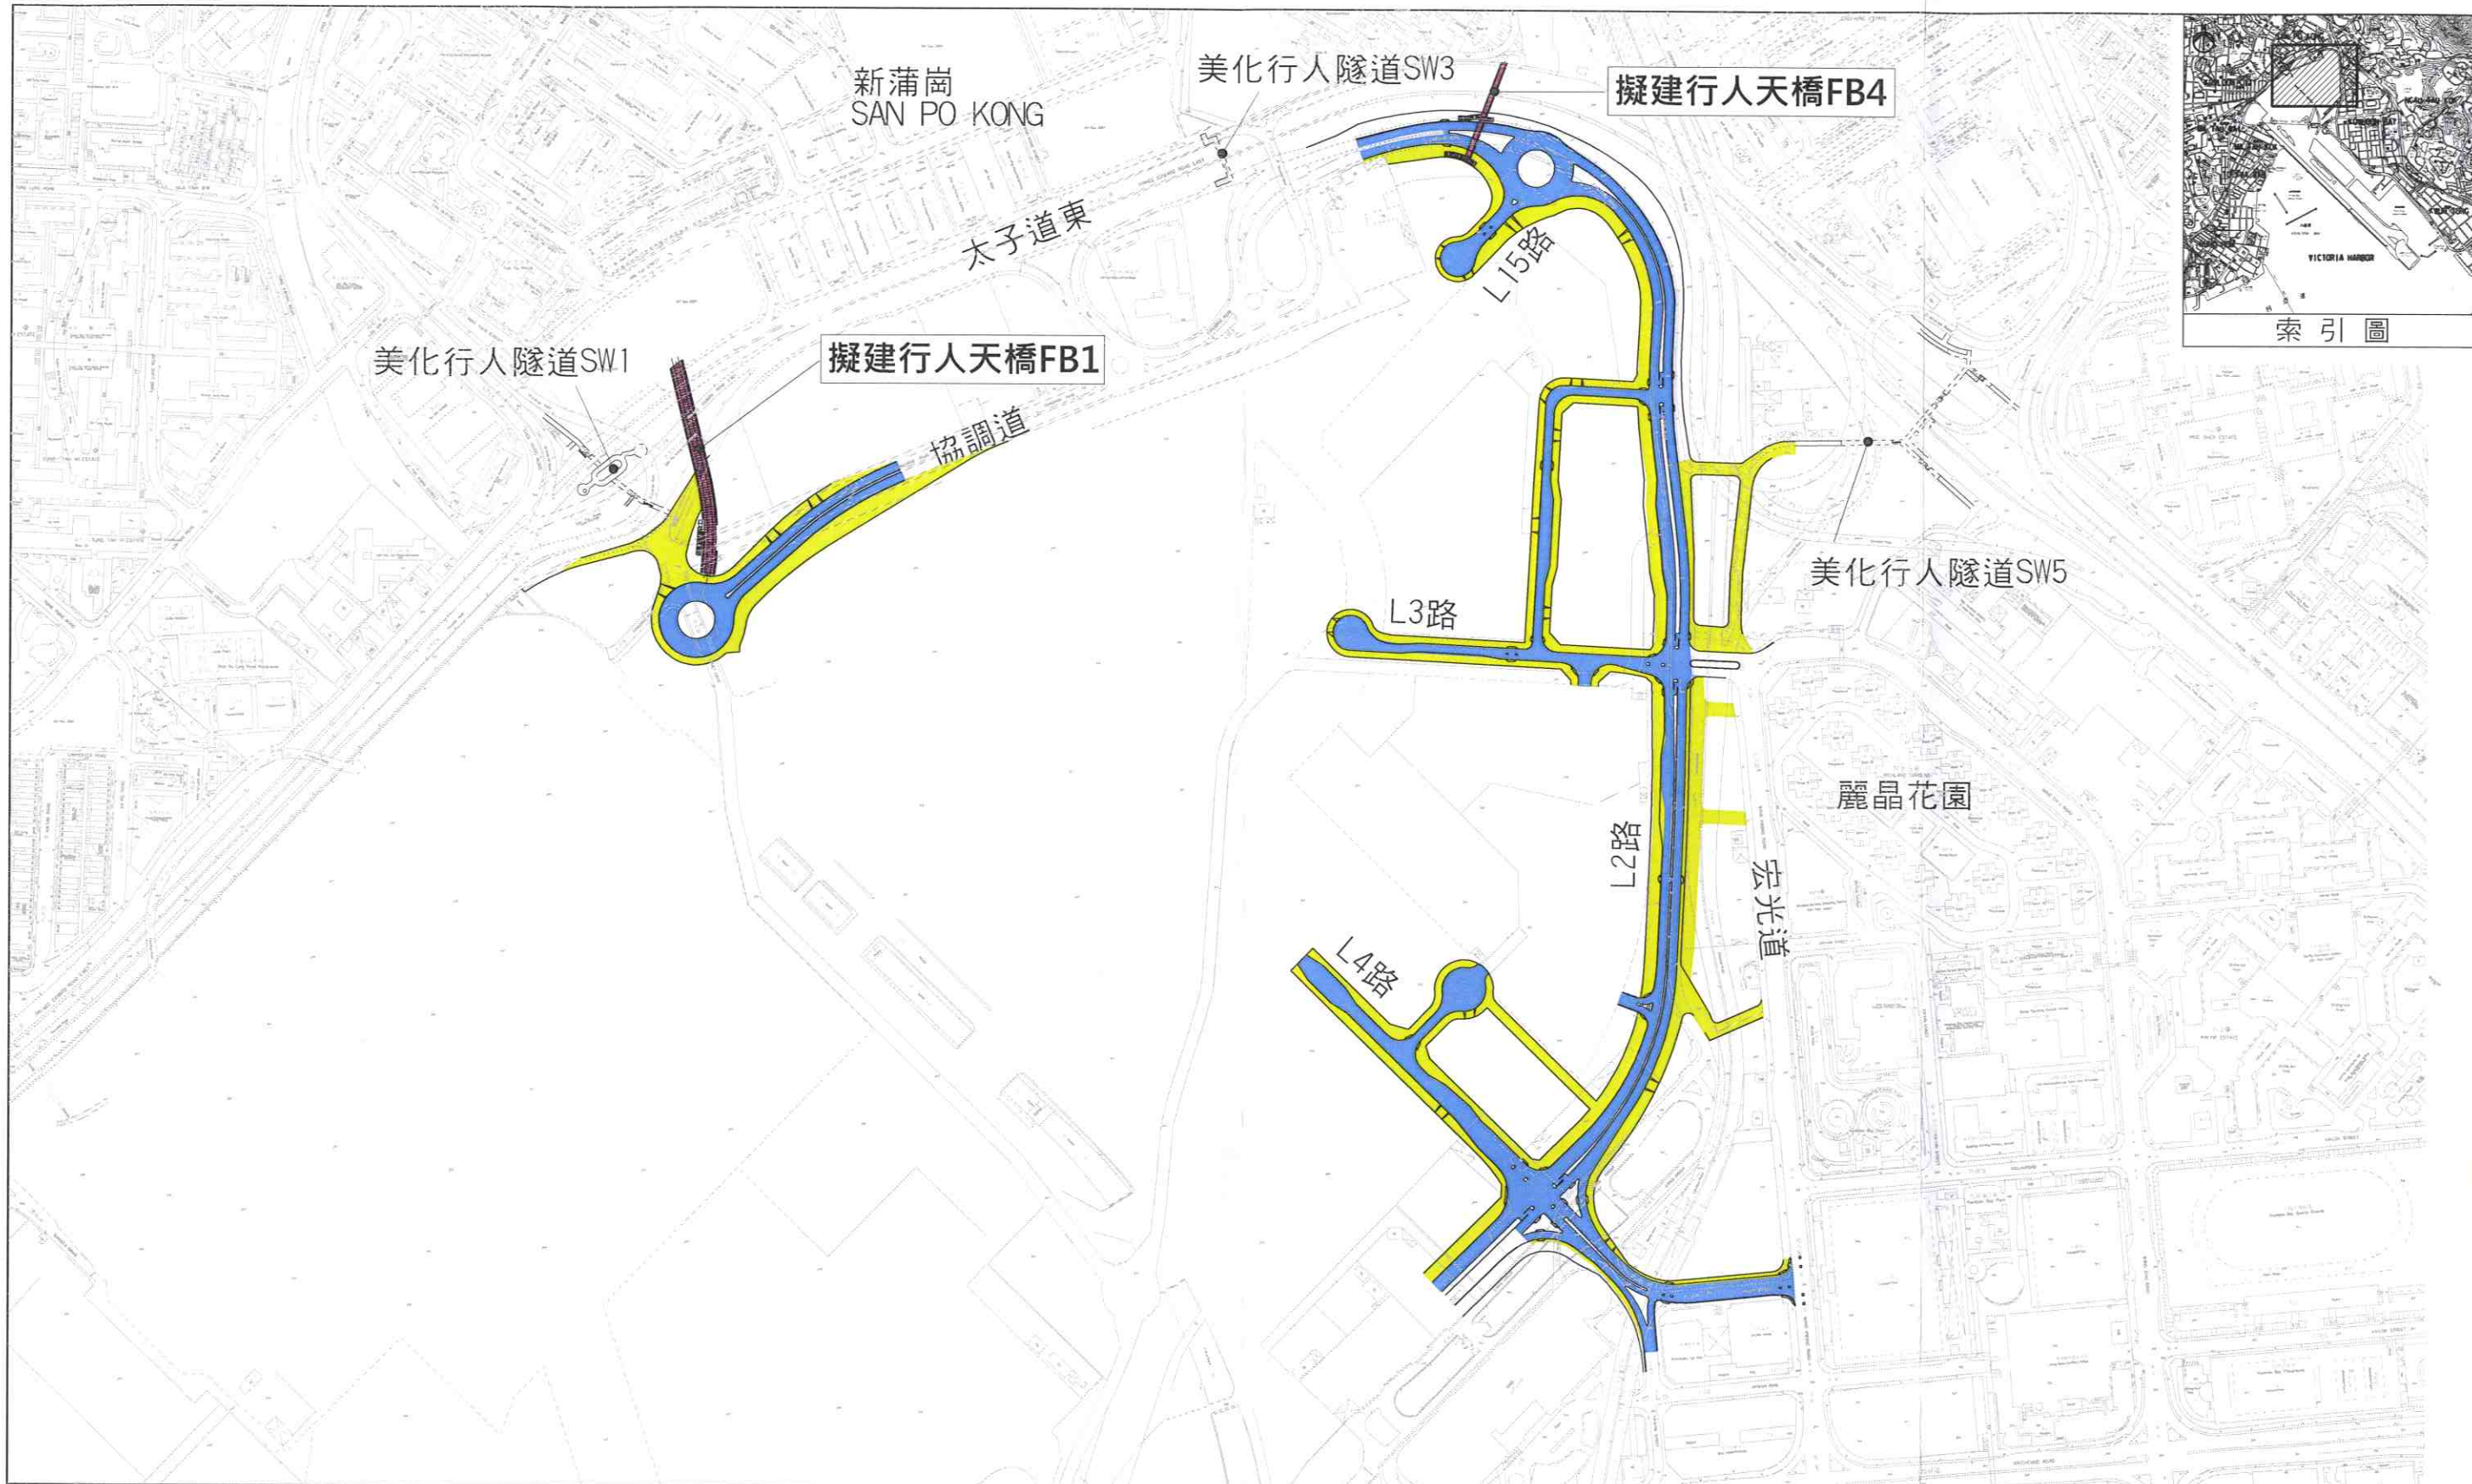

<p>LEGEND 圖例</p> <p> 擬建行人路</p> <p> 擬建行車路</p>	<p> 土木工程拓展署 Civil Engineering and Development Department</p> <p> 奧雅納工程顧問 Ove Arup &amp; Partners Hong Kong Limited</p>	<p>CONTRACT NO. 合約編號 KL/2008/09</p> <p>CONTRACT TITLE 合約名稱 啓德發展計劃 - 啓德機場北面停機坪基礎設施 第一期工程</p>	<p>DRAWING TITLE 圖則名稱 第一期工程項目圖(附圖1)</p>
--	--	---	---
