

黃大仙區議會轄下

政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 36/2012 號 ( 11.12.2012 )

渠務署

工程合約編號 DC/2011/04

重建、改善及修復一段由黃大仙警署至東頭二邨的啟德河

黃大仙區工程進度報告

## 1. 目的

本報告的主要目的是向小組成員匯報上述工程至今的工作進度。

## 2. 工程進度

### 2.1 相關水管及公共設施改道工程

位於下列位置的水管及公共設施改道工程已經展開：

位置	總結施工進度
親仁街及沙田坳道	進展良好
黃大仙下邨	
彩虹道遊樂場	
大成街	
摩士公園對出	
彩虹道北行線	
東頭(二)邨對出	
啟德花園	在緊急車輛通道上佔用的工地已經還原。現正與業主立案法團商討有關工程事宜

相關水管及公共設施改道工程預計於 2013 年完成。

## 2.2 河道工程

摩士公園及東頭(二)邨對出位置的河道牆身鞏固工程進展良好，黃大仙下邨的牆身鞏固工程預計將於 2012 年 12 月展開。另外，摩士公園對出的河道加深工程亦已經於 2012 年 11 月展開。

## 2.3 交通改道安排

位於下列位置的彩虹道南行線後移工程正在進行，並大約於 2016 年還原。

位置	總結施工進度
彩虹道遊樂場對出	進展良好
可立中學對出	
新蒲崗大廈對出	

現時彩虹道可供雙線雙程行車，總共 4 條行車線。待以上後移工程完成後，4 條行車線預計將於 2013 年年初向新蒲崗方向移動以建設河道旁邊的箱形暗渠（見附件）。工程期間，彩虹道的行車線數目將維持不變。

## 2.4 借用土地


我們需要臨時借用康樂及文化事務署轄下摩士一號公園內部份的太極園直至 2017 年以進行渠務工程及實施臨時行人改道措施。在有關渠務工程完成後，渠務署會在上述地點進行公園美化工程，以優化啟德河畔的暢達性。由於部份太極園內的緩跑徑將會受工程影響，承建商將會興建一段臨時緩跑徑以提供一個連貫的緩跑徑予市民在工程期間享用。

## 3. 總結

我們會繼續就區內的工程向鄰近的屋苑、學校及商戶保持緊密繫及溝通，進一協調工程期間的施工安排，並定期向工作小組匯報工程進度。我們亦已開放熱線電話（電話號碼：9639 0007），以便市民查詢及收集公眾人士對本工程的意見。

渠務署

2012 年 11 月

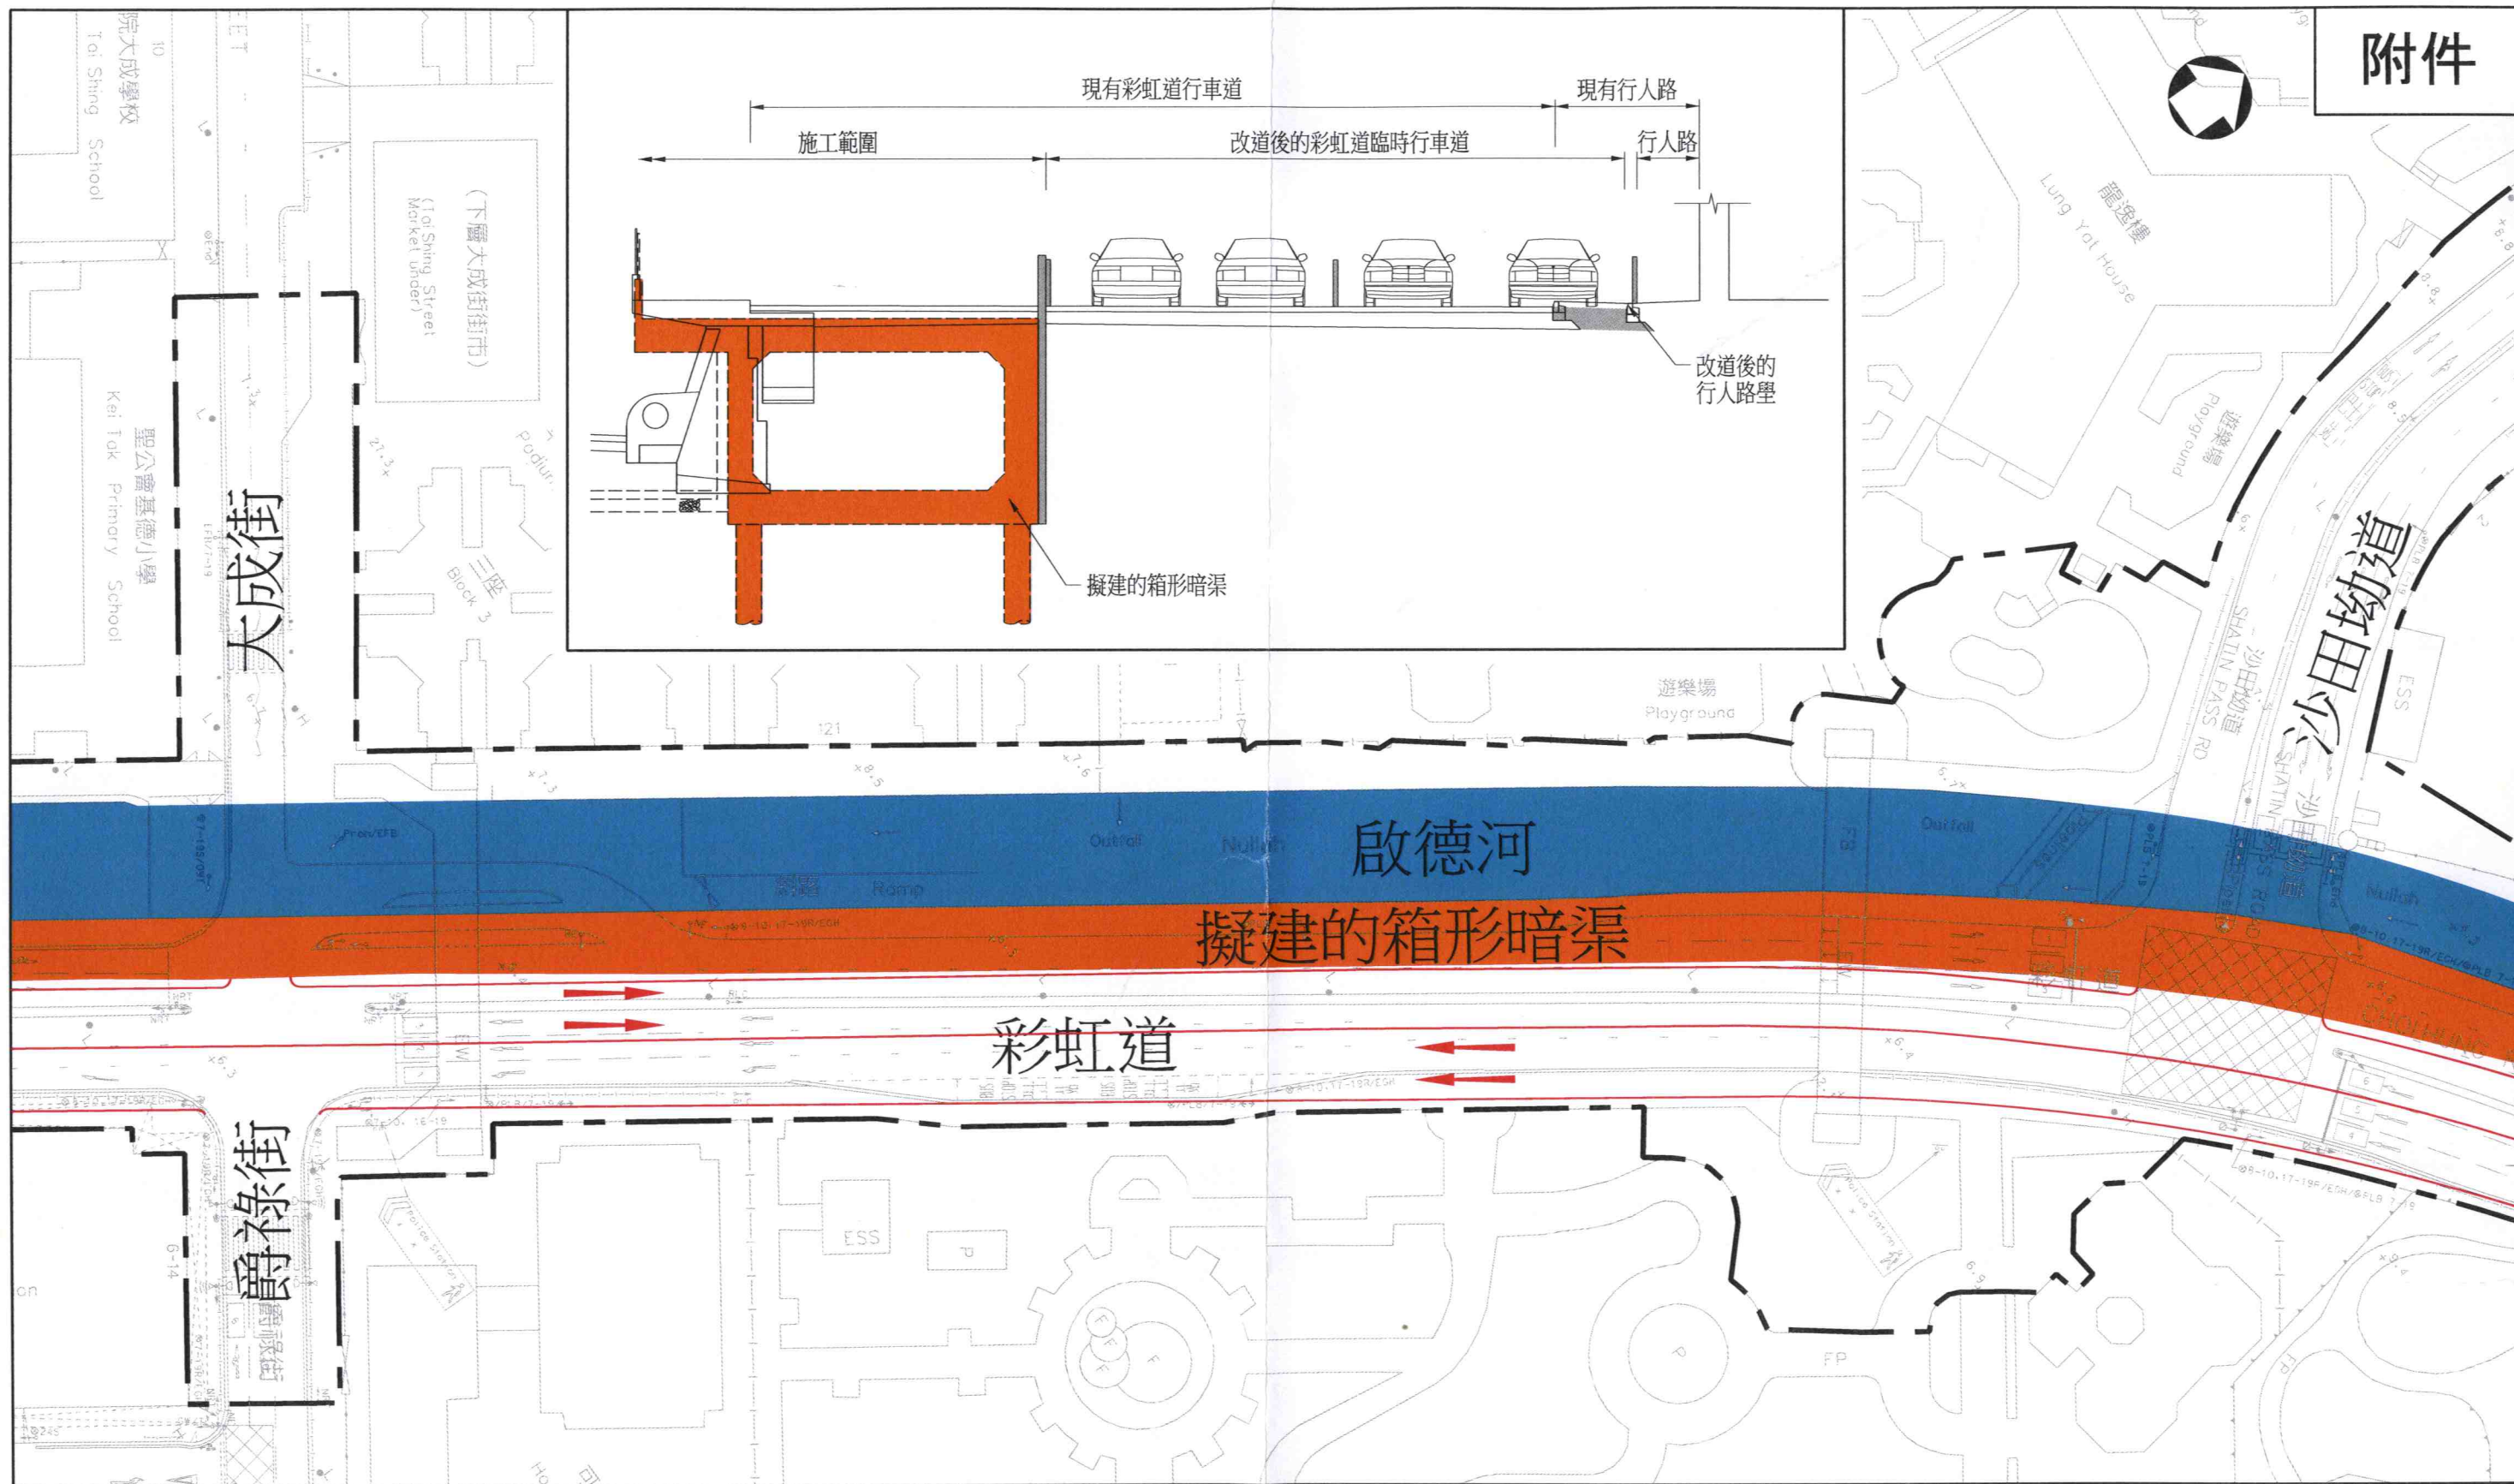

臨時交通改道  
維持彩虹道南行及北行各兩條行車線
