

**2008 至 2011 年度油尖旺區議會
地區設施管理委員會**

**康樂及文化事務署於 2008 至 2011 年度在油尖旺區
康樂體育場地的小型工程及環境改善項目匯報
(截至 2011 年 2 月 15 日)**

目的

油尖旺區地區設施管理委員會曾通過由康樂及文化事務署(康文署)主導的工程項目，本文件旨在向委員匯報有關工程項目的最新進度，以及請委員考慮有關工程安排的建議。

進度報告

2. 截至 2011 年 2 月 15 日，獲地區設施管理委員會正式通過的工程項目包括：

項目	進度/備註
i) 在櫻桃街公園加建上肢健身器	已完成
ii) 在油尖旺區康文署轄下場地及路旁花床進行綠化及美化工程	已完成
iii) 在油尖旺區康文署轄下籃球場及排球場進行改善工程	進行中
iv) 在塘尾道兒童遊樂場加設一部飲水機連一個摺合式帳篷	已完成
v) 在康文署轄下場地進行緊急小型改善工程的撥備	進行中
vi) 改善櫻桃街公園人造草地足球場的灌溉系統	進行中
vii) 在康達徑花園近科學館徑出入口位置加設一條斜道，方便有需要人士使用	進行中
viii) 在晏架街遊樂場及埃華街休憩花園內增設植物簡介告示板	已完成
ix) 在西貢街遊樂場增設洗手間	進行中
x) 改善尖沙咀東海濱平台花園扶手電梯工程	進行中

項目	進度/備註
xi) 改善西九龍海濱長廊二期燈飾電路及加裝漏電斷路器	已完成
xii) 改善普慶廣場花園噴水池電泵工程	進行中
xiii) 在中間道兒童遊樂場清拆已損毀的燈柱及加裝 5 支射燈	進行中

上述工程已陸續進入招標、施工及完工等階段，而工程的進度詳情，請參閱**附件**。

文件提交

3. 本文件將在 2011 年 3 月 10 日的地區設施管理委員會第二十次會議上提交。

康樂及文化事務署

2011 年 3 月

2008-2011 年度地區設施管理委員會通過的工程項目進度報告

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
1. 在櫻桃街公園 加建上肢 健身器 (項目編號 DMW071)	陳偉強 議員	康樂及文 化事務署	加建兩套上肢 健身器材	<u>\$45,000</u> 施工日期： 2011 年 1 月至 2 月 現金流： 2010-11 年度： \$45,000	康樂及文 化事務署 建築署 預計每年 維修費用： \$4,000	安裝工程已於 2011 年 2 月下 旬完成。 (見附錄一)
2. 在油尖旺區 康文署轄下 場地及進路 花床及美化 工程 (項目編號 DMW077)	康樂及文 化事務署	康樂及文 化事務署	在區內以下適 合的場地進行綠 化及美化工程 ● 香港文化中心 ● 尖沙咀海濱花 園 ● 天星碼頭廣場 噴水池 ● 市政局百週年 紀念花園	<u>\$1,280,000</u> 細項： 1. 香港文化中心 (\$100,000) 2. 尖沙咀海濱花園 (\$60,000) 3. 天星碼頭廣場噴水池 (\$10,000) 4. 市政局百週年紀念花園 (\$100,000)	康樂及文 化事務署	工程已於 2010 年 4 月展開。 在上次會議中 報告其中 6 個 工程項目已完 工。 在今次會議中 將報告另有 8 個工程項目完 成。全部 22 項 工程現已完成 (見附錄二)

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
			● 麼地道花園	5. 麼地道花園 (\$20,000)		
			● 尖沙咀東海濱 平台花園	6. 尖沙咀東海濱平台花園 (\$30,000)		
			● 中間道兒童遊 樂場	7. 中間道兒童遊樂場 (\$30,000)		
			● 香港體育館	8. 香港體育館 (\$15,000)		
			● 佐敦道與加士 居道交界路邊 花床	9. 佐敦道與加士居道交界路 邊花床 (\$40,000)		
			● 西九龍海濱長 廊	10. 西九龍海濱長廊 (\$80,000)		
			● 覺士道兒童遊 樂場	11. 覺士道兒童遊樂場 (\$30,000)		
			● 西貢街遊樂場	12. 西貢街遊樂場 (\$25,000)		
			● 九龍佐治五世 紀念公園	13. 九龍佐治五世紀念公園 (\$60,000)		
			● 京士柏曲棍球 場	14. 京士柏曲棍球場 (\$40,000)		
			● 京士柏遊樂場	15. 京士柏遊樂場 (\$40,000)		

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
			● 櫻桃街/海輝道迴旋處	16. 櫻桃街/海輝道迴旋處 (\$200,000)		
			● 櫻桃街公園	17. 櫻桃街公園 (\$100,000)		
			● 彌敦道/荔枝角道交界小園地	18. 彌敦道/荔枝角道交界小園地 (\$60,000)		
			● 櫻桃街路邊花床	19. 櫻桃街路邊花床 (\$60,000)		
			● 樂群街公園	20. 樂群街公園 (\$60,000)		
			● 晏架街遊樂場	21. 晏架街遊樂場 (\$60,000)		
			● 櫻桃街/渡船街交界小園地	22. 櫻桃街/渡船街交界小園地 (\$60,000)		
				<u>施工日期：</u> 2010 年 4 月至 2011 年 2 月 <u>現金流：</u> 2010-11 年度：\$1,280,000		

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
3. 在油尖旺區 康文署轄下 籃球場進行 改善工程 (項目編號 DMW078)	康樂及文 化事務署	康樂及文 化事務署	- 在五個體育館的主場加裝安全軟墊及添置排球裁判椅 - 在十個戶外籃球場的柱身加裝安全軟墊	<u>\$656,500</u> <u>細項:</u> - 在五個體育館主場的排球柱加裝安全軟墊及添置排球裁判椅(\$338,000) - 在十一個戶外籃球場及排球場柱身加裝安全軟墊(\$318,500) <u>施工日期:</u> 2010年9月至2011年3月 <u>現金流:</u> 2010-11年度: \$656,500	康樂及文 化事務署	在五個體育館的主場加裝安全軟墊及添置排球裁判椅工程已於2010年9月完成。 在十個戶外籃球場的柱身加裝安全軟墊工程已於2010年11月完成。 (見附錄三) 在六個戶外籃球場的柱身加裝安全軟墊工程現正進行中。
4. 在塘尾道 兒童遊樂場 設置一個 連式帳篷 (項目編號 DMW083)	康樂及文 化事務署	建築署及 機電署	加裝一個飲水及一個摺疊式帳篷	<u>\$37,000</u> <u>施工日期:</u> 2011年1月至2月 <u>現金流:</u> 2010-11年度: \$37,000	康樂及文 化事務署 機電署	安裝工程已於2011年2月下旬完成。 (見附錄四) 預計每年維修費用: \$2,500

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
5. 康文署轄下康樂及文化事務署轄下緊急工程 (項目編號 DMW087)	康樂及文化事務署	建築署	在花園街體育館加裝電制	<u>\$200,000</u> 花園街體育館 (\$4,760)	建築署	在 10 樓女廁加裝電掣已於 2010 年 9 月初完成。
		機電署	更換大角咀體育館主場籃球架組件	大角咀體育館 (\$52,200)	機電署	工程已於 2010 年 10 月底完成。
		建築署	在界限街遊樂場內供電站加裝貓梯、圍欄及相關的安全設施	界限街遊樂場 (\$13,000)	建築署	工程已於 2010 年 11 月中完成。
		建築署	在界限街遊樂場球場圍網底部加裝不銹鋼片	界限街遊樂場 (\$25,000)	建築署	工程已於 2010 年 12 月初完成。
		水務署	在櫟樹街休憩處安裝一個水錶以供植物灌溉之用	櫟樹街休憩處 (\$30,000)	水務署	工程預計於 2011 年 3 月中完成。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
		機電署	在旺角康民角 安裝三支射燈 以改善照明	旺角康民角 (\$20,000)	機電署	工程已於 2011 年 1 月底完成。 (見附錄五(a))
		機電署	於京士柏曲棍 球場改善消防 「重置」系統	京士柏曲棍球場 (\$5,200)	機電署	工程已於 2011 年 1 月底完成。 (見附錄五(a))
		建築署	於官涌體育館 5 樓及 6 樓更衣 室內設置吹髮 機	官涌體育館 (\$15,000)	建築署	工程已於 2010 年 12 月完成。
		建築署	在京士柏遊樂 場男更衣室及 女更衣室加裝 風扇	京士柏遊樂場 (3,100)	建築署	工程已於 2010 年 12 月完成。
		機電署	為京士柏遊樂 場上層殘疾人 士洗手間加設 獨立電力系統	京士柏遊樂場 (8,000)	機電署	工程已於 2011 年 1 月底完成 (見附錄五(b))

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
6. 改善櫻桃街的 公園足球場的 灌溉系統 (項目編號 DMW089)	康樂及文 化事務署	機電署	加裝一個水缸 及更換水管	<u>\$200,000</u> 施工日期： 2011年2月至3月 現金流： 2010-11 年度： \$200,000	康樂及文 化事務署 機電署	工 程 預 計 於 2011 年 3 月完 成。
7. 在康達徑花 園近出入口 置斜道，方便 有需要人士 使用 (項目編號 DMW093)	康樂及文 化事務署	建築署	加設一條斜道 供有需要人士 使用。	<u>\$80,000</u> 施工日期： 2011年1月至3月 現金流： 2011-12 年度： \$80,000	建築署	工 程 預 計 於 2011 年 3 月中 完成。
8. 在晏架街遊 樂場及埃華街 內增設植物 簡介告示板 (項目編號 DMW094)	康樂及文 化事務署	建築署	在晏架街遊樂 場及埃華街休 憩花園加設植 物簡介告示 板，以介紹樹木 的名稱和特性。	<u>\$45,000</u> 施工日期： 2011年1月 現金流： 2010-11 年度： \$45,000	康樂及文 化事務署	安 裝 工 程 已 於 2011 年 1 月 下 旬 完 成 (見附錄六)

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
9. 在西貢街遊樂場增設洗手間 (項目編號 DMW099)	陳少棠 主席	建築署	西貢街遊樂場 增設洗手間	<u>\$1,450,000</u> 施工日期：待定 現金流： 2011-12 年度： \$1,450,000	建築署 預計每年 維修費用： \$164,060	建築署現正進行工程前期籌備工作。
10. 改善沙咀海濱平台扶手工程 (項目編號 DMW104)	康樂及文 化事務署	機電署	更換兩條梯級 的金屬履帶	<u>\$499,100</u> 施工日期： 2011 年 1 月至 3 月 現金流： 2010-11 年度： \$499,100	機電署	工程預計於 2011 年 3 月下 旬完成。
11. 改善西九龍海濱二期燈飾及加裝 31 個漏電斷路器 (項目編號 DMW106)	康樂及文 化事務署	機電署	改善西九龍海濱二期燈飾及加裝 31 個漏電斷路器	<u>\$17,000</u> 施工日期： 2011 年 1 月 現金流： 2010-11 年度： \$17,000	機電署	工程已於 1 月 中完成。 (見附錄七)

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
12.改善普慶廣場花園噴水池電泵工程 (項目編號 DMW107)	康樂及文化事務署	機電署	更換一台功率較高的噴水池電泵	<u>\$50,000</u> 施工日期： 2011年2月至3月 現金流： 2010-11 年度： \$50,000	機電署	工程預計於2011年3月中完成。
13.在中間道兒童遊樂場清拆已損毀的燈柱及加裝5支射燈 (項目編號 DMW108)	康樂及文化事務署	機電署	在中間道兒童遊樂場清拆已損毀的燈柱及加裝5支射燈	<u>\$56,978</u> 施工日期： 待定 現金流： 2010-11 年度： \$56,978	機電署	現正進行工程前期籌備工作。

在櫻桃街公園加建上肢健身器

(項目編號 DMW071)

櫻桃街公園

工程前



工程後




在油尖旺區康文署轄下場地及路旁花床進行綠化及美化工程

(項目編號 DMW077)

九龍佐治五世紀念公園

工程前

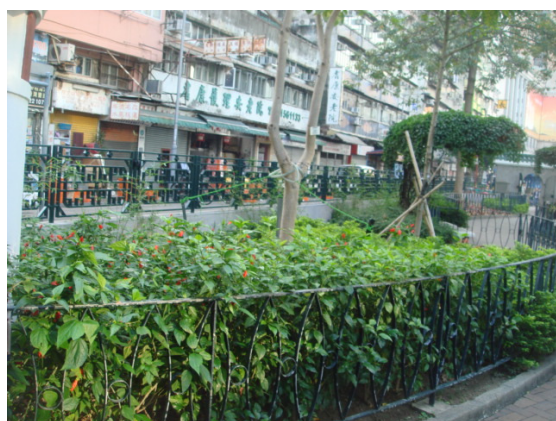

工程後



在油尖旺區康文署轄下場地及路旁花床進行綠化及美化工程

(項目編號 DMW077)

櫻桃街/海輝道迴旋處



在油尖旺區康文署轄下場地及路旁花床進行綠化及美化工程

(項目編號 DMW077)

彌敦道/荔枝角道交界小園地

工程前



工程後



在油尖旺區康文署轄下場地及路旁花床進行綠化及美化工程

(項目編號 DMW077)

樂群街公園

工程前	工程後
	
	
	

在油尖旺區康文署轄下場地及路旁花床進行綠化及美化工程

(項目編號 DMW077)



晏架街遊樂場



在油尖旺區康文署轄下場地及路旁花床進行綠化及美化工程

(項目編號 DMW077)

櫻桃街公園

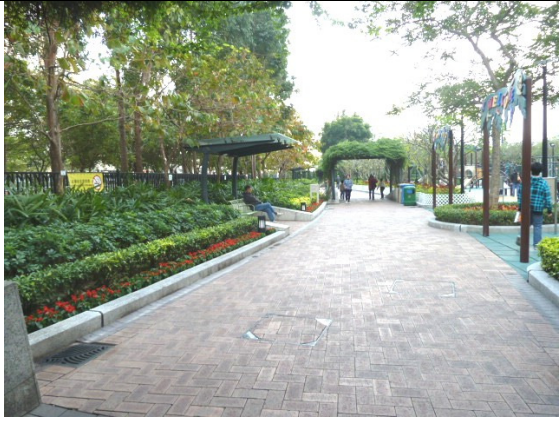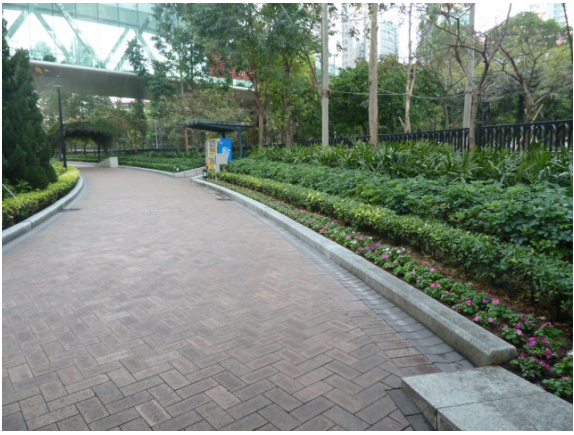工程前	工程後
	
	
	

在油尖旺區康文署轄下場地及路旁花床進行綠化及美化工程

(項目編號 DMW077)

京士柏曲棍球場

工程前	工程後
	
	

京士柏遊樂場

工程前	工程後
	

在油尖旺區康文署轄下籃球場及排球場進行改善工程

(項目編號 DMW078)

上海街/街市街遊樂場



康達徑花園



鴉打街臨時遊樂場



九龍佐治五世紀念公園



東安街休憩花園



備註：安全軟墊



在塘尾道兒童遊樂場加設一部飲水機連一個摺合式帳篷

(項目編號 DMW083)

工程前



工程後



在康文署轄下場地進行緊急小型改善工程的撥備


(項目編號 DMW087)

在旺角康民角安裝三支射燈以改善照明

工程前



工程後

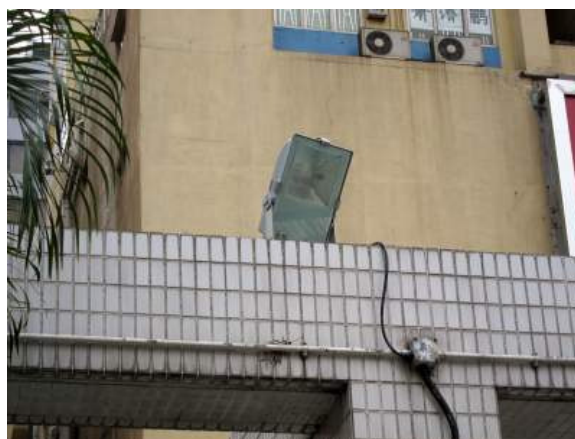

於京士柏曲棍球場改善消防「重置」系統

工程前



工程後



在康文署轄下場地進行緊急小型改善工程的撥備

(項目編號 DMW087)

為京士柏遊樂場上層殘疾人士洗手間加設獨立電力系統

工程前



工程後



在晏架街遊樂場及埃華街休憩花園內增設植物簡介告示板

(項目編號 DMW094)

晏架街遊樂場植物簡介告示板(總數 7 塊)

工程前



工程後



埃華街休憩花園植物簡介告示板(總數 5 塊)

工程前



工程後




改善西九龍海濱長廊二期燈飾電路及加裝漏電斷路器


(項目編號 DMW106)

西九龍海濱長廊二期照明系統電路改善及加裝漏電斷路制工程

工程前

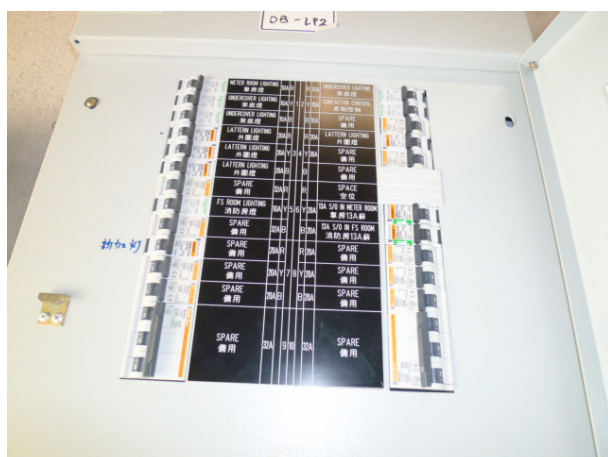

工程後

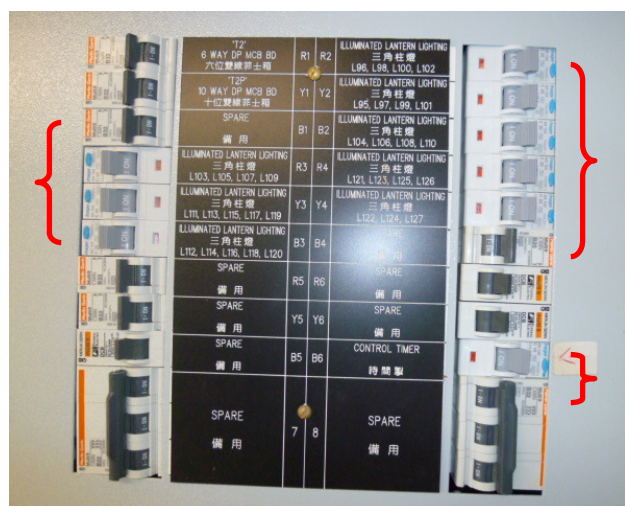

} 新漏電斷路
