

土木工程拓展署就港鐵粉嶺站外之 行人道擴闊工程進度事宜提問的書面回應

於港鐵粉嶺站外，近百和路行人道的位置，本署已完成部份行人道的擴闊工程，並開放予公眾使用。



餘下由行人天橋往嘉福邨方向及由行人天橋往景盛苑方向的行人道擴闊工程，預計分別於 2020 年下半年及 2021 年上半年完成。行人道擴闊工程的位置請參考附件。

上述工程其中一個主要挑戰是在工程進行時，將無可避免地佔用部份現有的行人道及單車徑以便施工。本署及承建商會與不同的持份者保持緊密的溝通以制訂合適的臨時改道方案以配合工程的進展及公眾的需求。

土木工程拓展署
2020 年 7 月

註釋
NOTES :
圖例 :
LEGEND

- 行人道擴闊 (已開放予公眾使用)
- 行人道擴闊 (由行人天橋往嘉福邨方向段 - 預計於2020年下半年完成)
- 行人道擴闊 (由行人天橋往景盛苑方向段 - 預計於2021年上半年完成)

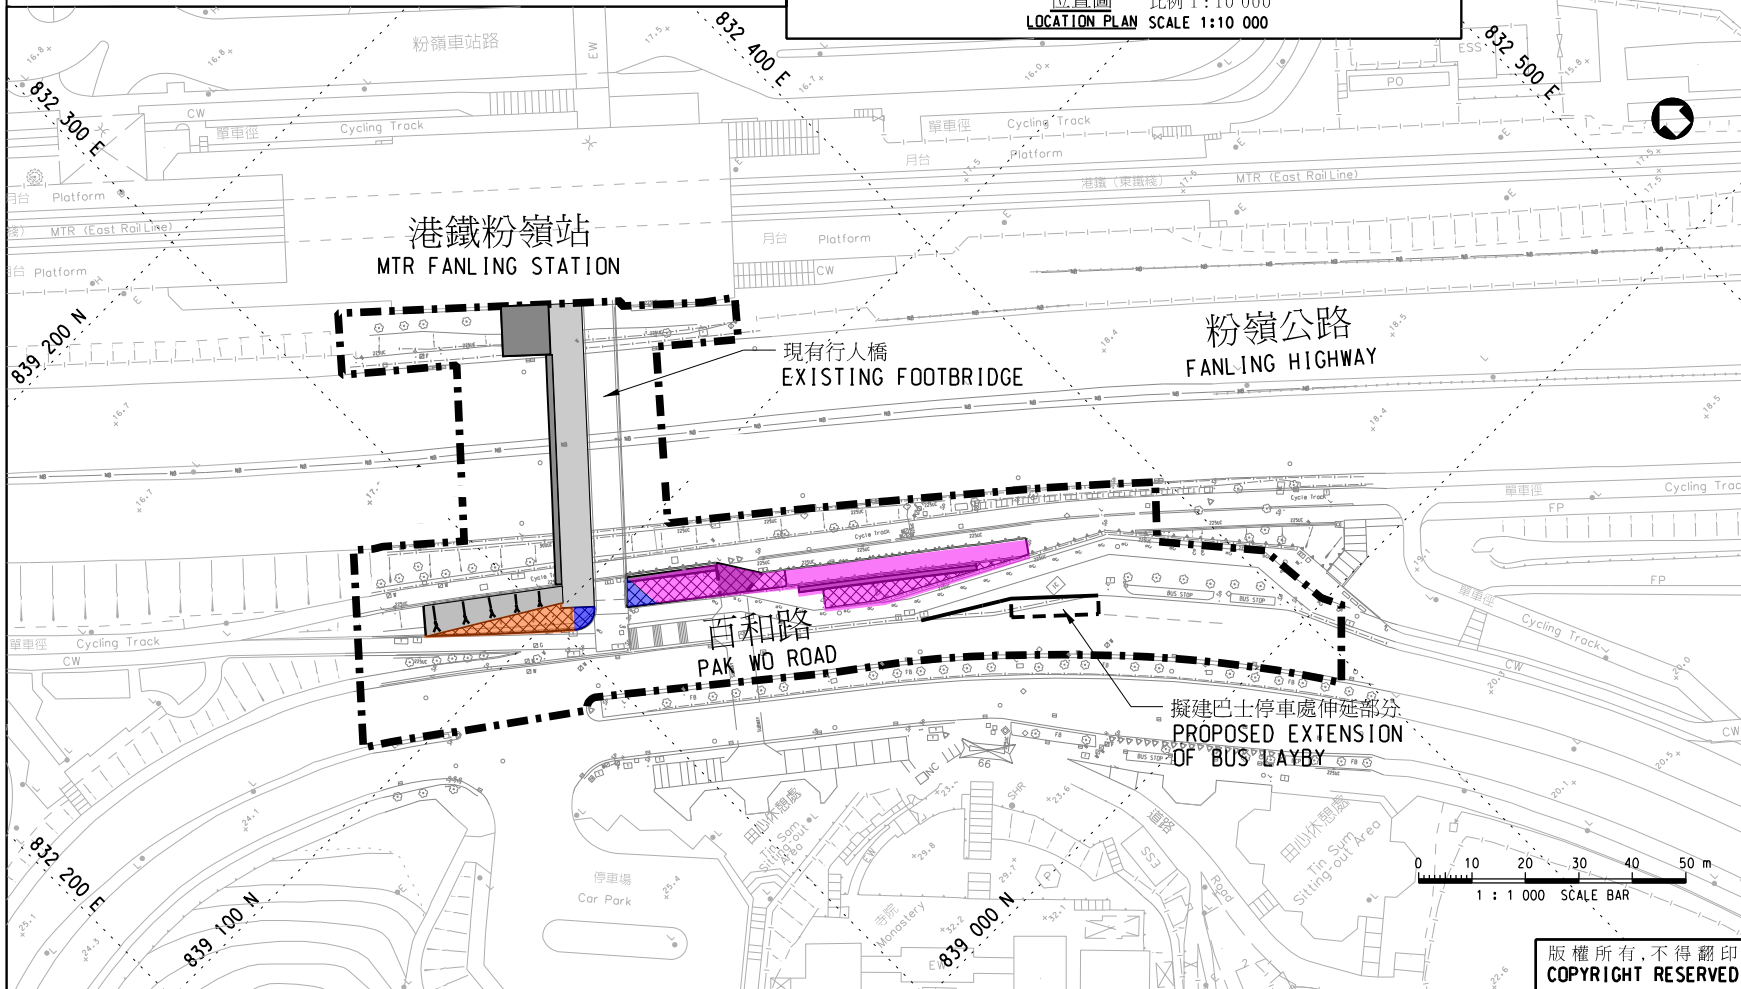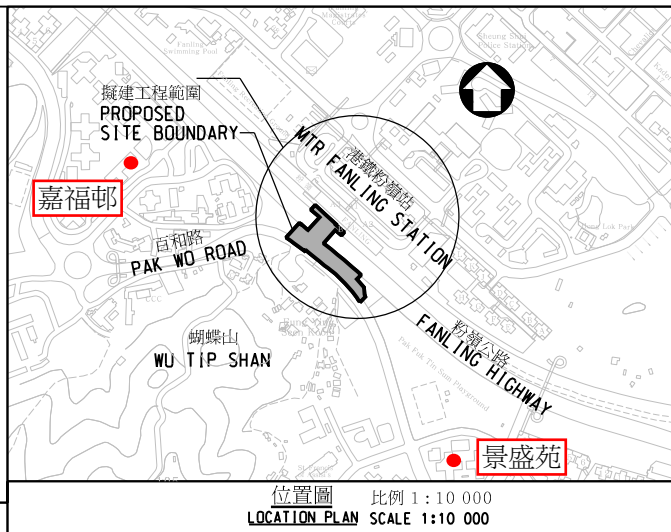

S:\C\201606\DRAWING\W4488.dgn
9/5/2016 R:\PE\L\TABLE\F11\enmsd\cote.tbl
