

西貢區議會 2021/2022 年度 主要工程項目進度報告 (2021 年 12 月)

清水灣道與匡湖居之間的西貢公路



百勝角消防處紀律部隊宿舍



和明苑/煜明苑對出行人路段加裝上蓋



將軍澳跨灣連接路



土木工程拓展署
東拓展處

頁數

甲部	進行中的工程	
(一)	社區設施工程	1 – 6
(二)	水務及渠務工程	7 – 16
(三)	土地開拓、道路及其他工程	17 – 34
乙部	規劃中及即將進行的工程	
(四)	康樂及文化設施工程	35 – 39
(五)	水務及渠務工程	40 – 43
(六)	土地開拓、道路及其他工程	44 – 51

附圖： 工程項目位置圖

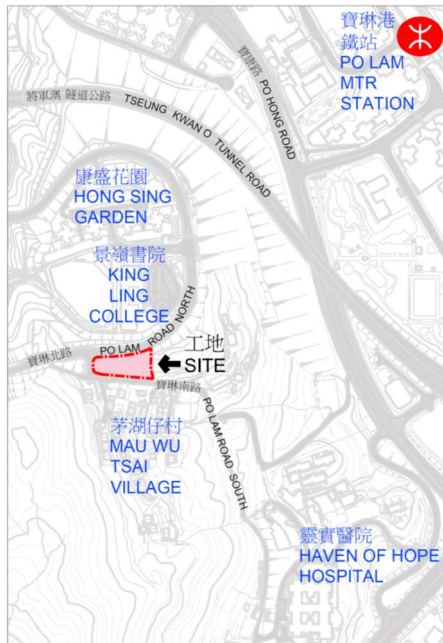
甲部
進行中的工程

(一) 社區設施工程

(一) 社區設施工程

截至 2021 年 12 月

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
67JA 甲級	將軍澳第 123 區寶琳路香港海關職員宿舍建造工程	1,035.2	保安局局長 香港海關 建築署	11/2018	9/2023	工程範圍包括： (一) 興建 2 幢 25 至 26 層高、總建築樓面面積約為 23 860 平方米的宿舍樓宇，以提供 306 個部門宿舍單位； (二) 下列附屬設備－ (i) 1 個管理處； (ii) 康樂及公用地方，包括 1 個多用途室； (iii) 私家車及電單車泊車位；以及 (三) 進行相關的渠務工程。	現正進行挖掘與側向承托工程。



(一)社區設施工程(續)

截至 2021 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
174BF 甲級	在將軍澳第 72 區興建消 防局暨救護 站、部門宿 舍及消防設 施	655.0	保安局局長 香港消防處 建築署	Q1 2022	Q4 2024	工程計劃的工地面積約 3 015 平方米，工程將興建樓高 17 層附設天台的大樓。工程範圍包括： - 興建可容納 5 個泊車間的消防局暨救護站； - 重置社區應急準備課貯物室 - 重置消防設備專責隊伍辦公室 - 為消防處行動車輛(包括消防安全教育巴士及應急準備教育巴士)提供室外有蓋停車間及為部門宿舍提供室外停車場(包括 21 個私家車泊車位及 2 個電單車泊車位)；以及提供 132 個 H 級部門宿舍單位及相關設施	本項目的主體建造合約已於 2021 年 9 月 10 日展開招標，並於 2021 年 11 月 19 日收到標書。

圖例 LEGEND

- 工地界線 SITE BOUNDARY
- 無障礙通道 BARRIER-FREE ACCESS
- ↑ 無障礙出入口 BARRIER-FREE ENTRANCE / EXIT
- ↑ 暢通易達升降機 ACCESSIBLE LIFT
- ||||| 現有人行過路處 EXISTING AT-GRADE PEDESTRIAN CROSSING
- 現有巴士站 EXISTING BUS STOP
- 现有小巴站 EXISTING MINIBUS STOP
- ⊗ 現有港鐵站 EXISTING MTR STATION
- ⊗ 港現有鐵站出入口 EXISTING MTR STATION ENTRANCE / EXIT
- 現有有蓋行人天橋 EXISTING COVERED FOOTBRIDGE
- 擬建行人天橋 (不包括在 174BF 內) PROPOSED FOOTBRIDGE (NOT FORMING PART OF 174BF)

工地 SITE

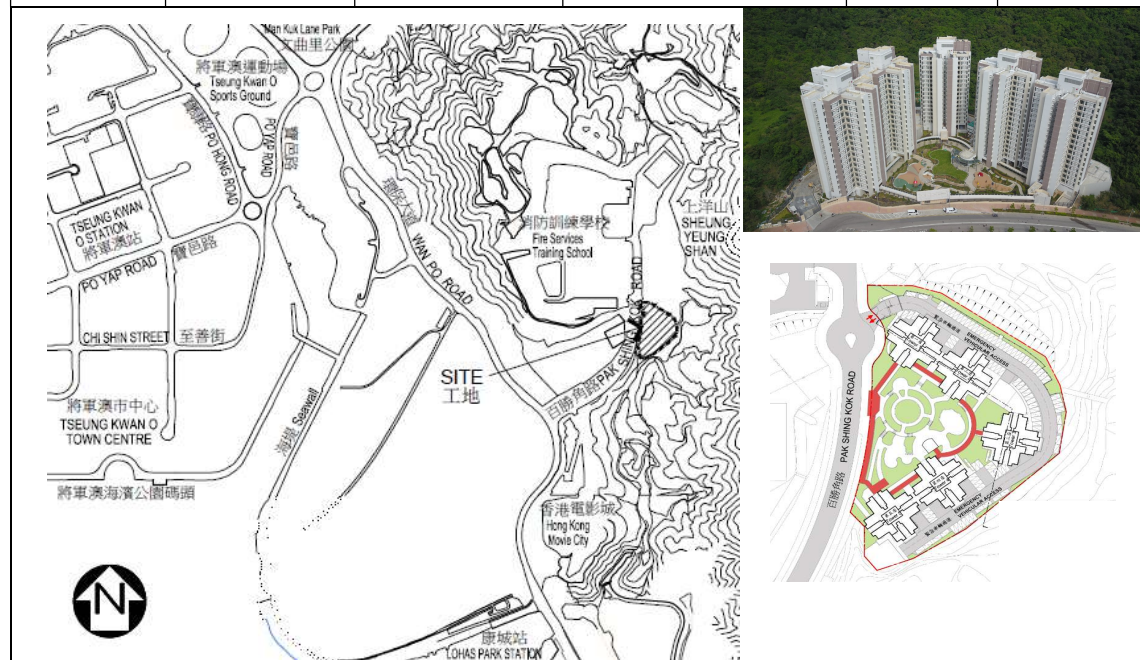
擬建公眾垃圾收集站 PROPOSED PUBLIC REFUSE COLLECTION POINT

25m 0m 50m 100m

(一)社區設施工程(續)

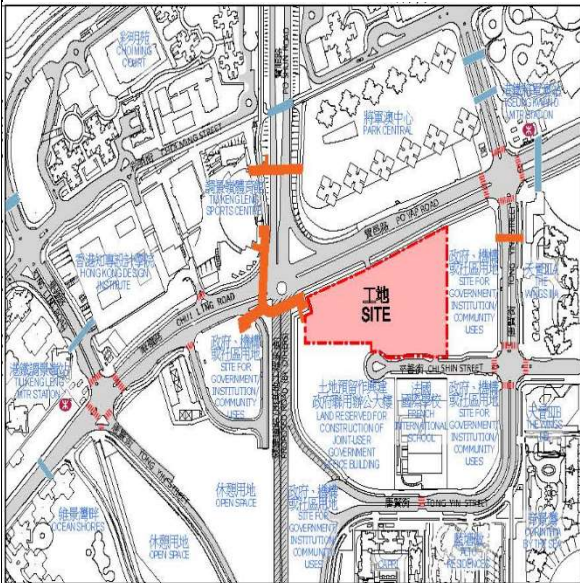
截至 2021 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
64JA 甲級	將軍澳 百勝角 消防處紀律 部隊宿舍 建造工程	1,507.9	保安局局長 香港消防處 建築署	8/2018	3/2021	工程範圍包括： (一) 興建 5 幢 16 至 17 層的宿舍樓宇，以提供 648 個部門宿舍單位；以及 (二) 下列附屬設備－ (i) 管理處； (ii) 休憩／公用地方；以及 (iii) 私家車及電單車泊車位。	工程已於 3/2021 完工。



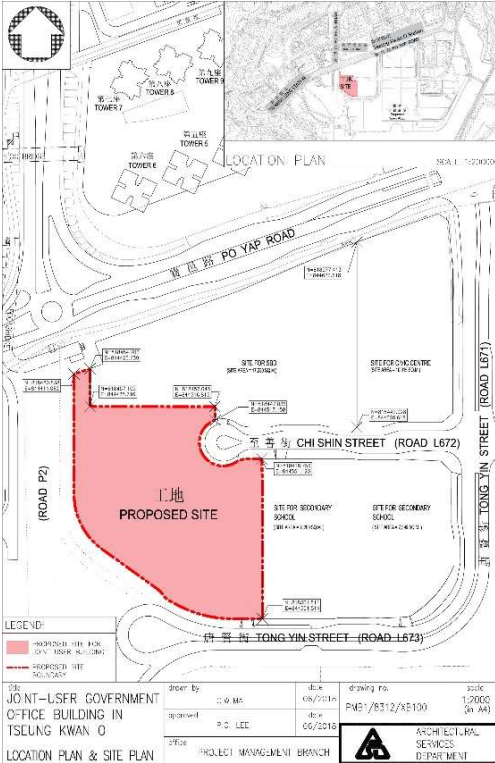
(一)社區設施工程(續)

截至 2021 年 12 月

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
130KA 甲級	將軍澳入境事務處總部	6,806.0	保安局局長 入境事務處 建築署	6/2019	9/2023	工程範圍包括興建入境處總部，提供約57 400 平方米淨作業樓面面積供入境處使用。設施包括－： (a) 公共服務辦事處； (b) 一般辦公室； (c) 電話熱線中心； (d) 運作設施； (e) 指揮控制中心； (f) 輔助設施；以及 (g) 停車場供部門使用。	現正進行上蓋建築工程。
 							

(一)社區設施工程(續)

截至 2021 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
3125KA 甲級	將軍澳 第 67 區 政府聯用 辦公大樓	5,228.4	財經事務及庫務局 政府產業署 建築署	9/2020	3/2025	工程計劃的擬議用途和設施包括 - • 一般政府辦公室 • 普通科門診診所 • 為公務員及合資格人士而設的公務員診所、牙科診所及幼兒中心 • 就業中心 • 郵政局及派遞局 • 社會保障辦事處 • 公眾停車場 • 實驗室	項目的設計及建造工程已於 2020 年 9 月展開。 第一期圍板工程已完成。打樁工程、挖掘及側向支撐工程正在進行中。與用戶的詳細設計討論會正在進行中。
							

(一)社區設施工程(續)

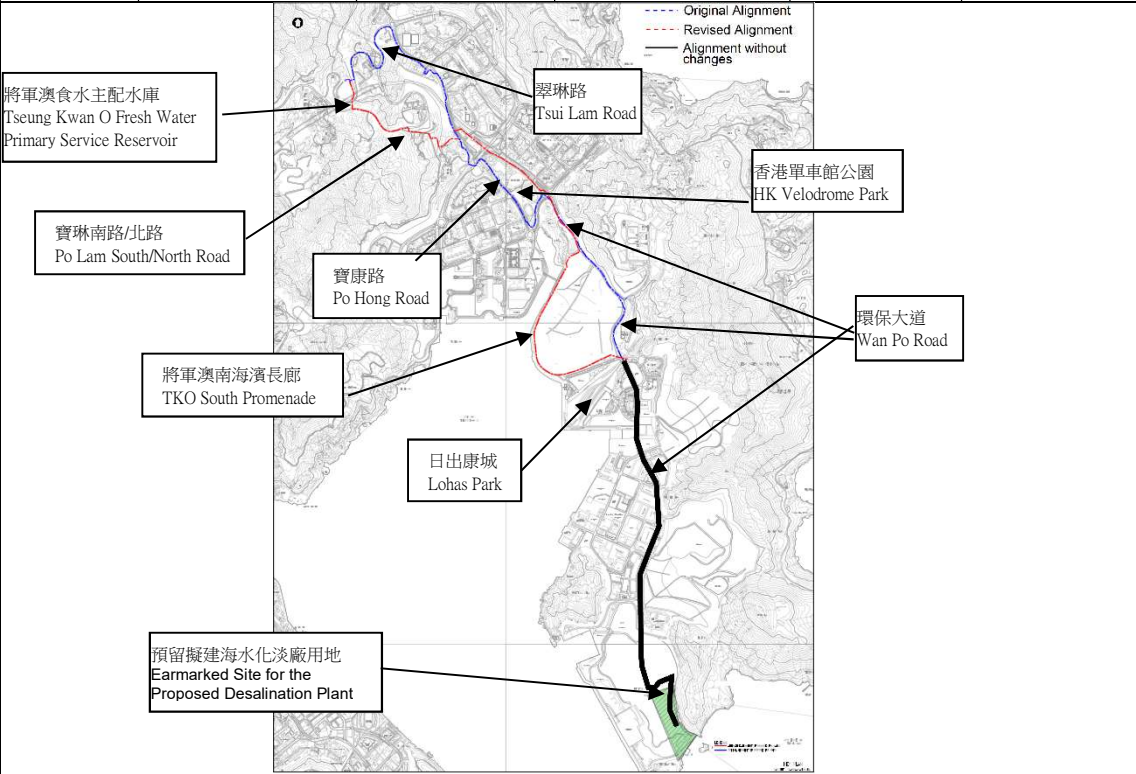
截至 2021 年 12 月

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
7F09R0 丁級	西貢海濱長廊優化計劃	15 (第一階段工程)	民政事務局局長 土木工程拓展署	12/2021	6/2022 (第一階段工程)	工程項目旨在推展西貢海濱長廊的園景優化計劃，現計劃在宜春街至惠民路之間的海濱長廊進行下列主要優化工程，包括更換沿岸欄杆及長廊地磚、美化配置設施和更換照明設施等。  Enhancement Proposal (Overview) 優化建議 (總綱) - Phase 5 階段5: 更換欄杆和路燈 (Replacement of Shoreline Railings and Lampposts) - Phase 4 階段4: 移除現有小樹 (Refurbishment of Soft Landscape), 增設添水站 (Installation of Water-filling Facility), 遷移及更換座椅 (Replacement and Re-arrangement of Benches) - Phase 3 階段3: 重塗泵房外牆 (Re-painting of Wall of Sewage Pumping Station) - Phase 2 階段2: 遷移及更換路燈 (Replacement and Relocation of Lampposts), 更換座椅 (Replacement of Benches) - Phase 1 階段1: 遷移現有棕櫚樹 (Transplanting of Existing Palm Trees), 增設牌坊照明 (Enhancement of Lighting for Palfong of Seafood Street), 重新鋪裝 (Replacement and Re-arrangement of Paving Blocks)	我們在 2019 年諮詢了西貢區議會轄下旅遊及經濟發展工作小組及相關持份者，並在 2020 年至 2021 年期間多次進行地區諮詢，收集了眾多持份者及地區人士對優化計劃的寶貴意見，從而進一步優化西貢海濱長廊的設計。西貢區議會及地區持份者均支持西貢海濱長廊的園景優化概念，並要求早日落實有關優化工程。 優化工程將會分五階段進行。第一階段的工程(即海鮮街牌坊廣場一帶)會於 2021 年年底開展，目標於 2022 年年中完成；餘下階段的工程將會視乎地區持份者反應陸續推展。

(二) 水務及渠務工程

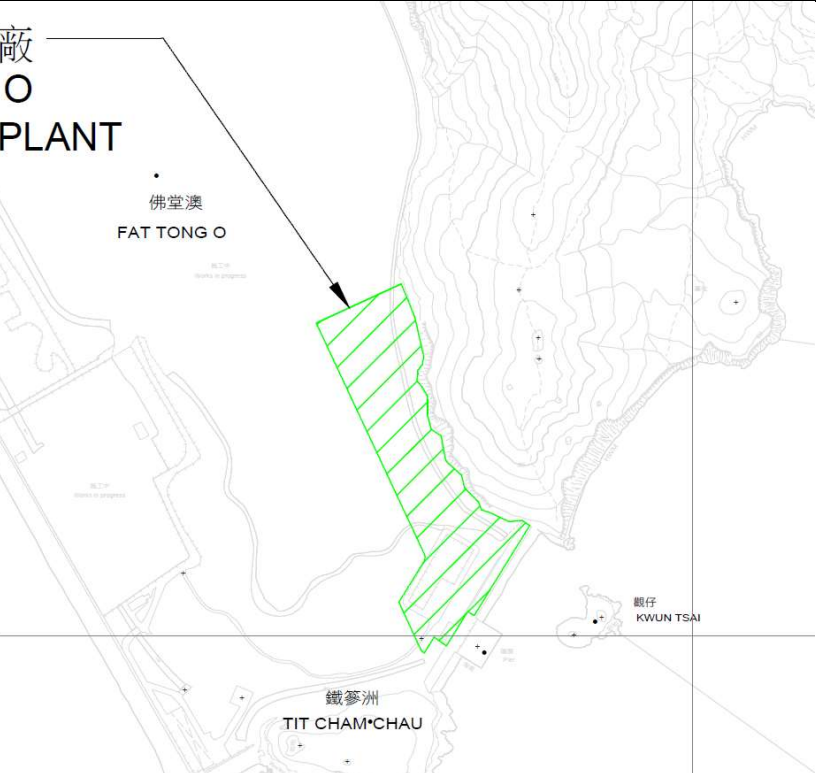
(二) 水務及渠務工程

截至 2021 年12月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
364WF 甲級	將軍澳 海水化淡廠 第一階段 設計及建造 - 水管敷設	720.5	發展局局長 水務署	11/2017	12/2022	敷設一條長約 10 公里的主食 水管道，將食水由擬議的海水 化淡廠運送至現有將軍澳食 水主配水庫。	敷設水管的工程合約已於 2017 年 11 月開展。 在考慮相關持分者的意見後，部分 位於環保大道、寶康路及翠琳路 (圖中藍線標示)的水管走線已更改 至將軍澳南海濱長廊、香港單車館 及寶琳南路/寶琳路(圖中紅線標 示)，以減低工程對交通造成的影 響。
							

(二) 水務及渠務工程(續)

截至 2021 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
357WF 甲級	將軍澳海水化淡廠第一階段設計及建造—主要工程	7,727.5	發展局局長 水務署	12/2019	6/2023	在將軍澳 137 區設計、建造及運作每日食水產量達 135 000 立方米的海水化淡廠。	將軍澳海水化淡廠第一階段的設計、建造及運作合約已於 2019 年 12 月開展。設計和建造工程現正進行中。
將軍澳海水化淡廠 TSEUNG KWAN O DESALINATION PLANT  <!-- This area is intentionally left blank as per the image content -->							

(二) 水務及渠務工程(續)

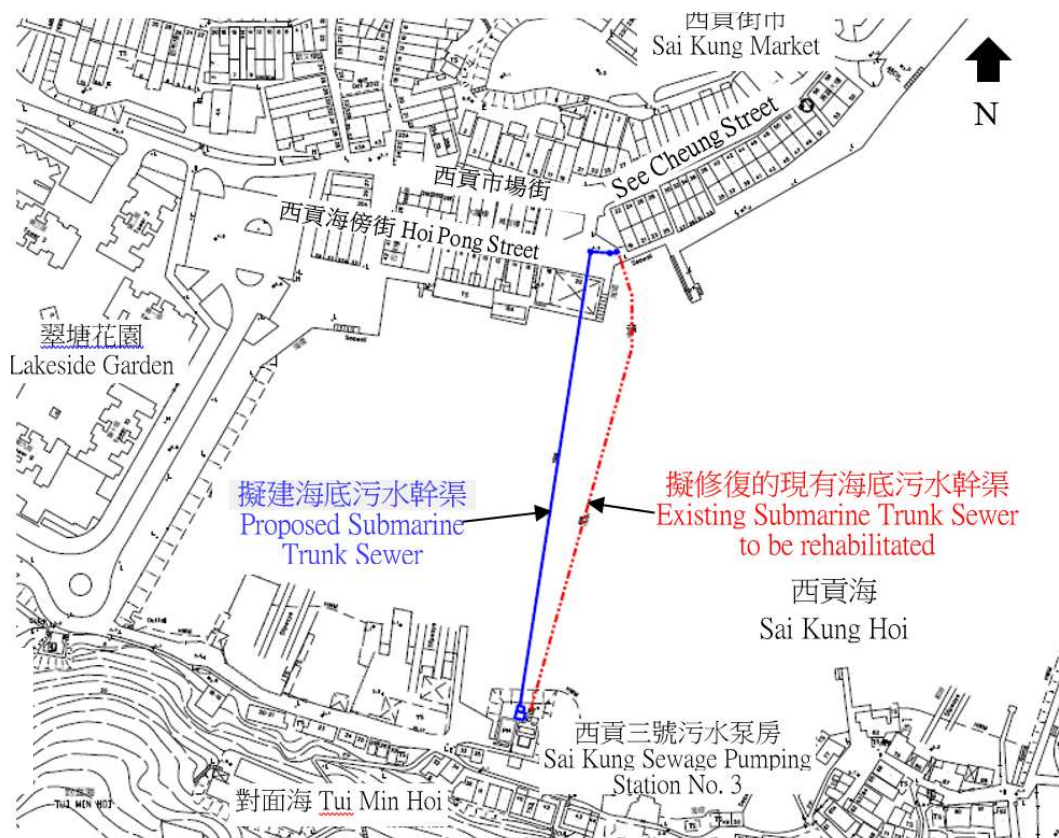
截至 2021 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
402DS 甲級	搬遷西貢 污水處理廠 往岩洞的 可行性研究	41	發展局局長 渠務署	8/2014	12/2018	可行性研究將會初步評估搬遷西貢污水處理廠在建造及運作階段的影響，包括相關的初步技術和影響評估、擬訂工程設計大綱及制定施工策略和時間表等。	渠務署已完成搬遷西貢污水處理廠往岩洞的可行性研究，確定此工程計劃在技術上可行。 渠務署會與其他相關部門協調相關基建的發展步伐，推展時間表正在檢視中。
							

(二) 水務及渠務工程(續)

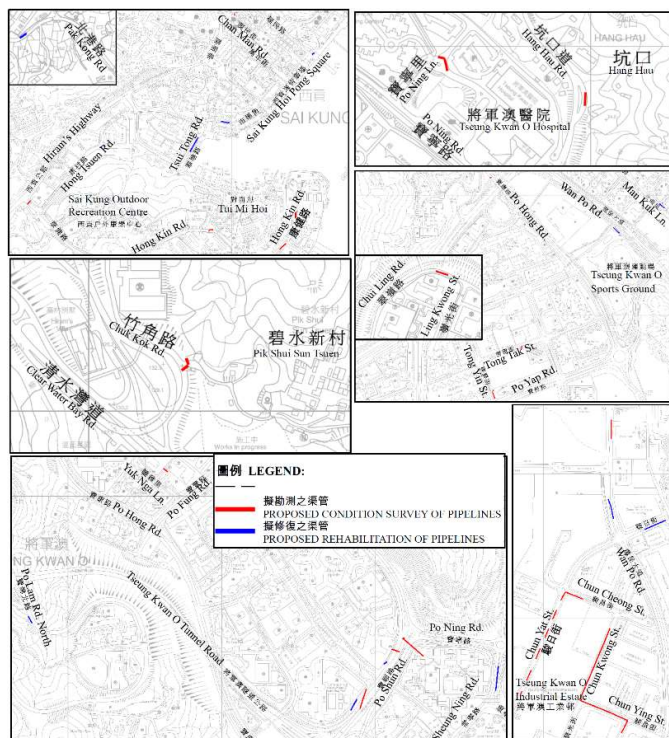
截至 2021 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
393DS 甲級	九龍、沙田及 西貢污水幹渠 修復工程	679	環境局局長 渠務署	1/2018	3/2022	工程包括建造一段橫跨西貢海、連接西貢市及對面海的海底污水幹渠及修復現有的海底污水幹渠。此工程的目的為減低污水滲漏的風險及增強污水系統的可靠性。	工程合約於 2018 年 1 月展開。由西貢魚類批發市場至位於對面海的西貢三號污水泵房的海底污水幹渠已經完成。 我們正建造污水沙井及準備修復現有的海底污水幹渠。



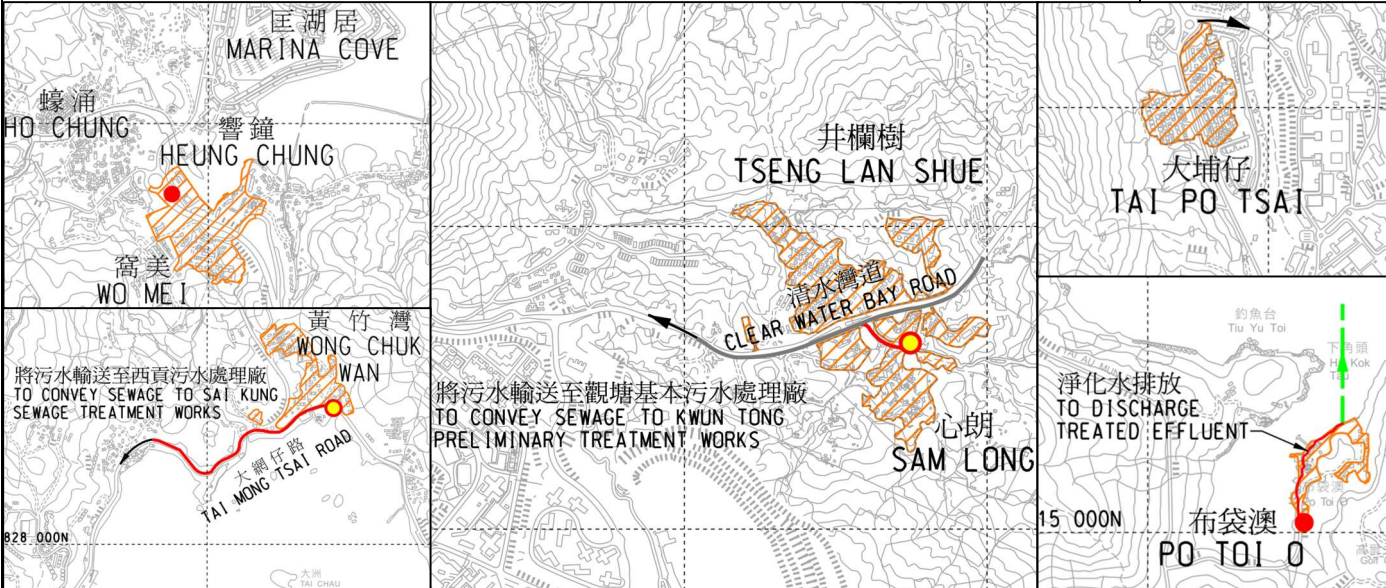
(二) 水務及渠務工程(續)

截至 2021 年12月

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
426DS 甲級	地下污水渠修復工程第1階段	391.9	環境局局長 渠務署	1/2019	10/2022	工程包括為西貢區內共約 1.3 公里長的地下污水渠及雨水渠進行勘測和修復共約 300 米長的地下污水渠及雨水渠。	工程項目 426DS 及 180CD 工程已於 2019 年 1 月展開，預計整項工程將於 2022 年 10 月完成。
180CD 甲級	地下雨水渠修復工程第1階段	122.8	發展局局長 渠務署	1/2019	10/2022		
							

(二) 水務及渠務工程(續)

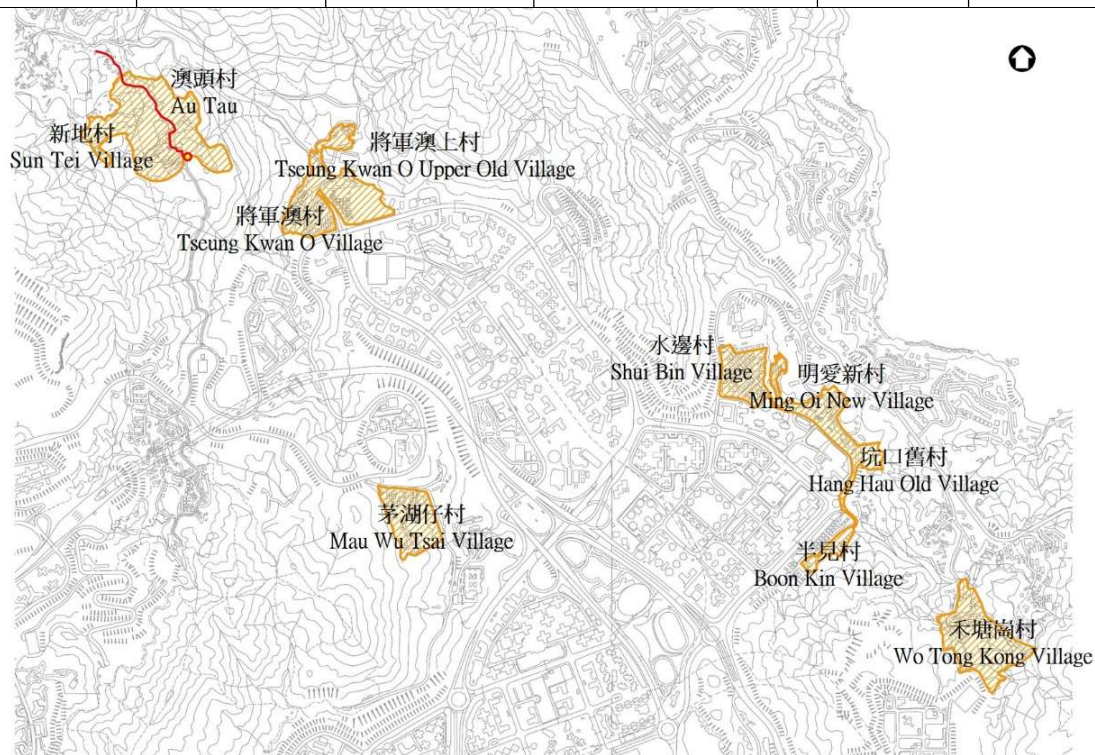
截至 2021 年12月

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
431DS 甲級	牛尾海污水收集系統第2階段工程第3部分	515.9	環境局局長 渠務署	7/2020	5/2025	工程包括為西貢 7 個未有污水收集設施的地區(黃竹灣, 窩尾及響鐘, 布袋澳, 井欄樹及心朗和大埔仔)鋪設約 18 公里污水渠, 約 2 公里雙管加壓污水泵喉, 1 條海底排放管道, 建造 2 所二級污水處理設處理廠及 2 所污水泵房, 以改善上述地區的衛生情況。	工程項目 2020 年 7 月展開, 預計整項工程將於 2025 年 5 月完成。
432DS 甲級	牛尾海污水收集系統第3階段工程第2部分	604.9					
							

(二) 水務及渠務工程(續)

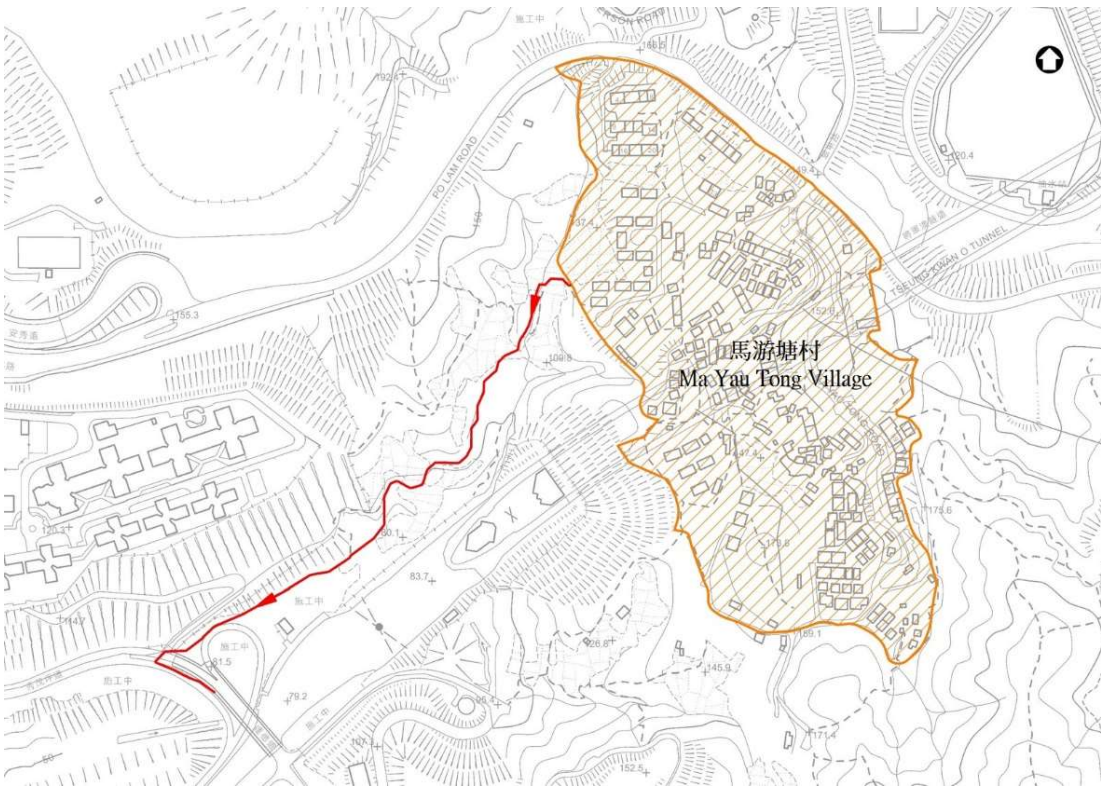
截至 2021 年12月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
214DS 甲級	將軍澳鄉村 污水收集系 統	289.5	環境局局長 渠務署	10/2020	4/2025	工程目的是改善鄉村衛生環境，減低河流及水域污染，從而保障公眾健康。 此工程項目主要是為將軍澳區以下 10 條鄉村提供公共污水收集系統包括－ ● 水邊村； ● 明愛新村； ● 茅湖仔村； ● 將軍澳上村； ● 將軍澳村； ● 半見村； ● 坑口舊村； ● 禾塘崗村； ● 澳頭村；及 ● 新地村 工程內容主要包括敷設污水渠及興建一座污水泵房。	本項目於 2020 年 10 月展開工程。現正於各鄉村進行挖掘和敷設污水渠。



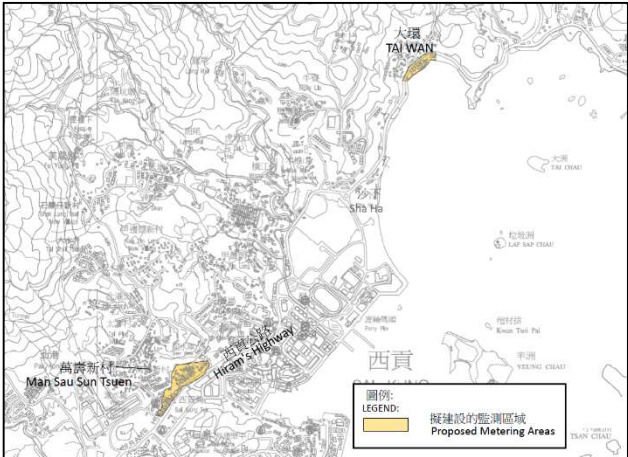
(二) 水務及渠務工程(續)

截至 2021 年12月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
362DS 甲級	將軍澳馬游塘村 污水收集系統	179.5	環境局局長 渠務署	10/2020	10/2024	工程目的是改善鄉村衛生環境，減低河流及水域污染，從而保障公眾健康。工程內容主要包括在馬游塘村興建污水渠。	本項目於 2020 年 10 月展開工程。現正於馬游塘村進行挖掘和敷設污水渠。
							

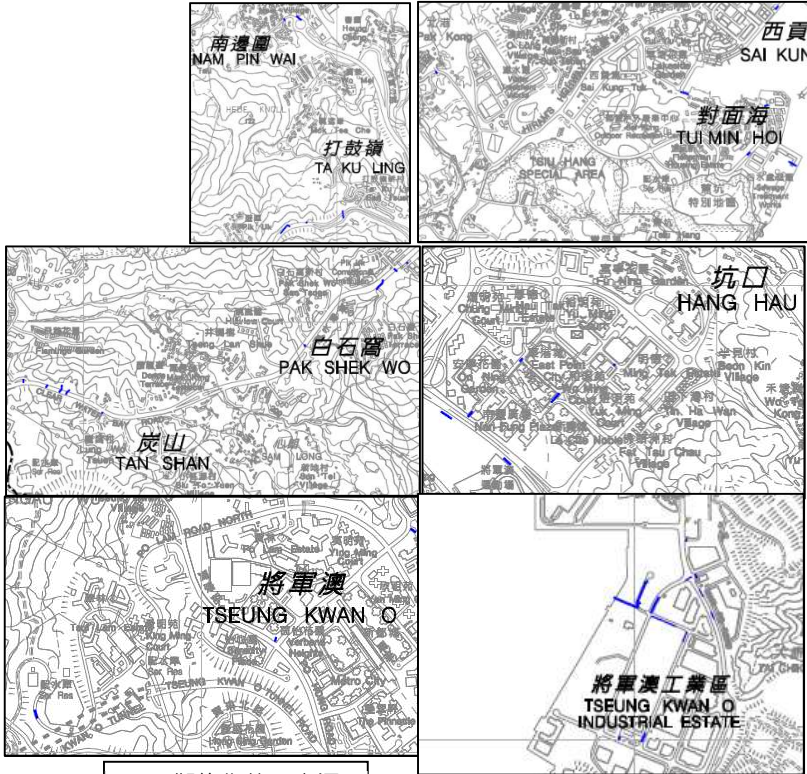
(二) 水務及渠務工程(續)

截至 2021 年12月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
196WC 甲級	智管網之水 壓管理及區 域監測裝置 建造工程- 餘下工程	424.2	發展局局長 水務署	08/2020	02/2024	工程項目包括在各區建立約 320 個監測區域，當中 4 個監測區域位於西貢區。	西貢區內的工程現正申請有關許可證，預計於 2022 年陸續展開相關挖掘及安裝工程。
 							

(二) 水務及渠務工程(續)

截至 2021 年12月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
172CD 甲級	地下雨水渠 修復工程第 3 階段	702.7	發展局局長 渠務署	06/2021	12/2025	工程包括為西貢區內修復共約 1 100 米 長的地下雨水渠。	工程項目 2021 年 6 月展 開，預計整項工程將於 2025 年 12 月完成。
 — 擬修復的雨水渠							

(三) 土地開拓、道路及其他工程

(三) 土地開拓、道路及其他工程

截至 2021 年12 月

合約編號	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	合約期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
CV/2015/07	處理剩餘 公眾填料 (2016-2018)	1,840	環境局局長 土木工程拓展署	02/2017 - 12/2021	運作將軍澳第 137 區填料庫；及運送 公眾填料至內地指定填海區。	運作進行中。
CV/2021/09	處理剩餘 公眾填料 (2022-2023)	970		01/2022 - 12/2023		當現有的合約（合約編號 CV/2015/07）於 12/2021 完結後,立即由 此新合約承接運作。
 						

(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2021 年12 月

合約編號	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	合約期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
CV/2018/02	臨時建築廢物 篩選分類設施 (2019-2022)	88	環境局局長 土木工程拓展署	5/2019 - 5/2022	在將軍澳第 137 區營運一所臨時建築廢物篩選分類設施。該設施主要從混合建築廢物中將惰性建築物料如泥石等篩選出來，循環再用。	臨時建築廢物篩選分類設施運作進行中。 當現有合約（合約編號 CV/2018/02）於 2022 年 5 月完結後，新合約將立即承接運作。
 						

(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2021 年12 月

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
872TH 甲級	將軍澳-藍田隧道-主隧道及相關工程	15,093	運輸及房屋局局長 土木工程拓展署	7/2016	2022	將軍澳-藍田隧道主隧道及相關工程將連接將軍澳與藍田，以配合將軍澳區持續發展的交通需求。 主隧道及相關工程包括建造一條長約 3.8 公里的雙線雙程行車路(其中隧道部分長約 2.2 公里)，東端連接將軍澳寶順路，而西端則連接藍田，並有支路直接連接東區海底隧道及茶果嶺道。將來亦會連接至興建中的 T2 主幹路。 工程亦包括在將軍澳灣填海約 3 公頃，以提供土地興建低於地面的 P2 路。	土木工程拓展署自 2016 年 7 月起批出相關工程合約，其中連接將軍澳中心及調景嶺體育館的北行人天橋已經完成，並已於 2019 年 12 月中開放給市民使用。主隧道在 2020 年 6 月爆破貫通，後續工程現正進行中。 2019 冠狀病毒病疫情對建築材料及裝置的供應構成了影響，亦令工地施工人手減少，部分工地更曾因疫情暫時停工，導致工程進度受到影響。土木工程拓展署正全力推展餘下工程，以期可於 2022 年開通。



(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2021 年12 月

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
822TH 甲級	將軍澳跨灣連接路	5,626	運輸及房屋局局長 土木工程拓展署	7/2018	2022	跨灣連接路橫跨將軍澳海灣，連接建造中的將軍澳-藍田隧道及將軍澳第 86 區附近的環保大道。跨灣連接路提供替代路線讓交通繞過市中心，從而改善市中心住宅區的居住環境。 跨灣連接路是雙線雙程行車道，全長約 1.8 公里，並設置行人路和單車徑。	跨海橋建造工程和 D9 路建造工程兩份合約分別於 2018 年 7 月和 10 月展開。 跨海橋的大型預製組件已於 2021 年 7 月底安裝完畢，現正進行其他後續工程，包括預製組件焊接和接合，安裝交通管理系統連接將軍澳-藍田隧道海上交匯處，與其他配套工程，以期可於 2022 年開通。



(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2021 年12 月

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
716CL 甲級	將軍澳第一期堆填區基礎設施工程	301.6	發展局局長 土木工程拓展署	1/2021	2024	工程項目主要包括興建一條長150 米、淨闊 4.5 米的行人天橋，橫跨東邊水道連接將軍澳 68 區與 77 區，及在康城路建造排污設施(包括一座污水泵站、污水泵喉和排污渠)。 	工程於 2021 年1 月中展開。行人天橋及污水泵房的土地勘測及地基工程正在進行。

(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2021 年12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
42DR 甲級	新界東南堆填區 發展計劃	2,320	環境局局長 環境保護署	9/1993	約 2030	工程包括建造海堤、填海、地盤平整、興建道路、廢物接收設施、滲濾污水收集及處理系統、堆填氣體收集及管理系統和建造修復及護理設施。	堆填區已運作約 27 年，於 2021 年 11 月 21 日關閉。隨後會進行修復工程，然後展開為期 30 年的堆填區護理工序。
							

(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2021 年12 月

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
164DR 甲級	新界東南堆填區擴建計劃	2,101	環境局局長 環境保護署	4/2018	約2030	工程項目包括合約採購的顧問研究、新界東南堆填區擴建計劃的設計、建造、營運、修復和護理。 工程包括工地平整、興建與遷移堆填區基礎設施和地面水管理系統、安裝堆填區防滲漏墊層系統、滲濾污水收集及處理系統、堆填氣體收集及管理系統和建造修復及護理設施。	所需工地於 2018 年 12 月 31 日移交承辦商。基本擴建工程已完成，堆填區擴建部分於 2021 年 11 月 21 日開始接收建築廢物。



(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2021 年12 月

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
703TH 甲級	清水灣道與匡湖居之間的一段西貢公路分隔車道工程及蠔涌區內通路改善工程	1,774	運輸及房屋局局長 運輸署 路政署	3/2016	12/2020	工程主要包括擴闊清水灣道至打鼓嶺及南邊圍迴旋處至匡湖居的兩段西貢公路為雙線雙程分隔行車道。	工程已於 2016 年 3 月 30 日開展，並於 2020 年年底大致完成。現正進行種植樹木、公共設施重置等餘下工程。
							

(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2021 年12 月

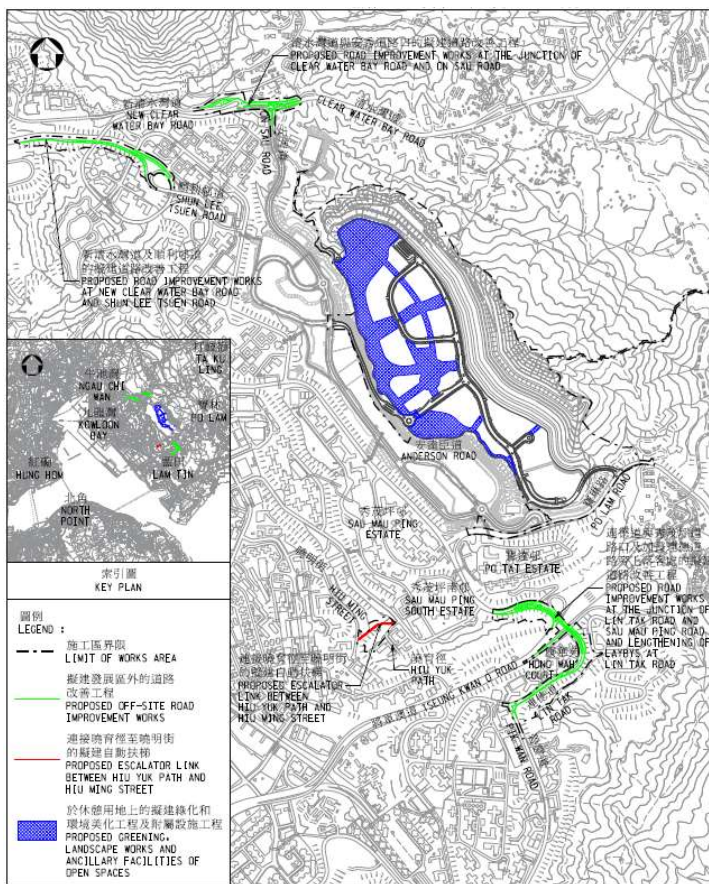
工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
7803CL 甲級	安達臣道石礦場用地發展 - 地盤平整及相關基礎建設工程	7,693	發展局局長 土木工程拓展署	12/2016	2022	工程範圍包括： (一) 在安達臣道石礦場用地平整約 40 公頃土地平台及進行相關的土力工程； (二) 提供並改善供水、排水、污水系統、道路和環境美化工程；以及 (三) 在發展區外鄰近安達邨、曉麗苑及曉華大廈興建行人連繫設施和在將軍澳隧道收費廣場設置巴士轉乘站。	在安達臣道石礦場用地的地盤平整及相關基礎建設工程，及發展區外所興建之行人連繫設施已經在 2016 年 12 月起分階段展開。 將軍澳隧道巴士轉乘站已於 2021 年 5 月完成。 連接將軍澳隧道巴士轉乘站及連德道的行人連繫設施已於 2021 年 8 月啟用。 安達臣道石礦場用地的大部份地盤平整工程已大致完成，供房屋及其他發展用途的土地已陸續交付予地政總署作相關發展。



(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2021 年12月

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
7818CL 甲級	安達臣道石礦場用地發展－道路改善及基礎建設工程	2,654	發展局局長 土木工程拓展署	5/2018	12/2023	工程範圍包括： (一) 道路和路口改善工程包括興建一條由連德道通往秀茂坪道的新行車天橋、於近藍田康華苑及興田邨的連德道路段增設路旁上落客處、改善清水灣道與安秀道的路口和擴闊於新清水灣道近順利邨道的一段往九龍方向行車道； (二) 興建自動扶梯連接曉光街(曉育徑)至曉明街；以及 (三) 在發展區內進行休憩用地環境美化及附屬工程。	道路改善工程及興建自動扶梯工程已經在 2018 年 5 月展開。 休憩用地環境美化及附屬工程已經在 2021 年 7 月展開。 連接曉光街(曉育徑)至曉明街的自動扶梯已於 2021 年 9 月 1 日啟用。



(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2021 年12月

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
6101TX 丁級	為行人天橋、高架行人道及行人隧道提供暢道通行設施-第三組 - 勘查研究、設計及建造	14	運輸及房屋局 路政署	6/2020	6/2023	擬建設施包括為橫跨翠琳路近翠林社區會堂的行人天橋(結構編號 SK01) 加建升降機設施	工程合約已於 2020 年中展開，而翠林邨內施工用地的相關法律文件正由有關部門審閱。 路政署於 2021 年 9 月 2 日與翠林邨業主立案法團會面交待最新工作進度及講解有關法律文件，並爭取於 2021 年內備妥有關文件供法團簽立。 路政署承建商已於 2021 年 7 月在翠林邨內開展前期勘測工程，並將會在簽立法律文件後開展升降塔的地基工程。



(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2021 年12月

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
6100TX 丁級	將軍澳銀澳路和明苑/ 煜明苑對出行人 路段加裝上蓋	8.8	運輸及房屋局 運輸署 路政署	8/2019	7/2021	於銀澳路和明苑/煜明苑對出行人路段加裝長約 80 米的上蓋,以對應政府在 2016 年施政報告中,宣布建構長者友善城市的目標。	工程已於 2021 年 7 月 30 日大致完成。
							

(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2021 年 12 月

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
5101CX 丁級 – CE 26/2014 (CE)	相連搬遷西貢 污水處理廠的 初步綜合填海 發展研究	14	發展局局長 土木工程拓展署	11/2014	2021 年 (大致完成)	研究的範圍包括： (一) 為相連的西貢近岸填海及擬建防波堤工程進行工程可行性研究，包括相關的初步技術和影響評估； (二) 為搬遷西貢污水處理廠後所騰出的土地及填海地點進行初步規劃研究； (三) 配合擬議岩洞研究舉辦的公眾參與活動，諮詢相關持份者；及 (四) 進行初步的勘測及其他勘查工作。	綜合填海發展研究已大致完成，政府會考慮研究建議，以配合香港整體土地供應策略。

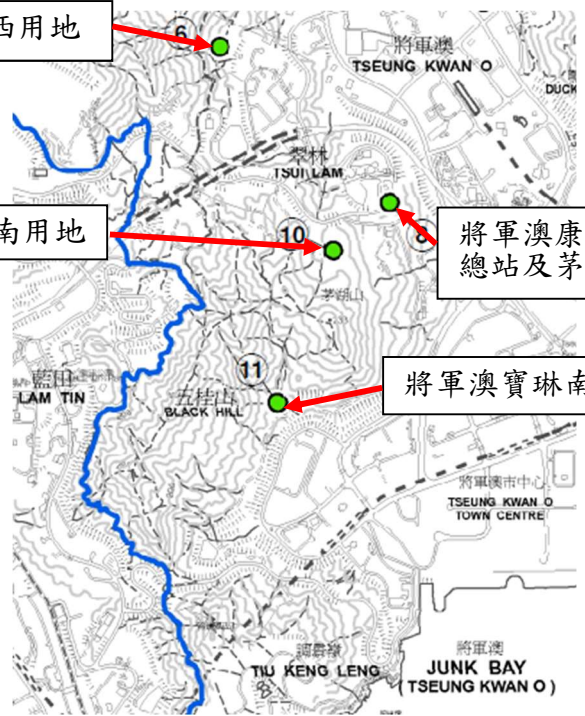
(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2021 年 12 月

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
總目 707 分目 7100CX 丁級	重新規劃將軍澳第 137 區的規劃及工程研究	29	發展局局長 土木工程拓展署 規劃署	12/2016	2022	這項研究會重新規劃將軍澳第 137 區約 80 公頃土地的發展，研究作房屋、商業及其他發展的可行性。	研究正在進行中。現正重新檢討土地規劃及發展潛力，並檢視相關規劃因素包括交通運輸配套設施，政府、機構或社區設施、其他基建和潛在環境影響等，以配合將軍澳整體發展需要，並善用土地。會適時諮詢區議會。

(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

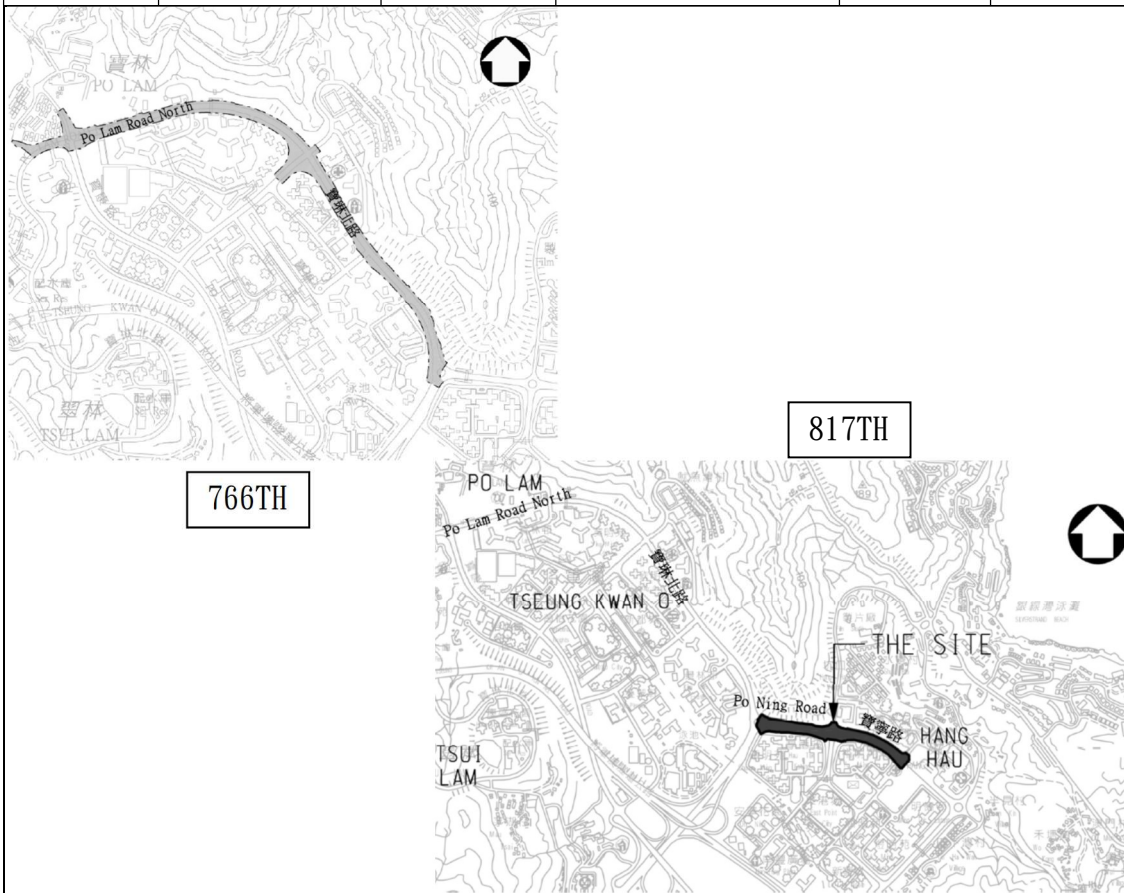
截至 2021 年12 月

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
總目 711 分目 B100HX 丁級	將軍澳近寶琳南路發展之工地平整及基礎設施工程 - 可行性研究	29	運輸及房屋局局長 土木工程拓展署	5/2018	2022 年中	這項研究會檢視寶琳南路附近土地作公營房屋發展的可行性。	研究於 2018 年 5 月展開，現正檢視相關因素包括交通和基礎設施，政府、機構或社區設施，其他基建和潛在環境影響等，以配合發展需要並善用土地。
 將軍澳翠林邨以西用地 將軍澳寶琳路以南用地 將軍澳康盛花園以南巴士總站及茅湖仔以北用地 將軍澳寶琳南路以北用地							

(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2021 年12 月

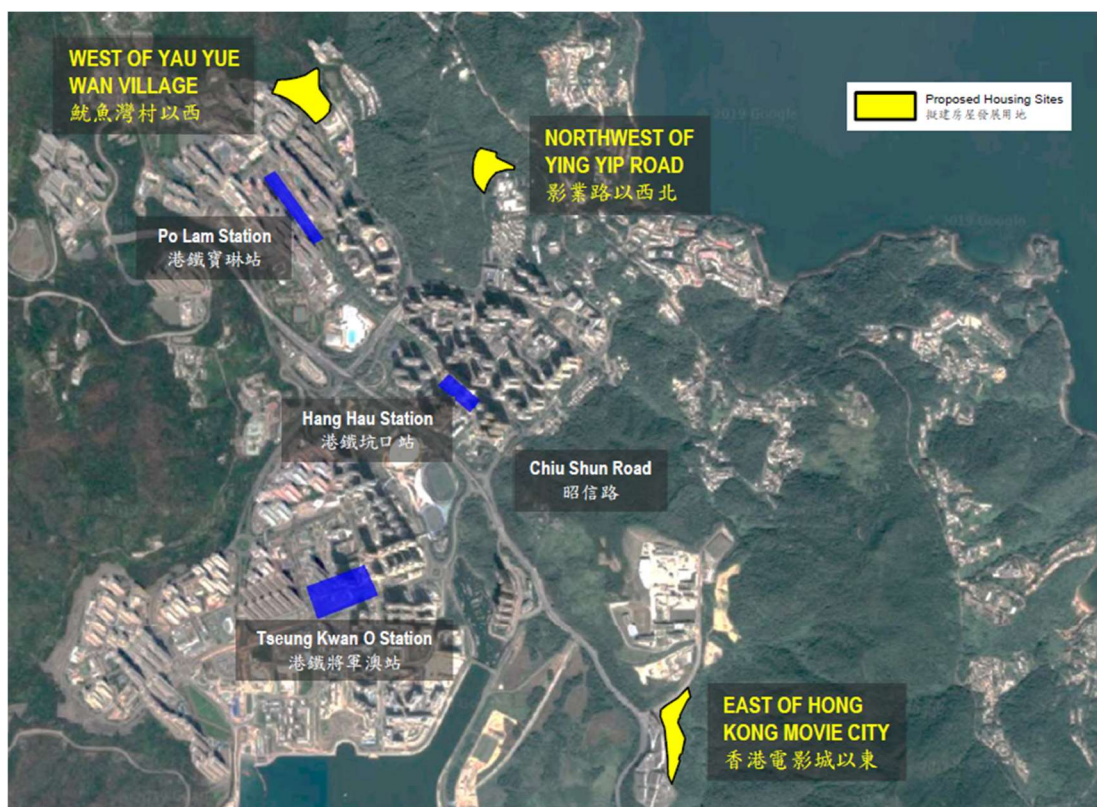
工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
766TH	寶琳北路加建隔音屏障工程	376.0	環境局局長	6/2021	6/2025	工程範圍包括：	工程合約編號 HY/2021/06 已於 2021 年 6 月展開，現正進行前期準備工作。
817TH	寶寧路加建隔音屏障工程	241.7	路政署			766TH- 在介乎寶康路至寶順路之間的一段寶琳北路加建隔音屏障；及	
						817TH- 在介乎寶順路至寶寧里之間的一段寶寧路加建隔音屏障。	



(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2021 年12月

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
B808CL	將軍澳公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程	2,508.4	運輸及房屋局局長 土木工程拓展署	9/2021	2026 (暫定)	在影業路以西北、魷魚灣村以西及香港電影城以東的房屋發展用地進行工地平整和相關的基礎設施工程。	將軍澳工地平整及基礎設施工程 - 影業路的工程合約已於 2021 年 9 月展開。 將軍澳工地平整及基礎設施工程 - 魷魚灣及百勝角的工程預計於 2022 年初展開工程。



(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2021 年12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
5058TF 甲級	滘西村碼頭改善工程	77.8	發展局局長 土木工程拓展署	09/2021	09/2024	工程計劃範圍包括： (一) 拆卸及重建現有碼頭； (二) 建造相關的輔助設施；以及 (三) 就擬議的工程進行環境監察及紓減環境影響的措施。	我們已在 2019 年 4 月 8 日諮詢旅遊及經濟發展工作小組，並得到小組委員支持有關初步設計。 工程已根據《前濱及海床(填海工程)條例》於 2020 年 8 月 21 日刊憲。 工程已於 2021 年 5 月 21 日獲財務委員會批准進行。建築合約已於 2021 年 9 月 13 日展開。 土木工程拓展署會適時就項目諮詢相關區議會的委員會。



乙部

規劃中及即將進行的工程

（四）康樂及文化設施工程

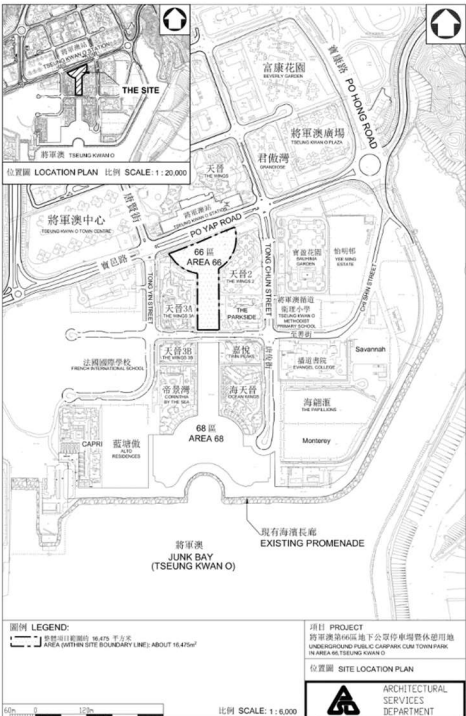
(四) 康樂及文化設施工程

截至 2021 年 12 月

工程編號	工程名稱	決策科首長及 負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
3451R0	將軍澳 第 68 區 市鎮公園	民政事務局局长 康樂及文化事務署 建築署	工程計劃中的擬建設施包括 - - 園景花園； - 中央大道（部分）； - 兒童遊樂處； - 單車公園（兒童）； - 單車租賃亭； - 健身設施； - 緩跑徑； - 兩個籃球場； - 優化現時將軍澳海濱公園的海濱長廊； - 重置及擴建將軍澳海濱公園的寵物公園；及 - 輔助設施等。	工程項目是 2017 年 1 月施政報告公佈的「體育及康樂設施五年計劃」的項目之一。項目的工程範圍及擬建設施於 2018 年 4 月 17 日獲西貢區議會轄下地區設施管理委員會(地委會)支持，其概念設計亦於 2020 年 5 月 12 日獲地委會支持。 工程項目的撥款申請於 2021 年 7 月 9 日獲立法會財務委員會批准，招標工作正在進行中，預計可於 2022 年初展開工程。

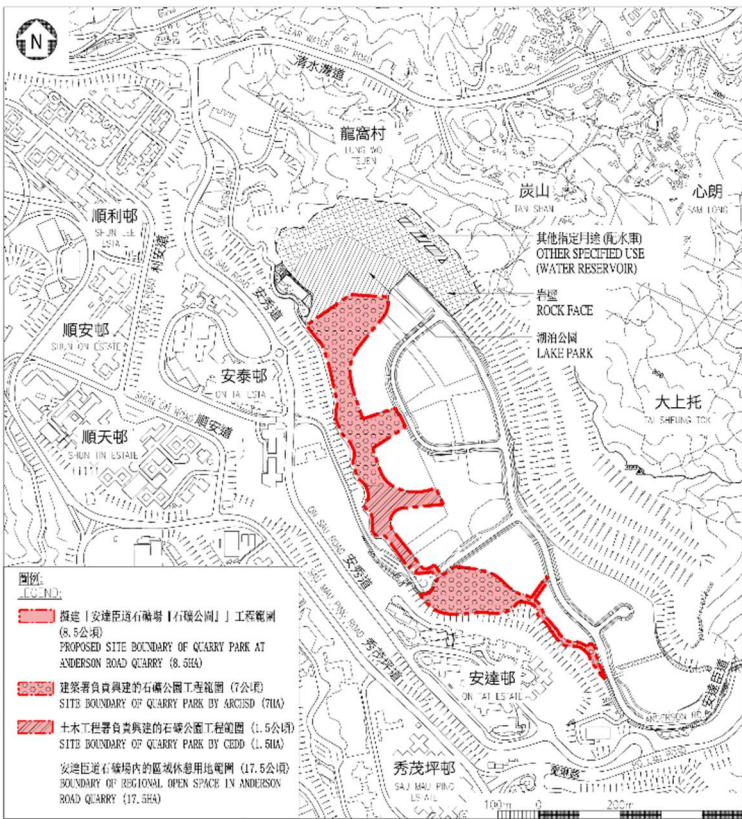
(四) 康樂及文化設施工程(續)

截至 2021 年12月

工程編號	工程名稱	決策科首長及負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
3027TP	將軍澳第 66 區市鎮公園及公眾停車場	運輸及房屋局局長 運輸署 建築署	工程計劃中的的擬建設施包括 - - 園景花園； - 中央大道廣場（部分）； - 有蓋廣場； - 健身設施等；及 - 地下公眾停車場等。	由於本項目涉及在分區計劃大綱圖下的休憩用地上興建公眾停車場，須按照《城市規劃條例》獲城市規劃委員會批准相關規劃許可，方能推行工程計劃。運輸署、康文署和建築署已於 2021 年 5 月 4 日就項目的規劃意向徵詢西貢區議會意見並且在 2021 年 7 月向城市規劃委員會遞交規劃申請，及於 2021 年 11 月提交補充資料。目前正跟據既定程序等候審理。
				

(四) 康樂及文化設施工程(續)

截至 2021 年 12 月

工程編號	工程名稱	決策科首長及負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
3478R0	安達臣道石礦場「石礦公園」	民政事務局局长 康樂及文化事務署 建築署	工程計劃中的擬建設施包括 - - 中央草坪及園景花園； - 步行/緩跑徑連健身設施； - 單車公園及單車亭； - 露天劇場； - 觀景台； - 歷奇遊樂場； - 寵物公園； - 供進行野外定向運動的設施； - 戶外多用途球場作籃球場/排球場用途； - 五人足球場/手球場； - 小食亭；及 - 其他輔助設施等。	工程計劃的擬建設施於 2020 年 3 月 17 日獲西貢區議會轄下房屋及規劃發展委員會（現重組為房屋、規劃及環境委員會）支持，其概念設計亦於 2021 年 11 月 23 日獲房屋、規劃及環境委員會支持。康文署現正按既定工務工程程序籌劃有關工程項目。
 圖例: - 擬建「安達臣道石礦場「石礦公園」」工程範圍 (8.5公頃) PROPOSED SITE BOUNDARY OF QUARRY PARK AT ANDERSON ROAD QUARRY (8.5HA) - 建築署負責興建的石礦公園工程範圍 (7公頃) SITE BOUNDARY OF QUARRY PARK BY ARCSID (7HA) - 土木工程署負責興建的石礦公園工程範圍 (1.5公頃) SITE BOUNDARY OF QUARRY PARK BY CEDD (1.5HA) - 安達臣道石礦場內的區域休憩用地範圍 (17.5公頃) BOUNDARY OF REGIONAL OPEN SPACE IN ANDERSON ROAD QUARRY (17.5HA)				

(四) 康樂及文化設施工程(續)

截至 2021 年12月

工程編號	工程名稱	決策科首長及負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
3195GK	安達臣道石礦場 G2 地盤 聯用綜合大樓	發展局局長 政府產業署 建築署	項目中的擬建設施包括 - <u>公共圖書館</u> - 成人及兒童圖書館、報刊閱覽室、推廣活動室及學生自修室；及 - 圖書館自助設施，如領取預約資料的自助服務機/櫃、多功能自助服務機、自助借書機及還書箱等。 <u>社區會堂</u> - 一個可設置 450 個座位連舞台的多用途禮堂； - 一個多用途舞台會客室；及 - 一個多用途會議室。 <u>體育館</u> - 一個可用作兩個籃球場或兩個排球場或八個羽毛球場或一個手球場或一個五人足球場的多用途主場； - 一個設有 300 個座位的摺合式活動看台；	政府產業署曾就工程項目的擬建設施於 2020 年 3 月 17 日及 2020 年 5 月 7 日分別諮詢西貢區議會轄下房屋及規劃發展委員會和觀塘區議會轄下房屋、規劃及地政事務委員會，擬建設施獲兩個委員會的支持。 此項目是首批「一地多用」發展項目之一，工程項目的技術可行性研究已於 2020 年 12 月完成。 政府產業署會繼續積極推展此項目，並會就聯用大樓工程計劃的規劃概念適時再次諮詢西貢區議會及觀塘區議會。



(四) 康樂及文化設施工程(續)

截至 2021 年 12 月

工程編號	工程名稱	決策科首長及 負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
			• 兩間多用途活動室(可合併為一個大型多用途活動室)； • 一間乒乓球室； • 一間健身室；及 • 一間兒童遊戲室。 <u>社會福利設施</u> • 長者日間護理中心(40 個服務名額)； • 安老院舍(100 個宿位)暨長者日間護理單位(30 個服務名額)； • 綜合青少年服務中心； • 綜合家庭服務中心； • 精神健康綜合社區中心分處； • 到校學前康復服務辦事處(100 個服務名額)； • 特殊幼兒中心(60 個服務名額)； • 早期教育及訓練中心(60 個服務名額)；及 • 市區單身人士宿舍(40 個宿位)。 <u>地庫公眾停車場</u>	

(五) 水務及渠務工程

(五) 水務及渠務工程

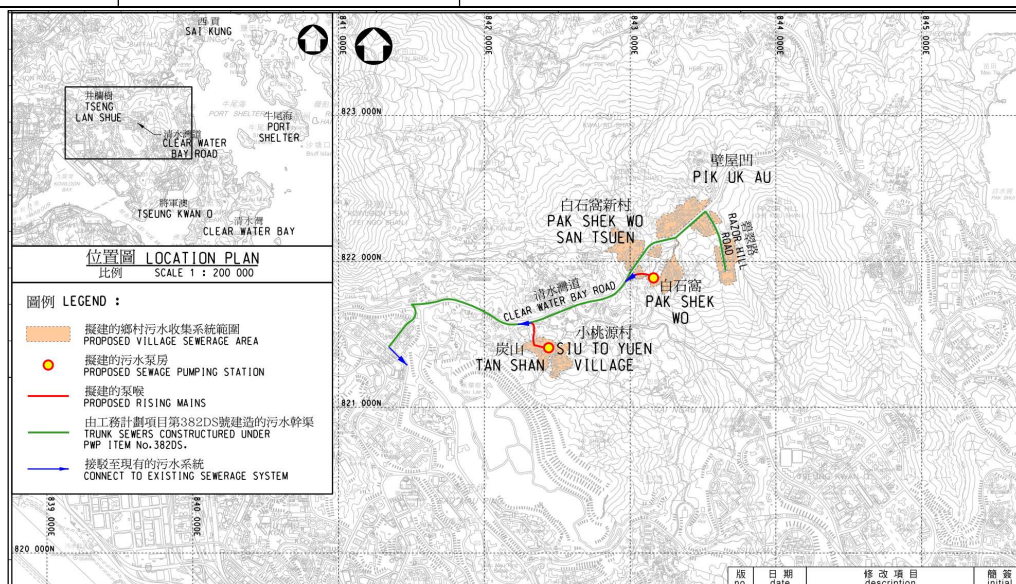
截至 2021 年12月

工程編號	工程名稱	決策科首長及 負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
272DS	牛尾海污水 收集系統 第二階段	環境局局長 渠務署	工程目的是改善鄉村衛生環境，減低河流及水域污染，從而保障公眾健康。工程主要是在以下地方興建污水收集系統 - ● 大涌口和白沙灣一帶地區(包括打蠔墩下圍、打蠔墩上圍、濠西新村等、大涌口及白沙灣)； ● 蠔涌一帶地區(包括北圍、鹿尾村、蠔涌、蠔涌新村、南邊圍、莫遮峯、窩美(餘下部分)、澳仔村及南圍等)；及 ● 西貢西郊部份地區(包括南山、北港及沙角尾的餘下部份)。	我們現正檢討工程設計。
圖例 LEGEND : 擬建的鄉村污水收集系統範圍 PROPOSED VILLAGE SEWERAGE AREA 擬建的污水泵房 PROPOSED SEWAGE PUMPING STATION 擬建的小型污水處理廠 PROPOSED LOCAL SEWAGE TREATMENT PLANT 擬建的污水幹渠 / 渠 PROPOSED TRUNK SEWERS / RISING MAINS 由工務計劃項目第41.005號 擬建的小型污水處理廠 TRUNK SEWERS TO BE CONSTRUCTED UNDER PAF ITEM 41.005 餘下現有或擬建的污水系統 CONNECT TO EXISTING OR PROPOSED SEWERAGE SYSTEM				

(五) 水務及渠務工程(續)

截至 2021 年 12 月

工程編號	工程名稱	決策科首長及 負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
273DS	牛尾海污水 收集系統 第三階段	環境局局長 渠務署	工程目的是改善鄉村衛生環境，減低河流及水域污染，從而保障公眾健康。工程主要是在以下地方興建污水收集系統 - 炭山、小桃源村、白石窩、白石窩新村及壁屋凹	我們現正檢討工程設計。



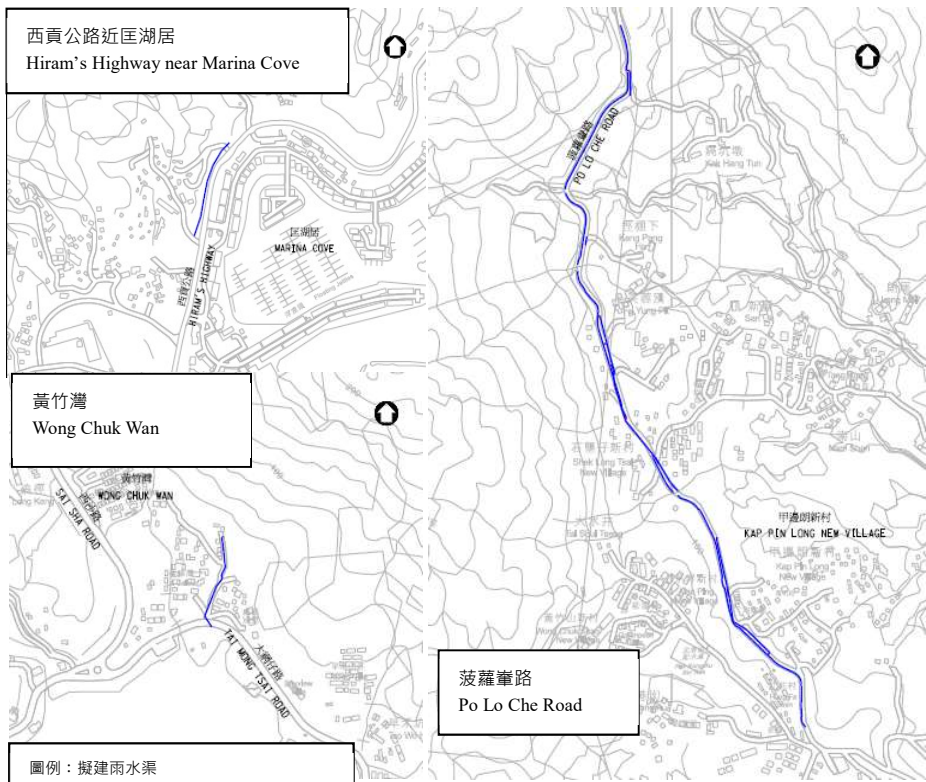
(五) 水務及渠務工程(續)

截至 2021 年 12 月

工程編號	工程名稱	決策科首長及 負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
414DS	地下污水渠修復工程— 餘下工程	環境局局長 渠務署	會為西貢區內約 400 米長的地下 污水渠進行修復。	工程已於 2020 年 8 月諮詢西貢 區議會。工程正在詳細設計階 段。
— 擬修復的污水渠				

(五) 水務及渠務工程(續)

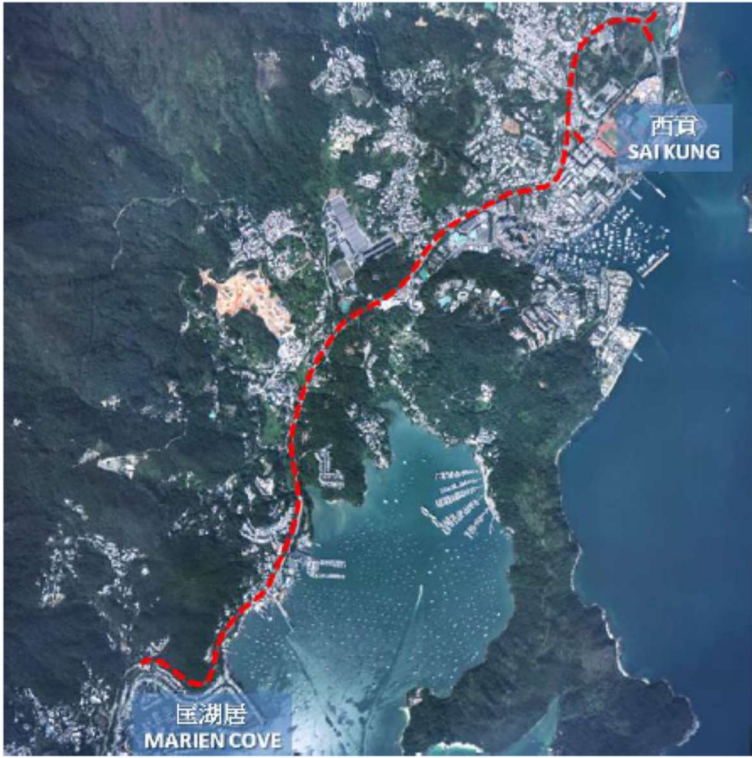
截至 2021 年 12 月

工程編號	工程名稱	決策科首長及 負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
182CD	沙田及西貢雨水排放系統改善工程	發展局局長 渠務署	工程目的是提升沙田及西貢地區雨水排放系統的防洪能力，工程包括在西貢菠蘿峯路、西貢公路近匡湖居、黃竹灣建造總長約 4 公里、直徑介乎 300 毫米至 1350 毫米的雨水渠	我們現正進行相關的勘查研究工作。
 西貢公路近匡湖居 Hiram's Highway near Marina Cove 黃竹灣 Wong Chuk Wan 菠蘿峯路 Po Lo Che Road 圖例：擬建雨水渠 Legend: Proposed storm water drain				

（六）土地開拓、道路及其他工程

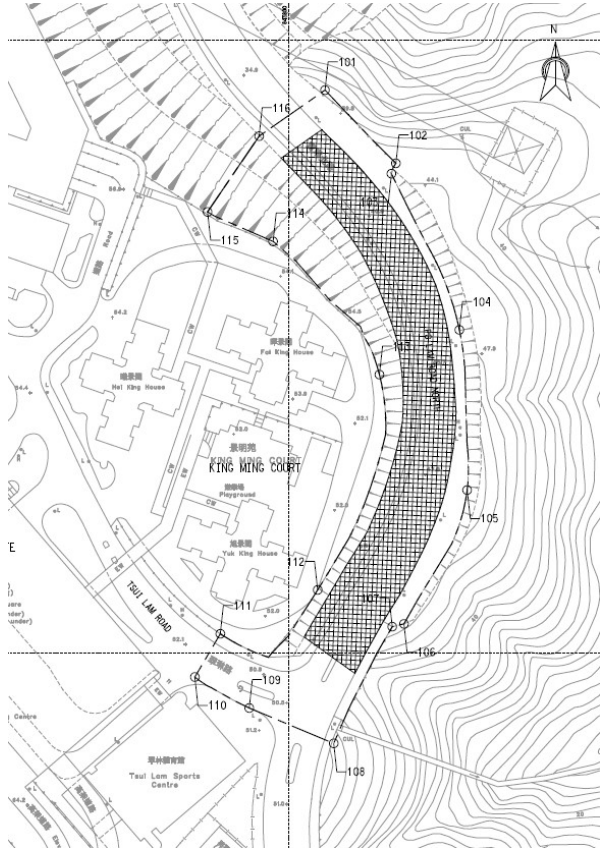
(六) 土地開拓、道路及其他工程

截至 2021 年12月

工程編號	工程名稱	決策科首長及 負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
806TH	匡湖居至西貢市之間 的一段西貢公路 分隔車道工程	運輸及房屋局局長 運輸署 路政署	工程主要包括改善由匡湖居至西貢市中心的一段西貢公路、普通道及沙下南的一段大網仔路。目的是為應付現時及預計的交通需求，並紓緩交通擠塞情況。	有關道路方案於 2020 年 1 月 3 日進行刊憲。為進一步回應市民的意見，路政署已於 2020 年 11 月 20 日在憲報刊登修訂計劃。 有關道路方案已於 2021 年 10 月 5 日獲得行政會議授權進行。路政署將會聘請顧問公司進行項目詳細設計。
				

(六) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2021 年12月

工程編號	工程名稱	決策科首長及 負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
871TH - 1	寶琳北路（近景明苑）加建 隔音屏障工程	環境局局長 路政署	工程主要包括在近景明苑的一段寶琳北路加建隔音屏障。	路政署委聘顧問公司經研究和設計後，當局已於2021年5月就有關加建隔音屏障工程諮詢西貢區議會環境衛生、氣候變化及漁農委員會，並得到區議會支持及促請政府盡早落實該有關工程。
			擬建的隔音屏障工程已於2021年10月獲授權進行。我們預計將於2022年上半年向立法會申請撥款，預計工程將於2022年第三季開展。	

(六) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2021 年12 月

工程編號	工程名稱	決策科首長及 負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
5057TF	糧船灣碼頭改善工程	發展局局長 土木工程拓展署	工程計劃範圍包括： (一) 拆卸及重建現有碼頭； (二) 建造相關的輔助設施；以及 (三) 就擬議的工程進行環境監察及紓減環境影響的措施。	我們已在 2019 年 4 月 8 日諮詢旅遊及經濟發展工作小組，並得到小組委員支持有關初步設計。 我們已委托顧問進行詳細設計、土地勘測及相關的法定程序等工作。 工程已根據《前濱及海床(填海工程)條例》於 2021 年 1 月 29 日刊憲。 工程已於 2021 年 4 月 30 日根據《前濱及海床(填海工程)條例》第 7 條，獲批准進行。 土木工程拓展署會適時就項目再次諮詢相關區議會的委員會。

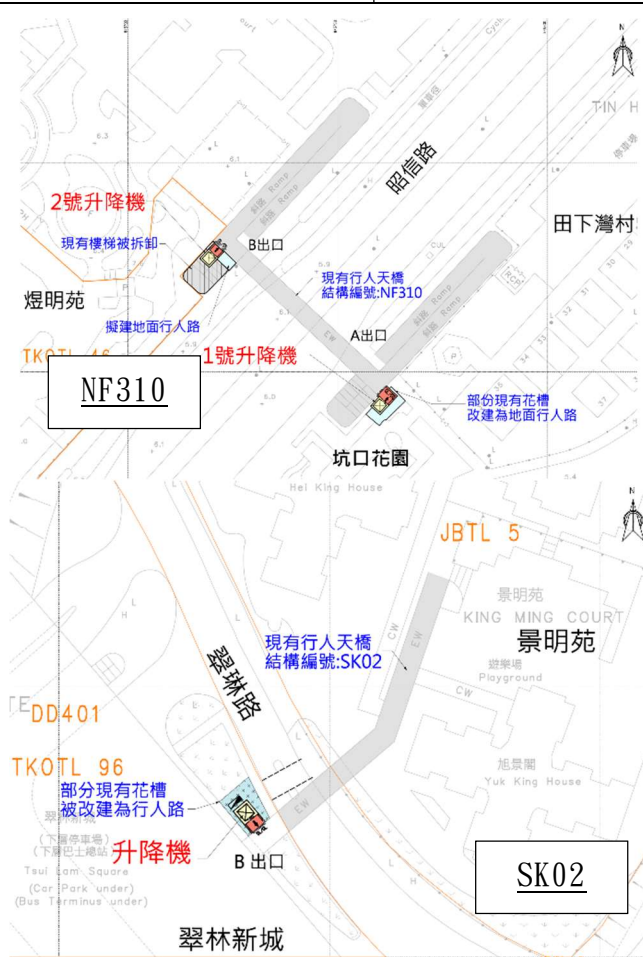


擬議糧船灣碼頭佈局模擬圖

(六) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2021 年12月

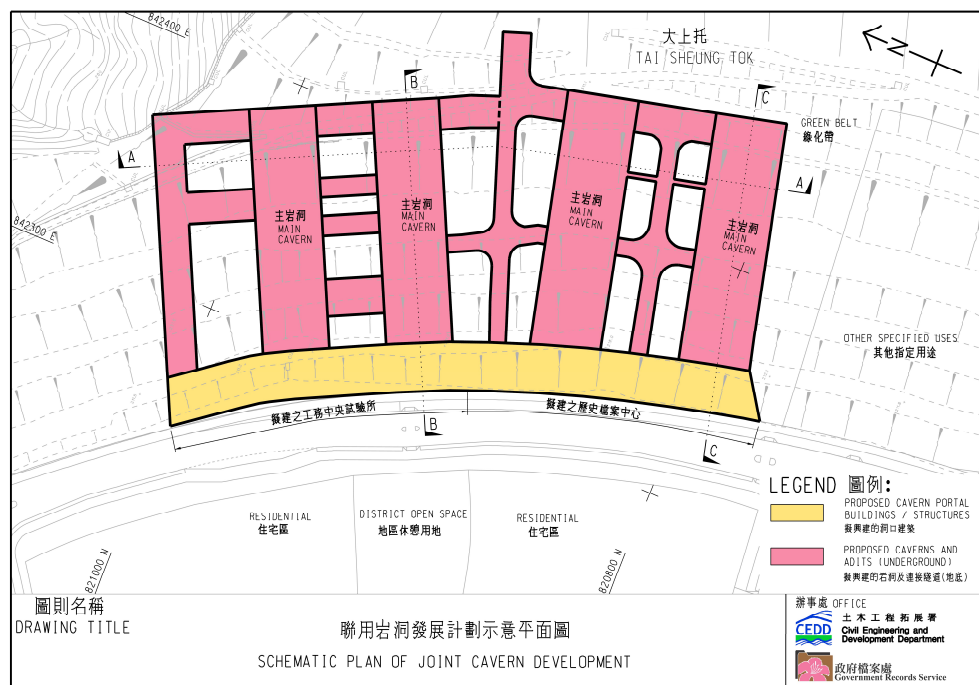
工程編號	工程名稱	決策科首長及 負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
6101TX	為行人天橋、高架行人道及 行人隧道提供暢道通行設施 - 第三組 - 勘查研究、 設計及建造	運輸及房屋局 路政署	擬建設施包括： 為橫跨昭信路近田下灣村的行人天橋（結構編號:NF310）加建的兩部升降機；以及 為橫跨翠琳路連接翠林商場及景明苑的行人天橋（結構編號:SK02）加建的一部升降機	就結構編號 NF310，由於路政署於2019年9月收集到西貢區議會轄下交通及運輸委員會（交運會）的不同意見，路政署已於2020年9月18日的交運會會議中，匯報有關該行人天橋加建升降機設施的最新修訂方案，並獲得交運會支持。路政署現正為項目進行詳細設計，以及準備按《道路(工程、使用及補償)條例》(第 370 章)就工程計劃刊登憲報。 就結構編號 SK02，路政署已應交運會主席於2020年9月18日的交運會會議上提出的建議，考慮循「人人暢道通行」計劃下的「特別計劃」推展有關項目，在屬「租者置其屋計劃」的翠林邨範圍內為行人天橋 SK02 加建升降機，並已取得翠林邨業主立案法團以及翠林新城業主的同意。路政署亦已於2021年9月16日的交運會會議上中，匯報有關該行人天橋加建升降機設施的最新修訂方案，並獲得交運會支持。路政署現正為項目進行詳細設計。



(六) 土地開拓、道路及其他工程(續)

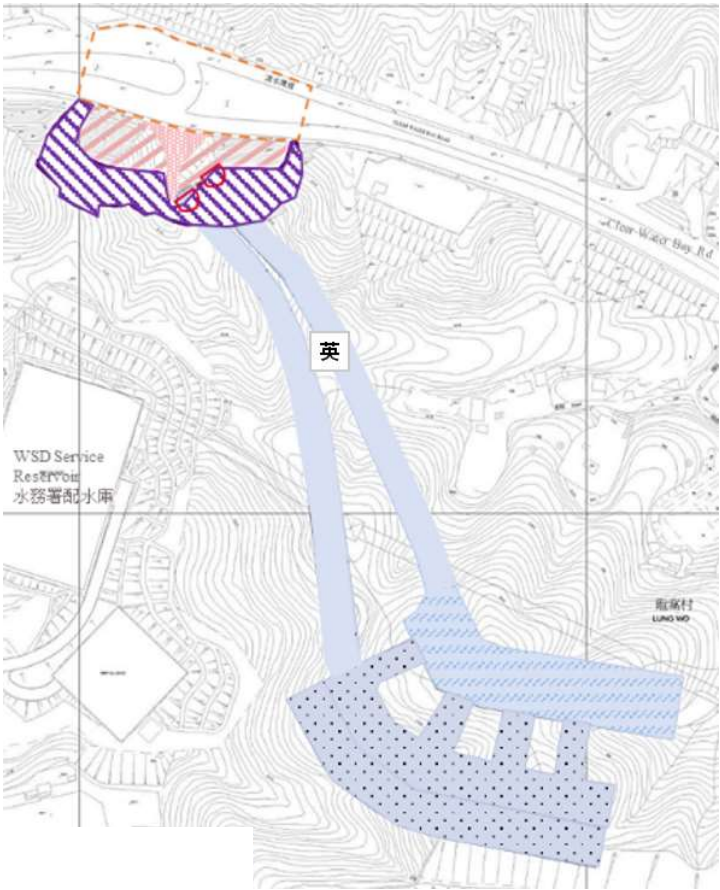
截至 2021 年12月

工程編號	工程名稱	決策科首長及 負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
7851CL & 5792CL	安達臣道石礦場用地聯用岩洞發展 — 遷置工務中央試驗所及興建政府檔案處歷史檔案中心	發展局局長 (遷置工務中央試驗所) 行政署長 政務司司長辦公室/政府檔案處 (政府檔案處歷史檔案中心) 土木工程拓展署	工程計劃包括 - - 在岩洞總綱圖中位於大上托的第 28 號策略性岩洞區內建築四個主岩洞及兩座洞口建築物； - 進行相關的岩土工程、道路工程、綜合岩洞結構的建築工程、裝置屋宇設備、裝置防火安全及緊急設施等；以及 - 搬遷及重置工務中央試驗所和設置歷史檔案儲存設施及儀器。	部門曾於 2020 年 9 月 17 日及 9 月 28 日，以「安達臣道石礦場聯用岩洞發展計劃」就此項目的概念設計分別諮詢觀塘區議會轄下房屋規劃及地政事務委員會及西貢區議會轄下房屋及規劃發展委員會。 項目的勘察研究工作已於 2021 年 12 月 6 日展開。土木工程拓展署會適時就項目再次諮詢相關區議會的委員會。



(六) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2021 年12月

工程編號	工程名稱	決策科首長及 負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
5188DR	發展大上托廢物轉運站	環境局局長 環境保護署	設計及建造地下岩洞內的大上托廢物轉運站，以應付東九龍及西貢區的廢物轉運需求(區內現時沒有都市固體廢物接收設施)。轉運站所接收的都市固體廢物會被壓縮，然後裝入特製的貨櫃內，再轉運至指定堆填區或其他的都市固體廢物處理設施作最終處理。	本署已於 2021 年 5 月就項目開展顧問研究，進行詳細技術研究和環境影響評估，並收集相關持分者和地區人士的意見。 環保署會適時就項目發展諮詢相關區議會的委員會。
				

(六) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2021 年12月

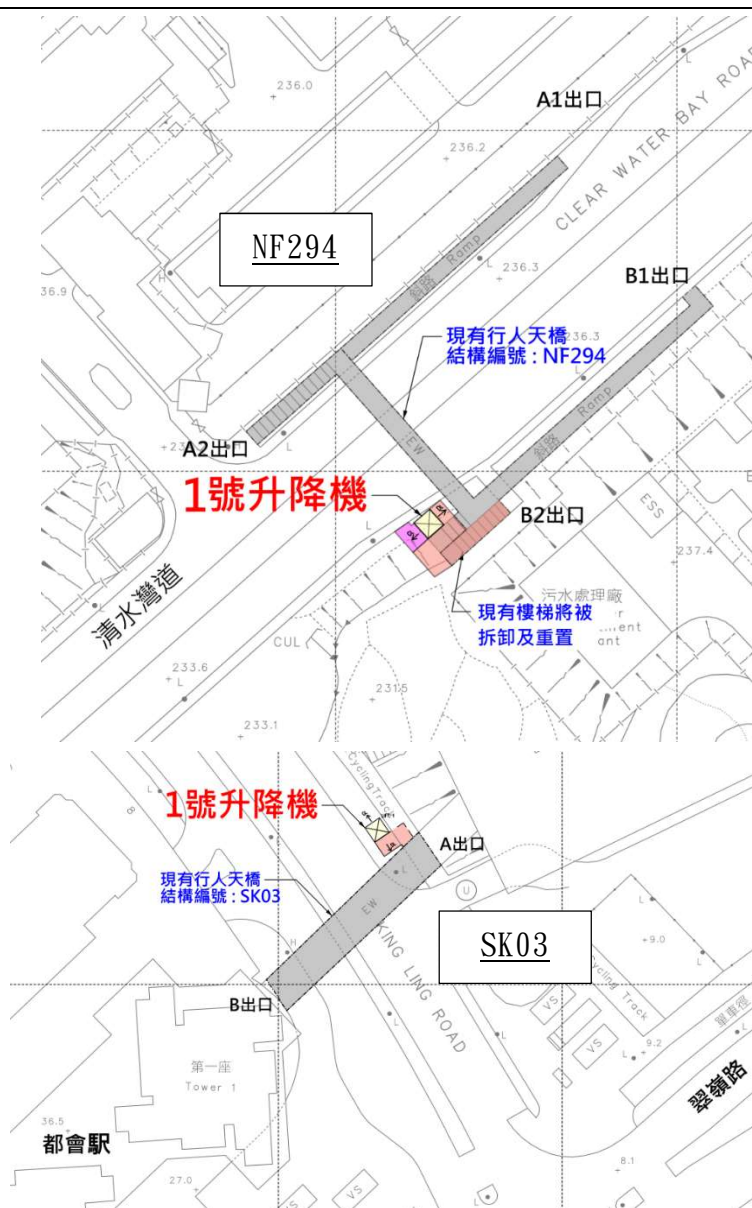
工程編號	工程名稱	決策科首長及 負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
6101TX	為行人天橋、高架行人道及 行人隧道加建人人暢道通行 設施-第七組- 勘查研究、 設計及建造	運輸及房屋局 路政署	擬建設施包括： 為橫跨寶寧路近將軍澳醫院的 行人隧道（結構編號: NS149） 加建的一部升降機； 為橫跨清水灣道近壁屋懲教所 的行人天橋（結構編號: NF294） 加建的一部升降機；以及 為橫跨景嶺路近香港知專設計 學院的行人天橋（結構編 號: SK03）加建的一部升降機	就結構編號 NS149，路政署已 於 2021 年 5 月，就加建升降 機的初步設計諮詢西貢區議 會轄下交通及運輸委員會， 現正檢視為該行人隧道於將 軍澳醫院池畔花園範圍內加 建升降機設施的替代方案的 可行性。 顧問公司已致函醫管局諮詢 對有關加建升降機的方案 的意見，醫院管理局已經回覆 原則上不反對替代方案。路 政署計劃於 2021 年 11 月呈 交有關的項目予區議會作討 論。 就結構編號 NF294，路政署已 於 2021 年 5 月，就加建升降 機的初步設計諮詢西貢區議 會轄下交通及運輸委員會，並 獲得支持。路政署現正為項目進 行詳細設計。 就結構編號 SK03，路政署已 經與香港知專設計學院就為 行人天橋加建升降機設施的 事宜進行協商，香港知專設



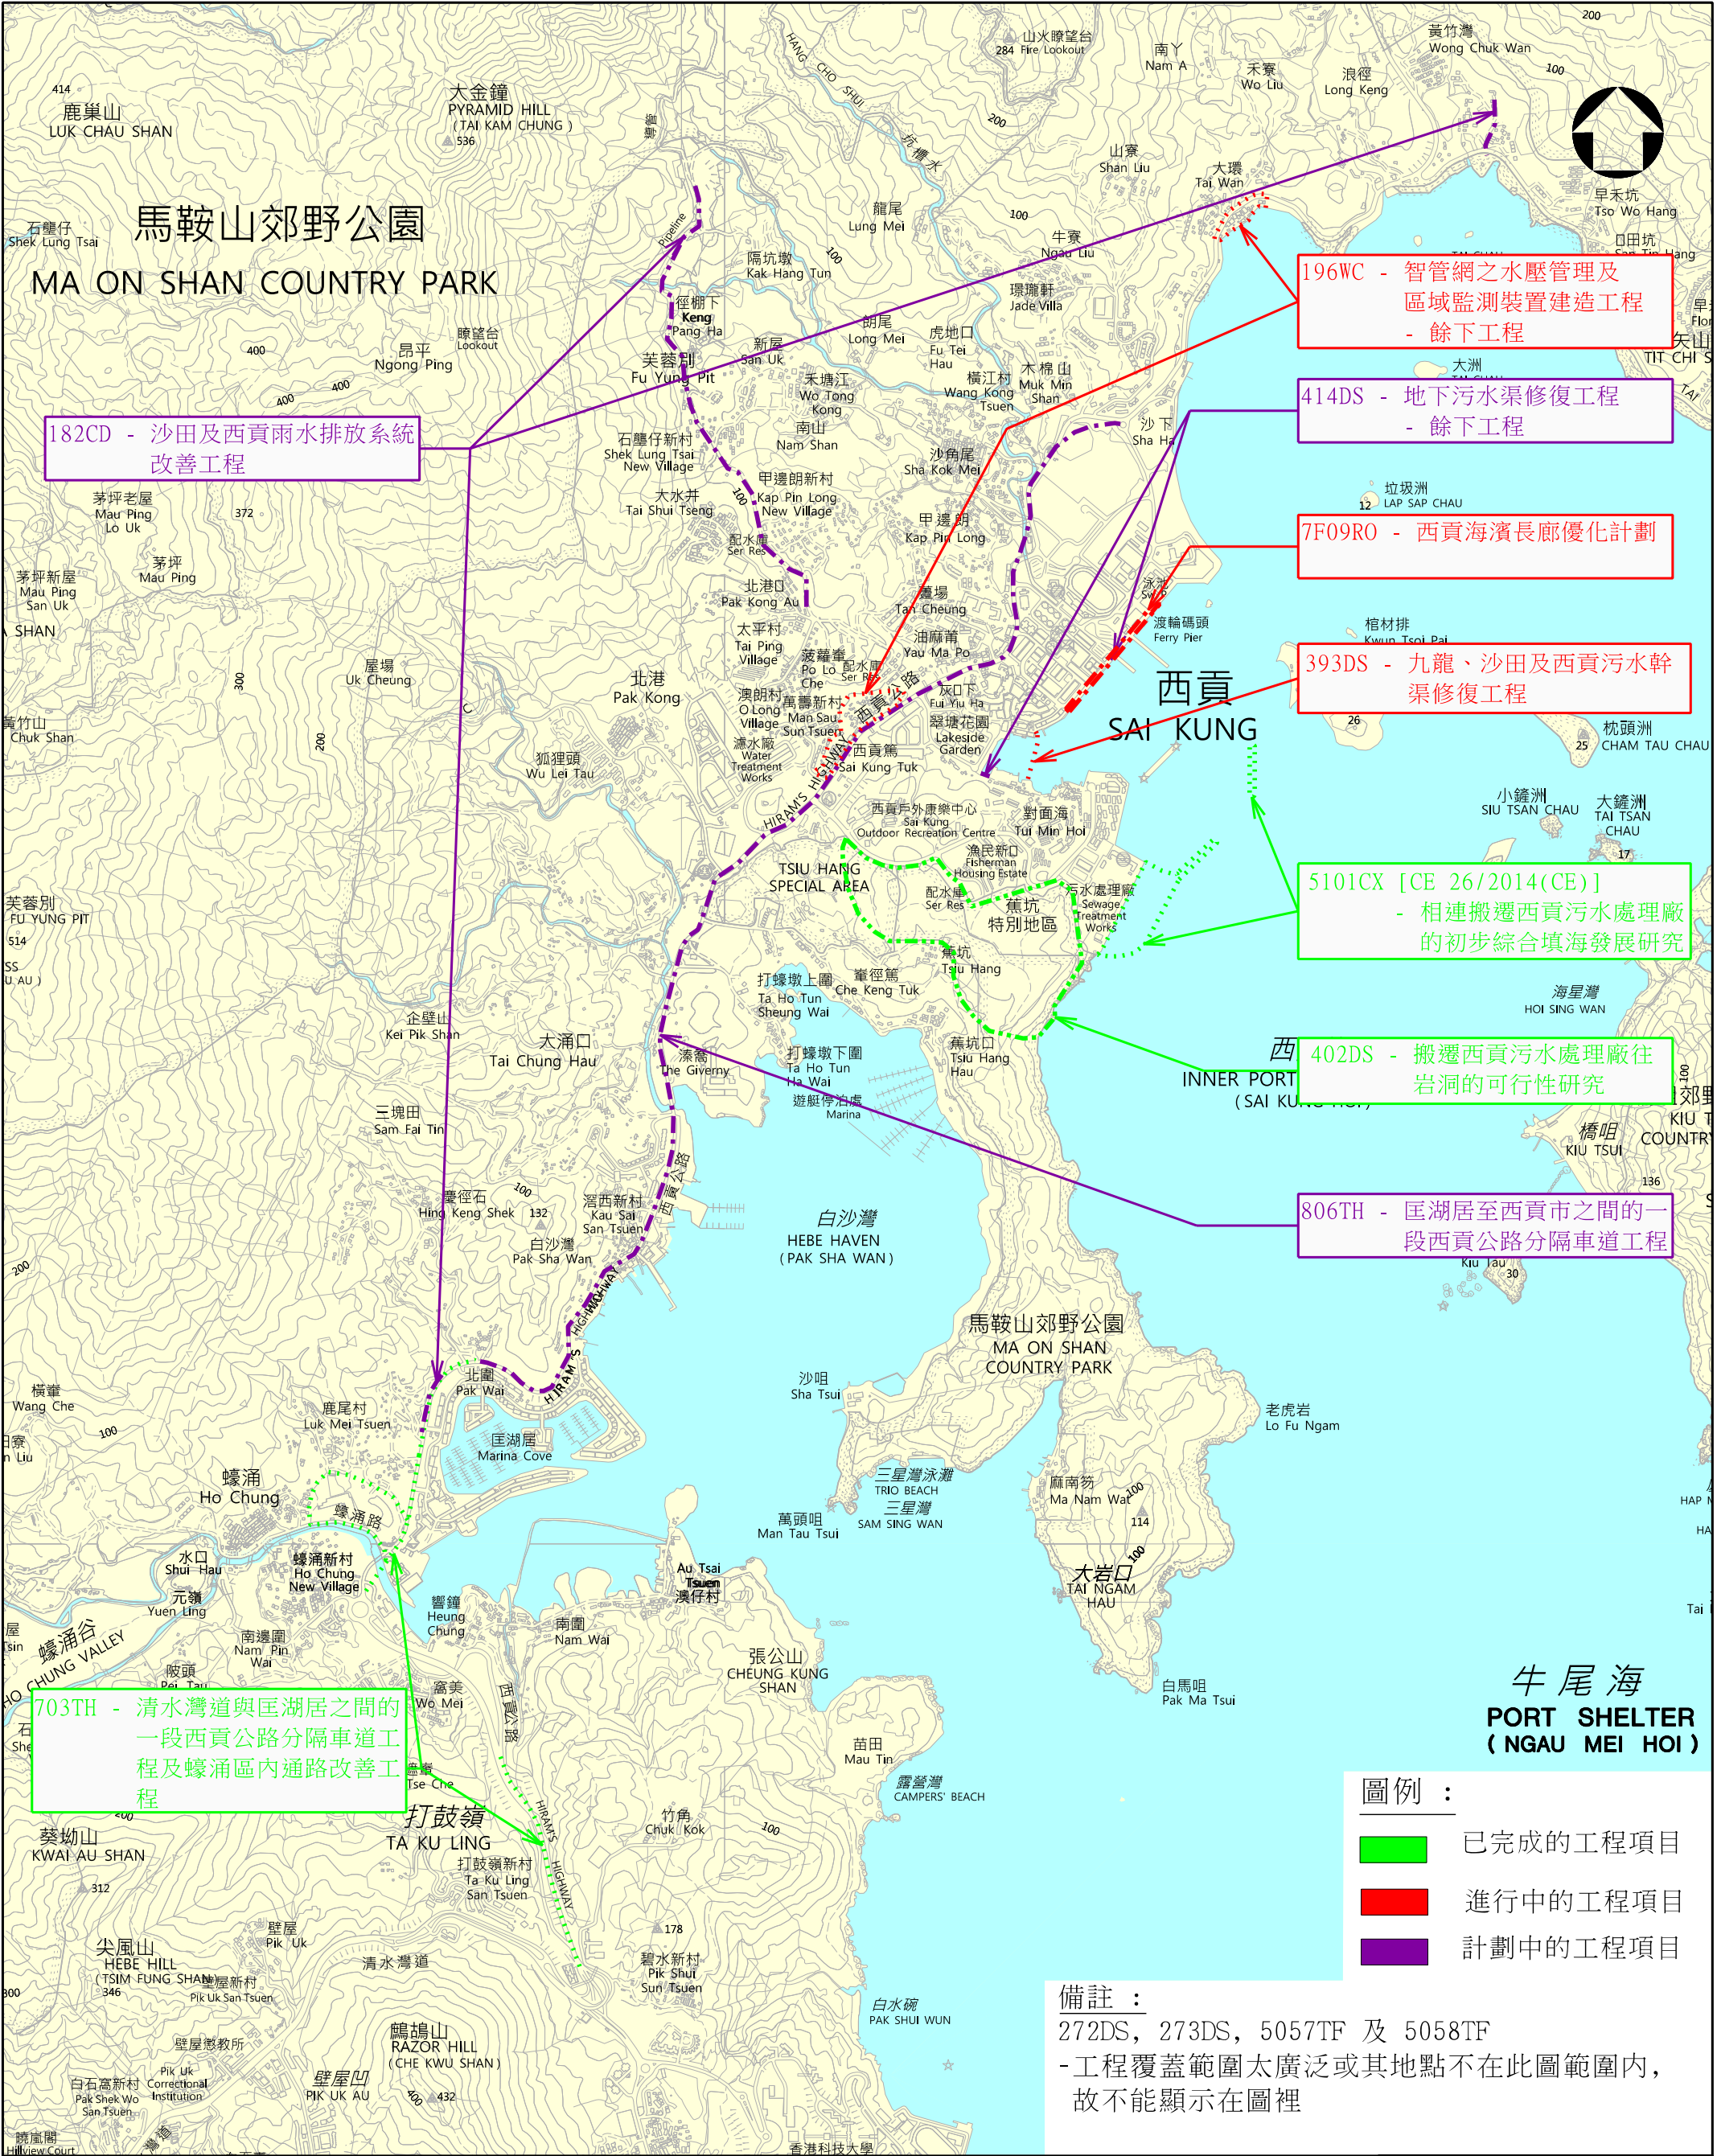
(六) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2021 年12月

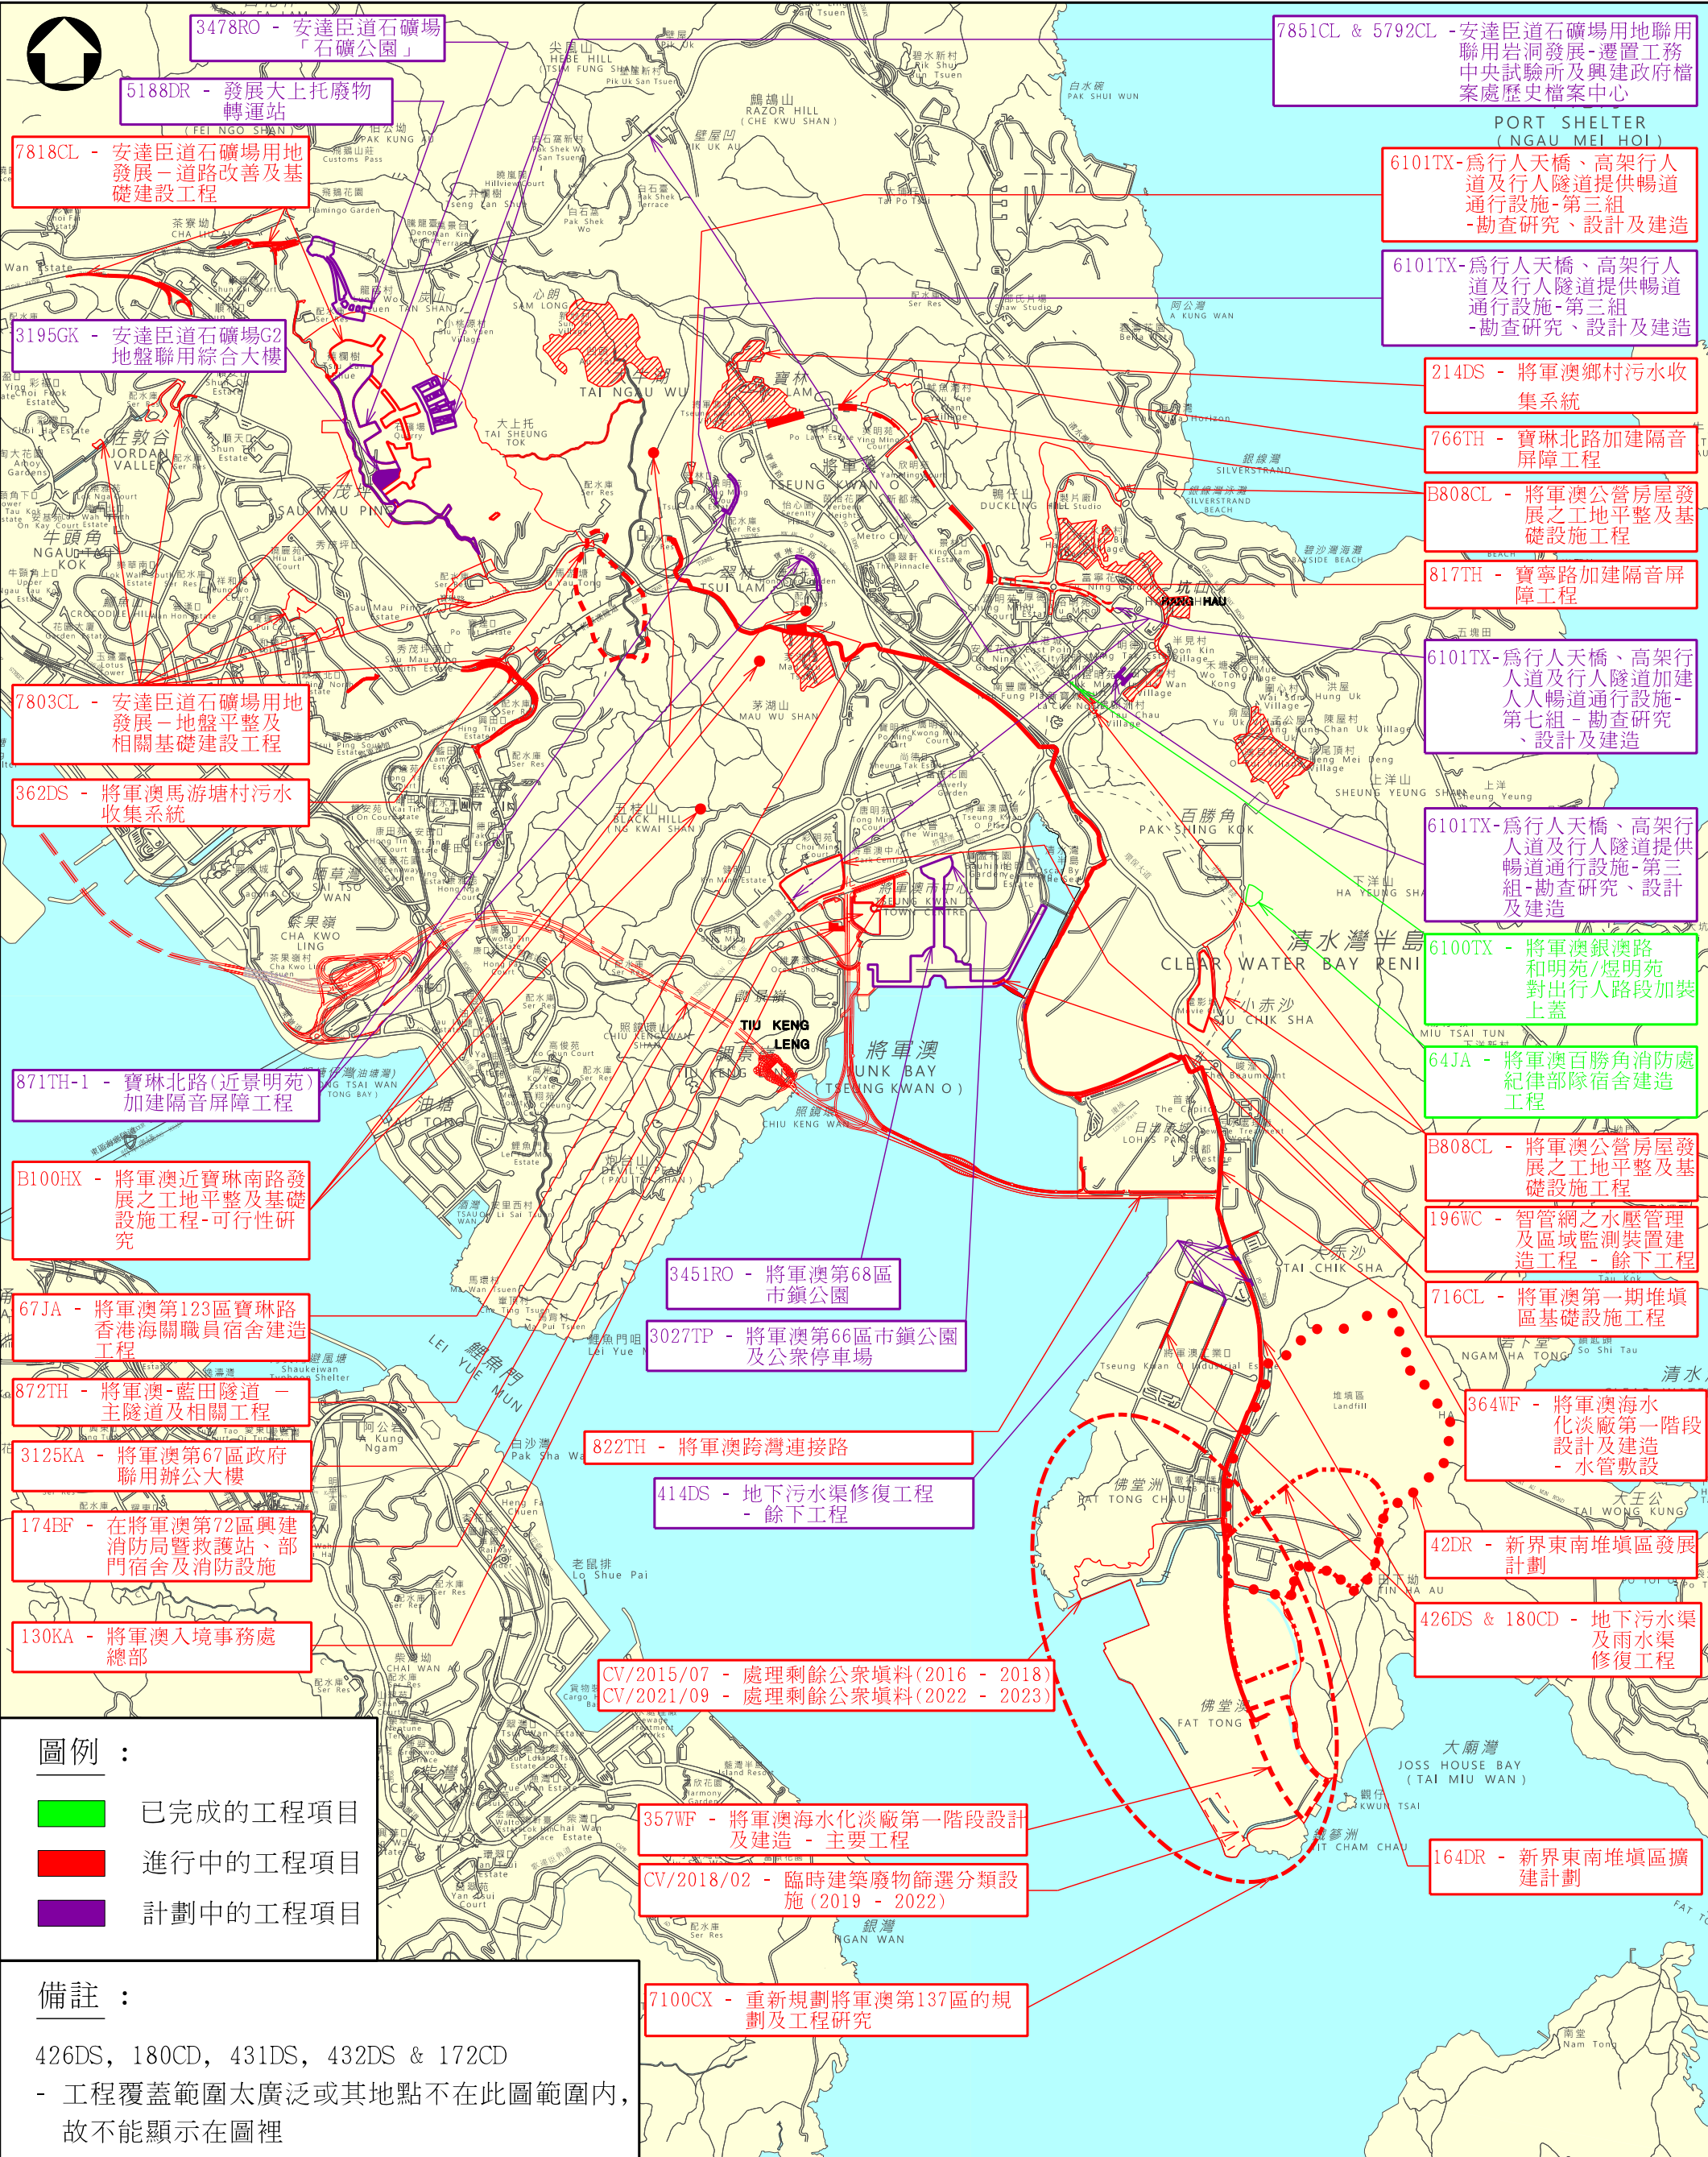
計學院回覆原則上不反對為該行人天橋加建升降機設施。路政署計劃於 2021 年 11 月呈交有關的項目予區議會作討論。



附件



圖則名稱 drawing title	繪圖 drawn		簽署initial	日期date	項目編號 item no.	辦事處 office
	核對 checked		簽署initial	日期date	比例 scale	
	核准 approved		簽署initial	日期date	圖則編號 drawing no.	
西貢主要工程項目位置圖 (2021年12月)				23.12.2021		東拓展處 EAST DEVELOPMENT OFFICE
					1 : 20 000	 土木工程拓展署 CIVIL ENGINEERING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT
					CDESAKZ0149	



圖則名稱 drawing title	繪圖 drawn		簽署initial	日期date	項目編號 item no.	辦事處 office 東拓展處 EAST DEVELOPMENT OFFICE
	核對 checked		簽署initial	日期date	比例 scale 1 : 30 000	
	核准 approved		簽署initial	日期date	圖則編號 drawing no. CDESAKZ0150	 土木工程拓展署 CIVIL ENGINEERING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT
將軍澳主要工程項目位置圖 (2021年12月)						
