

西貢區議會 2022/2023 年度 主要工程項目進度報告 (2022 年 12 月)

將軍澳跨灣連接路



將軍澳-藍田隧道



西貢海濱長廊優化計劃(第一階段工程)



清水灣道與匡湖居之間的西貢公路



頁數

甲部 進行中的工程

- | | | |
|-----|--------------|---------|
| (一) | 社區設施工程 | 1 – 6 |
| (二) | 水務及渠務工程 | 7 – 16 |
| (三) | 土地開拓、道路及其他工程 | 17 – 35 |

乙部 規劃中及即將進行的工程

- | | | |
|-----|--------------|---------|
| (四) | 康樂及文化設施工程 | 36 – 39 |
| (五) | 水務及渠務工程 | 40 – 44 |
| (六) | 土地開拓、道路及其他工程 | 45 – 51 |

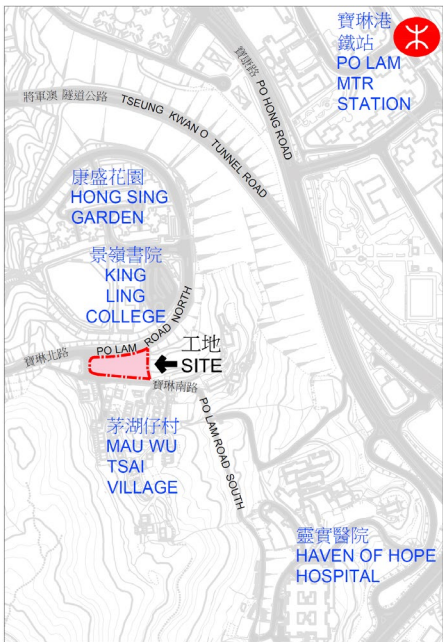
附圖： 工程項目位置圖

甲部 進行中的工程

(一) 社區設施工程

(一) 社區設施工程

截至 2022 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
67JA 甲級	將軍澳第 123 區 寶琳路香港海關 職員宿舍建造工 程	1,035.2	保安局局長 香港海關 建築署	11/2018	3/2024	工程範圍包括： (一) 興建 2 幢 25 至 26 層高、總建築樓面面積約為 23 860 平方米的宿舍樓宇，以提供 306 個部門宿舍單位； (二) 下列附屬設備— (i) 1 個管理處； (ii) 康樂及公用地方，包括 1 個多用途室； (iii) 私家車及電單車泊車位； 以及 (三) 進行相關的渠務工程。	現正進行挖掘與側向承托，底層結構及上層結構工程。
 							

(一) 社區設施工程(續)

截至 2022 年 12 月

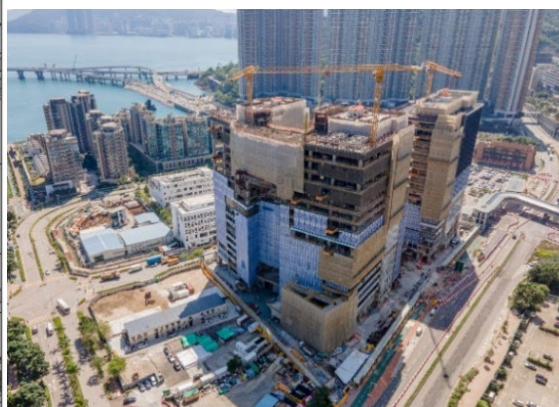
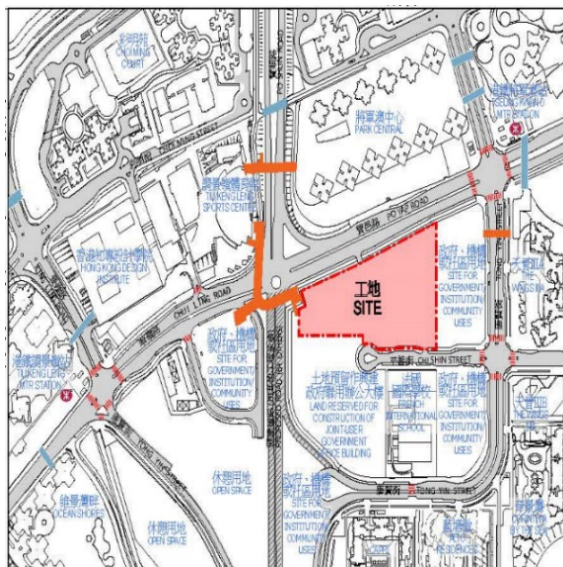
工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
174BF 甲級	在將軍澳第 72 區興建消防局暨救護站、部門宿舍及消防設施	655.0	保安局局長 香港消防處 建築署	2022 第 2 季	2024 第 4 季	工程計劃的工地面積約 3 015 平方米，工程將興建樓高 17 層附設天台的大樓。工程範圍包括： (一) 興建可容納 5 個泊車間的消防局暨救護站； (二) 重置社區應急準備課貯物室； (三) 重置消防設備專責隊伍辦公室； (四) 為消防處行動車輛(包括消防安全教育巴士及應急準備教育巴士)提供室外有蓋停車間及為部門宿舍提供室外停車場(包括 21 個私家車泊車位及 2 個電單車泊車位)；以及提供 132 個 H 級部門宿舍單位及相關設施。	現正進行地基工程。



(一) 社區設施工程(續)

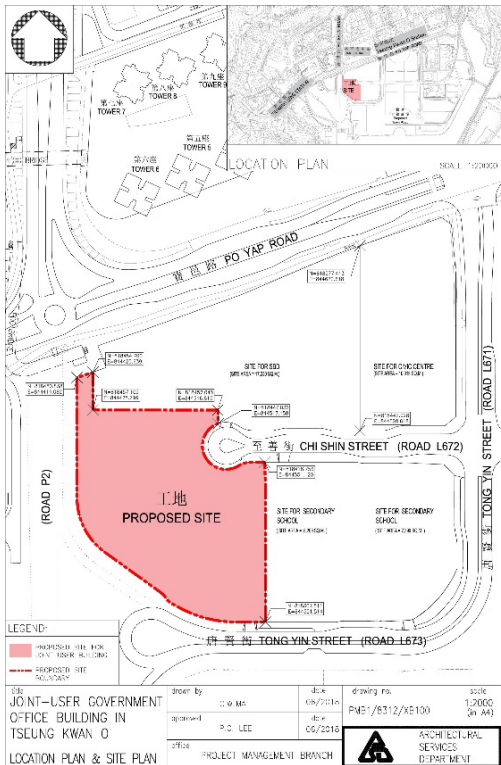
截至 2022 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
130KA 甲級	將軍澳入境事務處總部	6,806.0	保安局局長 入境事務處 建築署	6/2019	9/2023	工程範圍包括興建入境處總部，提供約 57 400 平方米淨作業樓面面積供入境處使用。設施包括： (一) 公共服務辦事處； (二) 一般辦公室； (三) 電話熱線中心； (四) 運作設施； (五) 指揮控制中心； (六) 輔助設施；以及 (七) 停車場供部門使用。	上蓋建築工程已完成。 現正進行外牆、內部裝飾和屋宇裝備工程。



(一) 社區設施工程(續)

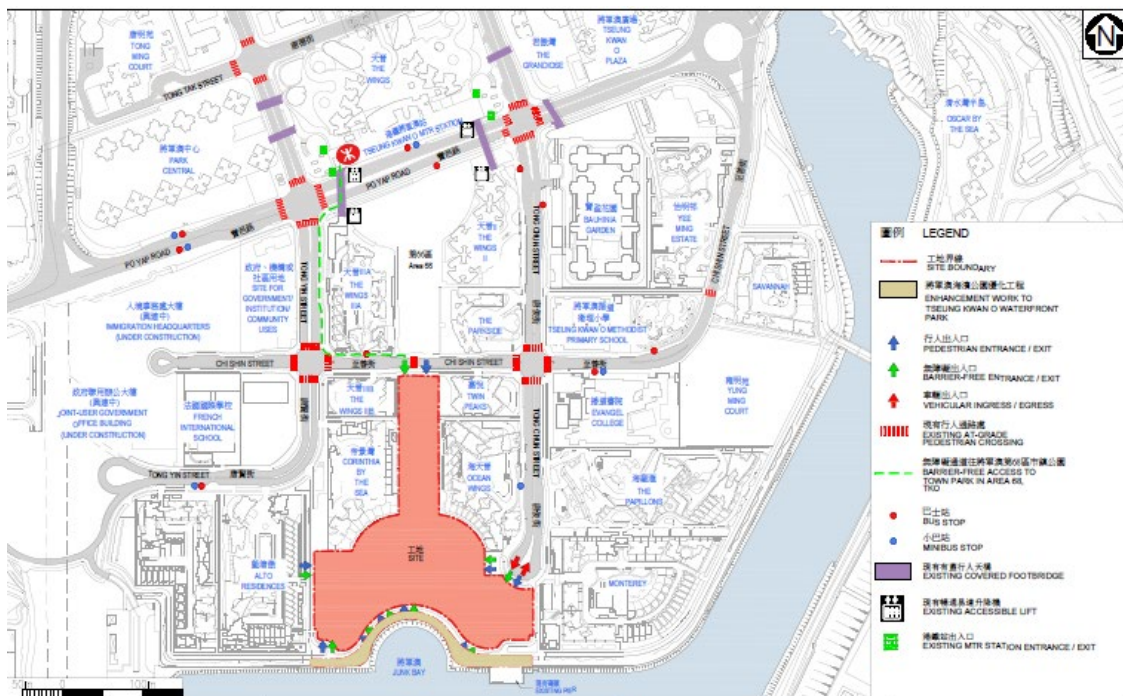
截至 2022 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
3125KA 甲級	將軍澳第 67 區 政府聯用辦公 大樓	5,228.4	財經事務及庫務局局長 政府產業署 建築署	9/2020	3/2025	工程計劃的擬議用途和設施包括： (一) 一般政府辦公室； (二) 普通科門診診所； (三) 為公務員及合資格人士而設的公務員診所、牙科診所及幼兒中心； (四) 就業中心； (五) 郵政局及派遞局； (六) 社會保障辦事處； (七) 公眾停車場；以及 (八) 實驗室。	項目的設計及建造工程已於 2020 年 9 月展開。 地庫工程正在進行中。與用戶的詳細設計討論會正在進行中。
 							

(一) 社區設施工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
3451RO 甲級	將軍澳第 68 區 市鎮公園	558.2	文化體育及旅遊局局長 康樂及文化事務署 建築署	4/2022	2024 年 年底	工程計劃中的擬建設施包括： (一) 園景花園； (二) 中央大道（部分）； (三) 兒童遊樂處； (四) 單車公園（兒童）； (五) 單車租賃亭； (六) 健身設施； (七) 緩跑徑； (八) 兩個籃球場； (九) 優化現有將軍澳海濱公園； (十) 重置和擴建將軍澳海濱公園內的寵物公園；以及 (十一) 附屬設施。	工程項目是 2017 年 1 月施政報告公佈的「體育及康樂設施五年計劃」的項目之一。 項目已於 2022 年 4 月動工，如果一切順利，預計工程最快可於 2024 年年底大致完成。



(一) 社區設施工程(續)

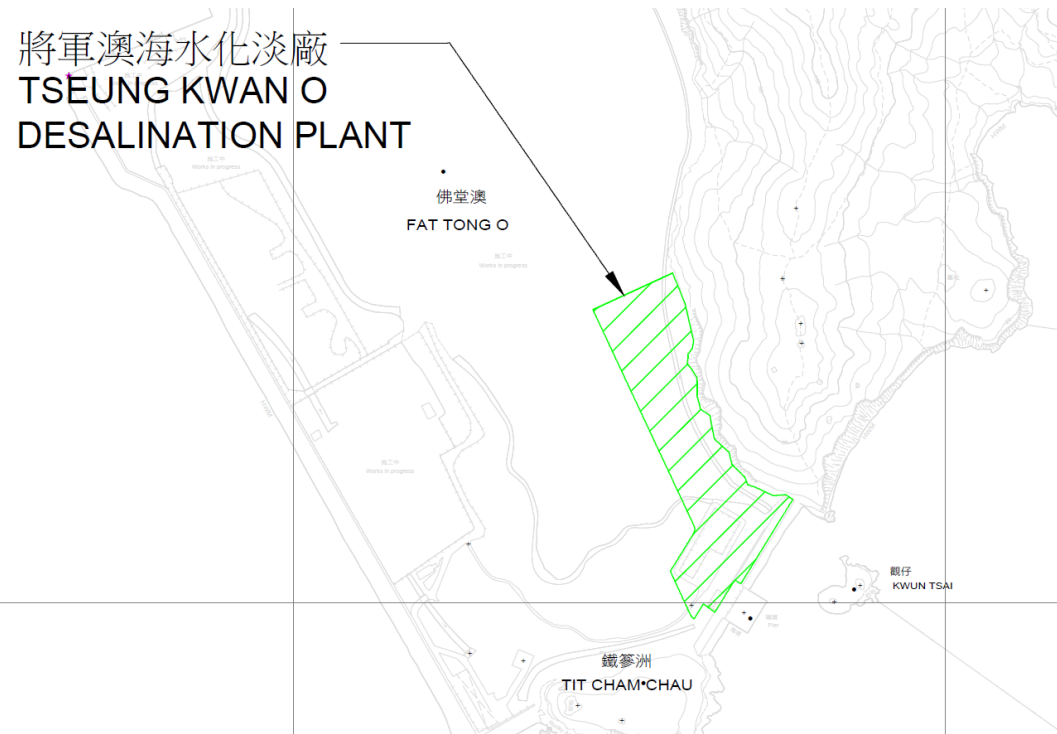
截至 2022 年 12 月

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
7F09R0 丁級	西貢海濱長廊優化計劃	15 (第一階段工程)	民政及青年事務局局長 土木工程拓展署	12/2021	6/2022 (第一階段工程)	工程項目旨在推展西貢海濱長廊的園景優化計劃，現計劃在宜春街至惠民路之間的海濱長廊進行下列主要優化工程，包括更換沿岸欄杆及長廊地磚、美化配置設施和更換照明設施等。 Enhancement Proposal (Overview) 優化建議 (總綱) - 更換欄杆和路燈 Replacement of Shoreline Railings and Lampposts - 移除現有小樹 Refurbishment of Soft Landscape - 增設添水站 Installation of Water-filling Facility - 遷移及更換座椅 Replacement and Re-arrangement of Benches - 重塗泵房外牆 Re-painting of Wall of Sewage Pumping Station - 遷移及更換路燈 Replacement and Relocation of Lampposts - 更換座椅 Replacement of Benches - 遷移現有棕櫚樹 Transplanting of Existing Palm Trees - 增設牌坊照明 Enhancement of Lighting for Paifong of Seafood Street - 重新鋪裝 Replacement and Re-arrangement of Paving Blocks	我們在 2019 年諮詢了西貢區議會轄下旅遊及經濟發展工作小組及相關持份者，並在 2020 年至 2021 年期間多次進行地區諮詢，收集了眾多持份者及地區人士對優化計劃的寶貴意見，從而進一步優化西貢海濱長廊的設計。西貢區議會及地區持份者均支持西貢海濱長廊的園景優化概念，並要求早日落實有關優化工程。 優化工程將會分五階段進行。第一階段的工程(即海鮮街牌坊廣場一帶)已於 2021 年年底開展，並於 2022 年 6 月大致完成；餘下階段的工程將會視乎地區持份者反應陸續推展。

(二) 水務及渠務工程

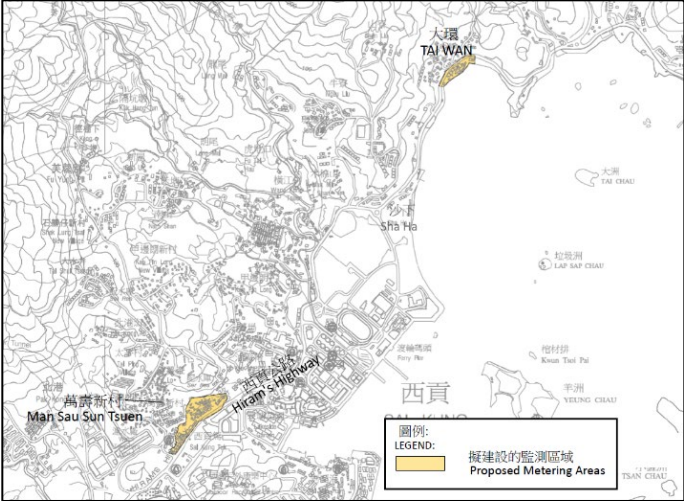
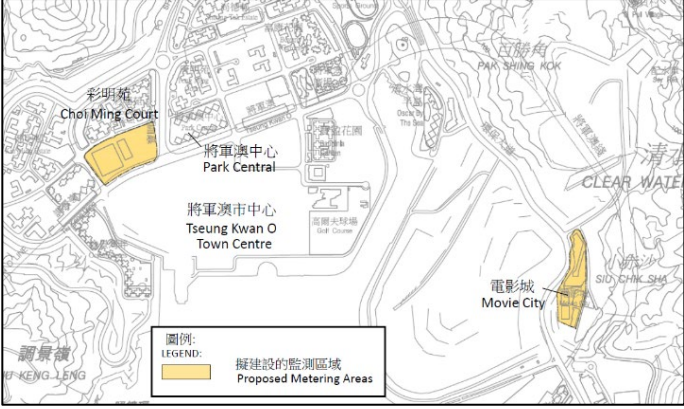
(二) 水務及渠務工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
357WF 甲級	將軍澳海水化淡廠 第一階段設計及建 造 — 主要工程	7,727.5	發展局局長 水務署	12/2019	9/2023	在將軍澳 137 區設計、建造及運作每日食水產量達 135 000 立方米的海水化淡廠。	將軍澳海水化淡廠第一階段的設計、建造及運作合約已於 2019 年 12 月開展。主要結構工程已完成，現正進行安裝機電設備。
 將軍澳海水化淡廠 TSEUNG KWAN O DESALINATION PLANT 佛堂澳 FAT TONG O 鐵蓼洲 TIT CHAM CHAU 觀仔 KWUN TSAI							

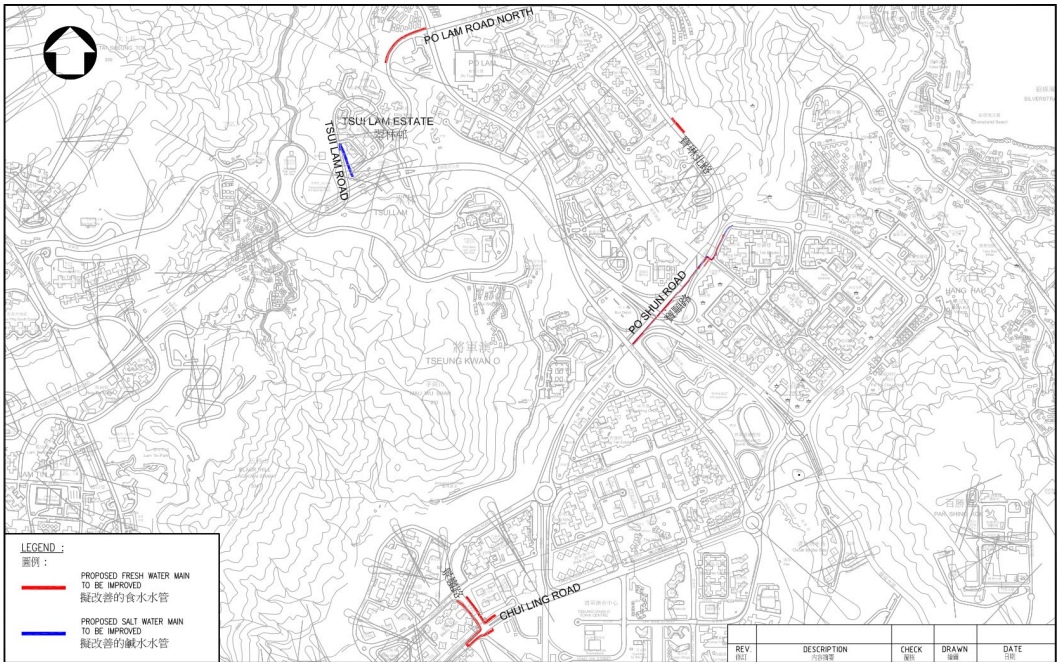
(二) 水務及渠務工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
196WC 甲級	智管網之水壓管理 及區域監測裝置建 造工程 — 餘下工 程	1,236	發展局局長 水務署	08/2020	03/2025	工程項目包括在各區建立約 640 個監測區域，當中 4 個監測區域位於西貢區。	西貢區內的工程已於 2022 年展開。
 							

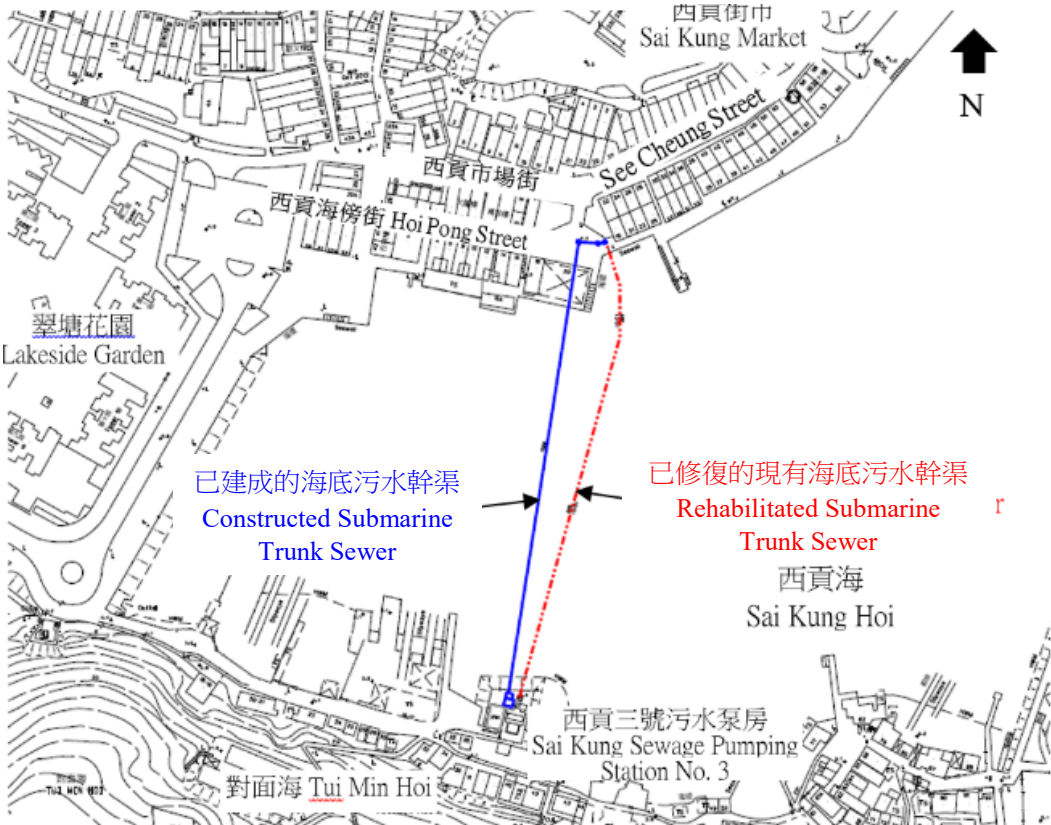
(二) 水務及渠務工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
9100WX 丁級	新界東風險為本水管改善定期合約	609.6	發展局局長 水務署	11/2021	2025	工程計劃旨在推行預防工程，改善新界東區域內被評定為高風險的水管，以維持供水網絡的健康及減低水管爆裂和滲漏的風險。 西貢區內的水管改善工程包括： (一) 景嶺路及翠嶺路； (二) 寶琳北路； (三) 翠琳路；及 (四) 寶順路。	工程合約 2021 年 11 月展開，預計整項工程將於 2025 年完成。
							

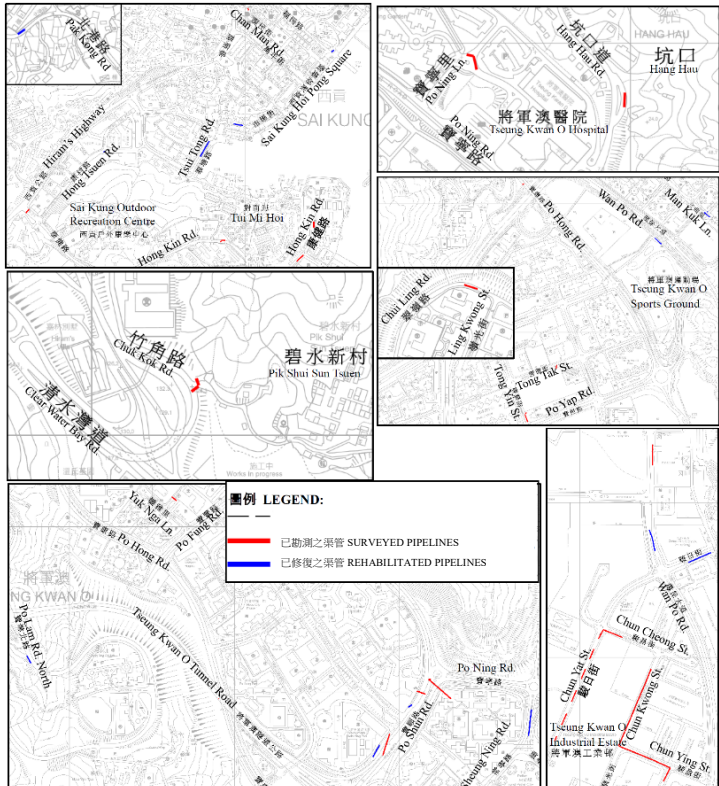
(二) 水務及渠務工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
393DS 甲級	九龍、沙田及西貢污水幹渠修復工程	679	環境及生態局局長 渠務署	1/2018	3/2022	工程包括建造一段橫跨西貢海、連接西貢市及對面海的海底污水幹渠及修復現有的海底污水幹渠。此工程的目的為減低污水滲漏的風險及增強污水系統的可靠性。	工程合約於 2018 年 1 月展開。 由西貢魚類批發市場至位於對面海的西貢三號污水泵房的海底污水幹渠已經完成。 有關污水沙井及現有的海底污水幹渠的修復工程已於 2022 年 3 月大致完成。
							

(二) 水務及渠務工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
426DS 甲級	地下污水渠修 復工程第 1 階 段	391.9	環境及生態局局長 渠務署	1/2019	12/2022	工程包括為西貢區內共約 1.3 公里長的地下污水渠及雨水渠進行勘測和修復共約 300 米長的地下污水渠及雨水渠。	工程項目 426DS 及 180CD 工程已於 2019 年 1 月展開，整項工程已於 2022 年 12 月大致完成。
180CD 甲級	地下雨水渠修 復工程第 1 階 段	122.8	發展局局長 渠務署	1/2019	12/2022		
 圖例 LEGEND: — 已勘測之渠管 SURVEYED PIPELINES — 已修復之渠管 REHABILITATED PIPELINES							

(二) 水務及渠務工程(續)

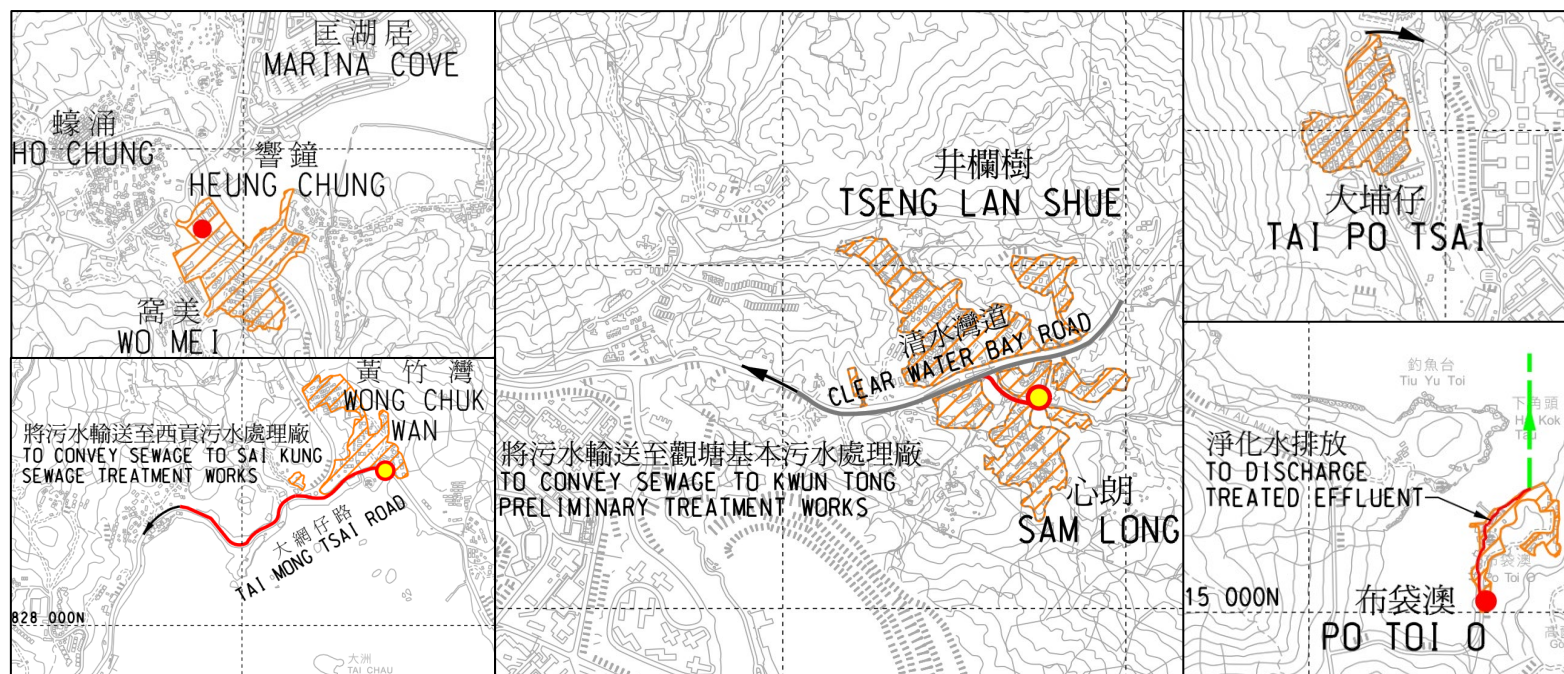
截至 2022 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
362DS 甲級	將軍澳馬游塘 村污水收集系 統	179.5	環境及生態局局長 渠務署	10/2020	2024 第 4 季	工程目的是改善鄉村衛生環境，減低河流及水域污染，從而保障公眾健康。工程內容主要包括在馬游塘村興建污水渠。	本項目於 2020 年 10 月展開工程。現正於馬游塘村進行挖掘和敷設污水渠。
							

(二) 水務及渠務工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
431DS 甲級	牛尾海污水收集系統第 2 階段工程第 3 部分	515.9	環境及生態局局長 渠務署	7/2020	2025 第 2 季	工程包括為西貢 7 個未有污水收集設施的地區(黃竹灣, 窩尾及響鐘, 布袋澳, 井欄樹及心朗和大埔仔)鋪設約 18 公里污水渠, 約 2 公里雙管加壓污水泵喉, 1 條海底排放管道, 建造 2 所二級污水處理設施處理廠及 2 所污水泵房, 以改善上述地區的衛生情況。	工程項目 2020 年 7 月展開, 預計整項工程將於 2025 第 2 季完成。
432DS 甲級	牛尾海污水收集系統第 3 階段工程第 2 部分	604.9	環境及生態局局長 渠務署	7/2020	2025 第 2 季		



(二) 水務及渠務工程(續)

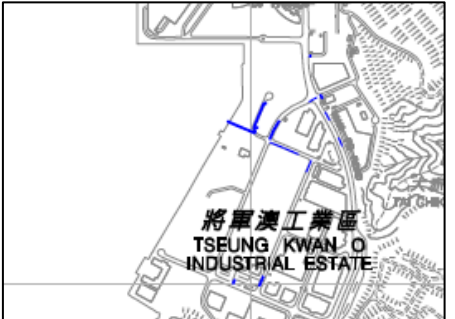

截至 2022 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
214DS 甲級	將軍澳鄉村污水 收集系統	289.5	環境及生態局 局長 渠務署	10/2020	2025 第 2 季	工程目的是改善鄉村衛生環境，減低河流及水域污染，從而保障公眾健康。 此工程項目主要是為將軍澳區以下 10 條鄉村提供公共污水收集系統包括： (一) 水邊村； (二) 明愛新村； (三) 茅湖仔村； (四) 將軍澳上村； (五) 將軍澳村； (六) 半見村； (七) 坑口舊村； (八) 禾塘崗村； (九) 澳頭村；及 (十) 新地村 工程內容主要包括敷設污水渠及興建一座污水泵房。	本項目於 2020 年 10 月展開工程。現正於各鄉村進行挖掘和敷設污水渠。



(二) 水務及渠務工程(續)

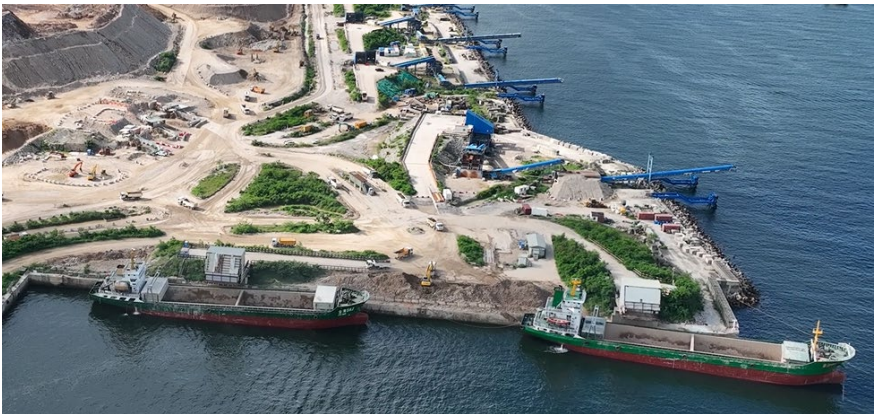
截至 2022 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
172CD 甲級	地下雨水渠修復 工程第 3 階段	702.7	發展局局長 渠務署	06/2021	2025 年 年底	工程包括為西貢區內修復共約 1 100 米長的地下雨水渠。	工程項目 2021 年 6 月展開，預計整 項工程將於 2025 年年底完成。
       — 擬修復的雨水渠							

(三) 土地開拓、道路及其他工程

(三) 土地開拓、道路及其他工程

截至 2022 年 12 月

合約編號	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	合約期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
CV/2021/09	處理剩餘公眾填料 (2022-2023)	417	發展局局長 土木工程拓展署	01/2022 - 12/2023	運作將軍澳第 137 區填料庫；及運送公眾填料至內地指定填海區。	運作進行中。
 						

(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2022 年 12 月

合約編號	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	合約期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
CV/2022/02	臨時建築廢物篩選分類設施 (2022-2025)	88	環境及生態局局長 土木工程拓展署	5/2022 - 5/2025	在將軍澳第 137 區營運一所臨時建築廢物篩選分類設施。該設施主要從混合建築廢物中將惰性建築物料如泥石等篩選出來，循環再用。	臨時建築廢物篩選分類設施運作進行中。
 						

(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
872TH 甲級	將軍澳-藍田隧道 — 主隧道及相關工程	15,093	運輸及物流局局長 土木工程拓展署	7/2016	12/2022	將軍澳-藍田隧道主隧道及相關工程將連接將軍澳與藍田，以配合將軍澳區持續發展的交通需求。 工程項目包括建造一條長約 3.8 公里的雙線雙程行車路(其中隧道部分長約 2.2 公里)，東端連接將軍澳市中心，而西端則連接藍田，東區海底隧道、茶果嶺道及興建中的 T2 主幹路。 工程項目亦包括在將軍澳灣填海約 3 公頃，以提供土地興建低於地面的 P2 路。	將軍澳-藍田隧道及將軍澳跨灣連接路已於 2022 年 12 月 11 日通車。 項目下的北行人天橋(連接將軍澳中心及調景嶺體育館的行人天橋)和南行人天橋(連接調景嶺體育館及橫跨翠嶺路，翠善街和 P2 路的行人連單車徑天橋)亦已分別於 2019 年 12 月及 2022 年 12 月開放供市民使用。



(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
822TH 甲級	將軍澳跨灣連接路	5,626	運輸及物流局局長 土木工程拓展署	7/2018	12/2022	跨灣連接路橫跨將軍澳海灣，連接建造中的將軍澳-藍田隧道及將軍澳第86區附近的環保大道。跨灣連接路提供替代路線讓交通繞過市中心，從而改善市中心住宅區的居住環境。 跨灣連接路是雙線雙程行車道，全長約 1.8 公里，並設置行人路和單車徑。	跨海橋建造工程和 D9 路建造工程兩份合約分別於 2018 年 7 月和 10 月展開，並於 2022 年 12 月 11 日與將軍澳-藍田隧道同步開通。
							

(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
716CL 甲級	將軍澳第一期堆 填區基礎設施工 程	301.6	發展局局長 土木工程拓展署	1/2021	2024	工程項目主要包括興建一條長 150 米、淨闊 4.5 米的行人天橋，橫跨東邊水道連接將軍澳 68 區與 77 區，及在康城路建造排污設施(包括一座污水泵站、污水泵喉和排污渠)。 	工程於 2021 年 1 月中展開。行人天橋及污水泵房的土地勘測及地基工程正在進行。 行人橋在預製廠完成安裝，並已運送到香港，暫存在工地。

(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
42DR 甲級	新界東南堆填區 發展計劃	2,320	環境及生態局 局長 環境保護署	9/1993	約 2028	工程包括建造海堤、填海、地盤平整、興建道路、廢物接收設施、滲濾污水收集及處理系統、堆填氣體收集及管理系統和建造修復及護理設施。	堆填區已運作約 27 年，於 2021 年 11 月 21 日關閉。現正逐步進行修復工程，然後展開為期 30 年的堆填區護理工序。
							

(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
164DR 甲級	新界東南堆填區 擴建計劃	2,101	環境及生態局 局長 環境保護署	4/2018	約2028	工程項目包括合約採購的顧問研究、新界東南堆填區擴建計劃的設計、建造、營運、修復和護理。 工程包括工地平整、興建與遷移堆填區基礎設施和地面水管理系統、安裝堆填區防滲漏墊層系統、滲濾污水收集及處理系統、堆填氣體收集及管理系統和建造修復及護理設施。	基本擴建工程已完成，並於 2021 年 11 月 21 日開始接收及處置建築廢物。餘下的堆填區擴建工程仍在進行，預計可於 2023 年年初完成。



(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
703TH 甲級	清水灣道與匡湖居之間的一段西貢公路分隔車道工程及蠓涌區內通路改善工程	1,774	運輸及物流局 局長 運輸署 路政署	3/2016	2/2021 (四線通車)	工程主要包括擴闊清水灣道至打鼓嶺及南邊圍迴旋處至匡湖居的兩段西貢公路為雙線雙程分隔行車道。	在開通西貢公路匡湖居段四線行車後，承建商繼續進行餘下的附帶工程(包括公共設施重置、樹木種植及其他綠化工程)。此外，公用事業機構亦按序鋪設相關公用設施。上述工程已於 2022 年年底大致完成。
							

(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

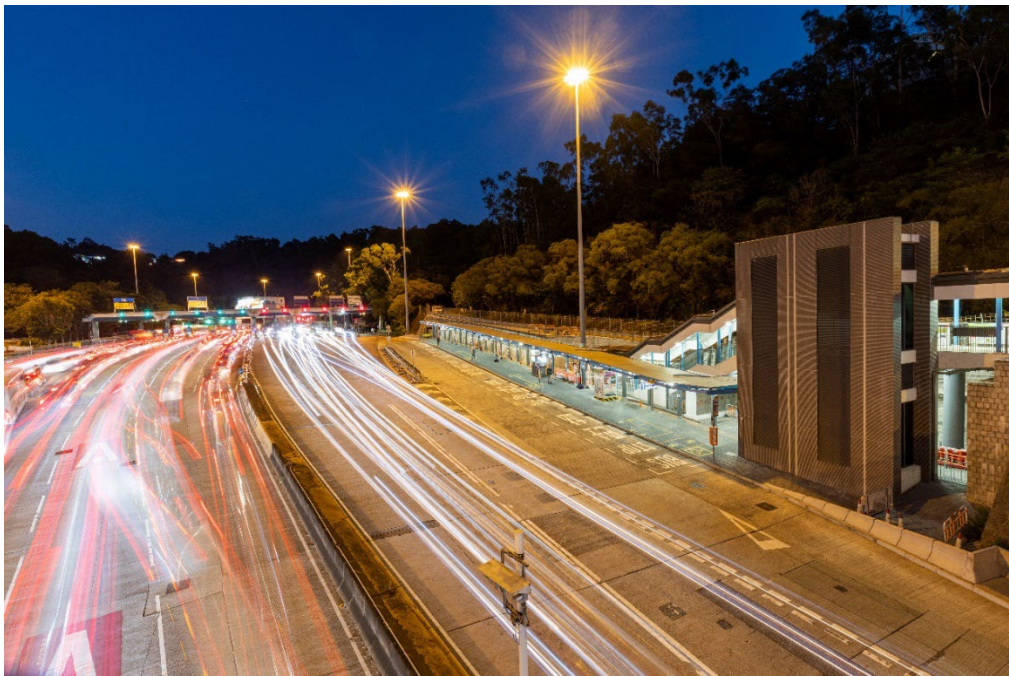
截至 2022 年 12 月

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
7803CL 甲級	安達臣道石礦場用地發展 — 地盤平整及相關基礎建設工程	7,693	發展局局長 土木工程拓展署	12/2016	2022 年起分階段完成	工程範圍包括： (一) 在安達臣道石礦場用地平整約 40 公頃土地平台及進行相關的土力工程； (二) 提供並改善供水、排水、污水系統、道路和環境美化工程；以及 (三) 在發展區外鄰近安達邨、曉麗苑及曉華大廈興建行人連繫設施和在將軍澳隧道收費廣場設置巴士轉乘站。	在安達臣道石礦場用地的地盤平整及相關基礎建設工程，及發展區外所興建之行人連繫設施已經在 2016 年 12 月起分階段展開。 往將軍澳方向及往九龍方向的將軍澳隧道巴士轉乘站已分別於 2020 年 10 月及 2021 年 5 月啟用。 連接將軍澳隧道巴士轉乘站（往九龍方向）及連德道的行人連繫設施已於 2021 年 8 月啟用。



(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

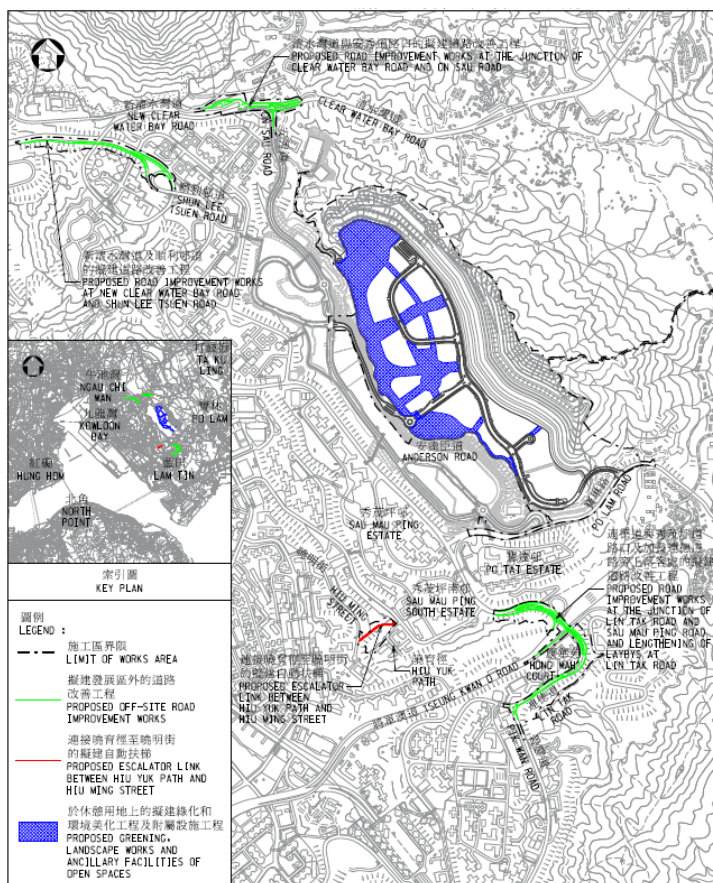
截至 2022 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
							連接曉光街及曉明街的雙向自動扶梯已於 2022 年 1 月啟用。 安達臣道石礦場用地的地盤平整工程已大致完成，供房屋及其他發展用途的土地（G2 地盤除外）已陸續交付予地政總署作相關發展。

(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
7818CL 甲級	安達臣道石礦場 用地發展 — 道 路改善及基礎建 設工程	2,654	發展局局長 土木工程拓展署	5/2018	12/2024	工程範圍包括： (一) 道路和路口改善工程包括興建一條由連德道通往秀茂坪道的新行車天橋、於近藍田康華苑及興田邨的連德道路段增設路旁上落客處、改善清水灣道與安秀道的路口和擴闊於新清水灣道近順利邨道的一段往九龍方向行車道； (二) 興建自動扶梯連接曉光街(曉育徑)至曉明街；以及 (三) 在發展區內進行休憩用地環境美化及附屬工程。	道路改善工程及興建自動扶梯工程已經在 2018 年 5 月展開。 休憩用地環境美化及附屬工程已經在 2021 年 7 月展開。 連接曉光街(曉育徑)至曉明街的自動扶梯已於 2021 年 9 月 1 日啟用。 道路改善工程進行期間，發現部份工地地質與原先設計有所偏差，故此需要調整施工方案。根據現時評估，預計相關工程將由 2024 年底起分階段完成。



(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
6101TX 丁級	為行人天橋、 高架行人道及 行人隧道提供 暢道通行設施 — 第三組 — 勘 查研究、設計 及建造	16.65	運輸及物流局局長 路政署	6/2020	10/2023	擬建設施包括為橫跨翠琳路近翠 林社區會堂的行人天橋（結構編 號 SK01）加建升降機設施。	工程合約已於 2020 年中展開， 路政署已於 2022 年 1 月 27 日與翠 林邨業主立案法 團簽立與邨內施 工用地相關的地 役權契約。路政 署承建商已完成 挖掘工程及正準 備建造升降機塔 的地基。由於取 得《建築物條例》(第 123 章) 下與工程相關的 批核所需的時間 較預期長，因此 建造工程預計於 2023 年 8 月完 成，而開放升降 機予公眾使用所 需的法定程序則 預計於 2023 年 10 月前完成。



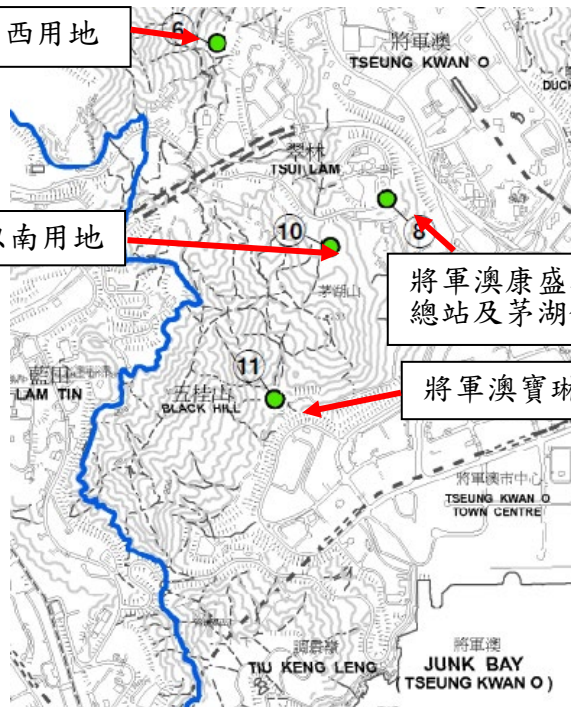
(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
總目 707 分目 7100CX 丁級	重新規劃將軍 澳第137區的規 劃及工程研究	29	發展局局長 土木工程拓展署 規劃署	12/2016	12/2022	這項研究會重新規劃將軍澳第 137 區約 80 公頃土地的發展，研究作房屋、商業及其他發展的可行性。	我們建議發展將軍澳第 137 區為以房屋用途為主的新社區，提供約 50 000 個房屋單位，預計可容納約 13.5 萬人。發展將軍澳第 137 區為高密度住宅發展的同時，我們會利用新增土地提供適切的社區或其他所需設施和服務，盡量滿足將軍澳社區的需要。為此，我們正研究於附近水域（包括第 137 區、將軍澳創新園及將軍澳華人永遠墳場對出水域範圍）進行近岸填海，以提供所需的用地興建交通配套及其他公共設施。我們會在完成研究後，提出建議並進行諮詢，包括聆聽當區持分者的意見。

(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

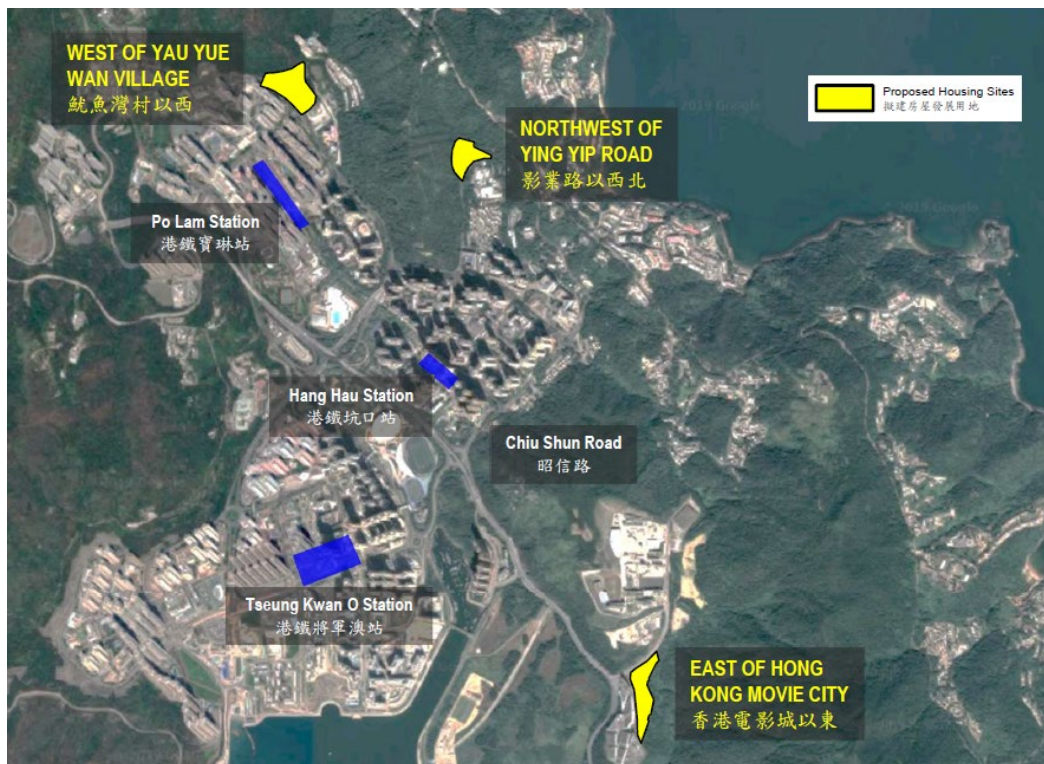
截至 2022 年 12 月

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
總目 711 分目 B100HX 丁級	將軍澳近寶琳南路發展之工地平整及基礎設施工程 — 可行性研究	29	房屋局局長 土木工程拓展署	5/2018	10/2022	這項研究會檢視寶琳南路附近土地作公營房屋發展的可行性。	可行性研究在 2022 年 10 月完成。我們會在將來合適的時間再進行研究，進一步探討建議的發展的可行性。
							

(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

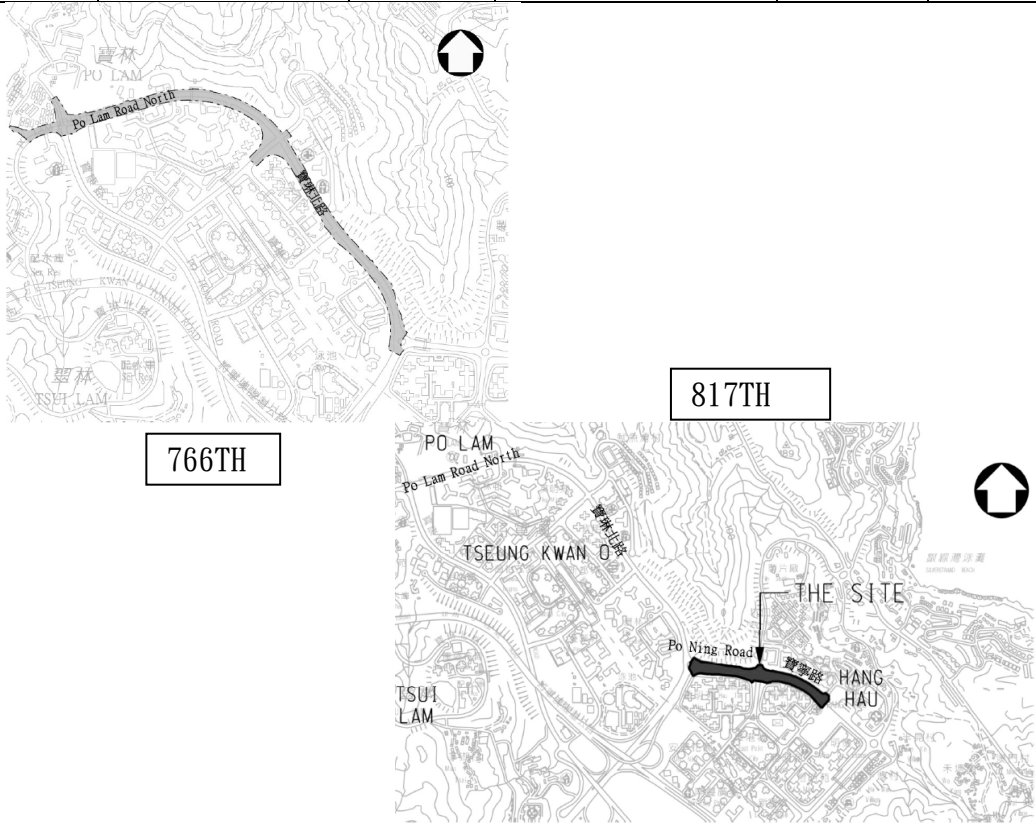
截至 2022 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
B808CL	將軍澳公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程	2,508	房屋局局長 土木工程拓展署	9/2021	2026	在影業路以西北、魷魚灣村以西及香港電影城以東的房屋發展用地進行工地平整和相關的基礎設施工程。 工程範圍包括： (一) 工地平整工程及建造相關的護土牆及斜坡； (二) 擴闊部分現有影業路，和進行相關道路及交界處的改善工程； (三) 修改影業路／寶寧路／常寧路交界處的迴旋處為交通燈控制的地面路口； (四) 在影業路興建行人天橋及相關的升降機設施； (五) 沿寶豐路南行的一段行人路建造行人路上蓋；以及 (六) 進行相關附屬工程，包括環境美化、排水、排污、供水工程等。	將軍澳工地平整及基礎設施工程－影業路的工程合約已於 2021 年 9 月展開。 將軍澳工地平整及基礎設施工程－魷魚灣及百勝角的工程合約已於 2022 年 4 月展開。



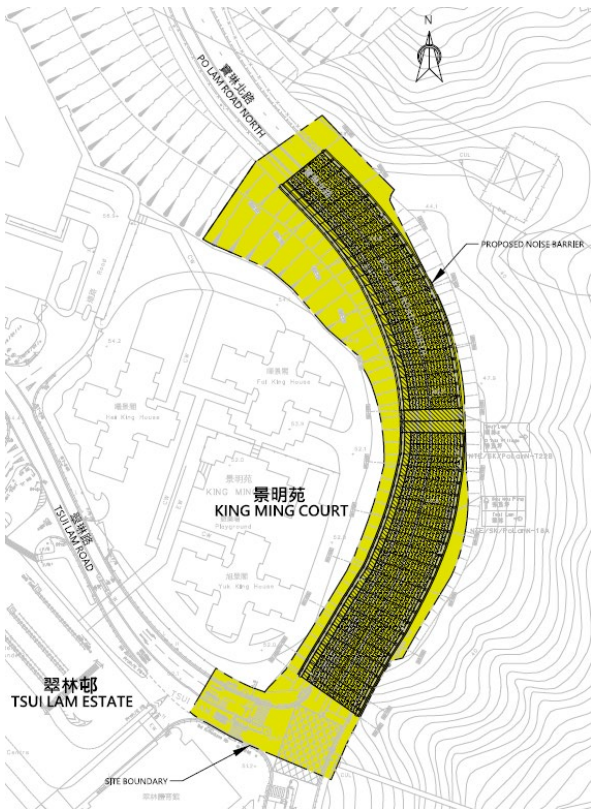
(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
766TH	寶琳北路加建隔音屏障工程	376.0	環境及生態局局長	6/2021	6/2025	工程範圍包括： (一) 766TH - 在介乎寶康路至寶順路之間的一段寶琳北路加建隔音屏障；以及 (二) 817TH - 在介乎寶順路至寶寧里之間的一段寶寧路加建隔音屏障。	工程合約編號 HY/2021/06 已於 2021 年 6 月展開，現正進行土地勘測及地基工程。
817TH	寶寧路加建隔音屏障工程	241.7	路政署				
							

(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
871TH 甲級	寶琳北路(近景明苑)加建隔音屏障工程	180.1	環境及生態局 局長 路政署	6/2022	6/2025	工程主要包括在近景明苑的一段寶琳北路加建隔音屏障。	工程合約編號 HY/2021/21 已於 2022 年 6 月展開，現正進行前期準備工作。
							

(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
5058TF 甲級	濶西村碼頭改善工程	77.8	發展局局長 土木工程拓展署	09/2021	09/2024	工程計劃範圍包括： (一) 拆卸及重建現有碼頭； (二) 建造相關的輔助設施；以及 (三) 就擬議的工程進行環境監察及紓減環境影響的措施。	我們已在 2019 年 4 月 8 日諮詢旅遊及經濟發展工作小組，並得到小組委員支持有關初步設計。 工程已根據《前濱及海床(填海工程)條例》於 2020 年 8 月 21 日刊憲。 工程已於 2021 年 5 月 21 日獲財務委員會批准進行。建築合約已於 2021 年 9 月 13 日展開。臨時碼頭已於 2022 年 6 月 25 日開放使用。現正進行打樁工程。
							

(三) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
5057TF 甲級	糧船灣碼頭 改善工程	62.4	發展局局長 土木工程拓展署	08/2022	07/2025	工程範圍包括： (一) 重建現有碼頭，包括提供靠泊位、斜道、上蓋、照明系統、長椅、太陽能電池板、Wi-Fi 裝置等輔助設施；以及 (二) 就擬議工程實施緩解環境影響措施和進行環境監察。	我們已在 2019 年 4 月 8 日諮詢旅遊及經濟發展工作小組，並得到小組委員支持是項工程。 工程已根據《前濱及海床(填海工程)條例》於 2021 年 1 月 29 日及 2 月 5 日刊憲，並於 4 月 30 日獲批准進行。 工程已於 2022 年 7 月 8 日獲財務委員會批准進行。建築合約(編號 CV/2022/03) 已於 2022 年 8 月 8 日展開。承建商現正進行前期準備工作。



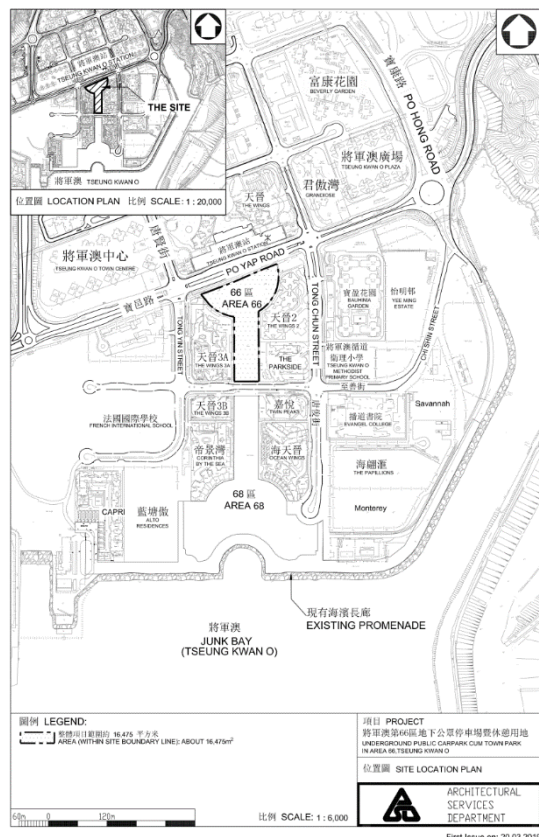
乙部

規劃中及即將進行的工程

（四）康樂及文化設施工程

(四) 康樂及文化設施工程

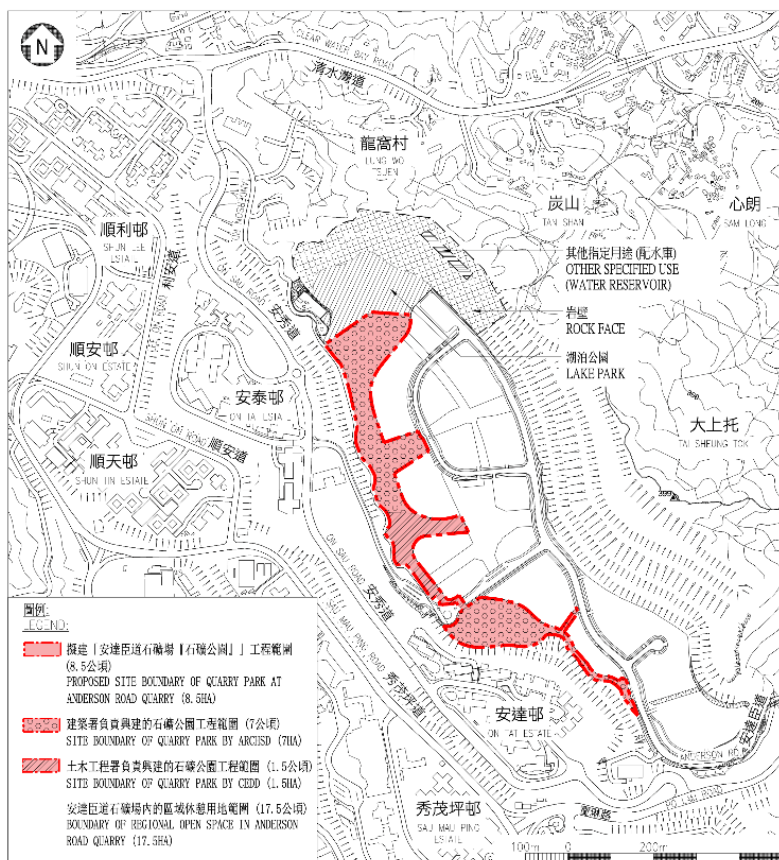
截至 2022 年 12 月

工程編號	工程名稱	決策科首長及 負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
3027TP	將軍澳第 66 區市鎮公園及公眾停車場	運輸及物流局局長 運輸署 建築署	工程計劃中的的擬建設施包括： (一) 園景花園； (二) 中央大道（第 66 區部分）； (三) 有蓋廣場； (四) 健身設施等；以及 (五) 地下公眾停車場等。	由於本項目涉及在分區計劃大綱圖下的休憩用地上興建公眾停車場，須按照《城市規劃條例》獲城市規劃委員會批准相關規劃許可，方能推行工程計劃。運輸署、康文署和建築署已於 2021 年 5 月 4 日就項目的規劃意向徵詢西貢區議會意見並且在 2021 年 12 月 24 日獲得城規會批准。目前政府正在擬備招標文件，如一切順利，將會於 2023 年第一季度展開招標等工作並根據工務工程既定程序期望在 2023 年向立法會申請撥款，隨即於 2024 年開展相關工程。
				

(四) 康樂及文化設施工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號	工程名稱	決策科首長及負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
3478R0	安達臣道石礦場「石礦公園」	文化體育及旅遊局局長 康樂及文化事務署 建築署	工程計劃中的擬建設施包括： (一) 中央草坪及園景花園； (二) 步行／緩跑徑連健身設施； (三) 單車公園及單車亭； (四) 露天劇場； (五) 觀景台； (六) 歷奇遊樂場； (七) 寵物公園； (八) 進行野外定向運動的設施； (九) 2 個多用途戶外籃球/排球場； (十) 2 個五人足球場暨手球場； (十一) 小食亭； (十二) 具有藝術或建築特色的裝置；以及 (十三) 其他附屬設施等。	工程計劃的擬建設施於 2020 年 3 月 17 日獲西貢區議會轄下房屋及規劃發展委員會（現重組為房屋、規劃及環境委員會）支持，其概念設計亦於 2021 年 11 月 23 日獲房屋、規劃及環境委員會支持。康文署現正按既定工務工程程序籌劃有關工程項目。



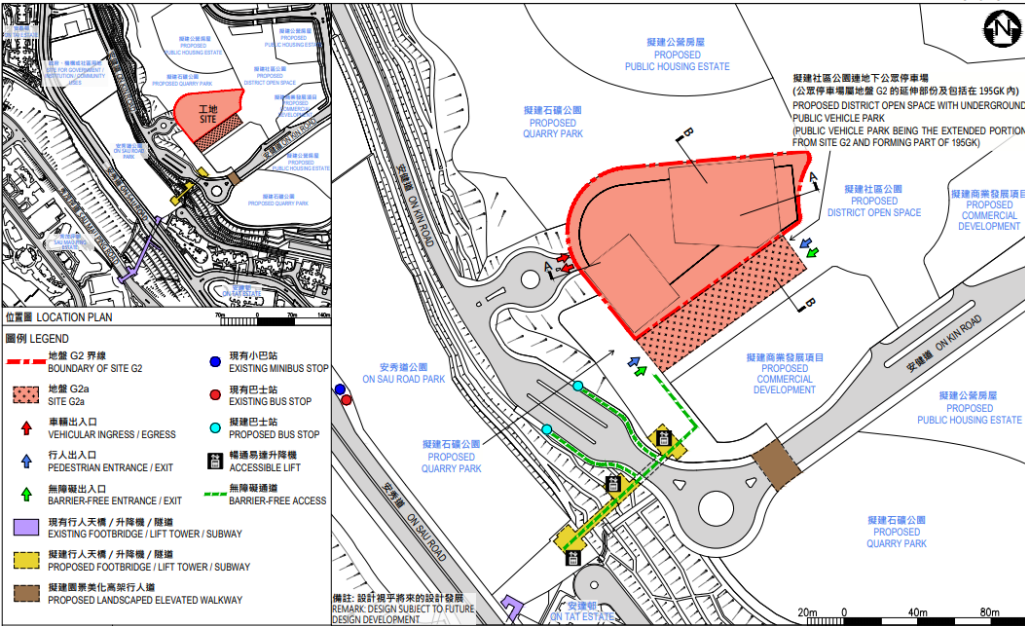
(四) 康樂及文化設施工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號	工程名稱	決策科首長及 負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
3195GK	安達臣道石礦場 G2 地盤聯用綜合大樓	發展局局長 政府產業署 建築署	項目中的擬建設施包括： <u>小型公共圖書館</u> - 成人及兒童圖書館、報刊閱覽室、推廣活動室及學生自修室；以及 - 圖書館自助設施，如領取預約資料的自助服務機/櫃、多功能自助服務機、自助借書機及還書箱等。 <u>社區會堂</u> - 一個可設置 450 個座位連舞台的多用途禮堂； - 一個多用途舞台會客室；以及 - 一個多用途會議室。 <u>體育館</u> - 一個可用作兩個籃球場或兩個排球場或八個羽毛球場或一個手球場或一個五人足球場的多用途主場； - 一個設有 300 個座位的摺合式活動看台； - 兩間多用途活動室（可合併為一個大型多用途活動室）； - 一間乒乓球室； - 一間健身室；以及 - 一間兒童遊戲室。	工程項目的撥款建議於 2022 年 7 月 8 日獲立法會財務委員會批准，招標工作正在進行中，預計可於 2023 年展開工程。
				

(四) 康樂及文化設施工程(續)

截至 2022 年 12 月

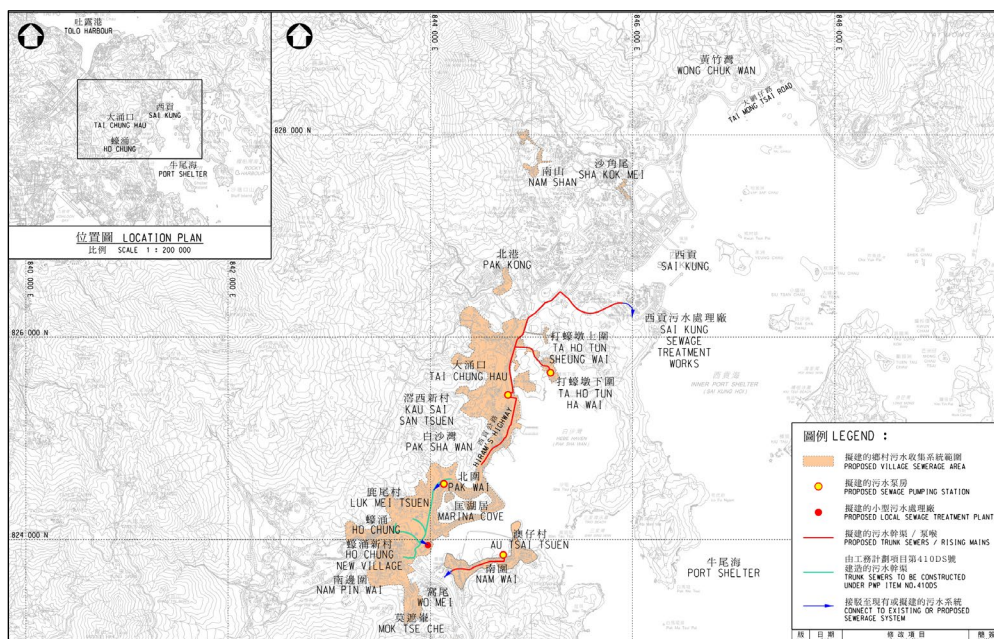
工程編號	工程名稱	決策科首長及 負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
			<u>社會福利設施</u> - 長者日間護理中心（40 個服務名額）； - 安老院舍（100 個宿位）暨長者日間護理單位（30 個服務名額）； - 綜合青少年服務中心； - 綜合家庭服務中心； - 精神健康綜合社區中心分處； - 到校學前康復服務辦事處（100 個服務名額）； - 特殊幼兒中心（60 個服務名額）； - 早期教育及訓練中心（60 個服務名額）；以及 - 市區單身人士宿舍（40 個宿位）。 <u>地庫公眾停車場</u>	

(五) 水務及渠務工程

(五) 水務及渠務工程

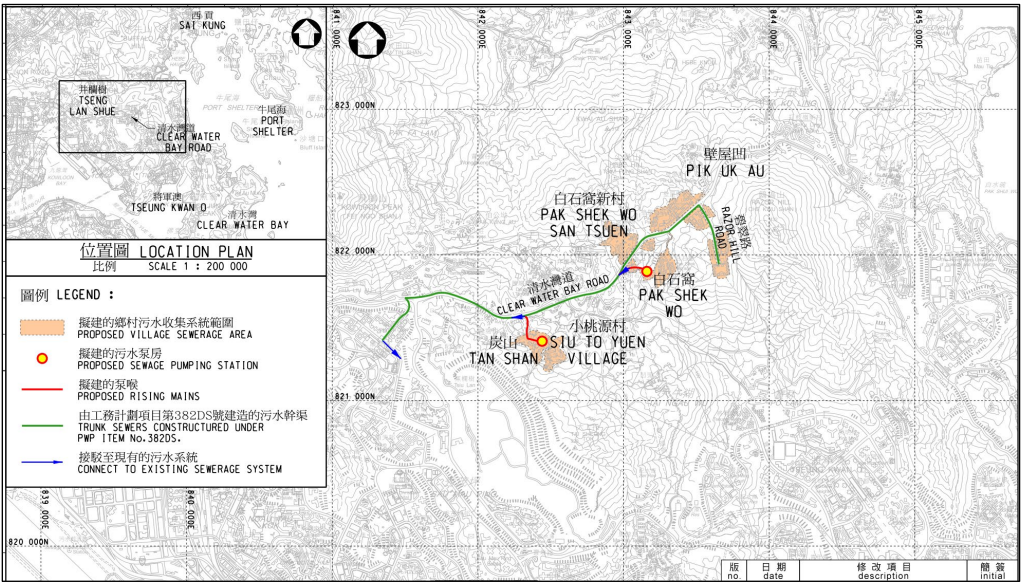
截至 2022 年 12 月

工程編號	工程名稱	決策科首長及 負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
272DS (272DS-1 部分工 程項目於 2022 年 的基本工程計劃 資源分配工作中 提升為乙級)	牛尾海污水收 集系統第二階 段	環境及生態局局長 渠務署	工程目的是改善鄉村衛生環境，減低河流及水域污染，從而保障公眾健康。工程主要是在以下地方興建污水收集系統： (一) 大涌口和白沙灣一帶地區(包括打蠔墩下圍、打蠔墩上圍、滘西新村等、大涌口及白沙灣)； (二) 蠔涌一帶地區(包括北圍、鹿尾村、蠔涌、蠔涌新村、南邊圍、莫遮輦、窩美(餘下部分)、澳仔村及南圍等)；以及 (三) 西貢西郊部份地區(包括南山、北港及沙角尾的餘下部份)。	渠務署已於 2022 年 10 月聘請顧問公司進行項目詳細設計。 渠務署將委託路政署於擬議的西貢公路改善工程第二期工程項目一併建造在匡湖居和康健路之間沿西貢公路的污水幹渠工程。



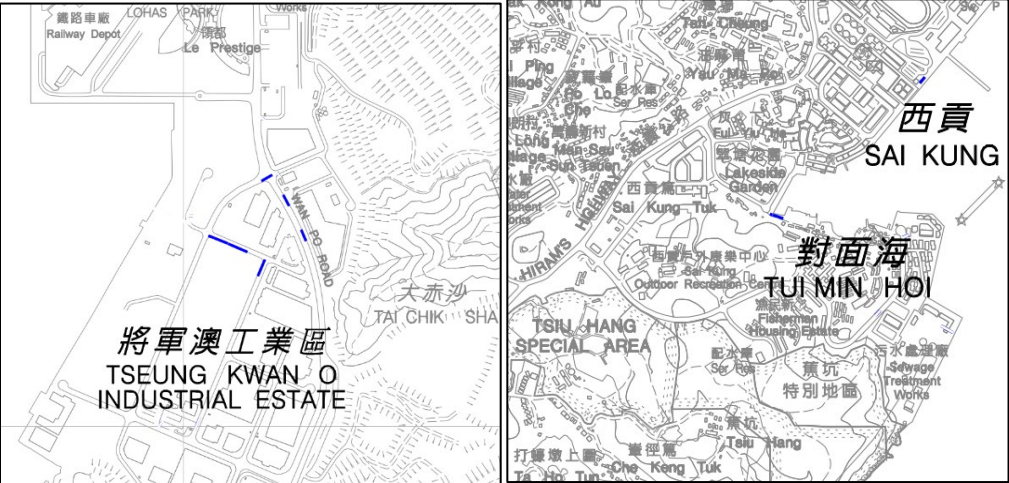
(五) 水務及渠務工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號	工程名稱	決策科首長及 負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
273DS	牛尾海污水收集系統 第三階段	環境及生態局局長 渠務署	工程目的是改善鄉村衛生環境，減低河流及水域污染，從而保障公眾健康。工程主要是在以下地方興建污水收集系統： (一) 炭山、小桃源村、白石窩、白石窩新村及壁屋凹。	我們現正檢討工程設計。
				

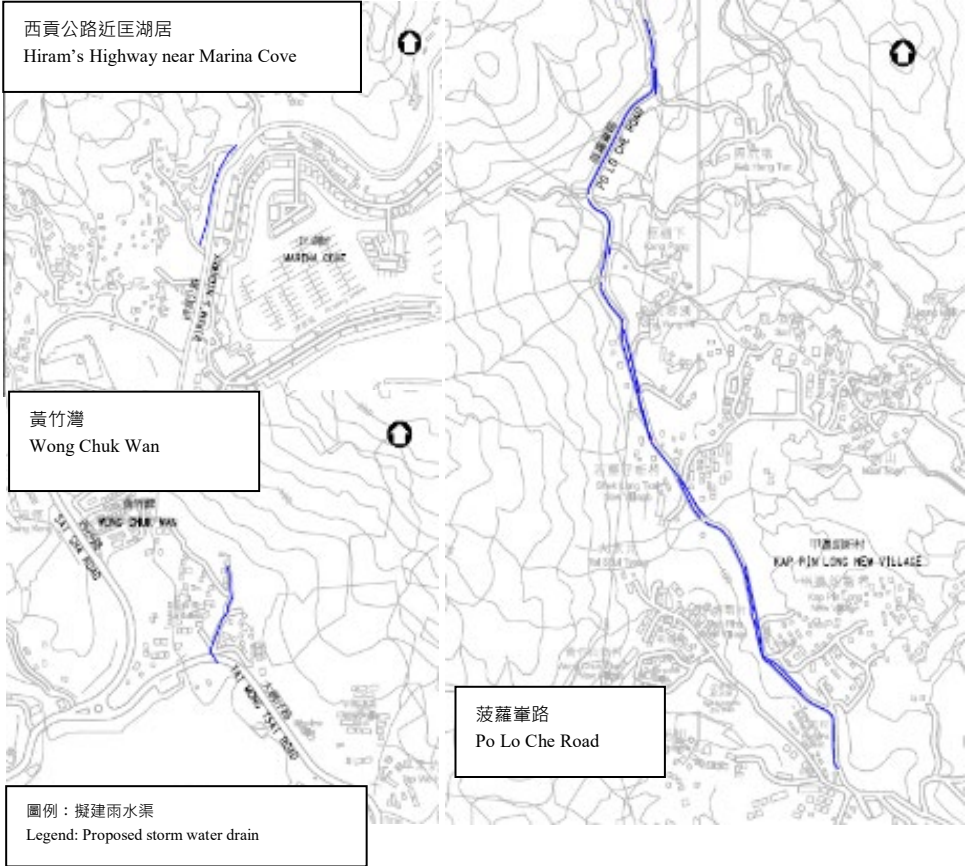
(五) 水務及渠務工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號	工程名稱	決策科首長及 負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
414DS	地下污水渠修復工程 — 餘下工程	環境及生態局局長 渠務署	會為西貢區內約 250 米長的地下污水渠進行修復。	工程已於 2020 年 8 月諮詢西貢區議會，並正在詳細設計階段。工程合約預計於 2023 年第 3 季展開。
 — 擬修復的污水				

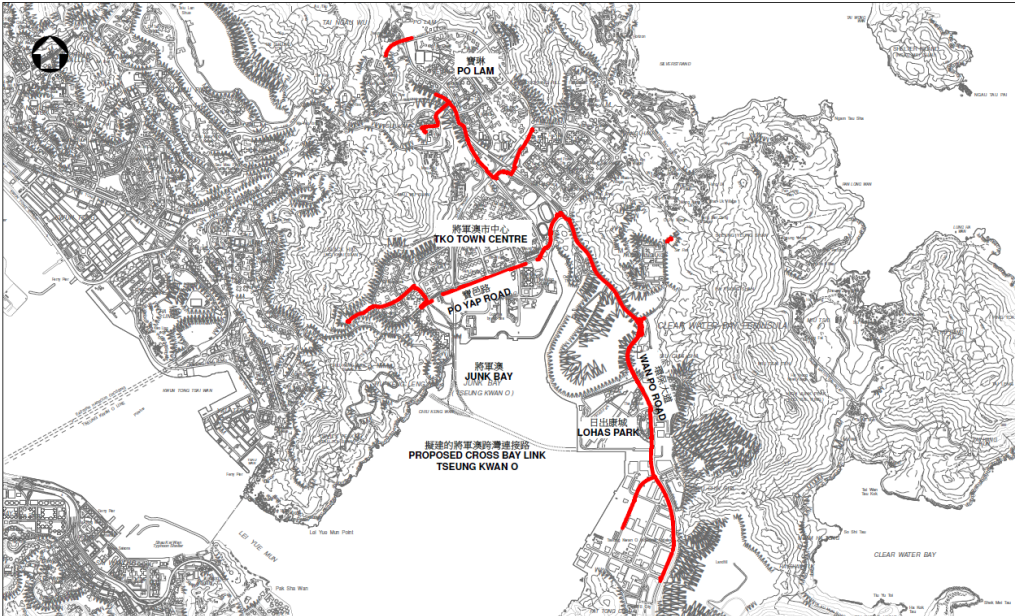
(五) 水務及渠務工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號	工程名稱	決策科首長及 負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
182CD	沙田及西貢雨水排放系統改善工程	發展局局長 渠務署	工程目的是提升沙田及西貢地區雨水排放系統的防洪能力，工程包括在西貢菠蘿峯路、西貢公路近匡湖居、黃竹灣建造總長約 2.5 公里、直徑介乎 375 毫米至 1350 毫米的雨水渠。	相關的勘查研究已於 2021 年內完成，我們現正進行詳細設計工作。
 西貢公路近匡湖居 Hiram's Highway near Marina Cove 黃竹灣 Wong Chuk Wan 菠蘿峯路 Po Lo Che Road 圖例：擬建雨水渠 Legend: Proposed storm water drain				

(五) 水務及渠務工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號	工程名稱	決策科首長及 負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
9374WF-1	內壁瀝青保護層食水管改善工程 — 第一批優先處理水管 — 第一階段	發展局局長 水務署	工程會在西貢區內更換及修復約 10 公里長有內壁瀝青保護層剝落問題的食水水管及在供水網絡內安裝濾水網。	顧問公司已於 2022 年 4 月展開更換及修復工程的走線及施工方法的勘測和設計，工程預計於 2023 年底前展開。
				

(六) 土地開拓、道路及其他工程

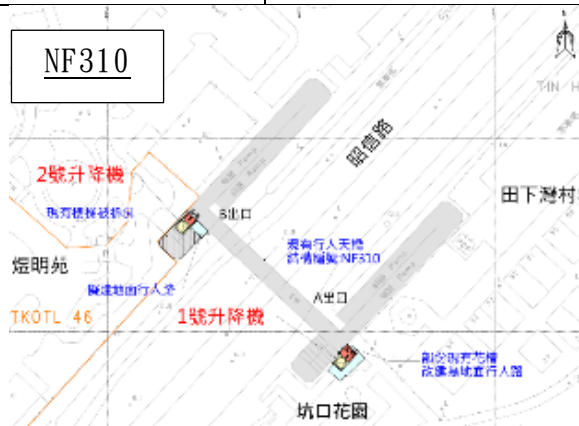
(六) 土地開拓、道路及其他工程

截至 2022 年 12 月

工程編號	工程名稱	決策科首長及 負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
806TH	匡湖居至西貢市之間的一段西貢公路分隔車道工程	運輸及物流局局長 運輸署 路政署	工程主要包括改善由匡湖居至西貢市中心的一段西貢公路、普通道及沙下南的一段大網仔路。目的是為應付現時及預計的交通需求，並紓緩交通擠塞情況。	路政署已於 2022 年 4 月聘請工程顧問就項目展開設計。設計工作及土地勘測工程現在進行中。
				

(六) 土地開拓、道路及其他工程(續)

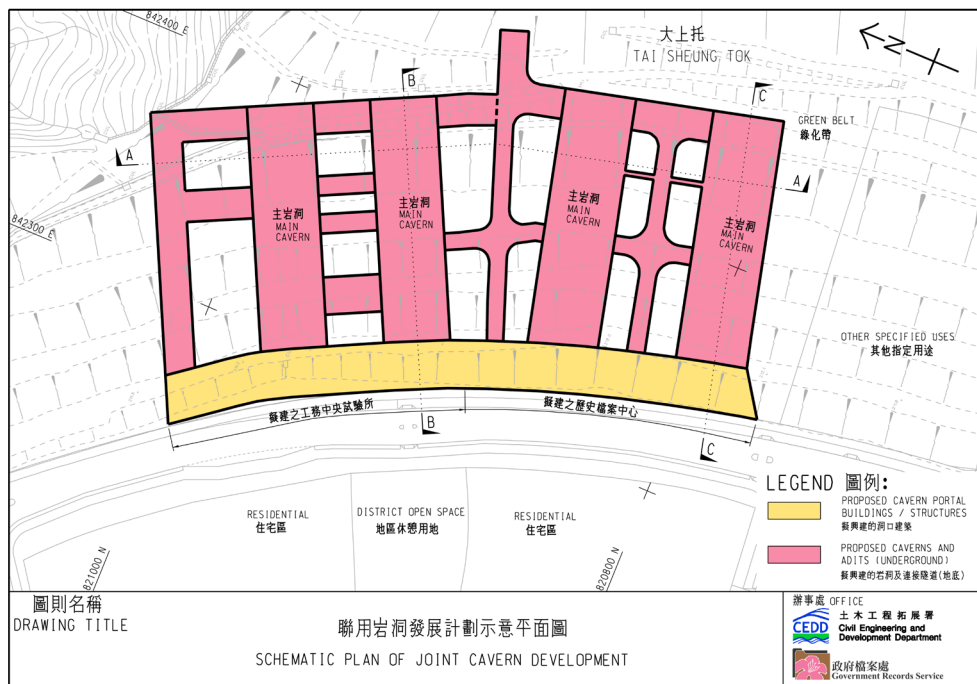
截至 2022 年 12 月

工程編號	工程名稱	決策科首長及 負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
6101TX	為行人天橋、高架行人道及行人隧道提供暢道通行設施 — 第三組 — 勘查研究、設計及建造	運輸及物流局局長 路政署	擬建設施包括： (一) 為橫跨昭信路近田下灣村的行人天橋（結構編號:NF310）加建的兩部升降機；以及 (二) 為橫跨翠琳路連接翠林商場及景明苑的行人天橋（結構編號:SK02）加建的一部升降機。	就結構編號 NF310，工程已於 2022 年 4 月 22 日按《道路(工程、使用及補償)條例》(第 370 章)獲授權進行。路政署現正為建造此工程項目進行招標工作，工程合約已於 2022 年 12 月展開。 路政署已於 2022 年 9 月為橫跨翠琳路連接翠林商場及景明苑的行人天橋（結構編號:SK02）加建一部升降機的建造工程項目進行招標工作。
 The map for NF310 shows the proposed pedestrian bridge and lift locations near Tin Tin Village and Tin Tin Road. Key features include: 2號升降機 (Lift 2), 1號升降機 (Lift 1), 擬建行人天橋 (Proposed pedestrian bridge), 擬建行人道 (Proposed pedestrian path), 田下灣村 (Tin Tin Village), 昭信路 (Tin Tin Road), 坑口花園 (Tin Tin Garden), 景明苑 (King Ming Court), 翠林商場 (Tsui King Mall), 翠琳路 (Tsui Lin Road), 翠林新城 (Tsui King New Town), 景明苑 (King Ming Court), 翠林商場 (Tsui King Mall), 翠琳路 (Tsui Lin Road), 翠林新城 (Tsui King New Town).		 The map for SK02 shows the proposed pedestrian bridge and lift location near King Ming Court and Tsui King Mall. Key features include: 擬建行人天橋 (Proposed pedestrian bridge), 擬建行人道 (Proposed pedestrian path), 景明苑 (King Ming Court), 翠林商場 (Tsui King Mall), 翠琳路 (Tsui Lin Road), 翠林新城 (Tsui King New Town), 景明苑 (King Ming Court), 翠林商場 (Tsui King Mall), 翠琳路 (Tsui Lin Road), 翠林新城 (Tsui King New Town).		

(六) 土地開拓、道路及其他工程(續)

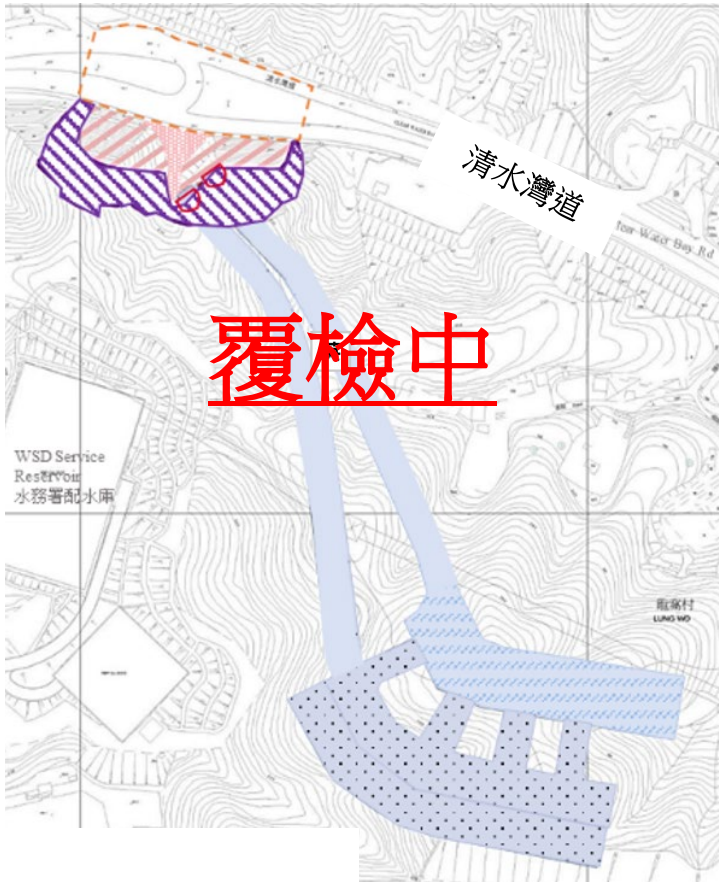
截至 2022 年 12 月

工程編號	工程名稱	決策科首長及負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
7851CL 及 5792CL	安達臣道石礦場用地聯用岩洞發展 — 遷置工務中央試驗所及興建政府檔案處歷史檔案中心	發展局局長 (遷置工務中央試驗所) 行政署長 政務司司長辦公室/政府檔案處 (政府檔案處歷史檔案中心) 土木工程拓展署	工程計劃包括： (一) 在岩洞總綱圖中位於大上托的第 28 號策略性岩洞區內建築四個主岩洞及兩座洞口建築物； (二) 進行相關的岩土工程、道路工程、綜合岩洞結構的建築工程、裝置屋宇設備、裝置防火安全及緊急設施等；以及 (三) 搬遷及重置工務中央試驗所和設置歷史檔案儲存設施及儀器。	部門曾於 2020 年 9 月 17 日及 9 月 28 日，以「安達臣道石礦場聯用岩洞發展計劃」就此項目的概念設計分別諮詢觀塘區議會轄下房屋規劃及地政事務委員會及西貢區議會轄下房屋及規劃發展委員會。 我們已委托顧問進行有關勘察研究檢討、工地勘測工程及擬議工程的參考設計。



(六) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號	工程名稱	決策科首長及負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
5188DR	發展大上托廢物轉運站	環境及生態局局長 環境保護署	設計及建造地下岩洞內的大上托廢物轉運站，以應付東九龍及西貢區的廢物轉運需求(區內現時沒有都市固體廢物接收設施)。轉運站所接收的都市固體廢物會被壓縮，然後裝入特製的貨櫃內，再轉運至指定堆填區或其他的都市固體廢物處理設施作最終處理。	本署已於 2021 年 5 月就項目開展顧問研究，進行詳細技術研究和環境影響評估，並逐步收集相關持分者和地區人士的意見。 環保署預計在 2023 年就項目發展諮詢相關區議會的委員會。
 擬議大上托廢物轉運站位置				

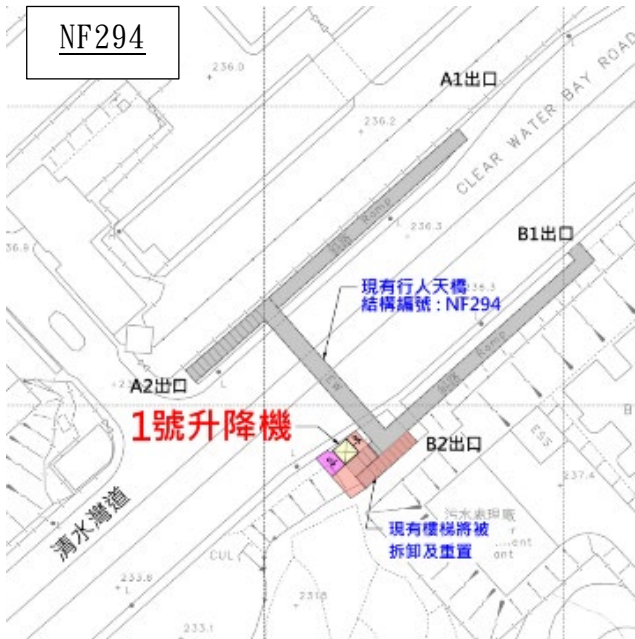
(六) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號	工程名稱	決策科首長及 負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
6101TX	為行人天橋、高架行人道及行人隧道加建人人暢道通行設施 — 第七組 — 勘查研究、設計及建造	運輸及物流局局長 路政署	擬建設施包括： (一) 為橫跨寶寧路近將軍澳醫院的行人隧道（結構編號: NS149）加建的一部升降機； (二) 為橫跨清水灣道近壁屋懲教所的行人天橋（結構編號: NF294）加建的一部升降機；以及 (三) 為橫跨景嶺路近香港知專設計學院的行人天橋（結構編號: SK03）加建的一部升降機。	路政署已於 2022 年 10 月為橫跨寶寧路近將軍澳醫院行人隧道（結構編號: NS149）加建一部升降機的建造工程項目進行招標工作。
NS149 部分現有將軍澳醫院池畔花園圍欄將被拆卸並重置 1號升降機 部分現有斜坡將被改建 部分現有護牆將被拆卸 現有行人隧道 結構編號: NS149 A1出口 A2出口 B出口 將軍澳醫院健康中心 Tsung Kwai O Po Ning Road Health Centre				

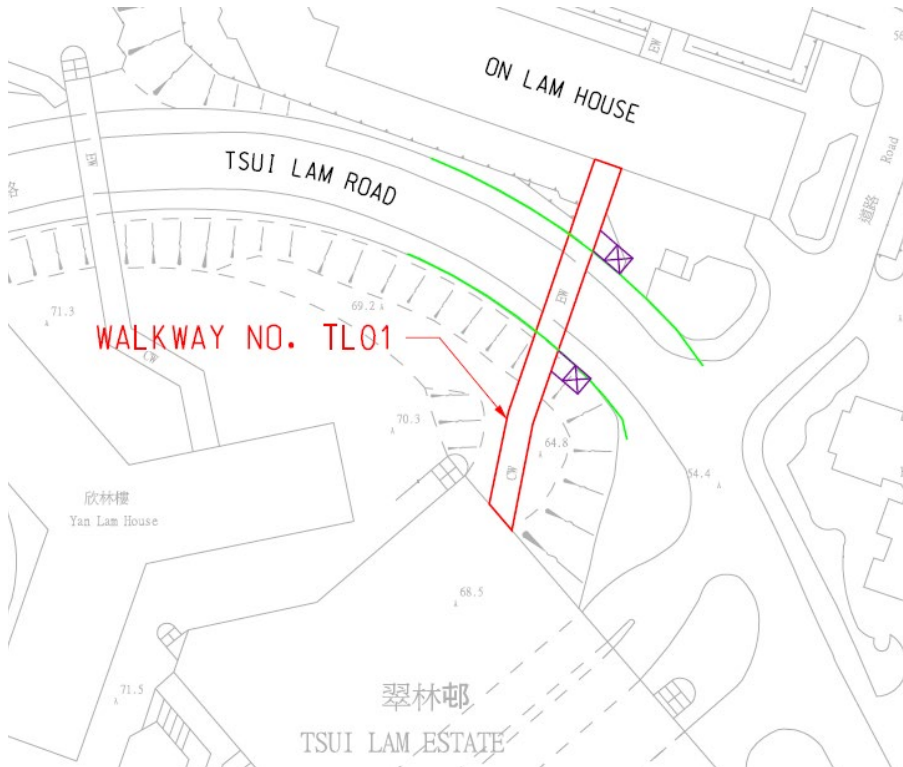
(六) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2022 年 12 月

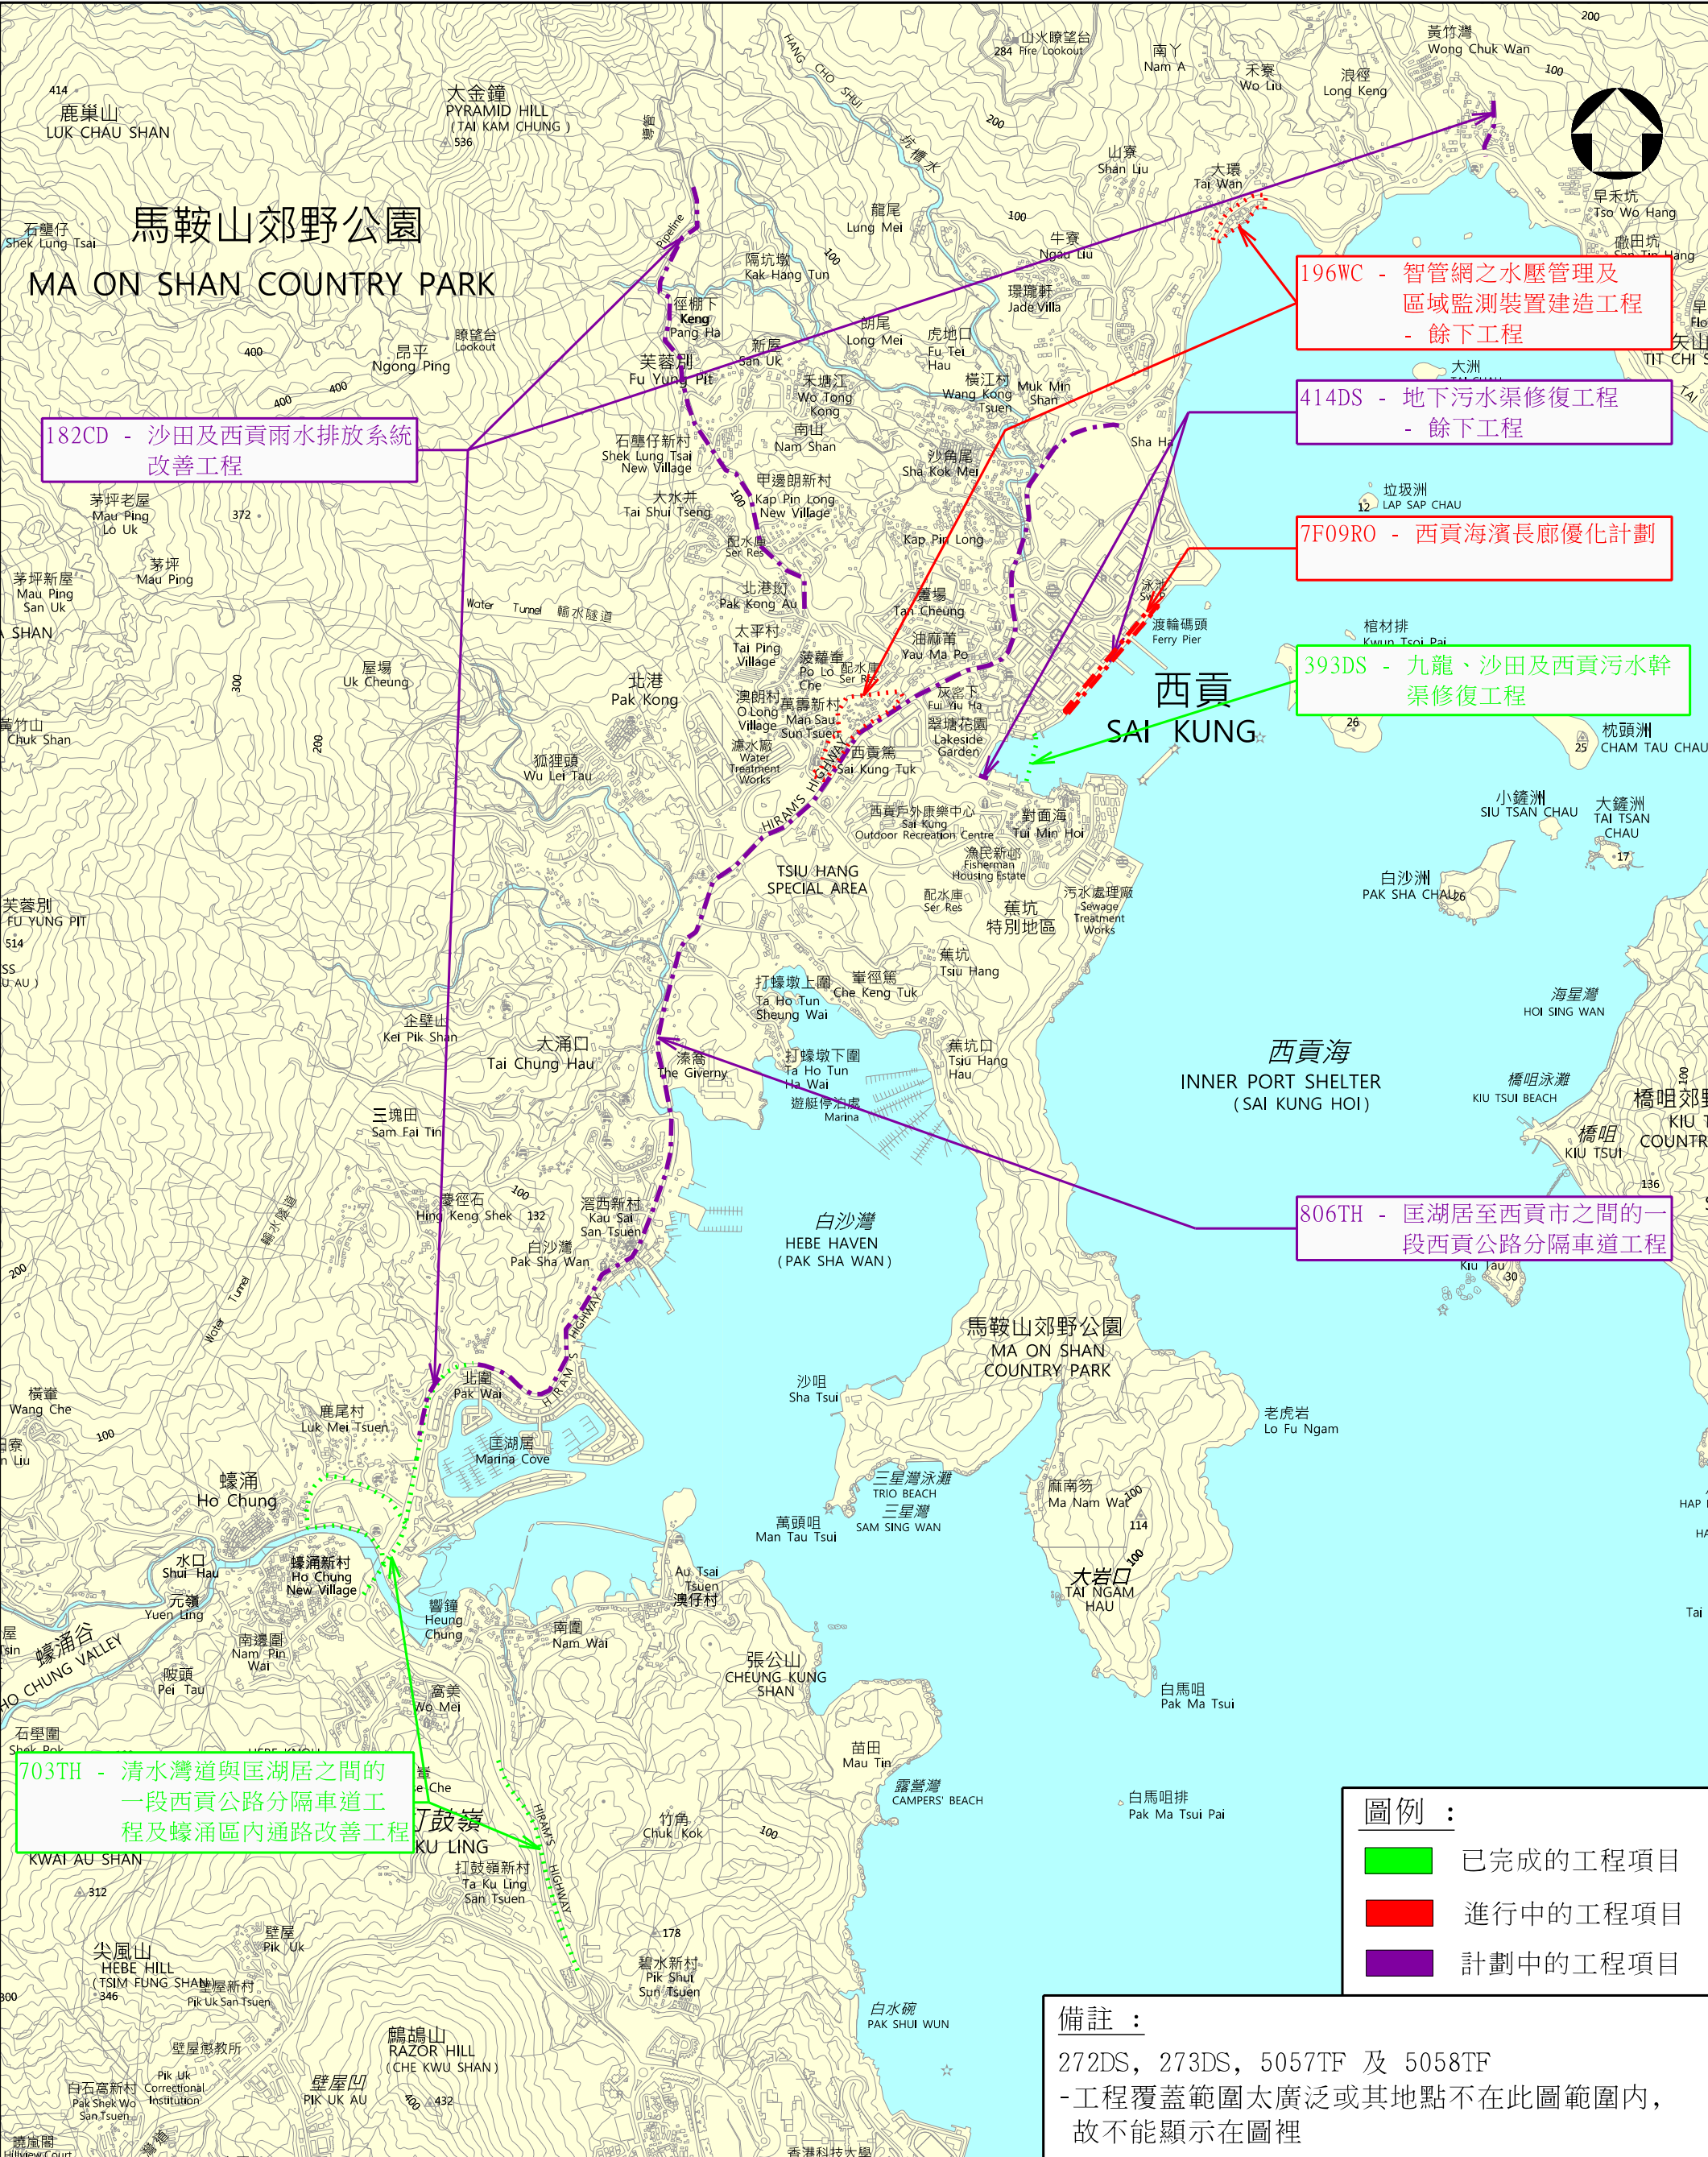
工程編號	工程名稱	決策科首長及 負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
	 			路政署已於 2022 年 10 月為橫跨清水灣道近壁屋懲教所行人天橋（結構編號:NF294）加建一部升降機的建造工程項目進行招標工作。 路政署已於 2022 年 10 月為橫跨景嶺路近香港知專設計學院行人天橋（結構編號:SK03）加建一部升降機的建造工程項目進行招標工作。

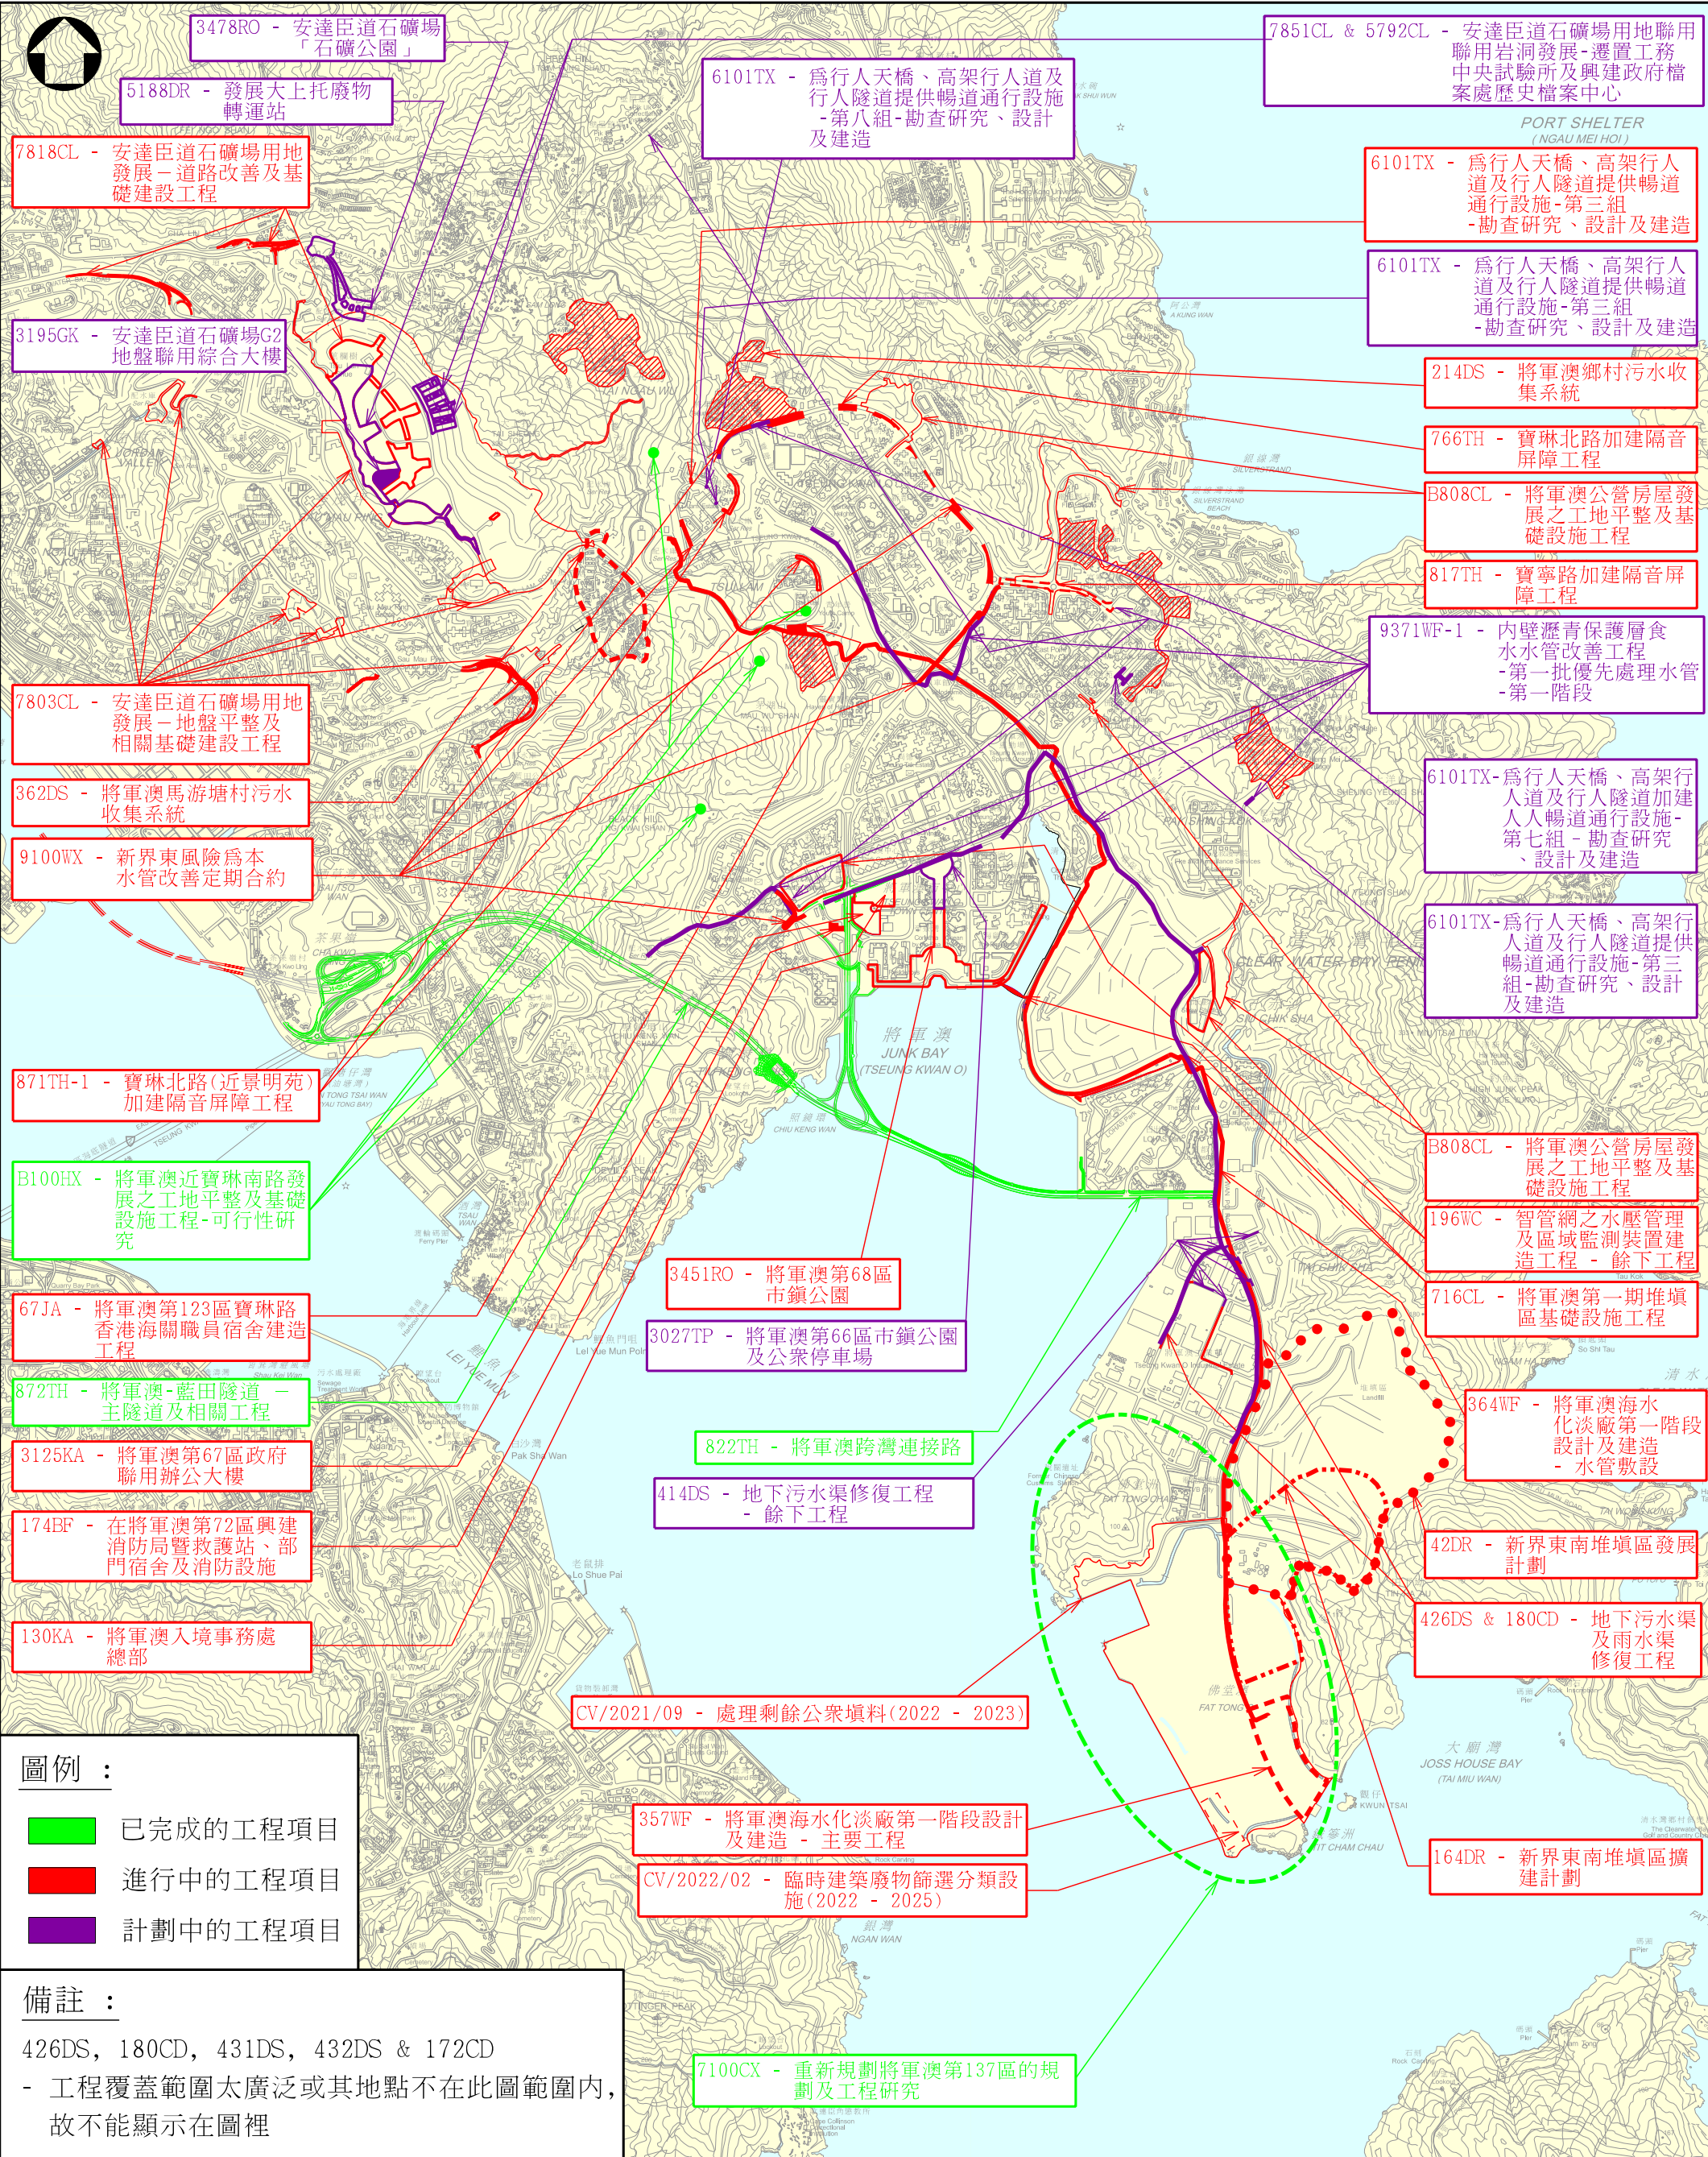
(六) 土地開拓、道路及其他工程(續)

截至 2022 年 12 月

工程編號	工程名稱	決策科首長及 負責部門/機構	工程內容/備註	工程進度/現況
6101TX	為行人天橋、高架行人道及行人隧道提供暢道通行設施 — 第八組 — 勘查研究、設計及建造	運輸及物流局局長 路政署	擬建設施包括為橫跨翠琳路連接翠林邨停車場及安林樓的行人天橋（行人天橋編號:TL01）加建的兩部升降機。	路政署已於 2022 年 9 月為橫跨翠琳路連接翠林邨停車場及安林樓行人天橋（行人天橋編號:TL01）加建兩部升降機的建造工程項目進行招標工作。
				

附件





圖則名稱 drawing title	繪圖 drawn	簽署initial	日期date	項目編號 item no.	辦事處 office
	Y W CHIU		21.12.2022		
	核對 checked	簽署initial	日期date	比例 scale	
				1 : 30 000	
將軍澳主要工程項目位置圖 (2022年12月)	核准 approved	簽署initial	日期date	圖則編號 drawing no.	土木工程拓展署 CIVIL ENGINEERING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT
				CDESAKZ0235	
