



西貢公路改善工程


西貢區議會
西貢公路改善工程工作小組
第一次會議
27.2.2020



路政署
HIGHWAYS DEPARTMENT
主要工程管理處
Major Works Project Management Office


為何需要改善西貢公路？

- 西貢公路路面狹窄、車流繁忙，再加上不時有車輛上落客，導致經常擠塞
- 一旦遇上交通事故或緊急工程，更造成全日交通癱瘓
- 要徹底解決目前交通的問題，增強西貢公路的應變能力，必須進行西貢公路改善工程
- 擴闊路面後，水管重鋪和渠道敷設工程才有機會進行，以改善有關基建

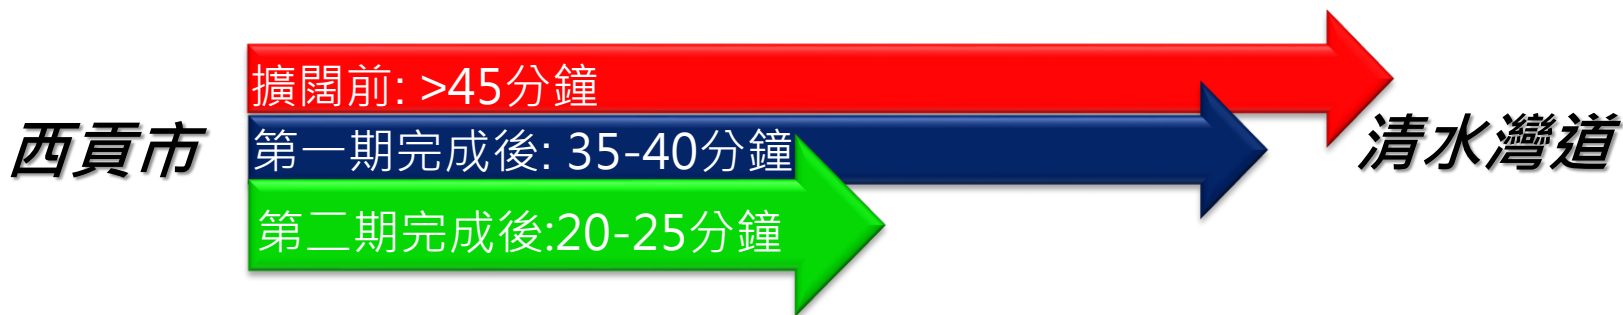


為何需要改善西貢公路?

雙程單線不分隔車道



雙程雙線分隔車道

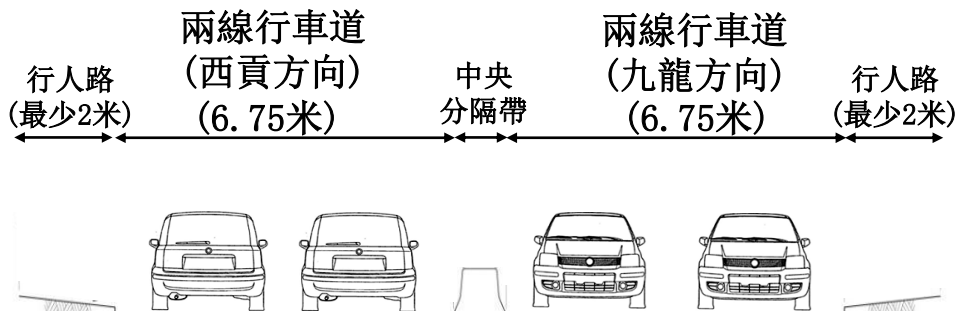

內容大綱

西貢公路第一期改善工程

➤ 工程概要及進度




西貢公路 第一期改善工程

工程概要

開工日期	2016年3月
1. 嘉林別墅段	已於2019年年底通車
2. 匡湖居段	預計於2020年年底通車
整體完成率	約70%

工程進度 - 嘉林別墅段

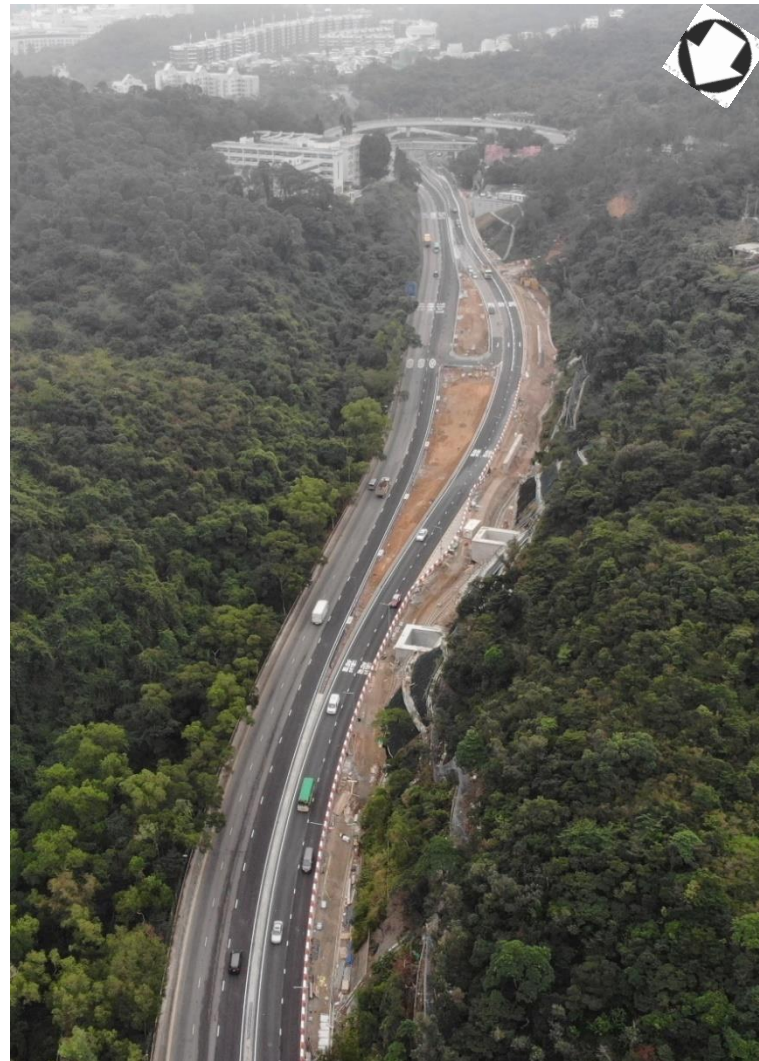


工程進度 - 匡湖居段



路政署
HIGHWAYS DEPARTMENT
主要工程管理處
Major Works Project Management Office

工程進度 - 匡湖居段

主要項目	完成率
新蠔涌橋	75%
南邊圍行人天橋	60%
斜坡工程	90%
隔音屏	77%
護土牆	85%
道路工程	42%

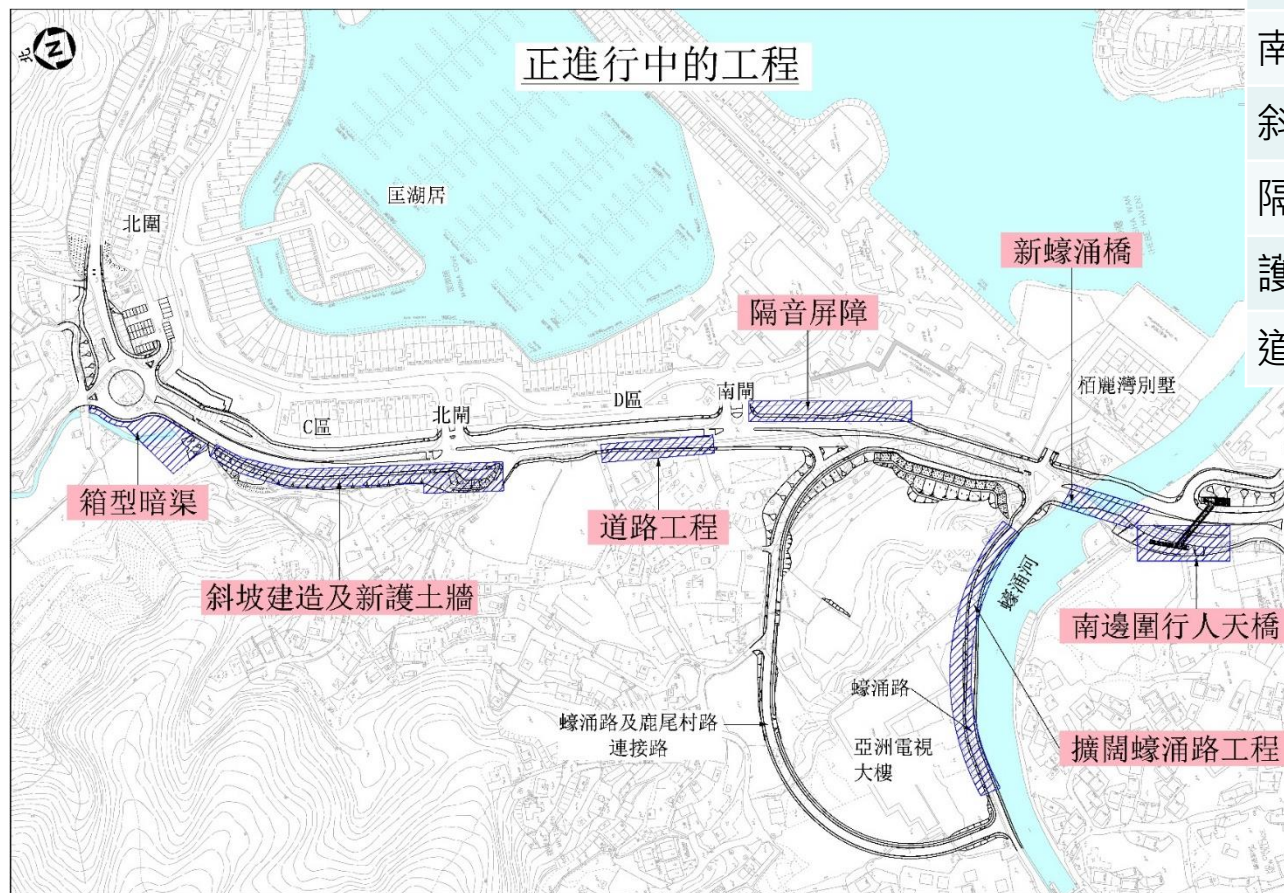

新蟬涌橋拱形結構裝配



路政署
HIGHWAYS DEPARTMENT
主要工程管理處
Major Works Project Management Office

蠔涌路改善工程



路政署
HIGHWAYS DEPARTMENT
主要工程管理處
Major Works Project Management Office

近北圍擋土牆工程



路政署
HIGHWAYS DEPARTMENT
主要工程管理處
Major Works Project Management Office

近慶徑石路的道路及渠務工程




路政署
HIGHWAYS DEPARTMENT
主要工程管理處
Major Works Project Management Office

臨時交通改道安排


編號	重要工序	預計日期	狀況
1	<u>臨時將一段近蠔涌的西貢公路往西貢方向的行車道向西遷移</u>	2020年4月	安排中
2	臨時將一段近匡湖居的西貢公路來回行車道向西遷移	2020年年中	工程進度理想
3	<u>實施臨時交通改道</u>，包括以下安排： (i) 蠔涌橋的交通改行西面部分 (ii) 將交通管制路口從鹿尾村路復原至近蠔涌路 (iii) 開放擴闊後的蠔涌路 (iv) 封閉近臨時交通管制路口的一段鹿尾村路	2020年9月	工程進度理想
4	開放西貢公路(匡湖居段)擴闊後的來回行車道(南北行各兩線)	2020年12月	工程進度理想



臨時交通改道安排 - 2020年4月

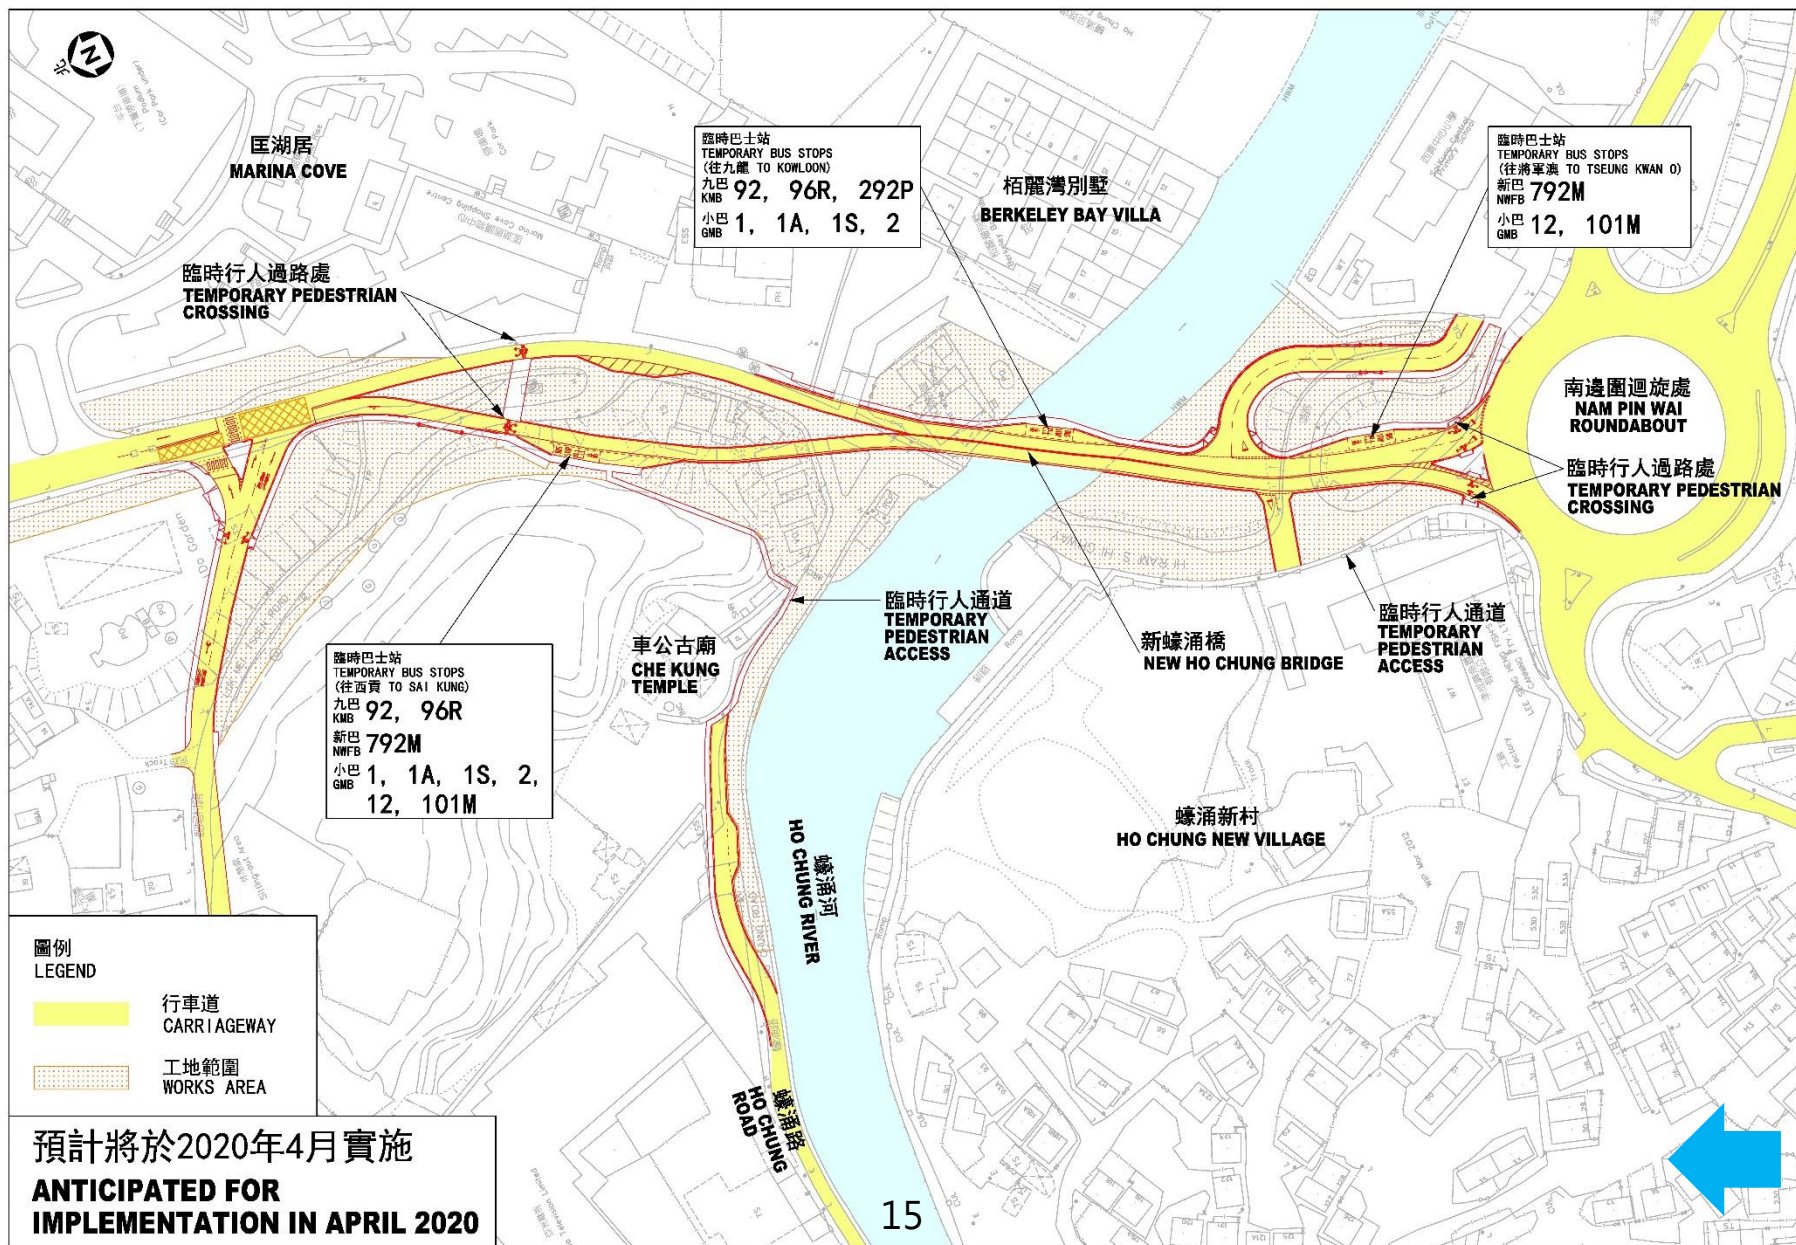

臨時交通改道安排 - 2020年9月

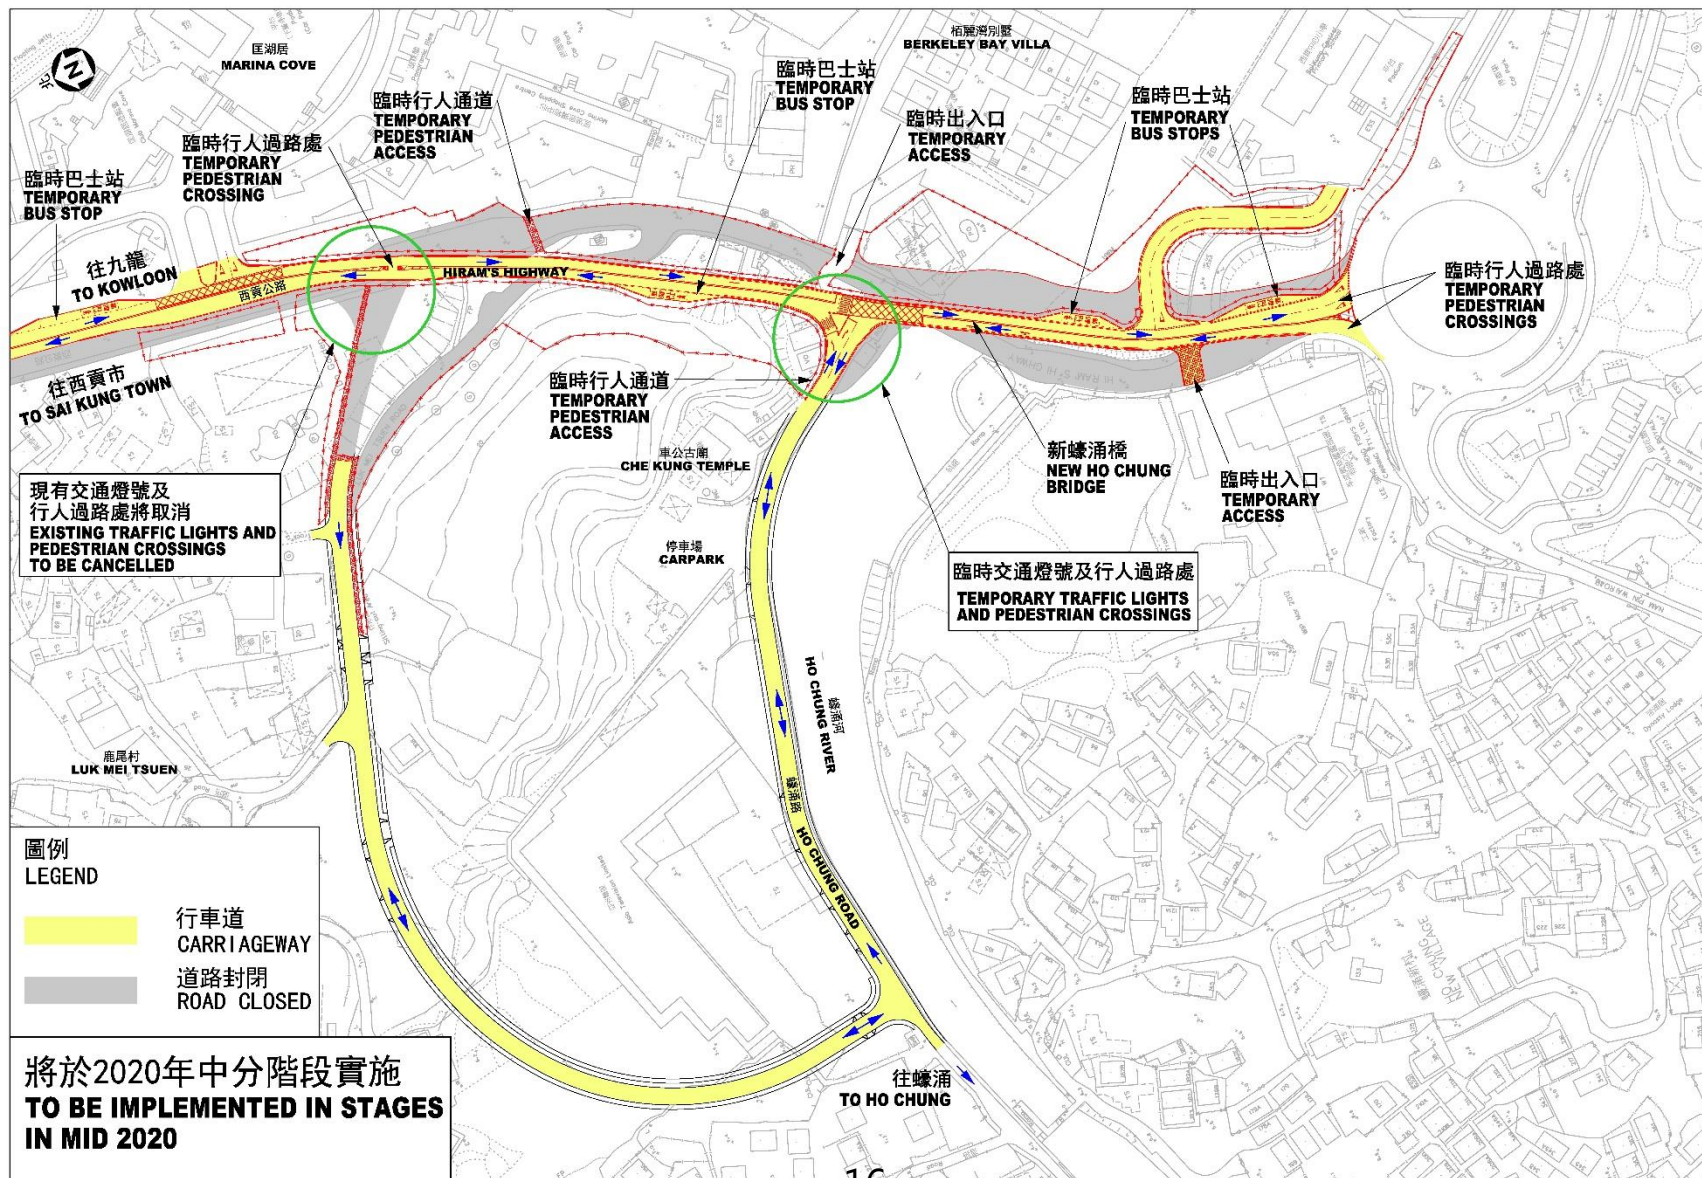

多謝
