

屯門區議會 2024 年度
地區設施管理委員會第二次會議
(2024 年 3 月 19 日)



主要工程項目進度報告

土木工程拓展署
西拓展處
2024 年 3 月

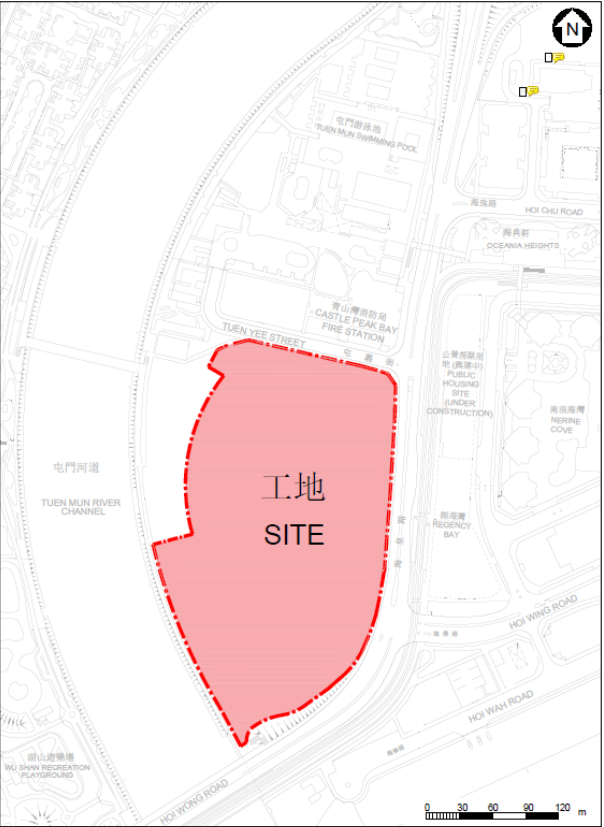
屯門區主要工程項目進度報告（截至 2024 年 2 月 15 日止）

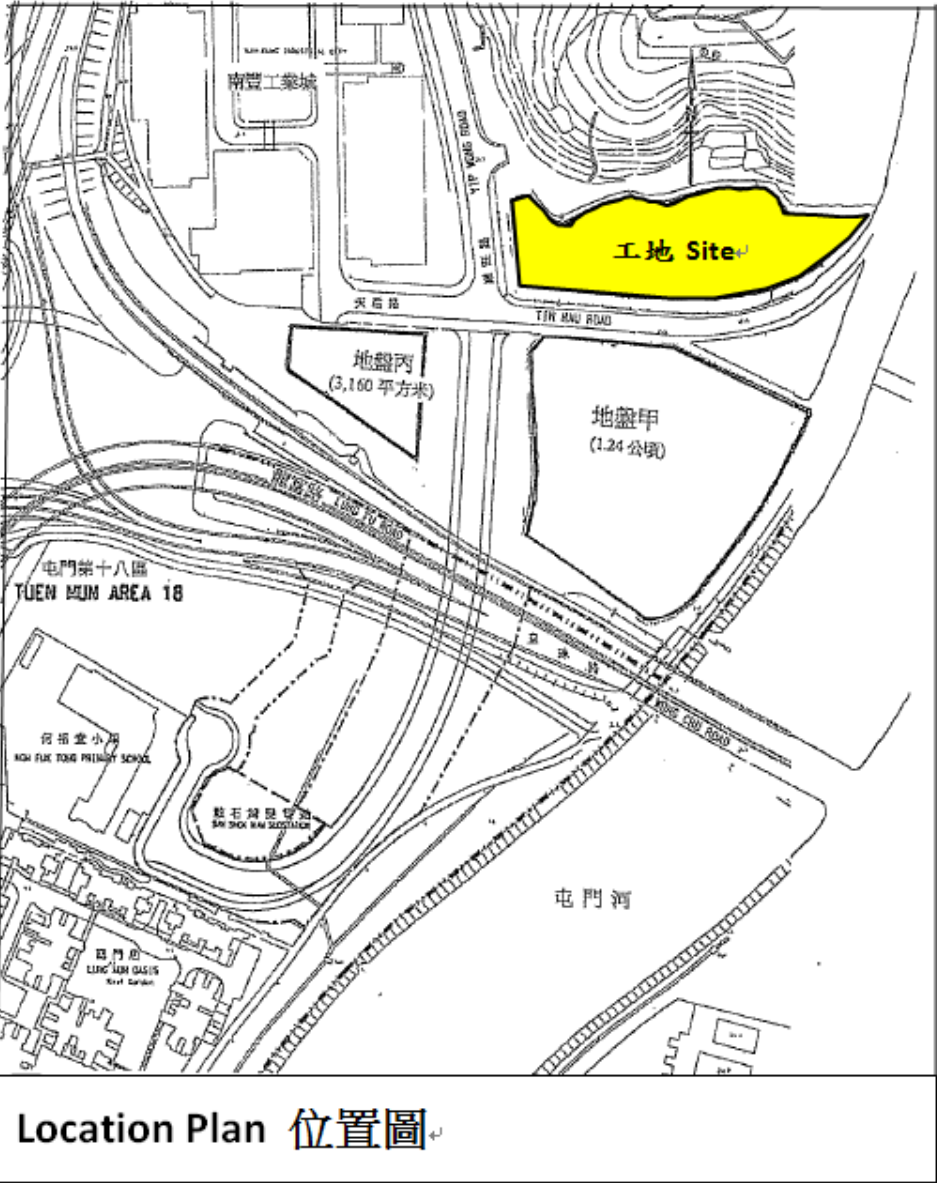
<u>目錄</u>	<u>頁數</u>
(1) 康樂及文化設施項目	3
(2) 道路工程項目	8
(3) 渠務工程項目	9
(4) 水務工程項目	14
(5) 其它工程項目	15

(1) 康樂及文化設施項目

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
第一階段 不適用 (小型建築工程)	第一階段 屯門第 27 區 工地乙二休憩 用地	25	第一階段 康樂及文化 事務署、 建築署	第一階段 (08/2021) 08/2021	第一階段 (08/2023) 06/2024	屯門區議會轄下的地區設施管理委員會(地委會)於2019年4月2日支持工程計劃修訂的擬建設施及分階段推行工程計劃，以讓市民可盡早使用部分設施。第一階段先由康文署推展，在工地乙二興建休憩設施，包括燈塔(觀賞性質)及觀景台、園景及洗手間設施。第二階段由運輸署負責推展，計劃在工地甲和工地乙一興建公眾停車場和靜態休憩設施，如園景、兒童遊樂處、健身角、太極廣場及海濱長廊、設有避雨亭的休憩處及輔助設施等。	
第二階段 3029TP/C	第二階段 屯門第 27 區 (工地甲及乙一)休憩用地及公眾停車場	待定	第二階段 運輸署、 康樂及文化 事務署、 建築署	第二階段 檢討中	第二階段 檢討中	康文署於2021年2月9日及4月2日就第一階段工程(乙二休憩用地)概念設計徵詢地委會意見，地委會支持沒有燈塔的設計方案，工程計劃已於2021年8月展開，預計於本年內完成。 運輸署及康文署亦已於2020年6月2日就第二階段工程計劃的擬建設施取得地委會的支持。由於第二階段工程需向城市規劃委員會申請規劃許可方能推展，待相關初步設計及技術研究完成後，我們會再徵詢委員的意見。	

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
不適用 (小型建築工程)	屯門第 6 區休憩用地公園建造工程	29.5	康樂及文化事務署、 建築署	(12/2022) 12/2022	(12/2024) 06/2025	為能在工程計劃用地提供更多類型的康樂設施予附近的居民及學生使用，康文署於 2018 年 4 月 10 日就更新的工程擬建設施諮詢地委會的意見，並於 2018 年 8 月 21 日向地委會報告進展。更新的工程擬建設施包括一個多用途硬地球場（可作一個 7 人足球場或兩個 5 人足球場或兩個手球場）及有蓋座位、健身設施、園景及輔助設施。 康文署於 2022 年 8 月 9 日就工程設計徵詢地環會意見並獲支持，工程計劃於 2022 年 12 月展開。在施工過程中，勘測結果顯示，政府雨水井的接入口與項目工地相距較遠，而且沿路的地面條件複雜，可能導致施工期延長。另外，項目正在申請額外款項，工程設計亦會稍作修改。	

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
3278RS/B	屯門第16區運動場、休憩用地及公眾停車場	待定	康樂及文化事務署、運輸署、建築署	檢討中	檢討中	工程擬建設施包括一條 400 米長的 8 線全天候跑道以及熱身區，一個 11 人天然草地場及一個 7 人天然草地場可作田徑及足球活動場地、一個設有 5000 個座位的有蓋看台、休憩用地及輔助設施等。按照 2018 年施政報告中提出「一地多用」的原則，運輸署建議於工程計劃中增建公眾停車場，提供約 500 個泊車位，以切合該區的泊車需求。康文署及運輸署於 2019 年 2 月 12 日就增建公眾停車場諮詢地委會的意見，並獲得地委會支持。 康文署及運輸署於 2022 年 10 月 11 日就工程計劃的規劃概念徵詢地環會的意見並獲支持。 工程項目用地現時用作一系列用途，包括九巴車廠、城巴車廠、建造業議會屯門訓練及測驗中心及收費公眾停車場。其中在搬遷兩間巴士車廠方面，之前數個潛在選址均因為其他互相競爭的用地需求或技術限制而未能落實。相關政府部門以及巴士公司正積極商討處理方案，盡早落實兩間巴士車廠的重置方案，致力減少對工程計劃時間表的影響。	 工地平面圖 SITE PLAN 278 RS 屯門第16區運動場、休憩用地及公眾停車場 SPORTS GROUND AND OPEN SPACE WITH PUBLIC VEHICLE PARK IN AREA 16, TUEN MUN  ARCHITECTURAL SERVICES DEPARTMENT 建築署

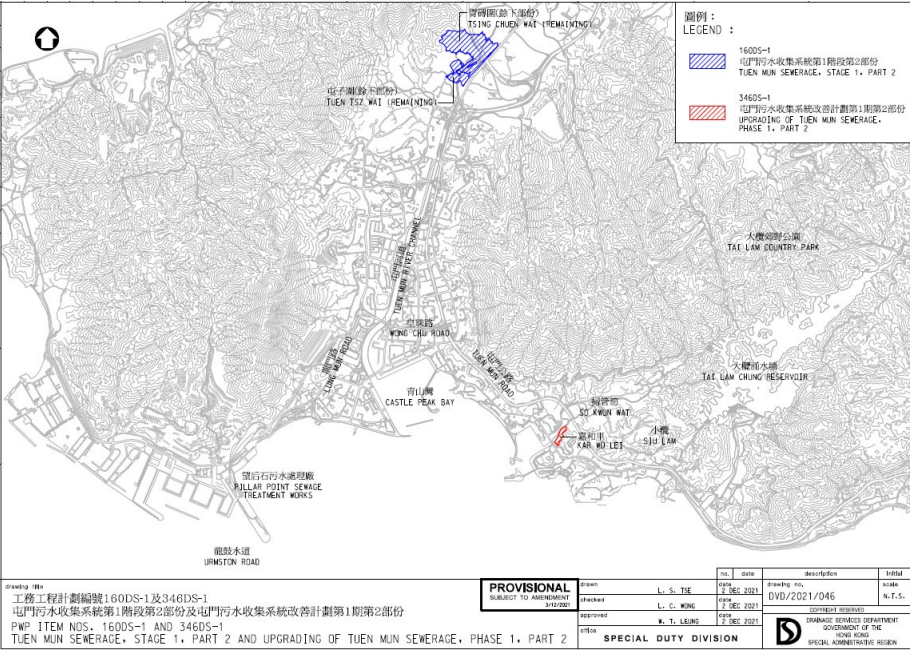
工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
3030TP/C	屯門第17區休憩用地及公眾停車場	待定	運輸署、康樂及文化事務署、建築署	檢討中	檢討中	康文署及運輸署於2019年4月及6月就工程計劃修訂的擬建範圍和設施諮詢地委會，並獲支持。修訂的擬建設施包括公眾停車場、一個多用途硬地球場(可作一個五人足球場或一個手球場)及50個座位、一個滑板場、一個籃球場及輔助設施。康文署及運輸署現正籌劃有關工程計劃，待初步設計完成後，會再徵詢委員的意見。	

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長 及負責 部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
75MC/A	屯門第 29 區 西社區健康 中心暨安老 院舍	1,046.40	建築署、 房屋署	(2019 年第 2 季) 06/2019	(2024 年) 最快於 2024 年	擬議工程的範圍包括建造以下佔地約 7500 平方米的社區健康中心暨安老院舍、附屬設施和附屬工程： (a) 1 所附有裝修的社區健康中心 (b) 1 所設有 100 個宿位的安老院舍 (c) 附屬設施，包括機電房、升降機及大堂、水電錶房、停車位及上落客貨車位等；以及 (d) 附屬工程，包括相關排水工程、排污工程、道路工程、斜坡鞏固工程及屯門西北游泳池停車場範圍內的改建工程。 項目工程已於 2019 年 6 月展開。整體工程現已完成 59%。工程大致依時進行。按目前計劃，項目預計最快於 2024 年完成。	

(2) 道路工程項目

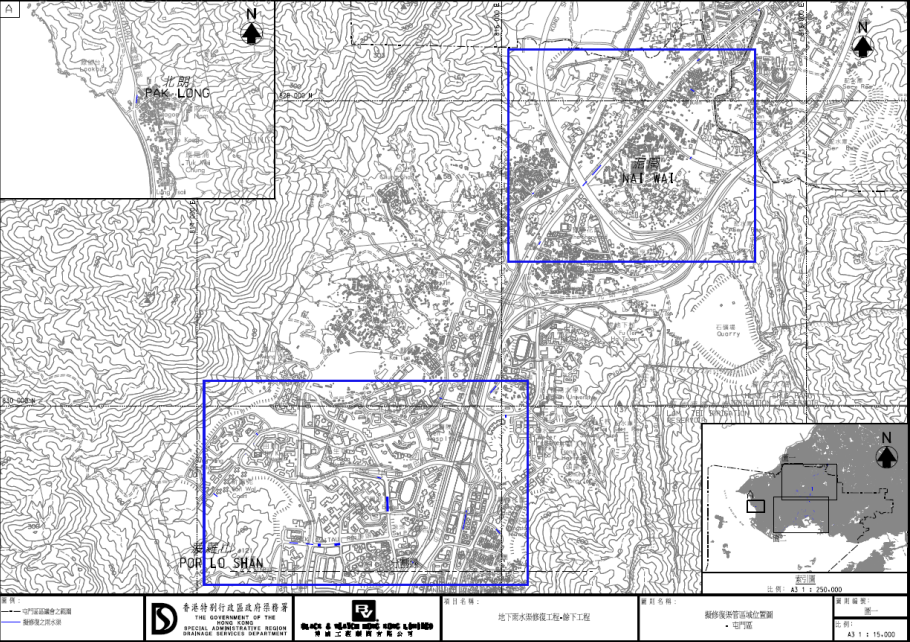
工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首 長及負責 部門/機構	(原訂計劃動工 日期) 最新估計/實際 日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日 期) 最新估計/實際日 期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
853TH/A	青山公路青山灣 段擴闊工程	755.2	路政署	(11/2020) 11/2020	(最快於 2024 年) 最快於 2024 年	路政署在 2020 年年中按程序為本工程計劃向立法會申請撥款，並於 2020 年 7 月 10 日獲得立法會財務委員會批准撥款。路政署為工程合約展開招標後，已於 2020 年 11 月 30 日開展工程，預計最快於 2024 年完工，以盡快改善青山公路青山灣段的交通情況。	

(3) 渠務工程項目

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首 長及負責 部門/機構	(原訂計劃動工 日期) 最新估計/實際 日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日 期) 最新估計/實際日 期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
4160DS/C	屯門污水收集系統工程－第 1 階段	檢討中	渠務署	檢討中	檢討中	工程主要包括為青磚圍及屯子圍敷設公共污水收集系統。現正檢視工程的設計和時間表。	

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
4390DS/A	屯門污水幹渠修復工程	806	渠務署	(11/2018) 12/2018	(03/2023) 03/2023	建於龍門路及天后路之約 4.2 公里的既有污水幹渠已為屯門居民服務超過 30 多年，該污水幹渠已出現一定程度的受損和折舊。渠務署現正為該段老化中的屯門污水幹渠進行原址修復工程。 工程主要是原址修復一段全長約 4.2 公里的 2.5 米高乘 2.5 米濶之現有八角形屯門污水幹渠。該段污水幹渠收集屯門區大部分的污水，並從屯門天后廟廣場，沿天后路、龍門路，經過龍門居、蝴蝶灣公園等，最後帶到望后石污水處理廠作污水處理。此外，該修復工程亦包括修復兩組位於天后路和屯義街的過河污水虹吸管，以及在天后路附近建造一段新的過河污水虹吸管，以優化既有的污水系統。需修復的污水幹渠位置及工程的範圍見附圖。 工程合約(DC/2018/09)已於 2018 年 12 月 28 日開始。主要工程已於 2023 年 3 月完工。餘下工程預計於 2024 年中完工。	

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
4435DS/A	屯門北部鄉村污水收集系統	431.2	渠務署	(1/2021) 1/2021	(12/2024) 12/2024	此工程項目主要在福亨村(下)興建一所污水泵房及相關壓力污水管道，為小坑村、福亨村(下)、紫田村及寶塘下敷設公共污水收集系統，將此地區所產生的污水輸送到望后石污水處理廠處理和排放，以避免流入屯門河道。工程合約(DC/2020/07)已於 2021 年 1 月開始，相關工程已完成超過 90%，整項工程預計於 2024 年第 4 季完成。	

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
4172CD/A	地下雨水渠修復工程-餘下工程	702.7	渠務署	(06/2021) 06/2021	(2025 年第 4 季) 2025 年第 4 季	餘下工程會為屯門、中西區、灣仔、東區、南區、離島、元朗、北區、大埔、沙田、觀塘及西貢區修復約 19 公里長的地下雨水渠。當中，會為屯門區內長約 1.2 公里的地下污水渠及雨水渠進行修復工程。 工程合約(DC/2020/09)已於 2021 年 6 月 28 日開始，相關的渠管修復工程分別已完成約 58%，進度合乎預期，整項工程預計於 2025 年第四季完成。	

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
4414DS/A	地下污水渠修復工程-餘下工程	306.4	環境及生態局 渠務署	09/2023	09/2027	餘下工程包括修復位於中西區、灣仔區、東區、南區、離島區、屯門區、元朗區、北區、大埔區、沙田區、觀塘區及西貢區共約 4.9 公里長的地下污水渠。當中，會為屯門區內約 1.4 公里長的地下污水渠進行修復。 工程已於 2023 年 9 月展開，預計整項工程將於 2027 年完成。	

(4) 水務工程項目

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長 及負責 部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
196WC/A	建設智管網 - 餘下工程	1,236.0	水務署	(2020 年第 3 季) 2020 年第 3 季	(最快於 2024 年) 2025 年第 1 季	工程項目包括在屯門區建造約 30 個監測區域。 截至 2024 年 2 月 15 日，屯門區已有 12 個監測區域完成建造。礙於近年疫情影響，大部分需要暫停食水供應才可進行設立監測區域的工程須暫緩從而確保市民獲食水供應以維持環境衛生。隨着社會全面復常，整項工程包括屯門區內餘下的監測區域預計會於 2025 年第 1 季前相繼完成。	 圖例： - 屯門區區議會之範圍 - 擬建區域監測站的位置 - 已完竣區域監測站 水務署 Water Supplies Department binnies BINNIES HONG KONG LIMITED 賓尼士工程顧問有限公司 項目名稱：建設智管網 圖則名稱：擬區域監測站位置圖 屯門區 日期：06 MAR 2024 比例：1:40,000 圖則編號：TMP-SK0030

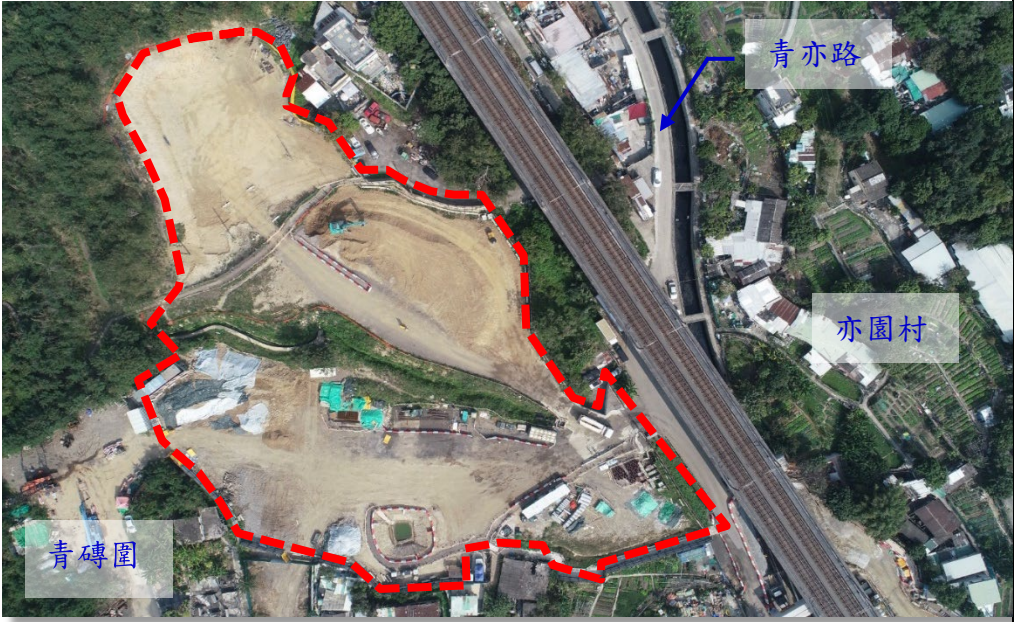
(5) 其它工程项目

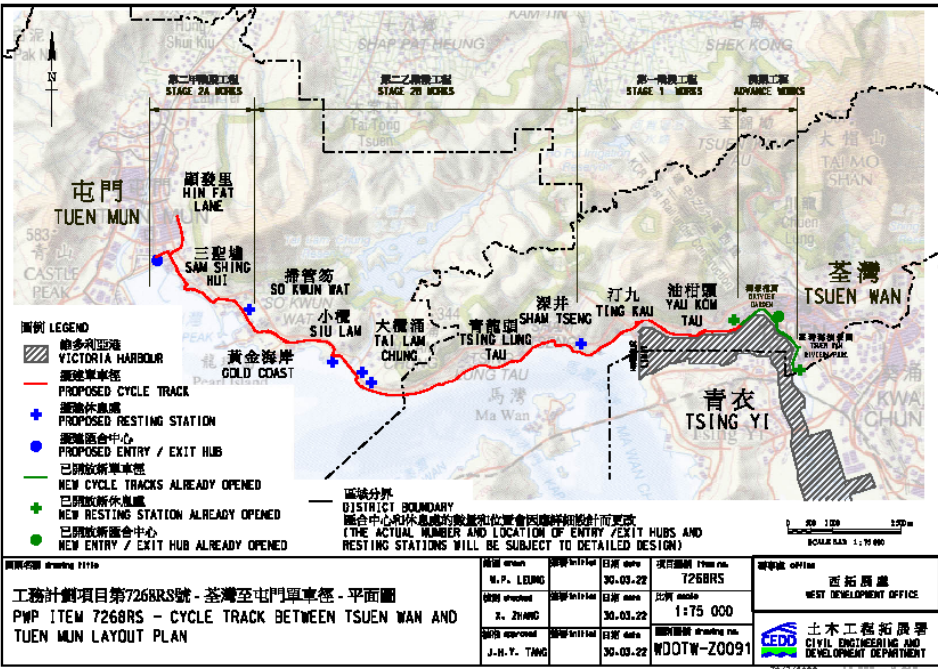
工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
請參閱“工程內容/備註”欄	屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程第 1 期及第 2 期	請參閱“工程內容/備註”欄	土木工程拓展署	(09/2011) 09/2011	請參閱“工程內容/備註”欄	屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程分兩期進行。 第 1 期 第 1 階段：請參閱 788CL 號工程計劃的進度報告。 第 2 階段：請參閱 666CL 號工程計劃的進度報告。 第 2 期 第 1 階段：第 2 號工地的土地平整及相關基建工程已於 2011 年 9 月展開。平整後的土地已於 2013 年 10 月交予房屋署進行房屋工程。其餘周邊的基建工程，包括青麟路、紫田路的擴闊工程及相關的隔音屏障和行人天橋工程也於 2016 年年底大致完成。(744CL/A 號工程計劃) 第 2 階段：工程包括在屯門第 54 區鄰近紫田路興建一個污水泵房及相關污水管道。工程已於 2012 年 10 月展開，相關之泵房的機電工程及污水管道建造工程已於 2016 年年中完成。 第 3 及 4A 階段：工程主要包括第 1 及 1A 號工地、第 3/4(東)號工地及第 4A(西)號工地的土地平整及相關基建工程。工程已於 2015 年 11 月展開，有關工程已於 2020 年 6 月大致完成，而接駁新發展區至現有交通網絡的新地區幹道(欣寶路及	

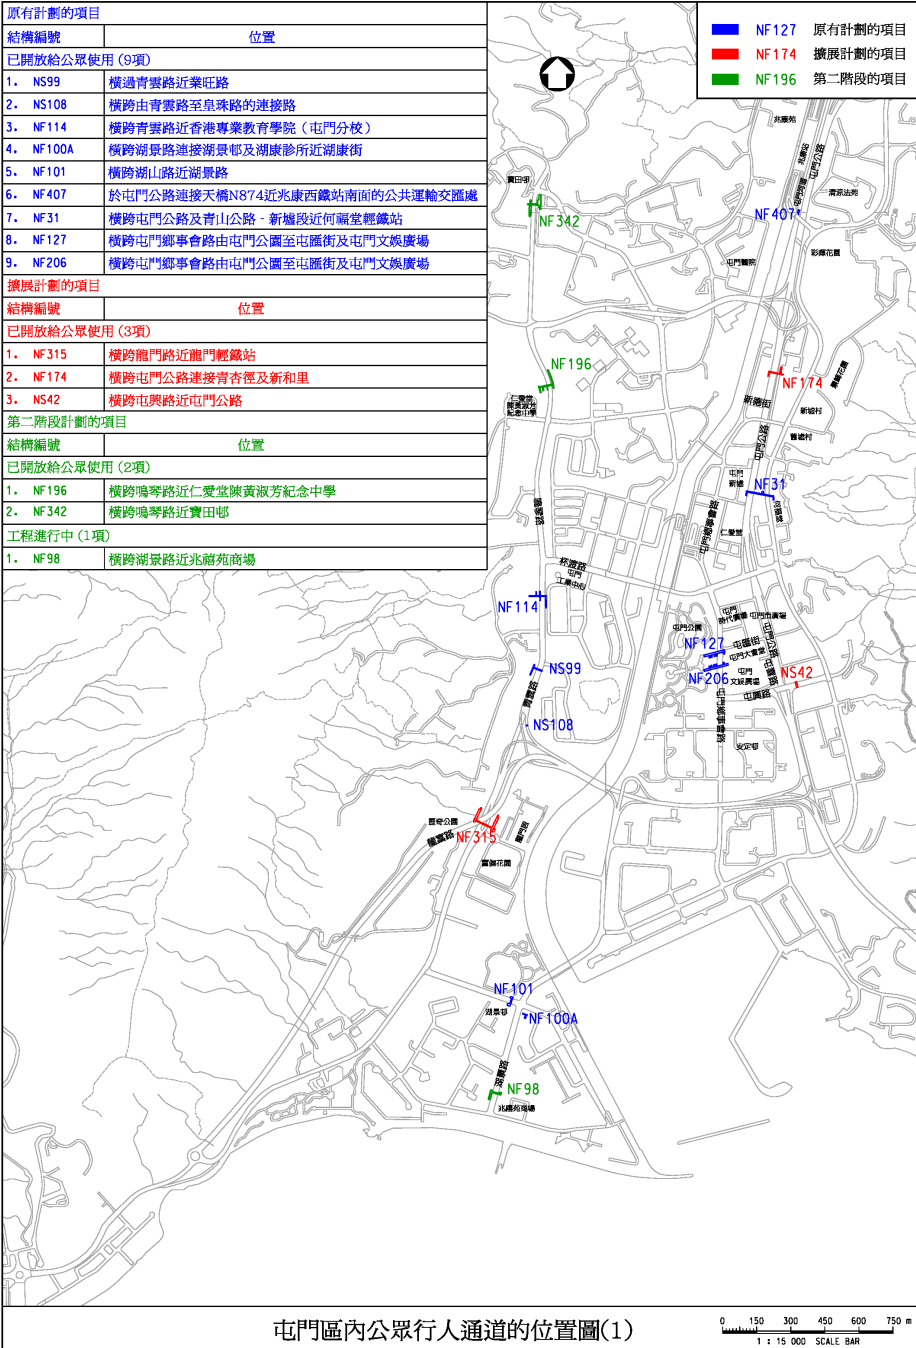
工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
						興貴街伸延部分)亦已於 2020 年 11 月起開放給公眾人士使用。 第 4B 階段: 請參閱 844CL 號工程計劃的進度報告。	
666CL/A 844CL/A	屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程第 1 期第 2 階段及第 2 期第 4B 階段 (屯門第 54 區鄰近紫田路及興富街工地平整及基礎建設工程)	312.5	土木工程拓展署	(2021 第 1 季) 12/2020	(12/2025) 12/2025	工程主要包括第 4A(東)號工地、第 4A(南)號工地及第 5 號工地的土地平整及相關基建工程。工程合約已於 2020 年 12 月展開，整項工程預計於 2025 年完成。而其中第 4A(南)號工地及第 5 號工地的土地平整工程及藍地交匯處改善工程已於 2023 年大致完成。第 4A(東)號工地的土地平整工程亦預計於 2024 年完成。而餘下的相關基礎設施工程預計於 2025 年完成。	

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
總目 711 分目 811CL 第一期 (857CL/A)	屯門中公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程	968.4	土木工程拓展署	(06/2021) 06/2021	(09/2024) 09/2024	此工程項目是為配合屯門中公營房屋發展計劃的入伙時間表，當中涉及五幅用地，分別位於天后路、湖山路、恆富街、顯發里及屯興路。土木工程拓展署現正分兩期推展有關的工地平整和基礎設施工程。 第一期工程配合分別位於天后路、湖山路、恆富街及顯發里的公營房屋發展。 湖山路的工地平整及基礎設施工程(合約編號 CV/2020/11)於 2021 年 6 月展開。工地平整工程已於 2023 年 2 月完成，餘下的基礎設施工程預計會於 2024 年年中大致完成。 另外，為配合於天后路、恆富街及顯發里公營房屋發展的基礎設施工程(合約編號 CV/2021/01)亦於 2021 年 8 月展開，工程預計會在 2024 年大致完成。	合約編號 CV/2020/11  湖山路的工地平整及基礎設施工程 合約編號 CV/2021/01  天后路近業旺路公營房屋發展項目的基礎設施工程

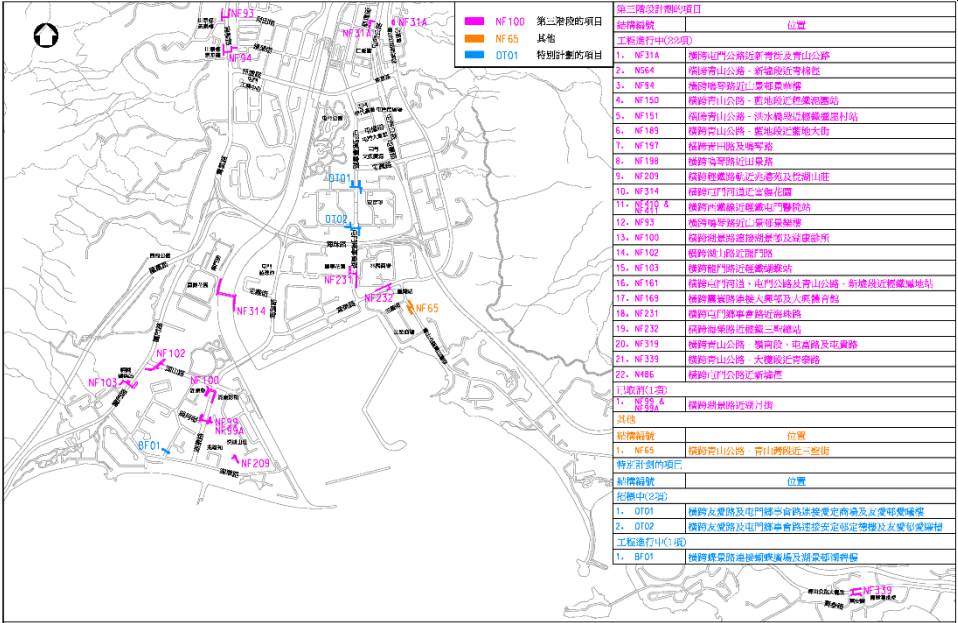
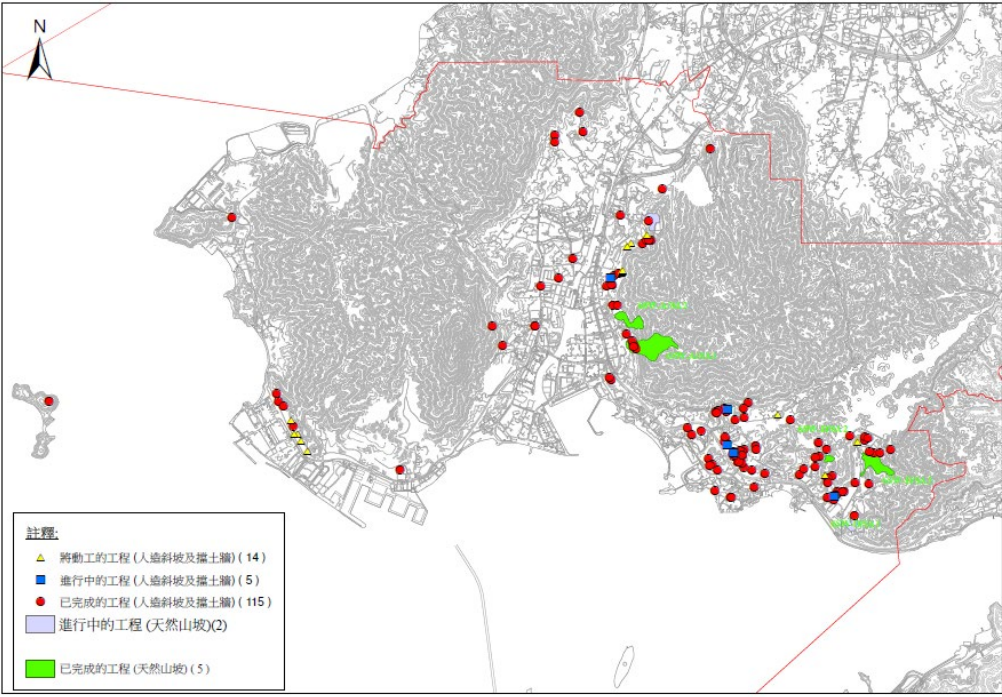
工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長 及負責 部門/機構	(原訂計劃動工 日期) 最新估計/實際 日期 (月/年)	(原訂計劃竣 工日期) 最新估計/實 際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
第二期 (811CL/A)		599.0		(07/2023) 07/2023	(03/2028) 03/2028	第二期工程配合位於屯興路的公營房屋發展。 屯興路的工地平整及基礎設施工程的有關工程撥款已於 2023 年 7 月 14 日獲立法會批准，工程合約(合約編號 CV/2023/04)亦於 2023 年 7 月批出，目前相關的土地清理工作正在進行中，工程預計會於 2028 年大致完成。	合約編號 CV/2021/01  青山公路—青山灣段近顯發里公營房屋發展項目的道路改善工程 合約編號 CV/2023/04 

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
總目 707 分目 845CL	洪水橋／厦村新發展區前期工程第一及第二期－工地平整和基礎設施	495.9	土木工程拓展署	(07/2020) 08/2020	(07/2023) 06/2024	除了位於元朗區內的其他工程，此工程項目將為約 1.2 公頃位於屯門區內的土地進行工地清理、工地平整(包括土地除污)和提供相關基礎設施，讓已平整的土地其後可發展鄉村遷置區以安置受影響而又符合搬村資格的屋地。工程已於 2020 年 8 月展開，並將於 2024 年 6 月前完成。	
不適用	臨時建築廢物篩選分類設施 2022－2025	233	環境及生態局局長 土木工程拓展署	(05/2022) 05/2022	(05/2025) 05/2025	合約(CV/2022/02)範圍包括在屯門第 38 區營運一所臨時建築廢物篩選分類設施，該設施的主要功能是從混合建築廢物中將惰性建築廢物如沙泥等篩選出來，循環再用。有關合約的營運期由 2022 年 5 月至 2025 年 5 月。	

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
268RS/B	荃灣至屯門單車徑	檢討中	土木工程拓展署	計劃分階段動工，施工時間表在檢討中	檢討中	工程範圍包括興建單車徑連貫荃灣與屯門及相關輔助設施。由於走線頗長，加上部分路段受不同環境因素影響其建造難度，我們已採取「先易後難」的策略，以分段形式推展單車徑項目。 屯門至掃管笏段單車徑的詳細設計工作已於 2017 年 1 月展開。我們已就此段單車徑的走線，分別於 2021 年 5 月 14 日及 7 月 23 日諮詢屯門區議會工商業及房屋委員會。我們亦已就單車徑工程諮詢單車徑沿線的屋苑，檢視優化此段單車徑走線的可行性，並調整了單車徑的走線。我們已於 2022 年 8 月 12 日至 10 月 11 日就此段單車徑根據《道路(工程、使用及補償)條例》(第 370 章)刊憲，有關工程已獲行政長官會同行政會議授權進行，授權公告已在 2023 年 5 月 12 日刊憲。 單車徑的建造工程已於 2023 年 8 月 25 日招標，我們會盡快向立法會申請撥款及展開建造工程。荃灣灣景花園至掃管笏段單車徑，因受到實地環境限制，例如部分現有道路沒有足夠空間建造單車徑，以及單車徑須建造在陡峭的坡度及海床或前濱上等考慮，使單車徑的設計難度及成本提升。我們於 2022 年 12 月完成了為期兩個月的公眾參與活動，收集公眾對第一及第二乙階段單車徑推展方向的意見，瞭解不同持份者的關注。大部分公眾均表示支持擬議的單車徑，並期望我們盡快推展有關項目。我們正著手籌備第二乙階段續後的詳細設計和工地勘測工作。 此外，荃灣青荃橋至灣景花園的前期工程已於 2021 年 7 月全面開放，供市民使用。	

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片																																												
總目 706 分目 6101TX /D	“人 人 暢 道 通 行”計劃	約 609 (工程進行中)	路政署	請參閱“工程內容/備註”欄	請參閱“工程內容/備註”欄	「人人暢道通行」計劃現按既定時間表全力展開。 在 2012 年 8 月宣布新政策前，運輸及房屋局已應平等機會委員會的建議，推展在公共行人通道加裝無障礙通道設施的「原有計劃」。在屯門區的所有 9 個項目已經完工。 至於計劃推出後市民的新建議項目(即「擴展計劃」)，全港 18 區的區議會已於 2013 年上半年各選出 3 個地點作為優先項目，並進行技術可行性研究。屯門區的所有 3 個項目已經完工。 就「人人暢道通行」計劃的第二階段，屯門區議會轄下的交通及運輸委員會已於 2017 年 5 月揀選 3 條現有行人通道，而路政署已於 2017 年 9 月底聘請顧問並展開了第二階段推展項目的技術可行性研究，包括安排進行前期勘測工程。當中結構編號 NF196 已於 2019 年 8 月展開工程，升降機已於 2022 年 12 月開放予公眾使用。而結構編號 NF342 的工程合約已於 2020 年 6 月展開，升降機已於 2023 年 12 月開放予公眾使用。至於結構編號 NF98，該行人天橋加建升降機工程位於擬建屯門南延線項目範圍內。經協調後，工程合約已於 2023 年 1 月展開。 路政署已於 2019 年 9 月底聘請顧問並展開了第三階段推展項目的技術可行性研究，其中 22 條行人通道加建升降機的初步設計及研究結果已分別於 2020 年 6 月、2020 年 10 月及 2021 年 10 月向區議會報告，並獲區議會支持推展。上述 22 條行人通道的加建升降機工程分別於 2021 年	<table><tr><th>原有計劃的項目</th><th>位置</th></tr><tr><td colspan="2">已開放給公眾使用 (9項)</td></tr><tr><td>1. NS99</td><td>橫過青雲路近樂旺路</td></tr><tr><td>2. NS108</td><td>橫跨由青雲路至皇珠路的連接路</td></tr><tr><td>3. NF114</td><td>橫跨青雲路近香港專業教育學院（屯門分校）</td></tr><tr><td>4. NF100A</td><td>橫跨湖景路連接湖景邨及湖康診所近湖康街</td></tr><tr><td>5. NF101</td><td>橫跨湖山路近湖景路</td></tr><tr><td>6. NF407</td><td>於屯門公路連接天橋N874近兆康西鐵站南面的公共運輸交匯處</td></tr><tr><td>7. NF31</td><td>橫跨屯門公路及青山公路 - 新墟段近何福堂輕鐵站</td></tr><tr><td>8. NF127</td><td>橫跨屯門鄉事會路由屯門公園至屯臨街及屯門文娛廣場</td></tr><tr><td>9. NF206</td><td>橫跨屯門鄉事會路由屯門公園至屯臨街及屯門文娛廣場</td></tr><tr><td colspan="2">擴展計劃的項目</td></tr><tr><td colspan="2">已開放給公眾使用 (3項)</td></tr><tr><td>1. NF315</td><td>橫跨龍門路近龍門輕鐵站</td></tr><tr><td>2. NF174</td><td>橫跨屯門公路連接青杏徑及新和里</td></tr><tr><td>3. NS42</td><td>橫跨屯興路近屯門公路</td></tr><tr><td colspan="2">第二階段計劃的項目</td></tr><tr><td colspan="2">已開放給公眾使用 (2項)</td></tr><tr><td>1. NF196</td><td>橫跨鳴琴路近仁愛堂陳黃淑芳紀念中學</td></tr><tr><td>2. NF342</td><td>橫跨鳴琴路近寶田邨</td></tr><tr><td colspan="2">工程進行中 (1項)</td></tr><tr><td>1. NF98</td><td>橫跨湖景路近兆麟苑商場</td></tr></table> 屯門區內公眾行人通道的位置圖(1)	原有計劃的項目	位置	已開放給公眾使用 (9項)		1. NS99	橫過青雲路近樂旺路	2. NS108	橫跨由青雲路至皇珠路的連接路	3. NF114	橫跨青雲路近香港專業教育學院（屯門分校）	4. NF100A	橫跨湖景路連接湖景邨及湖康診所近湖康街	5. NF101	橫跨湖山路近湖景路	6. NF407	於屯門公路連接天橋N874近兆康西鐵站南面的公共運輸交匯處	7. NF31	橫跨屯門公路及青山公路 - 新墟段近何福堂輕鐵站	8. NF127	橫跨屯門鄉事會路由屯門公園至屯臨街及屯門文娛廣場	9. NF206	橫跨屯門鄉事會路由屯門公園至屯臨街及屯門文娛廣場	擴展計劃的項目		已開放給公眾使用 (3項)		1. NF315	橫跨龍門路近龍門輕鐵站	2. NF174	橫跨屯門公路連接青杏徑及新和里	3. NS42	橫跨屯興路近屯門公路	第二階段計劃的項目		已開放給公眾使用 (2項)		1. NF196	橫跨鳴琴路近仁愛堂陳黃淑芳紀念中學	2. NF342	橫跨鳴琴路近寶田邨	工程進行中 (1項)		1. NF98	橫跨湖景路近兆麟苑商場
原有計劃的項目	位置																																																		
已開放給公眾使用 (9項)																																																			
1. NS99	橫過青雲路近樂旺路																																																		
2. NS108	橫跨由青雲路至皇珠路的連接路																																																		
3. NF114	橫跨青雲路近香港專業教育學院（屯門分校）																																																		
4. NF100A	橫跨湖景路連接湖景邨及湖康診所近湖康街																																																		
5. NF101	橫跨湖山路近湖景路																																																		
6. NF407	於屯門公路連接天橋N874近兆康西鐵站南面的公共運輸交匯處																																																		
7. NF31	橫跨屯門公路及青山公路 - 新墟段近何福堂輕鐵站																																																		
8. NF127	橫跨屯門鄉事會路由屯門公園至屯臨街及屯門文娛廣場																																																		
9. NF206	橫跨屯門鄉事會路由屯門公園至屯臨街及屯門文娛廣場																																																		
擴展計劃的項目																																																			
已開放給公眾使用 (3項)																																																			
1. NF315	橫跨龍門路近龍門輕鐵站																																																		
2. NF174	橫跨屯門公路連接青杏徑及新和里																																																		
3. NS42	橫跨屯興路近屯門公路																																																		
第二階段計劃的項目																																																			
已開放給公眾使用 (2項)																																																			
1. NF196	橫跨鳴琴路近仁愛堂陳黃淑芳紀念中學																																																		
2. NF342	橫跨鳴琴路近寶田邨																																																		
工程進行中 (1項)																																																			
1. NF98	橫跨湖景路近兆麟苑商場																																																		

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片																																																		
						7 月及 2022 年 12 月開展。 就「人人暢道通行」計劃的特別計劃，屯門區議會轄下的交通及運輸委員會已於 2020 年 12 月揀選 3 條現有行人通道，而路政署已於 2022 年 1 月底聘請顧問並展開了特別計劃推展項目的技術可行性研究。其中行人通道編號 BF01 加建升降機的初步設計及研究結果已於 2022 年 5 月向區議會報告，並獲區議會支持推展，路政署已於 2023 年 1 月開展建造工程合約。而行人通道編號 OT01 及 OT02 加建升降機的初步設計及研究結果亦已於 2023 年 8 月以傳閱方式向區議會報告，並獲區議會支持推展，並於 2024 年 3 月進行招標。	第三階段計劃的項目 <table><tr><th>結構編號</th><th>位置</th></tr><tr><td colspan="2">工程進行中(22項)</td></tr><tr><td>1. NF 31A</td><td>橫跨屯門公路近新青街及青山公路</td></tr><tr><td>2. NS64</td><td>橫跨青山公路 - 新墟段近青棉徑</td></tr><tr><td>3. NF 94</td><td>橫跨鳴琴路近山景邨景華樓</td></tr><tr><td>4. NF 150</td><td>橫跨青山公路 - 藍地段近輕鐵泥圍站</td></tr><tr><td>5. NF 151</td><td>橫跨青山公路 - 洪水橋段近輕鐵鍾屋村站</td></tr><tr><td>6. NF 189</td><td>橫跨青山公路 - 藍地段近藍地大街</td></tr><tr><td>7. NF 197</td><td>橫跨青田路及鳴琴路</td></tr><tr><td>8. NF 198</td><td>橫跨鳴琴路近田景路</td></tr><tr><td>9. NF 209</td><td>橫跨輕鐵路軌近兆禧苑及悅湖山莊</td></tr><tr><td>10. NF 314</td><td>橫跨屯門河道近富健花園</td></tr><tr><td>11. NF 410 & NF 411</td><td>橫跨西鐵線近輕鐵屯門醫院站</td></tr><tr><td>12. NF 93</td><td>橫跨鳴琴路近山景邨景華樓</td></tr><tr><td>13. NF 100</td><td>橫跨湖景路連接湖景邨及湖康診所</td></tr><tr><td>14. NF 102</td><td>橫跨湖山路近龍門路</td></tr><tr><td>15. NF 103</td><td>橫跨龍門路近輕鐵蝴蝶站</td></tr><tr><td>16. NF 161</td><td>橫跨屯門河道、屯門公路及青山公路 - 新墟段近輕鐵鳳地站</td></tr><tr><td>17. NF 169</td><td>橫跨置業路連接大興邨及大興體育館</td></tr><tr><td>18. NF 231</td><td>橫跨屯門鄉事會路近海珠路</td></tr><tr><td>19. NF 232</td><td>橫跨海榮路近輕鐵三聖總站</td></tr><tr><td>20. NF 319</td><td>橫跨青山公路 - 嶺南段、屯富路及屯貴路</td></tr><tr><td>21. NF 339</td><td>橫跨青山公路 - 大樓段近青泰路</td></tr><tr><td>22. N486</td><td>橫跨屯門公路近新墟徑</td></tr></table> 已取消(1項) <table><tr><td>1. NF 99 & NF 99A</td><td>橫跨湖景路近湖月街</td></tr></table>	結構編號	位置	工程進行中(22項)		1. NF 31A	橫跨屯門公路近新青街及青山公路	2. NS64	橫跨青山公路 - 新墟段近青棉徑	3. NF 94	橫跨鳴琴路近山景邨景華樓	4. NF 150	橫跨青山公路 - 藍地段近輕鐵泥圍站	5. NF 151	橫跨青山公路 - 洪水橋段近輕鐵鍾屋村站	6. NF 189	橫跨青山公路 - 藍地段近藍地大街	7. NF 197	橫跨青田路及鳴琴路	8. NF 198	橫跨鳴琴路近田景路	9. NF 209	橫跨輕鐵路軌近兆禧苑及悅湖山莊	10. NF 314	橫跨屯門河道近富健花園	11. NF 410 & NF 411	橫跨西鐵線近輕鐵屯門醫院站	12. NF 93	橫跨鳴琴路近山景邨景華樓	13. NF 100	橫跨湖景路連接湖景邨及湖康診所	14. NF 102	橫跨湖山路近龍門路	15. NF 103	橫跨龍門路近輕鐵蝴蝶站	16. NF 161	橫跨屯門河道、屯門公路及青山公路 - 新墟段近輕鐵鳳地站	17. NF 169	橫跨置業路連接大興邨及大興體育館	18. NF 231	橫跨屯門鄉事會路近海珠路	19. NF 232	橫跨海榮路近輕鐵三聖總站	20. NF 319	橫跨青山公路 - 嶺南段、屯富路及屯貴路	21. NF 339	橫跨青山公路 - 大樓段近青泰路	22. N486	橫跨屯門公路近新墟徑	1. NF 99 & NF 99A	橫跨湖景路近湖月街
結構編號	位置																																																								
工程進行中(22項)																																																									
1. NF 31A	橫跨屯門公路近新青街及青山公路																																																								
2. NS64	橫跨青山公路 - 新墟段近青棉徑																																																								
3. NF 94	橫跨鳴琴路近山景邨景華樓																																																								
4. NF 150	橫跨青山公路 - 藍地段近輕鐵泥圍站																																																								
5. NF 151	橫跨青山公路 - 洪水橋段近輕鐵鍾屋村站																																																								
6. NF 189	橫跨青山公路 - 藍地段近藍地大街																																																								
7. NF 197	橫跨青田路及鳴琴路																																																								
8. NF 198	橫跨鳴琴路近田景路																																																								
9. NF 209	橫跨輕鐵路軌近兆禧苑及悅湖山莊																																																								
10. NF 314	橫跨屯門河道近富健花園																																																								
11. NF 410 & NF 411	橫跨西鐵線近輕鐵屯門醫院站																																																								
12. NF 93	橫跨鳴琴路近山景邨景華樓																																																								
13. NF 100	橫跨湖景路連接湖景邨及湖康診所																																																								
14. NF 102	橫跨湖山路近龍門路																																																								
15. NF 103	橫跨龍門路近輕鐵蝴蝶站																																																								
16. NF 161	橫跨屯門河道、屯門公路及青山公路 - 新墟段近輕鐵鳳地站																																																								
17. NF 169	橫跨置業路連接大興邨及大興體育館																																																								
18. NF 231	橫跨屯門鄉事會路近海珠路																																																								
19. NF 232	橫跨海榮路近輕鐵三聖總站																																																								
20. NF 319	橫跨青山公路 - 嶺南段、屯富路及屯貴路																																																								
21. NF 339	橫跨青山公路 - 大樓段近青泰路																																																								
22. N486	橫跨屯門公路近新墟徑																																																								
1. NF 99 & NF 99A	橫跨湖景路近湖月街																																																								

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長 及負責 部門/機構	(原訂計劃動工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	(原訂計劃竣工日期) 最新估計/實際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片																																																																												
							<table><tr><th colspan="2">第三階段計劃項目</th></tr><tr><th>紀錄編號</th><th>位置</th></tr><tr><td colspan="2">工程進行中(23項)</td></tr><tr><td>1. NF 31A</td><td>連接屯門公路及新墟路及青山公路</td></tr><tr><td>2. NS64</td><td>連接青山公路、新墟路及豐利路</td></tr><tr><td>3. NF 84</td><td>接駁海旁路近「聚賢樓」樓下</td></tr><tr><td>4. NF 150</td><td>接駁青山公路、新墟路及豐利路</td></tr><tr><td>5. NF 151</td><td>接駁青山公路、新墟路及豐利路</td></tr><tr><td>6. NF 152</td><td>接駁青山公路、新墟路及豐利路</td></tr><tr><td>7. NF 153</td><td>接駁青山公路、新墟路及豐利路</td></tr><tr><td>8. NF 154</td><td>接駁青山公路、新墟路及豐利路</td></tr><tr><td>9. NF 209</td><td>接駁海旁路近豐利及豐利山莊</td></tr><tr><td>10. NF 314</td><td>接駁青山公路近豐利山莊</td></tr><tr><td>11. NF 315</td><td>接駁青山公路近豐利山莊</td></tr><tr><td>12. NF 83</td><td>接駁海旁路近「聚賢樓」樓下</td></tr><tr><td>13. NF 100</td><td>接駁海旁路近豐利及豐利山莊</td></tr><tr><td>14. NF 102</td><td>接駁海旁路近豐利及豐利山莊</td></tr><tr><td>15. NF 103</td><td>接駁海旁路近豐利及豐利山莊</td></tr><tr><td>16. NF 161</td><td>接駁青山公路、屯門公路及青山公路、新墟路及豐利路</td></tr><tr><td>17. NF 162</td><td>接駁青山公路、屯門公路及青山公路、新墟路及豐利路</td></tr><tr><td>18. NF 231</td><td>接駁青山公路、屯門公路及青山公路、新墟路及豐利路</td></tr><tr><td>19. NF 232</td><td>接駁海旁路近豐利及豐利山莊</td></tr><tr><td>20. NF 319</td><td>接駁青山公路、新墟路、屯門公路及青山公路</td></tr><tr><td>21. NF 339</td><td>接駁青山公路、大埔路及青山公路</td></tr><tr><td>22. NS66</td><td>接駁青山公路近豐利山莊</td></tr><tr><td colspan="2">已竣工(1項)</td></tr><tr><td>1. NS64</td><td>接駁海旁路近豐利及豐利山莊</td></tr><tr><th colspan="2">已竣工(1項)</th></tr><tr><th>紀錄編號</th><th>位置</th></tr><tr><td colspan="2">工程進行中(2項)</td></tr><tr><td>1. NF 65</td><td>接駁青山公路、青山公路近一號路</td></tr><tr><td colspan="2">暫定計劃項目</td></tr><tr><th>紀錄編號</th><th>位置</th></tr><tr><td colspan="2">已竣工(2項)</td></tr><tr><td>1. DT 01</td><td>接駁青山公路及屯門公路近豐利及豐利山莊及青山公路</td></tr><tr><td>2. DT 02</td><td>接駁青山公路及屯門公路近豐利及豐利山莊及青山公路</td></tr><tr><td colspan="2">工程進行中(1項)</td></tr><tr><td>1. DT 01</td><td>接駁青山公路及屯門公路近豐利及豐利山莊及青山公路</td></tr></table> 屯門區內公眾行人通道的位置圖(3)	第三階段計劃項目		紀錄編號	位置	工程進行中(23項)		1. NF 31A	連接屯門公路及新墟路及青山公路	2. NS64	連接青山公路、新墟路及豐利路	3. NF 84	接駁海旁路近「聚賢樓」樓下	4. NF 150	接駁青山公路、新墟路及豐利路	5. NF 151	接駁青山公路、新墟路及豐利路	6. NF 152	接駁青山公路、新墟路及豐利路	7. NF 153	接駁青山公路、新墟路及豐利路	8. NF 154	接駁青山公路、新墟路及豐利路	9. NF 209	接駁海旁路近豐利及豐利山莊	10. NF 314	接駁青山公路近豐利山莊	11. NF 315	接駁青山公路近豐利山莊	12. NF 83	接駁海旁路近「聚賢樓」樓下	13. NF 100	接駁海旁路近豐利及豐利山莊	14. NF 102	接駁海旁路近豐利及豐利山莊	15. NF 103	接駁海旁路近豐利及豐利山莊	16. NF 161	接駁青山公路、屯門公路及青山公路、新墟路及豐利路	17. NF 162	接駁青山公路、屯門公路及青山公路、新墟路及豐利路	18. NF 231	接駁青山公路、屯門公路及青山公路、新墟路及豐利路	19. NF 232	接駁海旁路近豐利及豐利山莊	20. NF 319	接駁青山公路、新墟路、屯門公路及青山公路	21. NF 339	接駁青山公路、大埔路及青山公路	22. NS66	接駁青山公路近豐利山莊	已竣工(1項)		1. NS64	接駁海旁路近豐利及豐利山莊	已竣工(1項)		紀錄編號	位置	工程進行中(2項)		1. NF 65	接駁青山公路、青山公路近一號路	暫定計劃項目		紀錄編號	位置	已竣工(2項)		1. DT 01	接駁青山公路及屯門公路近豐利及豐利山莊及青山公路	2. DT 02	接駁青山公路及屯門公路近豐利及豐利山莊及青山公路	工程進行中(1項)		1. DT 01	接駁青山公路及屯門公路近豐利及豐利山莊及青山公路
第三階段計劃項目																																																																																			
紀錄編號	位置																																																																																		
工程進行中(23項)																																																																																			
1. NF 31A	連接屯門公路及新墟路及青山公路																																																																																		
2. NS64	連接青山公路、新墟路及豐利路																																																																																		
3. NF 84	接駁海旁路近「聚賢樓」樓下																																																																																		
4. NF 150	接駁青山公路、新墟路及豐利路																																																																																		
5. NF 151	接駁青山公路、新墟路及豐利路																																																																																		
6. NF 152	接駁青山公路、新墟路及豐利路																																																																																		
7. NF 153	接駁青山公路、新墟路及豐利路																																																																																		
8. NF 154	接駁青山公路、新墟路及豐利路																																																																																		
9. NF 209	接駁海旁路近豐利及豐利山莊																																																																																		
10. NF 314	接駁青山公路近豐利山莊																																																																																		
11. NF 315	接駁青山公路近豐利山莊																																																																																		
12. NF 83	接駁海旁路近「聚賢樓」樓下																																																																																		
13. NF 100	接駁海旁路近豐利及豐利山莊																																																																																		
14. NF 102	接駁海旁路近豐利及豐利山莊																																																																																		
15. NF 103	接駁海旁路近豐利及豐利山莊																																																																																		
16. NF 161	接駁青山公路、屯門公路及青山公路、新墟路及豐利路																																																																																		
17. NF 162	接駁青山公路、屯門公路及青山公路、新墟路及豐利路																																																																																		
18. NF 231	接駁青山公路、屯門公路及青山公路、新墟路及豐利路																																																																																		
19. NF 232	接駁海旁路近豐利及豐利山莊																																																																																		
20. NF 319	接駁青山公路、新墟路、屯門公路及青山公路																																																																																		
21. NF 339	接駁青山公路、大埔路及青山公路																																																																																		
22. NS66	接駁青山公路近豐利山莊																																																																																		
已竣工(1項)																																																																																			
1. NS64	接駁海旁路近豐利及豐利山莊																																																																																		
已竣工(1項)																																																																																			
紀錄編號	位置																																																																																		
工程進行中(2項)																																																																																			
1. NF 65	接駁青山公路、青山公路近一號路																																																																																		
暫定計劃項目																																																																																			
紀錄編號	位置																																																																																		
已竣工(2項)																																																																																			
1. DT 01	接駁青山公路及屯門公路近豐利及豐利山莊及青山公路																																																																																		
2. DT 02	接駁青山公路及屯門公路近豐利及豐利山莊及青山公路																																																																																		
工程進行中(1項)																																																																																			
1. DT 01	接駁青山公路及屯門公路近豐利及豐利山莊及青山公路																																																																																		
總目 705 分目 5001BX	長遠防治山泥傾瀉計劃	1,045 (長遠防治山泥傾瀉計劃於2023/24年度的預算費用)	土木工程拓展署	(2010) 2010	(持續進行) 持續進行	在長遠防治山泥傾瀉計劃下，我們已為屯門區 115 個人造斜坡及擋土牆，以及 5 個天然山坡（山坡編號為 6SW-A/SA1、6SW-A/SA2、6SW-D/SA1、6SW-D/SA2 及 6SW-D/SA3）完成了防治山泥傾瀉工程。 現時屯門區有 5 個人造斜坡及擋土牆，以及 2 個天然山坡（山坡編號為 6SW-A/SA3, 6SW-D/SA4）正進行防治山泥傾瀉工程，這些工程預計於 2025 年第 2 季完成，斜坡資料如下： 合約編號: GE/2021/16 (合約已展開,預計於 2026 年第 1 季完成。) ● 1 個位於屯門掃管笏的斜坡，編號 6SW-C/C 171。	 註釋: ▲ 將動工的工程 (人造斜坡及擋土牆) (14) ■ 進行中的工程 (人造斜坡及擋土牆) (5) ● 已完成的工程 (人造斜坡及擋土牆) (115) ■ 進行中的工程 (天然山坡)(2) ■ 已完成的工程 (天然山坡) (5) 屯門區的長遠防治山泥傾瀉工程																																																																												

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長 及負責 部門/機構	(原訂計劃動工 日期) 最新估計/實際 日期 (月/年)	(原訂計劃竣 工日期) 最新估計/實 際日期 (月/年)	工程內容／備註	位置圖/照片
						合約編號: GE/2022/15 (合約已展開,預計於 2027 年第 2 季完成。) ● 1 個位於屯門新華里的斜坡，編號 6SW-A/C 62。 ● 1 個位於屯門聯安新村的斜坡，編號 6SW-D/C 844。 合約編號: GE/2022/16 (合約已展開,預計於 2027 年第 1 季完成。) ● 1 個位於屯門小秀村 19B 號屋後的斜坡，編號 6SW-C/CR 916。 合約編號: GE/2022/26 (合約已展開,預計於 2026 年第 4 季完成。) ● 1 個位於屯門掃管笏老青山村附近的斜坡，編號 6SW-C/C 76。 土木工程拓展署並計劃在未來一年為屯門區 14 個人造斜坡及擋土牆展開防治山泥傾瀉工程，相關工程將於 2026 年第 2 季完成。	
