

屯門區議會
2024-2027年地區設施及工程委員會

其他政府部門工程進度匯報（截至2025年2月28日）

編號	事項	政府部門	最新情況
A.	渠務署進度匯報	渠務署	見附件一
B.	水務署有關屯門區水管修復或敷設工程的進度匯報	水務署	見附件二

渠務署進展匯報

I. 清理屯門河河床淤泥工程進度(截至 2025 年 2 月 28 日)

工程位置	長度 (米)	負責部門	實際動工日期 (預計動工日期)	實際動工日期 (預計動工日期)	進度/備註
杯渡路至 屯馬綫 兆康站	2400	渠務署	10/2024	12/2024	工程已完成
			01/2025	(03/2025)	工程進行中
			(04/2025)	(06/2025)	工程計劃中
			(07/2025)	(09/2025)	工程計劃中
屯馬綫屯門 站至河口	1800	土木工程 拓展署	根據 2024 年第四季進行的深度測量數據顯示，有關位置的河床水平並未觸及渠務署所訂定的防洪戒備水平。土木工程拓展署會繼續定期於相關河段進行深度測量及巡查，以監察河床水平情況。當發現河床水平影響河道的防洪能力，便會安排清理積聚在河道的沉積物，以保持河道暢通。		

II. 第44區魚類批發市場及屯門避風塘的疏浚工程

土木工程拓展署已分別於2020年4月底和2021年4月底協助海事處完成屯門避風塘第一及第二階段的疏浚工程。有關位置見附圖一。


III. 屯門鄉郊排污渠工程

合約編號 DC/2020/07 - 屯門北部鄉村污水收集系統

此工程項目主要在福亨村(下)興建一所污水泵房及相關壓力污水管道，為小坑村、寶塘下、紫田村及福亨村(下)敷設公共污水收集系統。工程已於 2021 年 1 月展開，於 2024 年第 4 季大致完成。

渠務署

2025 年 2 月

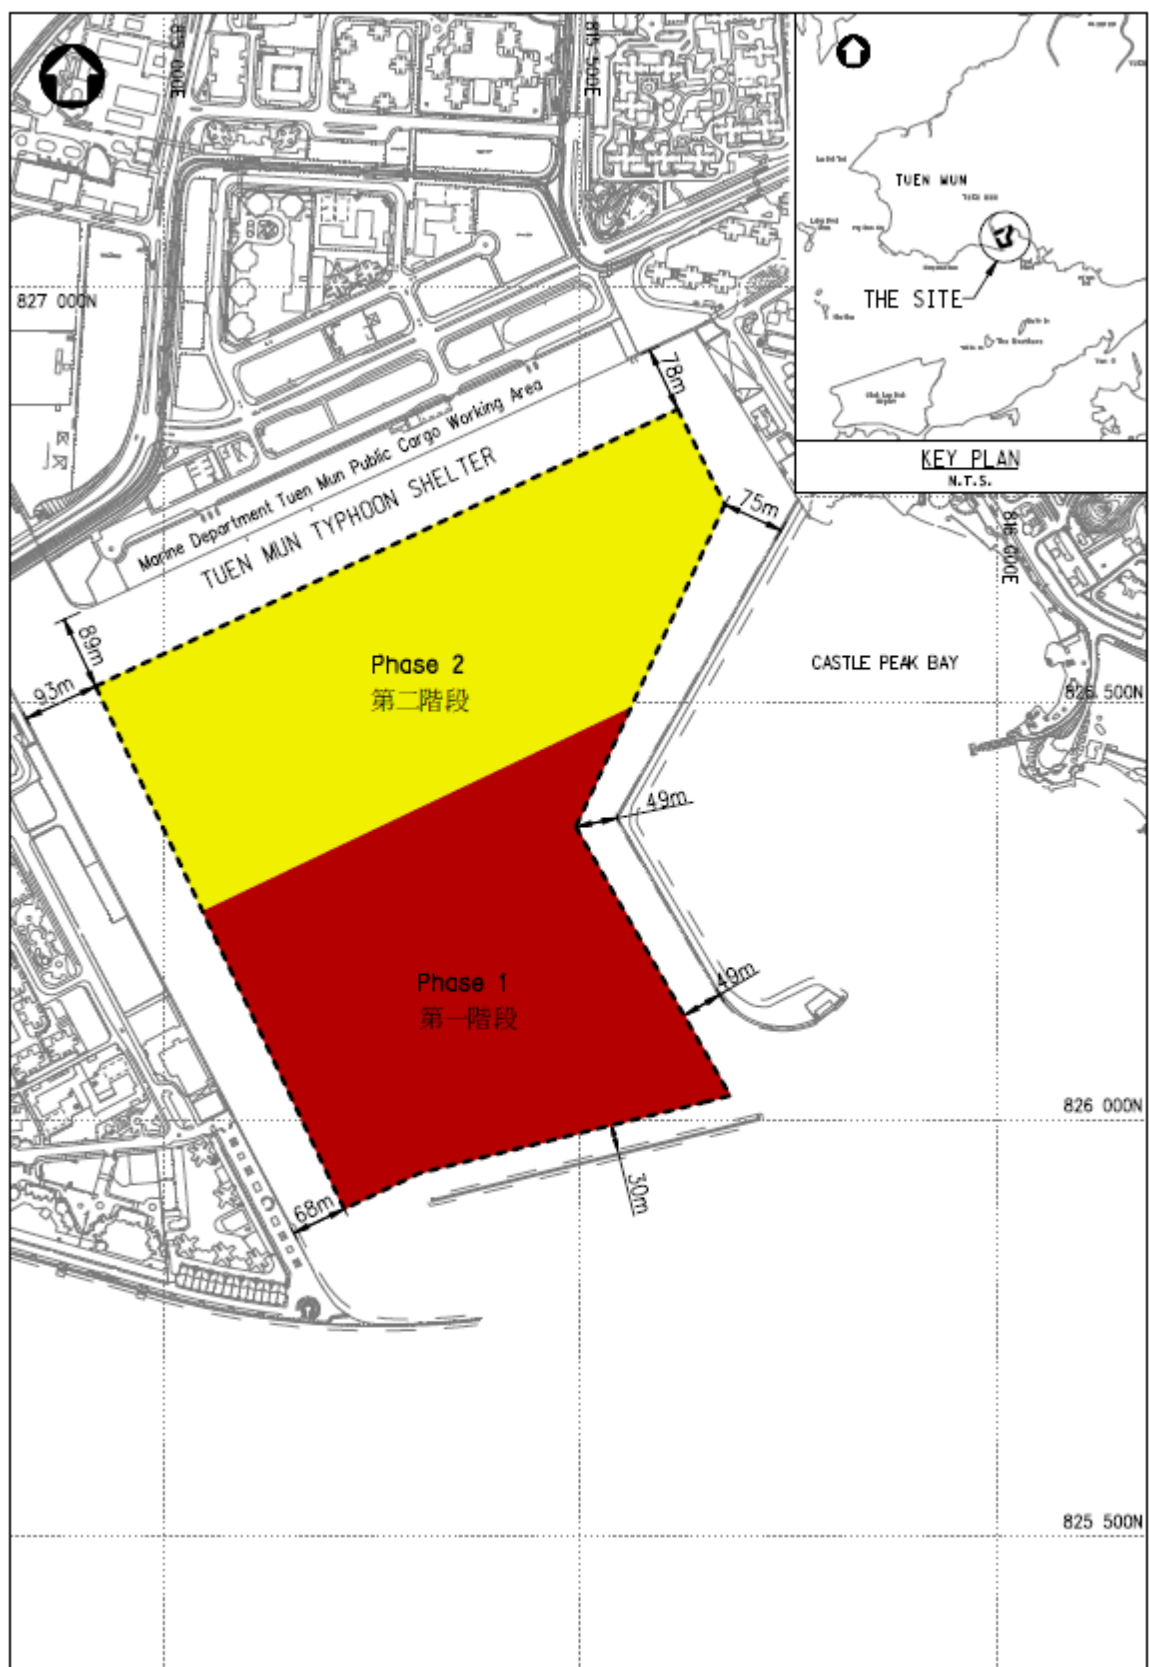

附圖一：屯門避風塘疏浚工程位置圖

水務署有關屯門區水管修復或敷設工程的進度匯報 (截至 2 月 28 日)

為改善屯門區內供水設施，水務署現正在區內進行的水管工程合約如下：

進行之水管修復或敷設工程及進度如下：

編號	合約編號	工程位置	長度 (米)	水管直徑 (毫米)	動工日期	完工日期	進度	備註
1	12/WSD/20	青賢街、河旁街、屯門鄉事會路	540	40 100	Q2/2022	Q2/2025	95%	鋪設水管進行中。
2	12/WSD/20	華發街	600	150 200	Q3/2023	Q2/2025	95%	鋪設水管進行中
3	3/WSD/21	湖山路至湖翠路	1440	200 250	Q3/2022	Q1/2025	90%	鋪設水管進行中。
4	3/WSD/21	龍門路	200	900	Q4/2023	Q1/2025	20%	鋪設水管進行中。
5	3/WSD/21	屯門鄉事會路 近屯興路	80	375	Q1/2024	Q2/2025	50%	鋪設水管進行中。
6	3/WSD/21	屯門鄉事會路 近友愛邨	150	375	Q4/2024	Q2/2025	5%	此路段已通過試路,工程將會隨即展開。
7	12/WSD/20	天后路	20	150	Q2/2022	Q1/2025	100%	鋪設水管完成。

計劃中的水管修復或敷設工程如下：

合約編號	工程位置	長度 (米)	水管直徑 (毫米)	動工日期	完工日期	備註
10/WSD/24	屯門石排頭路近建發街	195	50 100 150 250	Q4/2025	Q4/2027	現階段因遇到技術性問題，工程需要進行進一步研究後才能繼續展開。

水務署
2025 年 2 月
