

屯門區議會
2024-2027年地區設施及工程委員會

其他政府部門工程進度匯報

編號	事項	政府部門	最新情況
A.	渠務署進度匯報	渠務署	見附件一
B.	水務署有關屯門區水管修復 或敷設工程的進度匯報	水務署	見附件二

渠務署進度匯報

I. 清理屯門河河床淤泥工程進度(截至 2023 年 12 月 31 日)

工程位置	長度 (米)	負責部門	(預計動工日期) 實際動工日期	(預計完工日期) 實際完工日期	進度/備註
杯渡路至 屯馬綫 兆康站	2400	渠務署	05/2023	06/2023	工程已完成
			07/2023	09/2023	工程已完成
			10/2023	12/2023	工程已完成
皇珠路至 杯渡路	850	土木工程 拓展署	12/2011	04/2012	工程已完成
屯義街以南 的下游	600	土木工程 拓展署	04/2018	06/2018	工程已完成
屯義街至 友愛橋	640	土木工程 拓展署	09/2019	03/2020	工程已完成

II. 第44區魚類批發市場及屯門避風塘的疏浚工程

土木工程拓展署已分別於 2020 年 4 月底和 2021 年 4 月底完成屯門避風塘第一及第二階段的疏浚工程。有關位置見附圖一。


III. 屯門鄉郊排污渠工程

合約編號 DC/2020/07 - 屯門北部鄉村污水收集系統

此工程項目主要在福亨村(下)興建一所污水泵房及相關壓力污水管道，為小坑村、寶塘下、紫田村及福亨村(下)敷設公共污水收集系統。工程已於 2021 年 1 月展開，預計於 2024 年第 4 季大致完成。

渠務署

二零二三年十二月

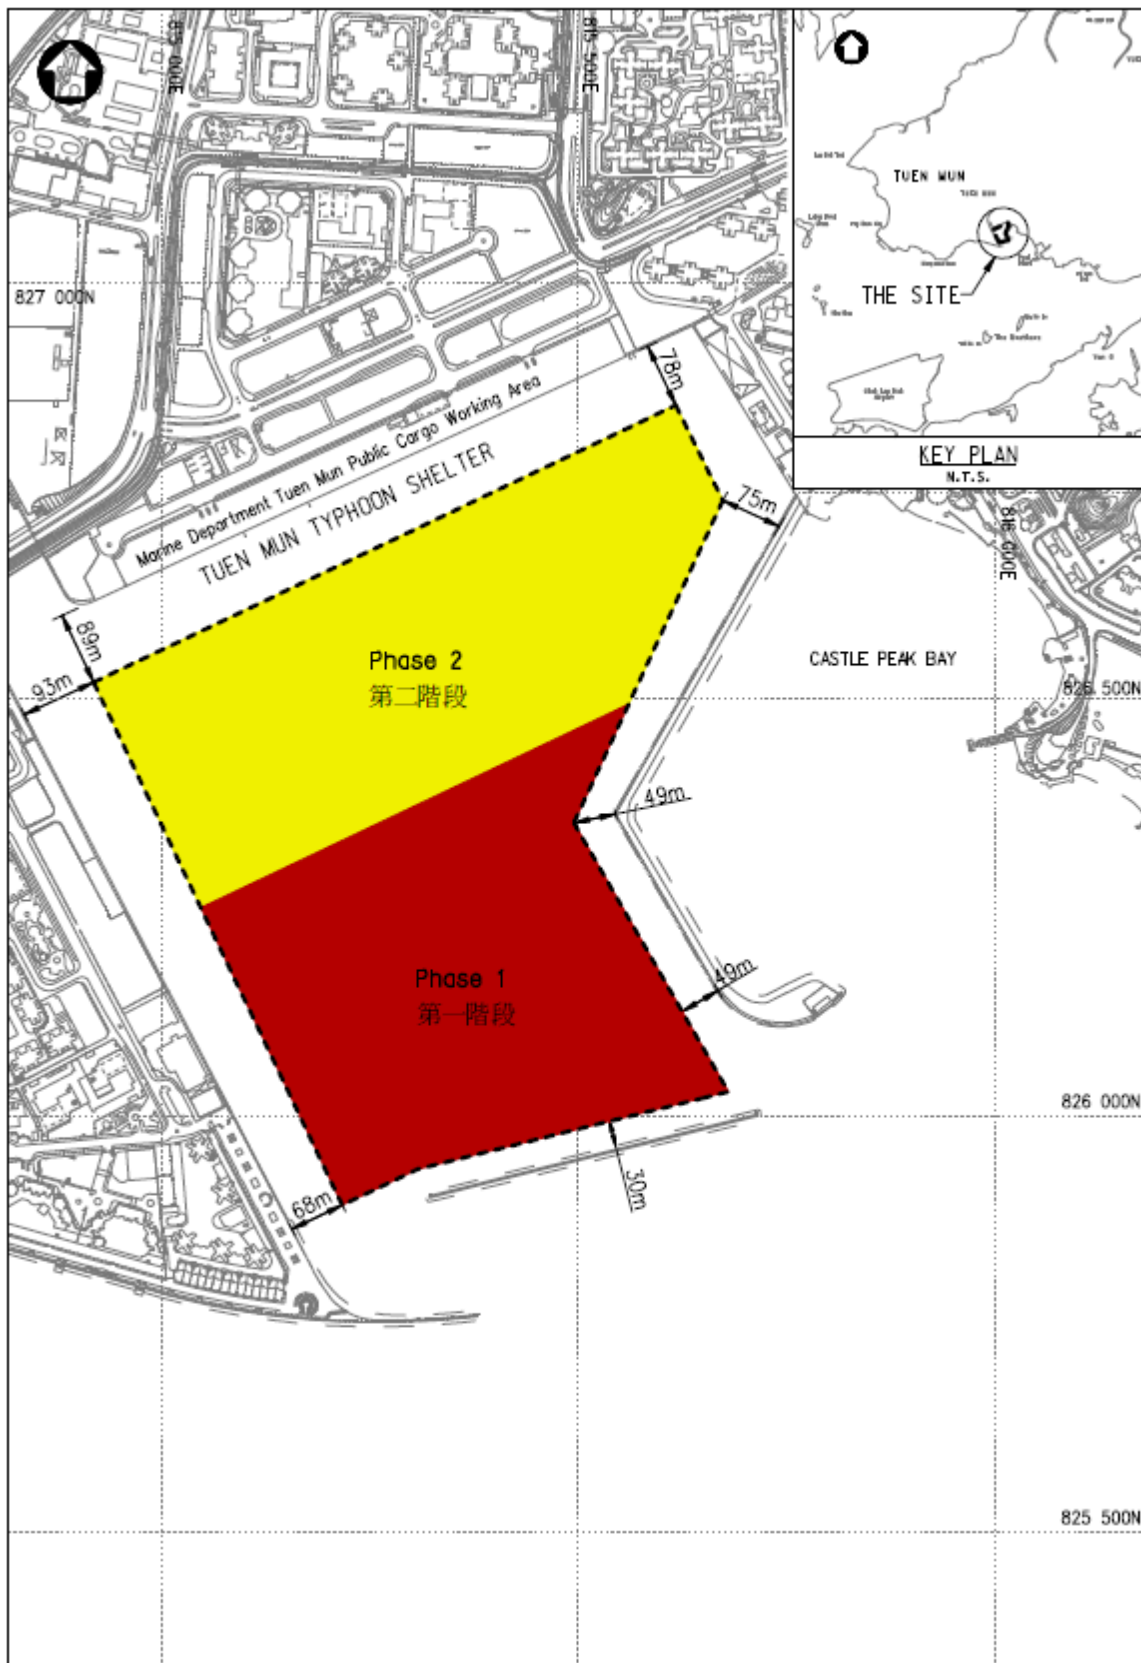

附圖一：屯門避風塘疏浚工程位置圖

水務署有關屯門區水管修復或敷設工程的進度匯報 (截至 1 月 15 日)

為改善屯門區內供水設施，水務署現正在區內進行的水管工程合約如下：

進行之中的水管修復或敷設工程及進度如下：

編號	合約編號	工程位置	長度 (米)	水管直徑 (毫米)	動工日期	完工日期	進度	備註
1	12/WSD/20	青賢街、河旁街、屯門鄉事會路	540	40 100	Q2/2022	Q2/2024	85%	鋪設水管進行中 路政署掘路許可證申請中。
2	12/WSD/20	屯富路	240	50	Q2/2022	Q1/2024	95%	鋪設水管進行中
3	12/WSD/20	屯貴路	130	50	Q1/2022	Q2/2024	80%	鋪設水管進行中。 路政署掘路許可證申請中。
4	12/WSD/20	龍鼓灘	2000	25 40 80	Q4/2022	Q2/2024	90%	鋪設水管進行中。
5	12/WSD/20	華發街	600	150 200	Q4/2023	Q2/2024	10%	鋪設水管進行中
6	3/WSD/21	湖山路至湖翠路	1440	200 250	Q3/2022	Q4/2024	65%	鋪設水管進行中。
7	3/WSD/21	屯門公園近愛德里及愛明里	1040	600	Q1/2023	Q4/2024	90%	鋪設水管進行中。
8	3/WSD/21	澤豐街	72	80	Q3/2023	Q4/2024	100%	鋪設水管完成。
9	3/WSD/21	康輝路	120	375	Q3/2023	Q4/2024	5%	鋪設水管進行中。
10	3/WSD/21	龍門路	200	900	Q3/2023	Q3/2024	5%	鋪設水管進行中。

計劃中的水管修復或敷設工程如下：

合約編號	工程位置	長度 (米)	水管直徑 (毫米)	動工日期	完工日期	備註
12/WSD/20	天后路	20	150	Q2/2024	Q2/2024	路政署掘路許可證申請中
3/WSD/21	屯門鄉事會路近友愛邨	150	400	Q1/2024	Q4/2024	港鐵不反對通知申請中。
3/WSD/21	屯門鄉事會路近屯興路	80	375	Q1/2024	Q4/2024	交通管制組道路工程展開通知申請中。
3/WSD/21	杯渡路	290	200 400	Q1/2024	Q3/2024	路政署掘路許可證申請中。
3/WSD/21	屯門石排頭路近建發街	195	50 100 150 250	Q1/2023	Q4/2024	路政署掘路許可證申請中。

水務署

2024 年 1 月
