

食物環境衛生署報告在大埔區內的
小規模工程項目(2025 年 7 月至 8 月)

目的

本文件旨在闡述食物環境衛生署及建築署的主要小規模工程進度。

背景

2. 截止 2025 年 8 月底，大埔區有 3 個規劃中的小規模工程。有關詳情已載列於附件 I 及 II。

小規模工程進度

3. 請各委員備悉上述工程進度報告。

大埔區議會秘書處
2025 年 9 月

大埔區議會地區設施及工程委員會

食物環境衛生署 / 建築署過去兩個月內完成、正在施工或規劃中的主要小規模工程項目及時間表(截至 2025 年 8 月底)

項目編號	擬建的小規模工程項目	地點	預期動工日期 【實際動工日期】	預期完工日期 【實際完工日期】	詳細備註	食環署 負責人姓名 【電話】	建築署 負責人姓名 【電話】
1	東平洲公廁翻新工程	東平洲	【2025 年 7 月】	2026 年 5 月	工程進行中	大埔區衛生總督察 1 劉偉祥先生 【3183 9101】	物業事務經理/ 食環事務 1 盧啟邦先生 【2286 3575】
2	港鐵大埔墟站公廁翻新工程	大埔墟港鐵站	2025 年 10 月	2026 年 8 月	工程規劃中	大埔區衛生總督察 1 劉偉祥先生 【3183 9101】	物業事務經理/ 食環事務 3 梁聖康先生 【2286 3587】

食物環境衛生署 圍下村公廁翻新工程

目的

本文件旨在向委員闡述有關食物環境衛生署(下稱「本署」)計劃於二零二五年第四季在圍下村公廁展開的翻新工程。

背景

2. 本署與建築署合作推行公廁翻新計劃，在較舊式或旅遊熱點的公廁進行翻新及改善工程，把公廁提升至最新的設計標準，從而提高本署提供公廁服務的水平。

3. 本署計劃翻新位於大埔汀角圍下村旱廁改為沖水式公廁，該圍下村公廁的位置圖載於附件一。

翻新工程範圍和實施計劃

4. 圍下村公廁翻新工程計劃如下：

(i) 施工期

翻新工程預計於二零二五年第四季展開及於二零二六年第三季竣工。

(ii) 翻新後設施

- 設有 1 個暢通易達洗手間；
- 設有 1 個無分性別的通用洗手間，並設有嬰兒座椅、兒童座廁及兒童洗手盆；
- 所有廁格均設有電子感應沖水系統；

- 所有洗手盆均設有電子感應水龍頭及電子感應視液機。

圍下村公廁現時及翻新工程後的平面圖分別載於附件二及
-----三。此外，圍下村公廁翻新後的外觀設計圖載於附件四。


(iii) 臨時安排

在翻新工程進行期間，本署會在附近合適地點提供臨時流動廁所服務，並在廁所外張貼適當告示。


5. 預計翻新工程的費用約為四百四十八萬元。

食物環境衛生署
大埔區環境衛生辦事處
2025 年 9 月 11 日


圍下村公廁的位置圖

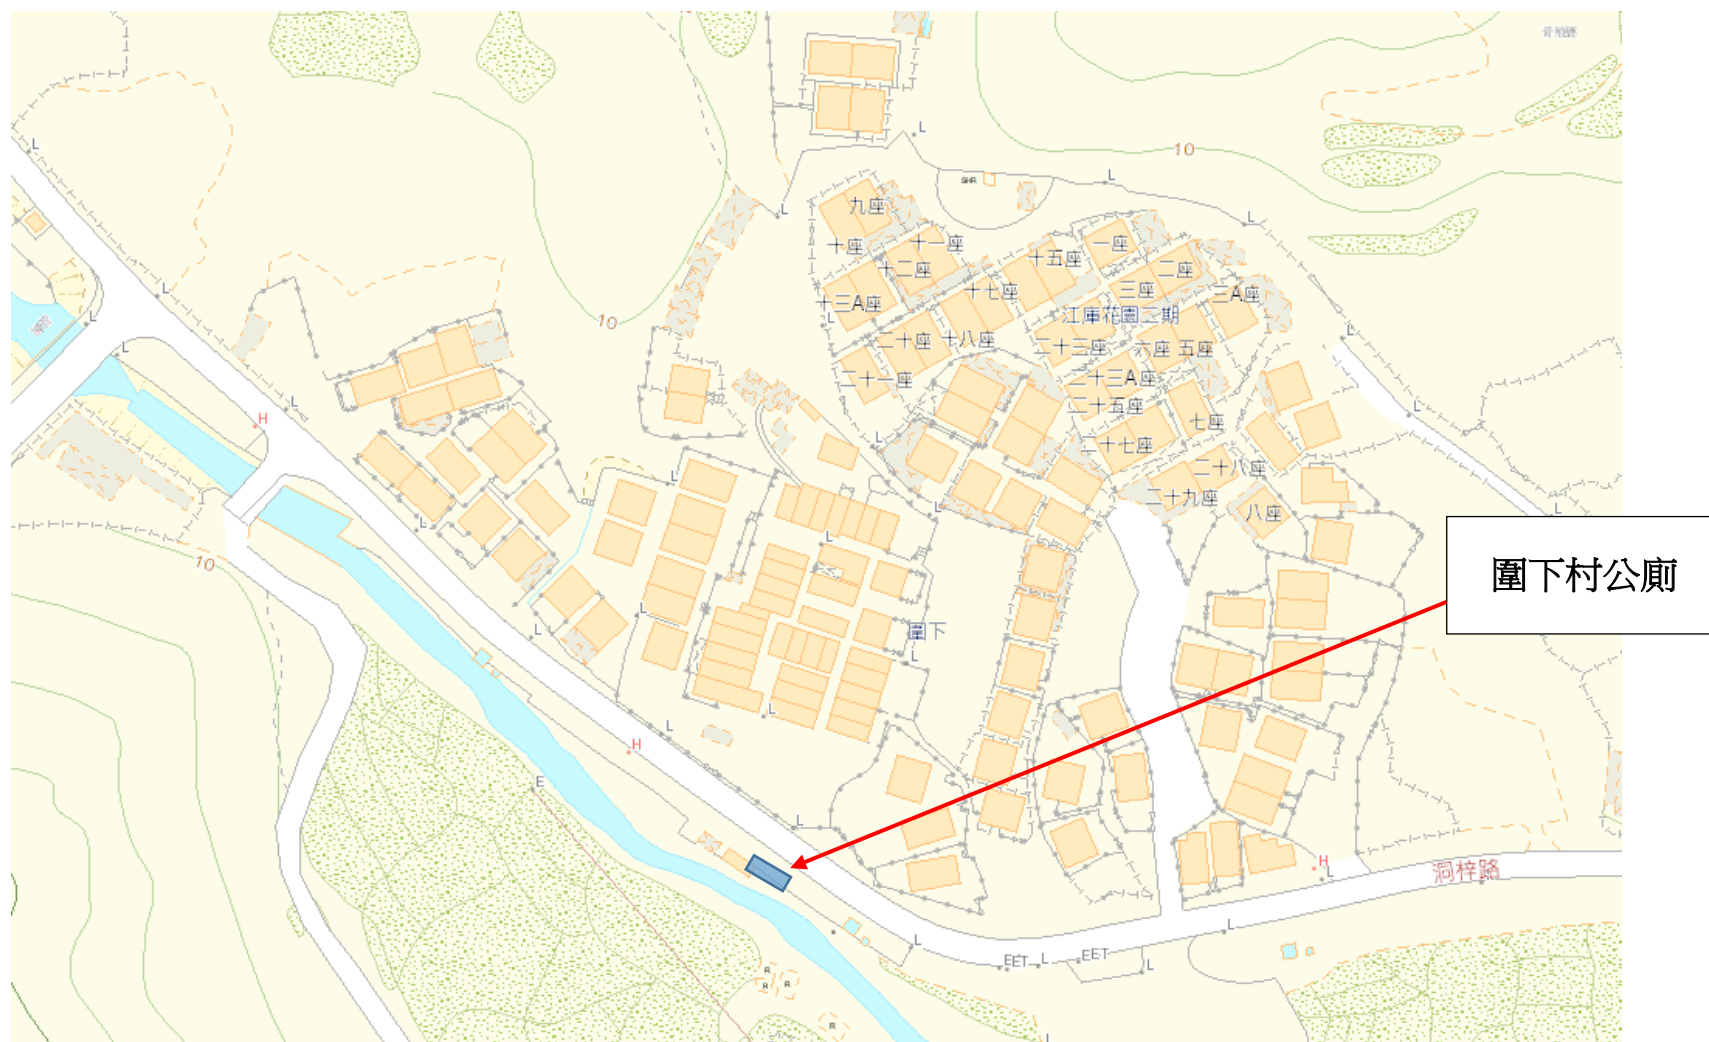

圍下村公廁現時的平面圖則

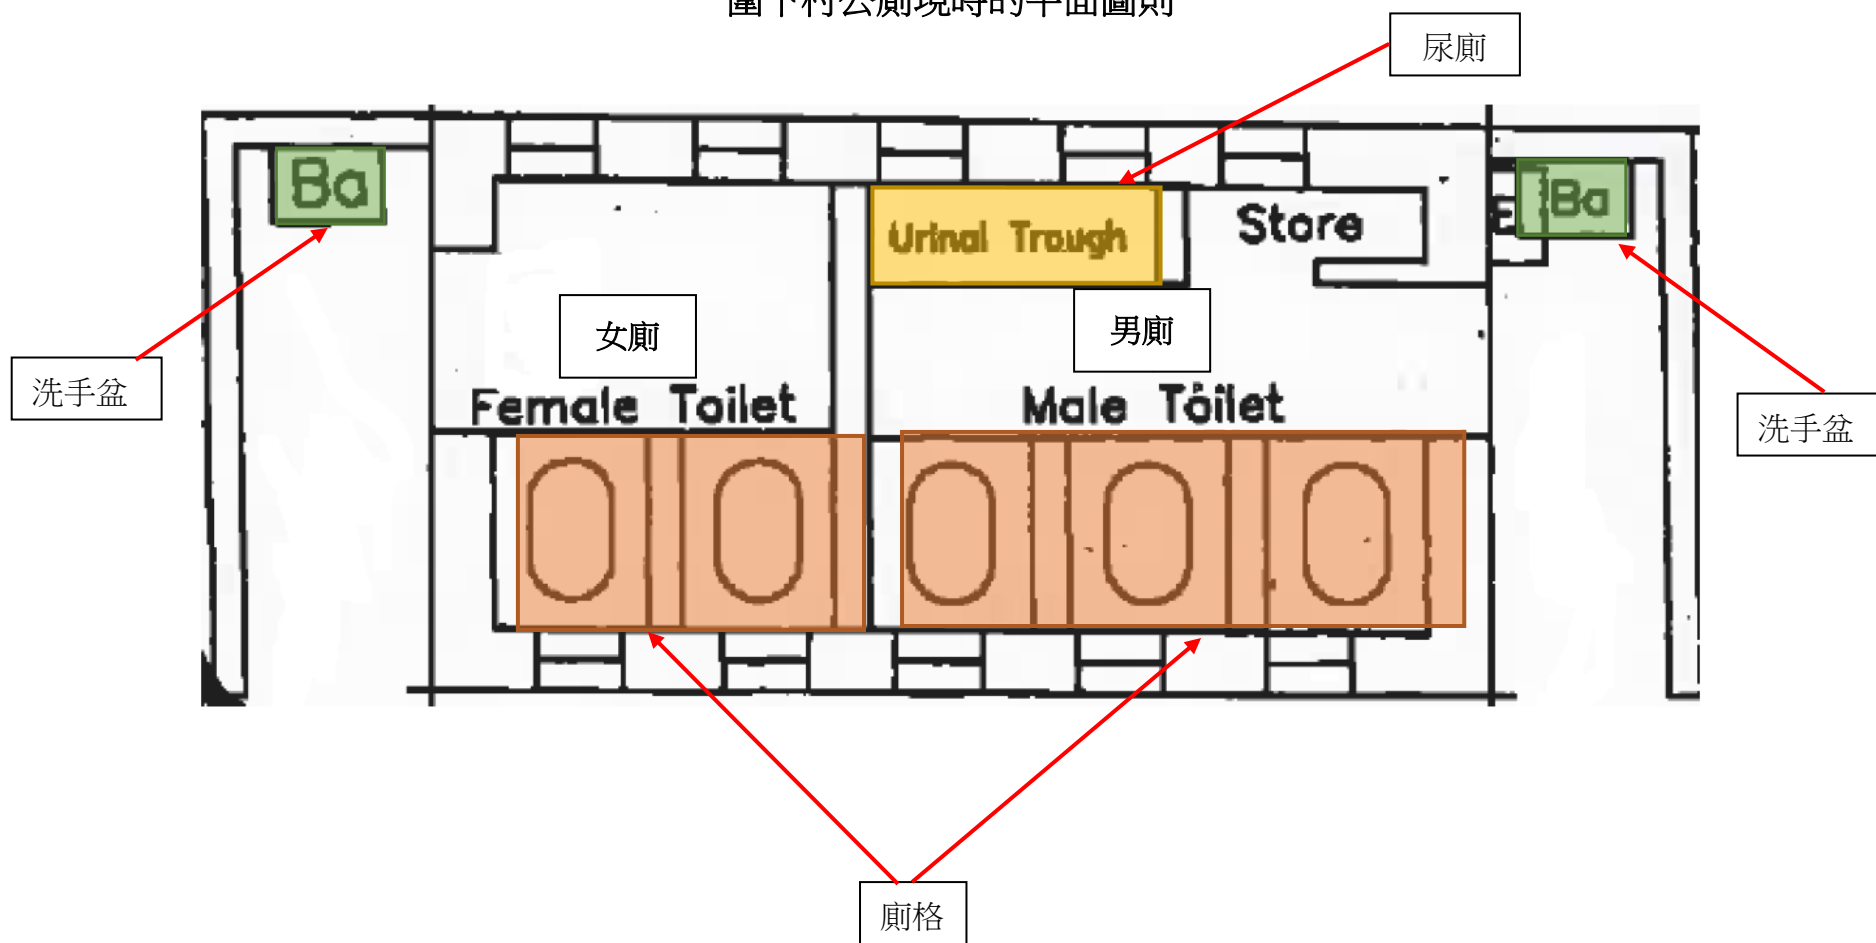

圍下村公廁翻新後的平面圖則

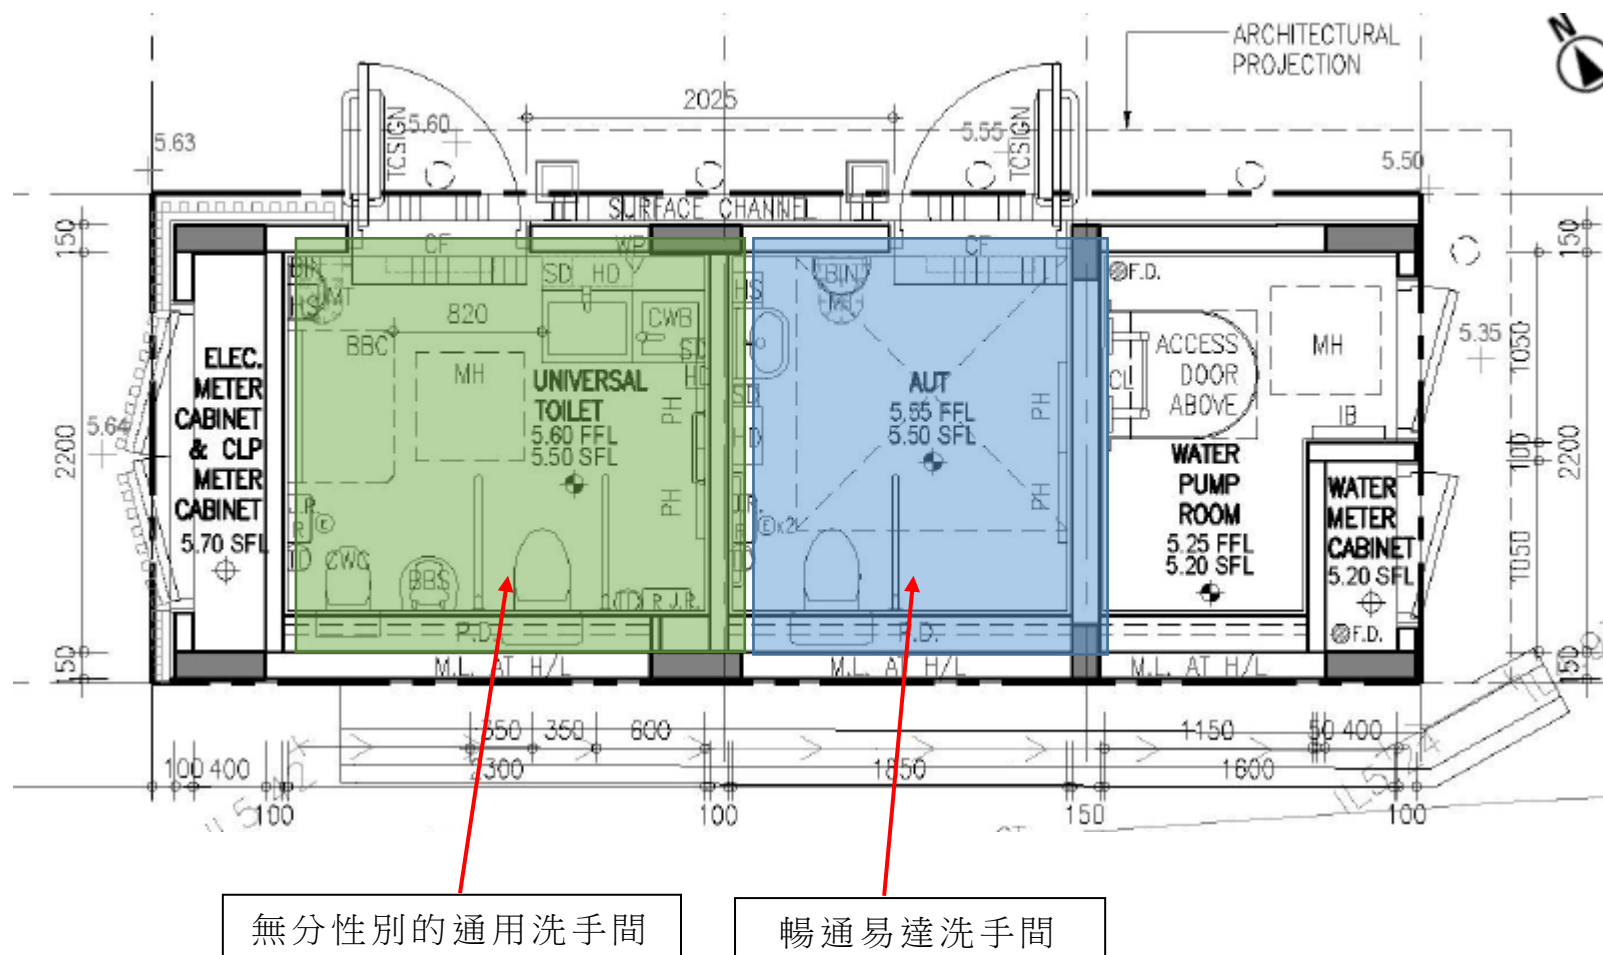

圍下村公廁翻新後的外觀設計圖

