

屯門區議會
2012-2013 年地區設施管理委員會轄下
屯門綠化事宜工作小組
第五次會議記錄

日期：2012 年 10 月 15 日（星期一）

時間：下午 3 時正

地點：屯門區議會會議室

出席者：

蘇炤成先生（召集人）	屯門區議員
梁健文先生，BBS, MH	屯門區議會副主席
李洪森先生，MH	屯門區議員
林頌鎧先生	屯門區議員
林德亮先生，MH, JP	屯門區議員
何君堯先生	屯門區議員
曾憲康先生	屯門區議員
蘇嘉雯女士	屯門區議員
李嘉燕女士（秘書）	屯門民政事務處活動統籌員（區議會）二

列席者：

羅慶新先生	土木工程拓展署高級工程師/土地工程部
譚嘉樂先生	康樂及文化事務署經理（公園及遊樂場）屯門區二
李淑嫻女士	康樂及文化事務署屯門區副康樂事務經理二
黃舜賢先生	康樂及文化事務署屯門區助理康樂事務經理（分區支援）
黃大元先生	康樂及文化事務署高級康樂助理員（屯門）
劉煦恆先生	康樂及文化事務署康樂事務經理（樹木）新界北
袁達成先生	康樂及文化事務署高級康樂助理員（樹木）新界北
向偉健先生	艾奕康有限公司駐地盤高級境觀建築師
陳雋浩先生	艾奕康有限公司駐地盤助理境觀建築師
邱若瑟先生	艾奕康有限公司駐地盤工程師
徐春香女士	艾奕康有限公司駐地盤高級林業主任
吳琰玲女士	艾奕康有限公司公共關係主任
高振華先生	中國港灣工程有限責任公司項目經理
伍宏碩先生	中國港灣工程有限責任公司地盤經理

缺席者：

陳雲生先生，MH	屯門區議員
陶錫源先生，MH	屯門區議員

蘇愛群女士
程志紅女士

屯門區議員
屯門區議員

負責人

通過上次會議記錄

小組成員一致通過上次會議記錄。

討論事項

(一) 屯門市中心段植樹安排及進度

2. 艾奕康有限公司（下稱「艾奕康」）向偉健先生以投影片介紹最新的植樹進度及編派情況（詳見附件一）。

3. 由於屯門公路市中心段位置受擴闊車道工程影響而需要移植及移除樹木，故向地政總署提出樹木移除申請，並已於 2009 年獲地政總署批准，於鄰近受影響地區補償種植共 539 棵樹木。

4. 艾奕康向先生補充，所有補償樹木的初步位置已於以往的監察屯門市中心段植樹事宜工作小組及屯門綠化事宜工作小組的會議上確認。截至 2012 年 10 月，已完成種植 374 棵樹木，餘下 165 棵樹木有待確認其種植位置及可行性，現正與區議員及有關部門協調中，其中受工程影響的地區會優先獲得分配。若成員認為有關建議種植位置並不合適，可於工作小組會議上提出。路政署及艾奕康將按成員的建議進行實地視察及諮詢相關政府部門及當區區議員的意見，再向工作小組匯報建議有否需要作出微調，討論並獲得工作小組同意後，方進行植樹工作。

5. 有成員表示，路政署及艾奕康須就餘下未確認種植位置的樹木諮詢各區議員，並作出公平分配。

6. 召集人建議於麒麟崗公眾公園種植楓香，取代日本葵。艾奕康向先生表示，需時作更仔細研究。康樂及文化事務署（下稱「康文署」）李淑嫻女士則表示，上述公園花床的空間並不適合種植楓香。

7. 經討論後，餘下 165 棵樹木的種植位置，工作小組已確認當中 142 棵樹木的位置，並同意再行商討餘下 23 棵原擬於屯門公路近西鐵兆康站植樹的位置。

其他事項

(一) 綠色力量市區綠化計劃

8. 秘書處已將各區議員的建議交予綠色力量研究。

9. 土木工程拓展署羅慶新先生表示，屯門綠化總綱圖將因應區內不同的綠化項目及成員的種植建議而作出相應的調整及修訂。

10. 康文署李女士重申，有關種植計劃應先得到署方同意，並須向署方提供應付日後保養工作的經常性開支款項，署方方能在其管轄的地方提供保養工作。此外，需按種植計劃邀請其他相關政府工程部門給予意見、同意日後的保養工作及提供協助保養或管理的工作。就上述各區議員提出的建議，她指出由於在青海圍麗寶大廈近置樂橋底位置設有電箱及正在進行工程，建議應先向相關部門諮詢意見。

下次會議日期

11. 議事完畢，主席於下午 4 時 15 分宣布會議結束，下次會議日期待定。

屯門區議會秘書處

日期：2012 年 11 月 8 日

檔號：HAD TM DC/13/35/DFMC/8



2012-2013年度 屯門區議會 地區設施管理委員會
屯門綠化事宜工作小組

第五次會議

屯門市中心段 植樹工作匯報



合約編號：HY/2009/03
合約名稱：屯門公路市中心段交通改善工程設計及建造



匯報議程

1. 背景
2. 植樹進度簡報
3. 補償樹木植樹 (修訂) 方案



仁愛街市

樹木品種：紫玉蘭 種植方式：樹穴



屯利街 近青山公路

樹木品種：厚葉榕 種植方式：花盆



清河坊近置樂花園

樹木品種：串錢柳 種植方式：樹穴



仁愛街市

樹木品種：白玉蘭 種植方式：樹穴



青山公路近恆福花園

樹木品種：垂榕 種植方式：花盆



屯門鄉事會路 近兆麟街

樹木品種：厚葉榕 種植方式：花盆



屯門鄉事會路

樹木品種：蒲葵 種植方式：花盆




清河坊近置樂花園

樹木品種：串錢柳/白蘭 種植方式：樹穴



屯利街 近青山公路

樹木品種：厚葉榕 種植方式：花盆

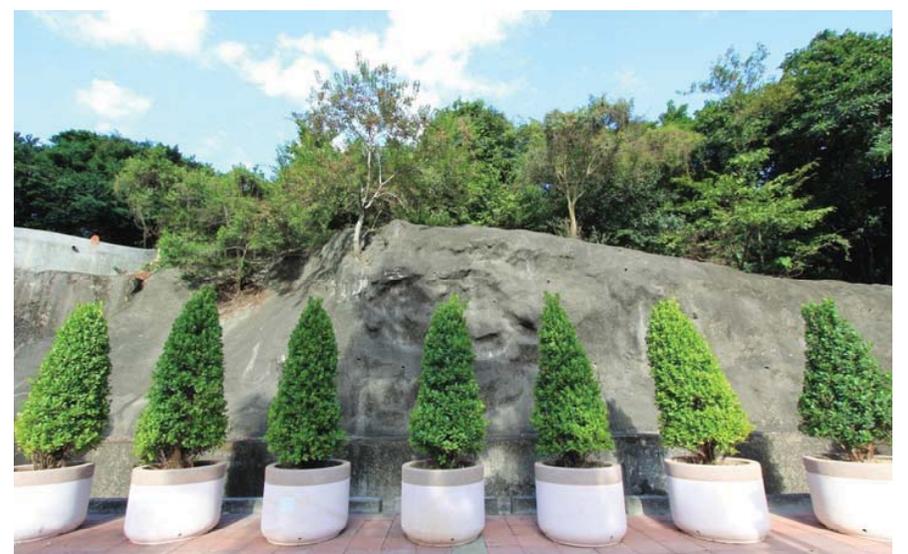

青山公路 近屯門市廣場

樹木品種：厚葉榕 種植方式：花盆

1. 背景

• 補償樹木總數

539 棵補償樹木總數是根據地政署於2009年批准的樹木移除申請
Ref: (11) DLOTM 131/3/184 Pt.4 所列出的補償樹木數量

• 補償樹木的保養部門

根據地政署上述批准的樹木移除申請、相關的技術指引及部門協商，所有補償樹木於承建商的12個月的保養期(Establishment Period)後將交由康文署進行保養工作

1. 背景

• 確定植樹方案之機制

根據地政署上述批准的樹木移除申請中的補償樹木方案向區議會、當區區議員、康文署及相關部門提出諮詢

因應區議員、康文署及相關部門的意見及實際現場環境(如地下管線道)作出微調，再得到上述各方批准後，方開始種植工作

故此，品種、位置及種植方式與原補償樹木方案或有區別。
全部種植工作完成後，所有竣工記錄圖將交予地政總署



2. 植樹進度簡報

2. 植樹進度簡報

補償樹木總數 539 棵

補償樹木總數是根據地政署已批准的樹木移除申請
Ref: (11)DLOTM 131/3/184 Pt.4所列出的補償樹木數量

直至2012年10月
已植樹數量 374 棵

樹穴 / 花盆種植總和
已種植的 374 棵樹木中
其中175 棵正由承建商進行保養工作
其中199 棵已移交相關部門保養

直至2012年10月
餘下樹木種植數目 165 棵

2. 植樹進度簡報

直至2012年10月餘下植樹數量：

餘下樹木樹穴種植數目 165 棵

準備種植的樹木數目
已於第三次綠化事宜工作小組確認 97 棵
(包括約10 棵已被小組確認種植位置的樹木於會後得到康文署確認)

準備與相關區議員及政府部門協調的樹木數目
於本次綠化事宜工作小組提出建議方案 68 棵
(包括已於第四次綠化事宜工作小組提出的建議方案)


補償樹木總數

539棵補償樹木總數是根據地政署已批准的樹木移除申請
Ref: (11) DLOTM 131/3/184 Pt.4 所列出的補償樹木數量

17


2. 植樹進度簡報

植樹總綱圖(Master tree planting plan)

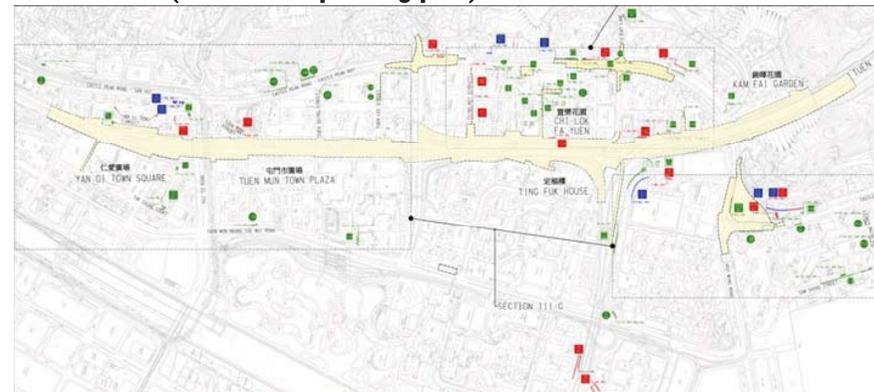

種植的位置

所有種植的位置皆位置在鄰近施工期間受影響的地區



3. 補償樹木植樹(修訂)方案

3. 補償樹木植樹(修訂)方案

直至2012年10月餘下植樹數量：

餘下樹木樹穴種植數目 165 棵

準備種植的樹木數目
已於第三次綠化事宜工作小組確認 97 棵
(包括約10 棵已被小組確認種植位置的樹木於會後得到康文署確認)

準備與相關區議員及政府部門協調的樹木數目
於本次綠化事宜工作小組提出建議方案 68 棵
(包括已於第四次綠化事宜工作小組提出的建議方案)

註： 本投影片上述數目乃建議方案數目，方案已於會議上作修訂及確認，
請參照第 21 張投影片上所列出的數目為準。

補償樹木總數

539棵補償樹木總數是根據地政署已批准的樹木移除申請
Ref: (11) DLOTM 131/3/184 Pt.4 所列出的補償樹木數量

20

3.1 補償樹木植樹(修訂)方案 準備種植的樹木(已於第三次綠化事宜工作小組會議通過)

位置10-R2 青山公路青山灣段近凱德花園

品種: 藍花楹 Jacaranda acutifolia 6棵



進度: 即將種植

3.1 補償樹木植樹(修訂)方案 準備種植的樹木(已於第三次綠化事宜工作小組會議通過)

位置 18 屯仁街

品種: 白蘭 Michelia x alba 5棵



進度: 掘路紙獲批, 植樹工作進行中

3.1 補償樹木植樹(修訂)方案 準備種植的樹木(已於第三次綠化事宜工作小組會議通過)

位置18A-R2 青山公路青山灣段中電變電站

品種: 楓香 Liquidambar formosana 4棵



進度: 水務署地下管線預計十月完成

3.1 補償樹木植樹(修訂)方案 準備種植的樹木(已於第三次綠化事宜工作小組會議通過)

位置 18A-R3 青山公路青山灣段近恆順園

品種: 楓香 Liquidambar formosana 4棵



進度: 種植工作協調中

3.1 補償樹木植樹(修訂)方案 準備種植的樹木(已於第三次綠化事宜工作小組會議通過)

位置 27 及 28 青海園

品種: 宮粉洋蹄甲 *Bauhinia variegata* 17棵



進度: 中電地下管線搬移完成, 掘路紙獲批, 2013上半年完成植樹工作。

3.1 補償樹木植樹(修訂)方案 準備種植的樹木(已於第三次綠化事宜工作小組會議通過)

位置 30A 青海園

品種: 黃槐 *Cassia surratensis* 3棵



進度: 待附近工程完成後, 開始種植程序

3.1 補償樹木植樹(修訂)方案 準備種植的樹木(已於第三次綠化事宜工作小組會議通過)

位置 34C 青海園

品種: 大花紫薇 *Lagerstromia speciosa* 5棵



進度: 待附近工程完成後, 開始種植程序

3.1 補償樹木植樹(修訂)方案 準備種植的樹木(已於第三次綠化事宜工作小組會議通過)

位置 38-R1 友愛邨愛義樓對開休憩處

品種: 蒲葵 *Livistona chinensis* 16棵



進度: 即將種植

3.1 補償樹木植樹(修訂)方案 準備種植的樹木(已於第三次綠化事宜工作小組會議通過)

位置 38-R2 兆麟街停車場

品種:白千層 *Melaleuca quinquenervia* 4棵



進度:掘路紙獲批, 即將種植

3.1 補償樹木植樹(修訂)方案 準備種植的樹木(已於第三次綠化事宜工作小組會議通過)

位置 38-R3 豐安街翠寧花園單車徑旁

品種:細葉欖仁 *Terminalia mantaly* 10棵



進度: 種植工作協調中 即將種植

3.1 補償樹木植樹(修訂)方案 準備種植的樹木(已於第三次綠化事宜工作小組會議通過)

位置 42 兆康站

品種:白千層 *Melaleuca quinquenervia* 12棵



進度: 即將種植

3.1 補償樹木植樹(修訂)方案 準備種植的樹木(已於第三次綠化事宜工作小組會議通過)

位置 40-R1 麒麟崗公園

品種:日本葵 *Phoenix roebelenii* 8棵



進度: 即將種植

3.2 : 餘下的68棵樹木種植建議方案

(包括已於第四次綠化事宜工作小組提出的建議方案)



37

3.2.餘下的68棵樹木種植建議方案

種植的位置

所有種植位置皆在工程範圍鄰近的地區



基於以前確認植樹的樹木位置, 有待屯門綠化事宜工作小組的確認 (68 棵)

38

3.2 補償樹木植樹(修訂)方案 建議種植的樹木

位置 40-R1 麒麟崗公園

品種: 日本葵 Phoenix roebelenii 14 棵



位置 40-R1
日本葵 14 棵

39

3.2 補償樹木植樹(修訂)方案 建議種植的樹木

位置 6-R1: 仁愛堂街停車場

品種: 日本葵 Phoenix roebelenii 6 棵



位置 6-R1
日本葵 6 棵

40

3.2 補償樹木植樹(修訂)方案 建議種植的樹木

位置 8-R1: 仁愛堂街停車場

品種: 日本葵 *Phoenix roebelenii* 5棵



3.2 補償樹木植樹(修訂)方案 建議種植的樹木

位置 13A-R1 青山公路青山灣段近恆順園

品種: 雙翼豆 *Peltophorum pterocarpum* 2棵



3.2 補償樹木植樹(修訂)方案 建議種植的樹木

位置 30A-R1: 青山公路青山灣段近顯發里

品種: 楓香 *Liquidambar formosana* 3棵



3.2 補償樹木植樹(修訂)方案 建議種植的樹木

位置 39-R1 兆麟街

品種: 白千層 *Melaleuca quinquenervia* 10棵



3.2 補償樹木植樹(修訂)方案 建議種植的樹木

位置 40B-R1 麒麟崗公園

品種: 紫玉蘭 Magnolia liliiflora 9 棵



3.2 補償樹木植樹(修訂)方案 建議種植的樹木

位置 41-R2 青山公路青山灣段近海榮路

品種: 白蘭 Michelia x alba 8 棵



3.2 補償樹木植樹(修訂)方案 建議種植的樹木

位置 42-R1 兆康站

品種: 白千層 Melaleuca quinquenervia 11 棵

