

屯門區議會
2012-2013 年地區設施管理委員會轄下
屯門綠化事宜工作小組
第六次會議記錄

日期：2013 年 1 月 10 日（星期四）

時間：上午 10 時 30 分

地點：屯門區議會會議室

出席者：

蘇炤成先生（召集人）	屯門區議員
梁健文先生，BBS, MH	屯門區議會副主席
蘇愛群女士	屯門區議員
曾憲康先生	屯門區議員
蘇嘉雯女士	屯門區議員
李嘉燕女士（秘書）	屯門民政事務處活動統籌員（區議會）二

列席者：

謝冠權先生	土木工程拓展署工程師/土地工程部
李淑嫻女士	康樂及文化事務署屯門區副康樂事務經理二
黃舜賢先生	康樂及文化事務署屯門區助理康樂事務經理（分區支援）
麥亨先生	康樂及文化事務署經理(公園及遊樂場)屯門區一
劉煦恆先生	康樂及文化事務署康樂事務經理（樹木）新界北
袁達成先生	康樂及文化事務署高級康樂助理員（樹木）新界北
楊潔行女士	屯門民政事務處行政主任(區議會)三
簡悅敏女士	路政署工程師 1/屯門路
向偉健先生	艾奕康有限公司駐地盤高級境觀建築師
陳雋浩先生	艾奕康有限公司駐地盤助理境觀建築師
王妍女士	艾奕康有限公司駐地盤助理境觀建築師
邱若瑟先生	艾奕康有限公司駐地盤工程師
吳琰玲女士	艾奕康有限公司公共關係主任
高振華先生	中國港灣工程有限責任公司項目經理
伍宏碩先生	中國港灣工程有限責任公司地盤經理
張耀輝先生，MH	綠色力量顧問
單家驊先生	綠色力量高級環境事務經理
蘇安敏女士	綠色力量教育及項目經理
游靜賢女士	綠色力量助理高級教育主任

缺席者：

陳雲生先生，MH	屯門區議員
----------	-------

陶錫源先生, MH	屯門區議員
李洪森先生, MH	屯門區議員
林頌鎧先生	屯門區議員
程志紅女士	屯門區議員
林德亮先生, MH, JP	屯門區議員
何君堯先生	屯門區議員

負責人

(一) 通過上次會議記錄

小組成員一致通過上次會議記錄。

(二) 討論事項

(1) 屯門市中心段植樹安排及進度

2. 路政署簡悅敏女士報告，截至 2012 年 12 月，已於屯門市中心段種植 441 棵樹木，其品種及位置已獲當區區議員和各保養部門的同意。

3. 艾奕康有限公司（下稱「艾奕康」）陳雋浩先生以投影片介紹最新的植樹進度、施工安排及餘下 98 棵樹木的種植建議方案（見附件一）。在餘下 98 棵樹木中，其中 40 棵樹木的種植建議方案已於上次工作小組會議上確認，並正進行有關種植工作。

4. 在餘下 58 棵樹木的建議種植方案中，工作小組已確認 41 棵樹木的種植位置及品種。其中，有關方案建議於屯門公路近西鐵兆康站種植 23 棵樹木，工作小組已確認其中 12 棵樹木的種植工作，至於餘下的 11 棵樹木，由於小組成員曾表示反對於該處種植，故將另覓地點進行有關種植。

5. 召集人建議，成員可於兩個月內提交種植餘下 17 棵樹木的位置的建議，若屆時沒有收到任何建議方案，則交由艾奕康決定補償樹木的位置。

6. 就餘下 17 棵補償樹木的種植位置，多名成員分別建議，於寶田區近輕鐵站單車泊位、蝴蝶灣區近龍門路和湖山路及友愛邨或附近位置植樹。

7. 路政署簡女士表示，須諮詢上述建議植樹位置所屬管轄部門的意見及了解地下管線道的情況，才能確認種植的可行性。艾奕康向偉健先生表示，會與相關區議員於上述建議植樹地點進行實地視察，如有關地點適合種植，將會一併確認植樹的品種及數量。工作

小組同意有關安排。

（會後補註：艾奕康已與相關區議員進行有關實地視察，並初步確認 17 棵樹木的植樹位置、品種及數量。）

8. 召集人請艾奕康繼續聯絡相關區議員。

艾奕康

(2) 綠色力量市區綠化計劃

9. 綠色力量單家驊先生以投影片介紹上述計劃（見附件二）。

10. 有成員指出，龍門路及龍富路交界位置將進行大型工程，擔心若在該處種植樹木，會受有關工程影響，並建議加強中山公園附近的綠化。

11. 另有成員支持於興貴街近寶田邨巴士總站擺放花槽，但指出該路段分別由房屋署及路政署管轄，關注日後的保養工作。此外，她查詢有關花槽的尺寸。

12. 綠色力量單先生回應表示，有關花槽的長度為約 1.4 米，闊度為約 0.7 米，而該處的行人路闊約 3 米，故有足夠空間供居民使用。此外，就加強綠化中山公園附近的建議，綠色力量將會進行實地視察。

13. 召集人查詢，於小欖巴士轉乘站進行植樹工程的時間表。

14. 綠色力量單先生回應表示，若有關計劃獲得工作小組、當區區議員及部門的同意，預計可於約 3 個月後進行有關工程。

15. 土木工程拓展署謝冠權先生指出，署方已修訂屯門綠化總綱概念圖，並會將有關草擬本交予綠色力量，以便互相協調，完善區內的綠化工程。他表示曾收到區議員提出在湖翠路、屯門青山警署對出行人路及屯門第 44 區聯用綜合大樓對出行人路進行綠化的建議，由於綠色力量已建議於上述地點或其附近位置進行綠化，他希望綠色力量能繼續推動有關工程，並就綠化設計諮詢相關區議員。

16. 艾奕康向先生表示，根據綠色力量的進度，預計小欖巴士轉乘站仍屬於現時承建商的工地範圍，建議綠色力量在有需要時與相關部門互相協調。

17. 康樂及文化事務署袁達成先生表示，有關計劃的部分建議地點須事前得到運輸署的審批及同意，以免妨礙駕駛人士。此外，關於在路旁植樹的建議，應參考由發展局發出的指引，以符合種植路旁

樹的最新標準。他續表示，署方將不會為纖維花槽進行保養工作，而相關種植範圍的清潔工作亦須事前得到食物及環境衛生署的同意。植物的品種方面，署方不建議於路旁種植棕櫚樹及於花盆種植喬木，並建議有關綠化計劃內相關建議種植的植物以灌木管理的方式進行修剪。

18. 綠色力量單先生回應表示，有關計劃將會交予相關部門，並會按照有關指引進行綠化設計。此外，建議種植於花盆的喬木亦會以灌木管理的方式進行修剪。綠色力量會為有關設施及植物提供約2年的保養，參照其他已推行有關計劃的地區，當保養期完結後，區議會將作出安排，交予相關部門負責後續的保養工作。

19. 召集人請綠色力量就有關計劃聯絡相關部門。

綠色力量

(三) 下次會議日期

20. 議事完畢，會議於上午11時55分結束。下次會議日期待定。

屯門區議會秘書處

日期：2013年1月28日

檔號：HAD TM DC/13/35/DFMC/8 pt.2



2012-2013年度 屯門區議會
地區設施管理委員會
屯門綠化事宜工作小組

第六次會議

屯門市中心段 植樹工作匯報



合約編號：HY/2009/03

合約名稱：屯門公路市中心段交通改善工程設計及建造

AZCOM



匯報議程

1. 背景
2. 植樹進度簡報
3. 補償樹木植樹 (修訂) 方案



1. 背景

直至2012年10月餘下植樹數量 :165 棵

第五次綠化事宜工作小組
未定案樹木
(位於屯門公路近西鐵兆康站)
23棵

第六次綠化事宜工作小組
提出修訂方案
58棵

不同意 /
環境限制 /
樹種修訂

35棵

待確認可種植的樹木

第五次綠化事宜工作小組
確認可種植的樹木數目
142 棵

通過後

諮詢當區區議員 / 康文署及相關部門

同意

進行種植
種植進行中
40棵

已種植樹木
數目
44棵

確認可種植的樹木

直至2012年12月餘下植樹數量 :40+58棵 = 98 棵




屯仁街

樹木品種：白蘭 種植方式：樹穴



屯門鄉事會路

樹木品種：蒲葵 種植方式：花盆

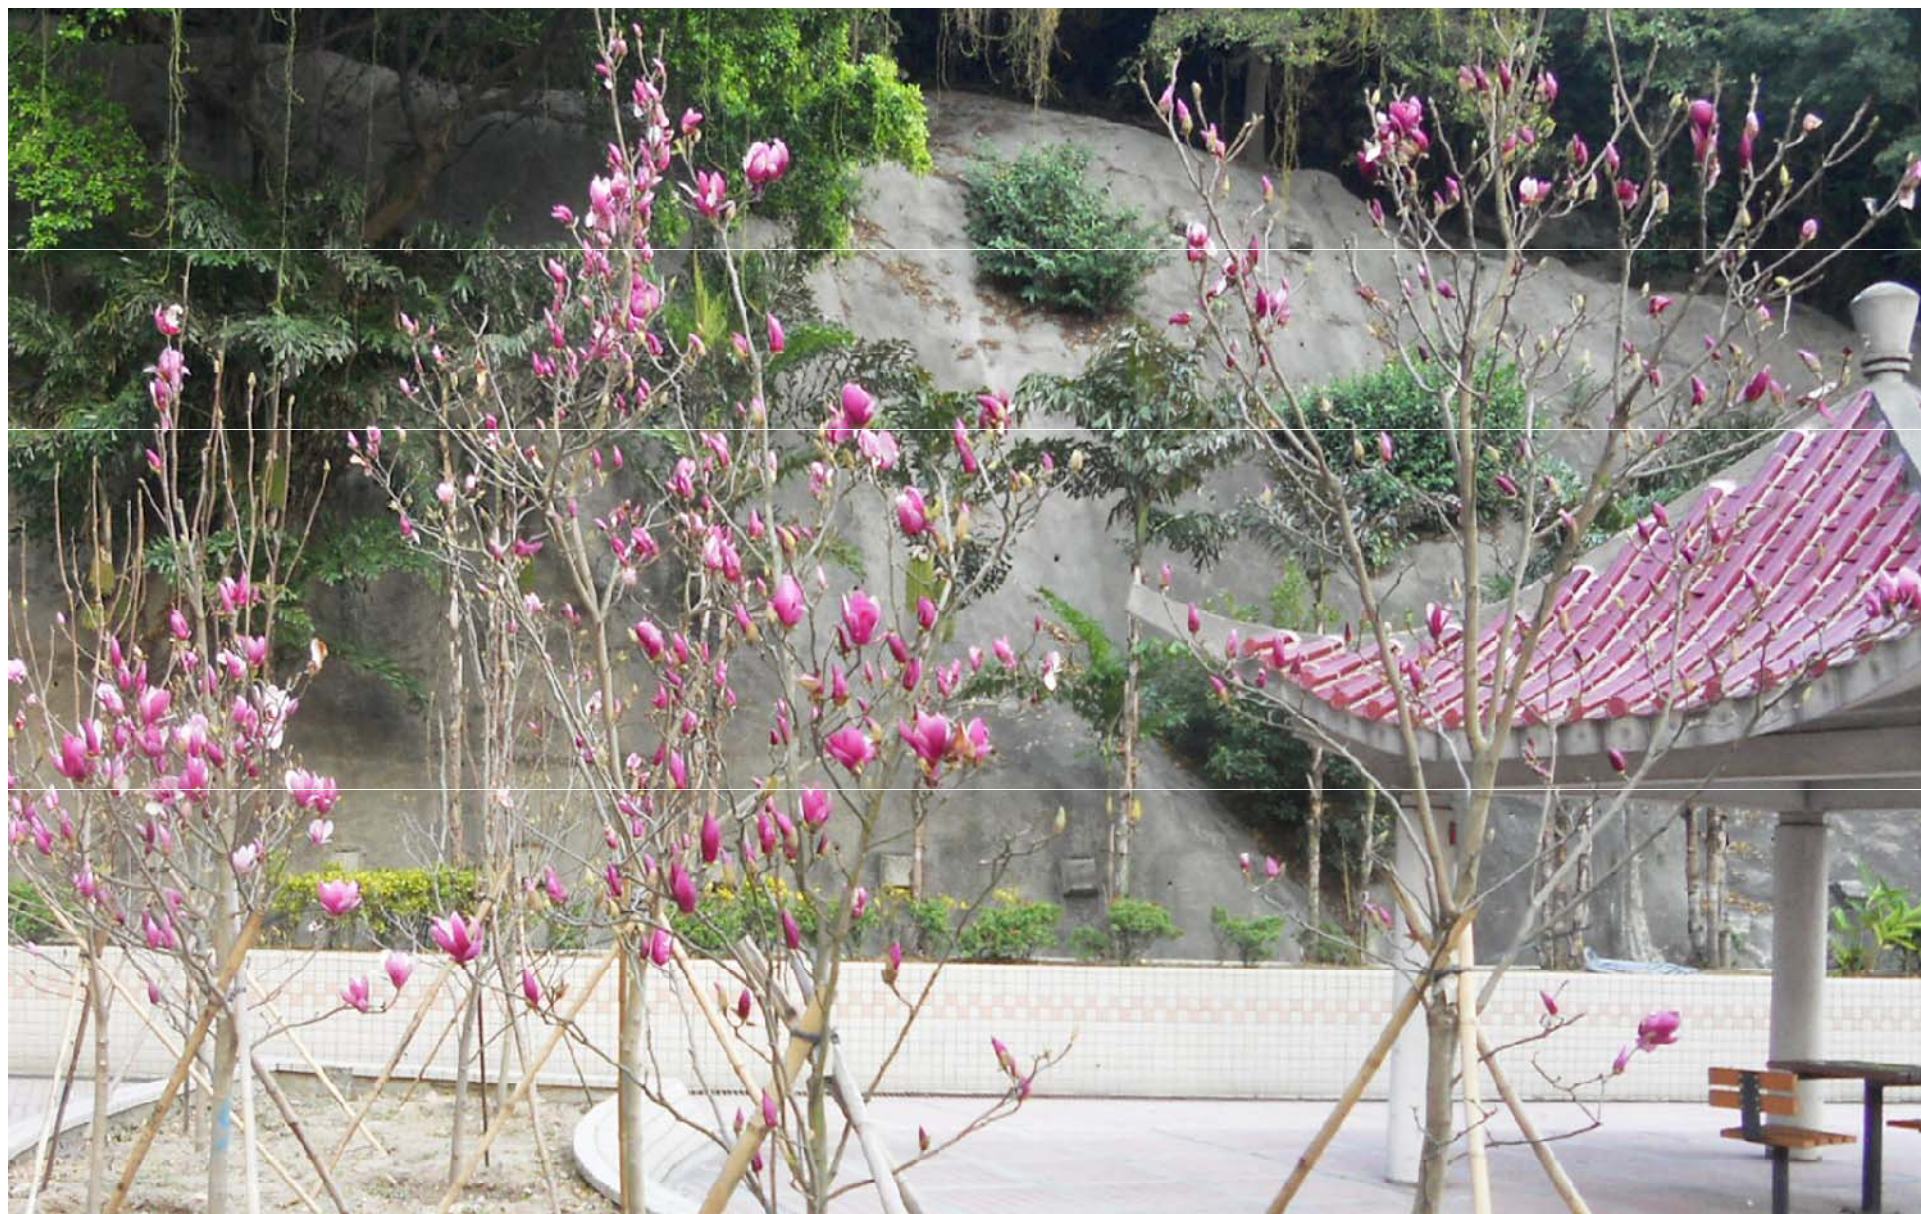

麒麟崗公園

樹木品種：紫玉蘭 種植方式：花槽



豐安街近翠寧花園

樹木品種：細葉欖仁 種植方式：樹穴



皇珠路


樹木品種：蒲葵 種植方式：花槽

2. 植樹進度簡報



2. 植樹進度簡報

植樹總綱圖(Master tree planting plan)

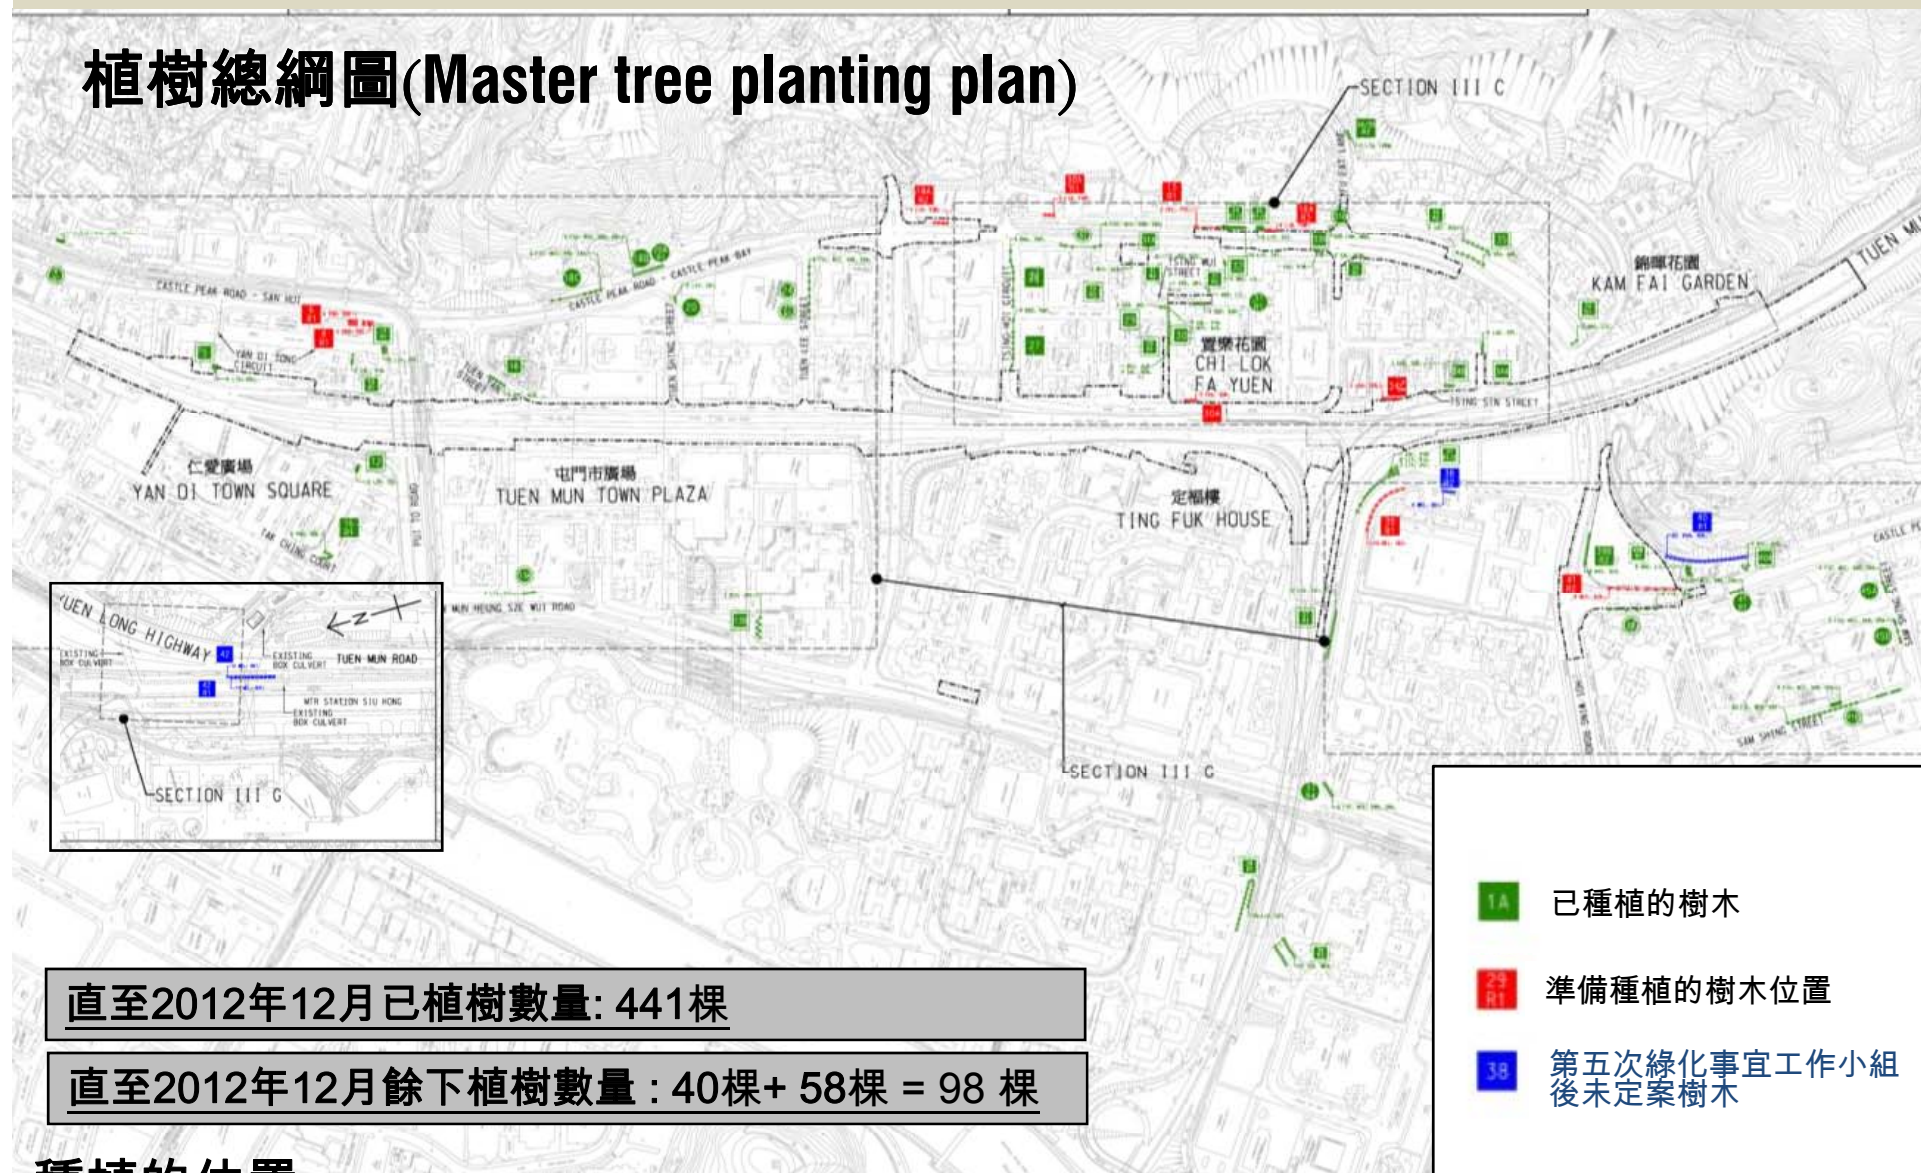

直至2012年12月已植樹數量: 441棵

直至2012年12月餘下植樹數量: 40棵+ 58棵 = 98 棵

種植的位置

所有種植的位置皆位置在鄰近施工期間受影響的地區

2. 植樹進度簡報

補償樹木總數

539 棵

補償樹木總數是根據地政署已批准的樹木移除申請
Ref: (11)DLOTM 131/3/184 Pt.4所列出的補償樹木數量

直至2012年12月
已植樹數量

441棵

樹穴 /花盆種植總和
已種植的441棵樹木中
其中196 棵 正由承建商進行保養工作
其中245 棵已移交相關部門保養

直至2012年12月
餘下樹木種植數目

98 棵

3. 補償樹木植樹(修訂)方案

直至2012年12月餘下植樹數量：

餘下樹木樹穴種植數目 98 棵

種植中的樹木數目
已於第五次綠化事宜工作小組確認 40 棵

與相關區議員/ 政府部門協調後
於本次綠化事宜工作小組提出修訂樹木數目 58 棵


補償樹木總數

539棵補償樹木總數是根據地政署已批准的樹木移除申請
Ref: (11) DLOTM 131/3/184 Pt.4 所列出的補償樹木數量

3. 補償樹木植樹(修訂)方案

種植的位置

所有種植位置皆在工程範圍鄰近的地區

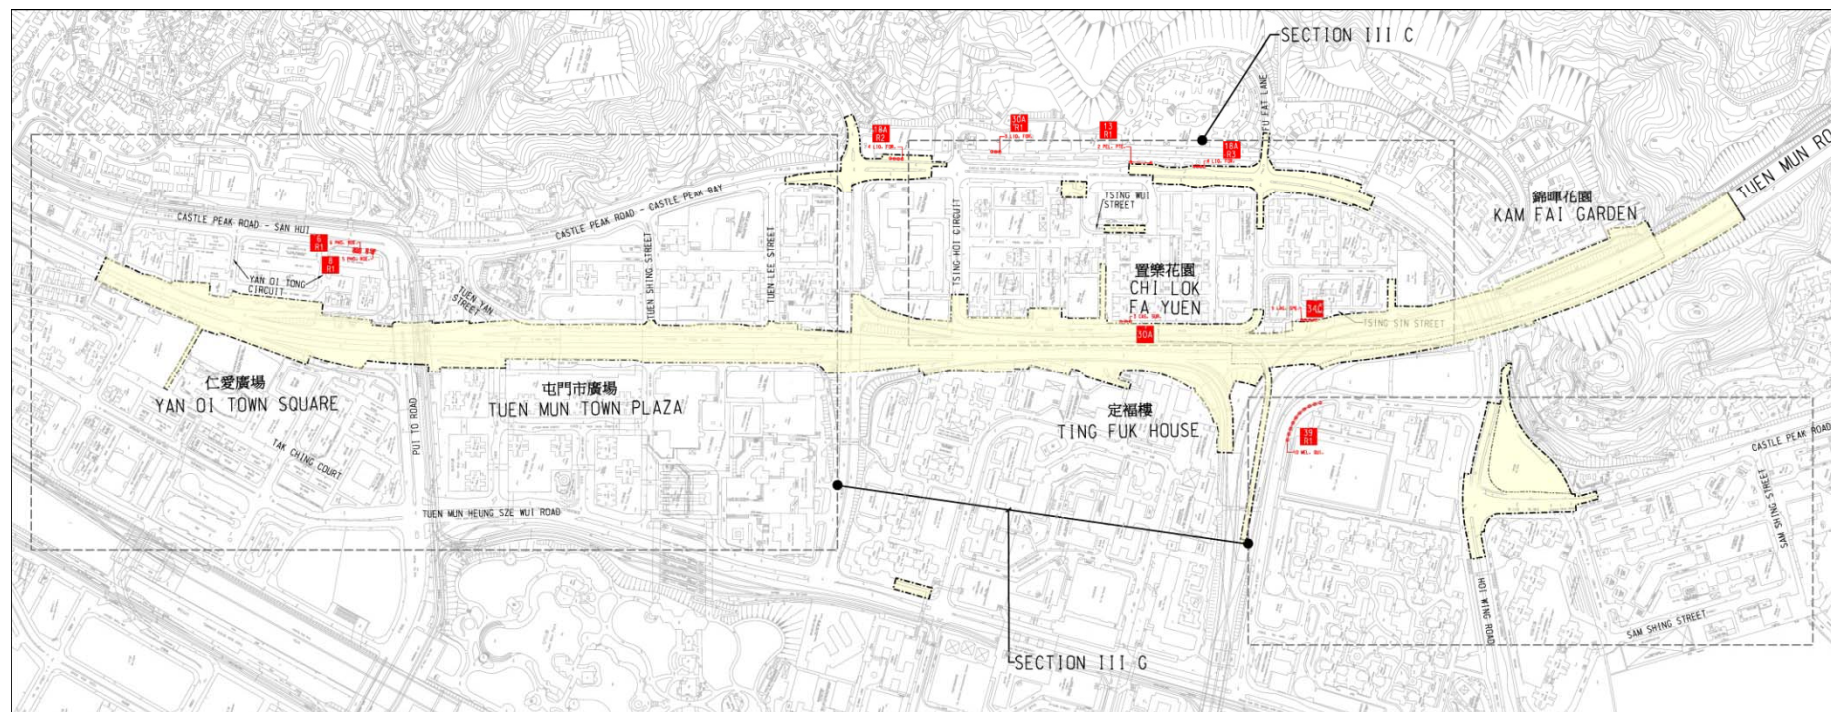

種植中的樹木數目

已於第五次綠化事宜工作小組確認 40 棵

位置圖 – 補償樹木植樹(修訂)方案

3. 補償樹木植樹(修訂)方案

直至2012年10月餘下植樹數量 :165 棵

第五次綠化事宜工作小組
未定案樹木
(位於屯門公路近西鐵兆康站)
23棵

第六次綠化事宜工作小組
提出修訂方案
58棵

不同意 /
環境限制 /
樹種修訂

35棵

待確認可種植的樹木

第五次綠化事宜工作小組
確認可種植的樹木數目
142 棵

通過後

諮詢當區區議員 / 康文署及相關部門

同意

進行種植
種植進行中
40棵

已種植樹木
數目
44棵

確認可種植的樹木

直至2012年12月餘下植樹數量 :40+58棵 = 98 棵

3. 補償樹木植樹(修訂)方案

直至2012年12月餘下植樹數量：

餘下樹木樹穴種植數目 98 棵

種植中的樹木數目
已於第五次綠化事宜工作小組確認 40 棵

與相關區議員/ 政府部門協調後
於本次綠化事宜工作小組提出修訂樹木數目 58 棵

補償樹木總數

539棵補償樹木總數是根據地政署已批准的樹木移除申請
Ref: (11) DLOTM 131/3/184 Pt.4 所列出的補償樹木數量

58棵樹木種植建議方案



補償樹木植樹(修訂)方案 建議種植的樹木

位置 1A-R2/3 新墟休憩處

品種: 紫玉蘭 *Magnolia liliiflora* 2棵

日本葵 *Phoenix roebelenii* 4棵



補償樹木植樹(修訂)方案 建議種植的樹木

位置 13A-R1 青山公路青山灣段近恆順園

品種:藍花楸 *Jacaranda acutifolia* 2棵



補償樹木植樹(修訂)方案 建議種植的樹木

位置 17-R1 仁愛廣場

品種: 日本葵 Phoenix roebelenii 9棵



(c) The Government of the Hong Kong SAR. Map reproduced with

補償樹木植樹(修訂)方案 建議種植的樹木

位置 40-R1 麒麟崗公園

品種:紫玉蘭 *Magnolia liliiflora* 12 棵



補償樹木植樹(修訂)方案 建議種植的樹木

位置 42, 42-R1 兆康站

品種:白千層 *Melaleuca quinquenervia* 12 棵

(品種:白千層 *Melaleuca quinquenervia* 11 棵)



補償樹木植樹(修訂)方案 建議種植的樹木

位置 42-R1 兆康站

品種:白千層 *Melaleuca quinquenervia* 11 棵



總結

進行種植
種植進行中
40棵

第六次綠化事宜工作小組
提出修訂方案
58棵

位置 1A-R2/3 新墟休憩處

品種: 紫玉蘭 *Magnolia liliiflora* 2棵/ 日本葵 *Phoenix roebelenii* 4棵

位置 17-R1 仁愛廣場

品種: 日本葵 *Phoenix roebelenii* 9棵

位置 13A-R1 青山公路青山灣段近恆順園

品種: 藍花楸 *Jacaranda acutifolia* 2棵

位置 40-R1 麒麟崗公園

品種: 紫玉蘭 *Magnolia liliiflora* 12 棵

位置 42, 42-R1 兆康站

品種: 白千層 *Melaleuca quinquenervia* 12 棵

品種: 白千層 *Melaleuca quinquenervia* 11 棵

The background of the slide is a blurred photograph of an urban scene. On the left, several tall, grey skyscrapers rise into the sky. To the right, there are lush green trees. The overall image is out of focus, creating a bokeh effect.

滙報完畢
多謝

屯門區 市區綠化計劃

贊助

籌劃



市區綠化計劃

- 於2008開展
- 由綠色力量發動及籌劃，易辦事贊助
- 全港首個在市區植樹的綠化計劃
- 目的：綠化市區，改善區內的空氣質素及微氣候
- 目前已在超過40個地點種植1,600株喬木和21,000株灌木

種植地點

地區	種植地點
黃大仙區	2個
油尖旺區	5個
沙田區	9個



沙田區 城門河河堤



黃大仙區 龍翔道(黃大仙廟)



油尖旺區 福全街(基全小學)

計劃範疇

- 與園藝專家實地考察，選擇合適地點進行綠化
- 提供種植設計書，詳述種植的地點、規模、形式和植物品種，以及模擬綠化效果圖
- 委託承辦商進行綠化工程
- 工程完成後，提供一至兩年的保養服務，包括施肥、更換植物等
- 有關種植工作全部由綠色力量負責，易辦事負責所需之全部費用

擬定綠化地點

屯門區綠化計劃

地點一 湖翠路 (啓豐商場段)

- 種植方式：放置仿石纖維花槽
- 花槽數量：23個



綠化後



屯門區綠化計劃

地點二 湖翠路 (海翠坊段)

- 種植方式：放置仿石纖維花槽
- 花槽數量：30個



綠化後



屯門區綠化計劃

地點三 湖翠路 (慧豐園段)

- 種植方式：放置仿石纖維花槽
- 花槽數量：14個



綠化後



屯門區綠化計劃

地點四 湖山路 (悅湖山莊多層停車場)

- 種植方式：開鑿樹穴及放置仿石纖維花槽
- 花槽數量：8個
- 樹穴數量：12個



綠化後



屯門區綠化計劃

地點五 湖安街 (悅湖山莊15座旁)

- 種植方式：放置仿石纖維花槽
- 花槽數量：18個



綠化後



屯門區綠化計劃

地點六 湖康街 (屯門湖康警察宿舍旁)

- 種植方式：開鑿樹穴
- 樹穴數量：8個



綠化後



屯門區綠化計劃

地點七 豐安街 (豐景園旁)

- 種植方式：開鑿樹穴
- 樹穴數量：21個



綠化後



屯門區綠化計劃

地點八 恆富街

- 種植方式：開鑿樹穴及放置仿石纖維花槽
- 樹穴數量：9個
- 花槽數量：32個



綠化後



屯門區綠化計劃

地點九 海榮路 (恆福花園、三聖墟輕鐵站段)

- 種植方式：放置仿石纖維花槽
- 花槽數量：54個



綠化後



屯門區綠化計劃

地點十 河傍街 (屯門西鐵站)

- 種植方式：放置仿石纖維花槽
- 花槽數量：13個



綠化後



屯門區綠化計劃

地點十一 鳴琴路 (鳴琴輕鐵站段)

- 種植方式：放置仿石纖維花槽
- 花槽數量：26個



綠化後



屯門區綠化計劃

地點十二 鳴琴路 (建發工業中心段)

- 種植方式：開鑿樹穴
- 樹穴數量：7個



綠化後



屯門區綠化計劃

地點十三 業旺路 (南豐工業城段)

- 種植方式：放置仿石纖維花槽
- 花槽數量：35個



綠化後



屯門區綠化計劃

地點十四 屯富路 (嶺南大學室外運動場段)

- 種植方式：開鑿樹穴
- 樹穴數量：10個



綠化後



屯門區綠化計劃

地點十五 屯富路 及 青山公路嶺南段交界

- 種植方式：放置仿石纖維花槽
- 花槽數量：15個



綠化後



屯門區綠化計劃

地點十六 青山公路 (嶺南段 - 屯門濾水廠職員宿舍)

- 種植方式：在原有空地上植樹
- 新增樹木數量：13



綠化後



更改綠化地點

屯門區綠化計劃

地點四 湖山路 (悅湖山莊多層停車場)

- 種植方式：開鑿樹穴及放置仿石纖維花槽
- 花槽數量：8個
- 樹穴數量：12個

刪除綠化地點，避免與綠化總綱圖重疊



綠化後



屯門區綠化計劃

地點七 豐安街 (豐景園旁)

- 種植方式：開鑿樹穴
- 樹穴數量：21個

刪除綠化地點，避免與綠化總綱圖重疊



綠化後



屯門區綠化計劃

地點九 海榮路 (恆福花園、三聖墟輕鐵站段)

- 種植方式：放置仿石纖維花槽
- 花槽數量：54個

花槽數量減至25個，避免與綠化總綱圖重疊



綠化後



屯門區綠化計劃

地點十四 屯富路 (嶺南大學室外運動場段)

- 種植方式：開鑿樹穴
- 樹穴數量：20個

樹穴數量減至10個，避免與綠化總綱圖重疊



綠化後



新增綠化地點

屯門區綠化計劃

地點十七 龍門路 (龍門路及龍富路交界)

- 種植方式：在原有空地上加種樹木及灌木
- 新增樹木數量：14



綠化後



屯門區綠化計劃

地點十八 龍門路 (屯門公眾騎術學校段)

- 種植方式：在原有空地上加種樹木及灌木
- 新增樹木數量：12



綠化後



屯門區綠化計劃

地點十九 龍門路中央分隔 (屯門公眾騎術學校段)

- 種植方式：放置仿石纖維花槽
- 花槽數量：28個



綠化後



屯門區綠化計劃

地點二十 悅湖山莊 (近兆禧輕鐵站)

- 種植方式：放置仿石纖維花槽
- 花槽數量：27個



屯門區綠化計劃

地點二十一 湖山路 (屯門第44區聯用綜合大樓段)

- 種植方式：開鑿樹穴及放置仿石纖維花槽
- 花槽數量：35個
- 樹穴數量：3個



屯門區綠化計劃

地點二十二 興貴街 (近寶田邨巴士總站)

- 種植方式：放置仿石纖維花槽
- 花槽數量：22個



屯門區綠化計劃

地點二十三 青榕街 (雅翠苑段)

- 種植方式：在原有空地上加種樹木及灌木
- 新增樹木數量：12



屯門區綠化計劃

地點二十四 青善街 (青善街籃球場段)

- 種植方式：在原有空地上加種樹木及灌木
- 新增樹木數量：12



屯門區綠化計劃

地點二十五 石排頭路中央分隔 (翠林花園段)

- 種植方式：放置仿石纖維花槽
- 花槽數量：66個



屯門區綠化計劃

地點二十六 建盛里 (屯門學童牙科診所段)

- 種植方式：開鑿樹穴
- 樹穴數量：12個



屯門區綠化計劃

地點二十七 小欖巴士轉乘站 (近巴士入口)

- 種植方式：在原有空地上加種樹木及灌木
- 新增樹木數量：9



屯門區綠化計劃

地點二十七 小欖巴士轉乘站 (近屯門公路)

- 種植方式：開鑿樹穴
- 樹穴數量：6個



屯門區綠化計劃

地點二十七 小欖巴士轉乘站 (近青山公路大欖段)

- 種植方式：開鑿樹穴
- 樹穴數量：5個



屯門區綠化計劃

- 綠化計劃一經接納後，工程可望於兩個月內開展
- 工程完成後，綠色力量會為有關設施及植物提供為期一至兩年保養，包括更換植物
- 保養期完結後，有關設施及植物可轉交屯門區議會

歡迎提問
及發表意見
