



運輸署/路政署過去兩個月在灣仔區內完成、正在施工或規劃中的主要小型交通改善工程項目及時間表 (截至 2025 年 7 月 10 日)


項目編號 (圖頁號)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署 工程師 姓名 (電話)	路政署 工程師 姓名 (電話)
HK/24/00507 & HK/24/00548 (1)	加設「留意乘客」及「慢駛」道路標記和交通標誌	黃泥涌道近香港墳場及黃泥涌道近雅谷大廈電車站	[15/12/2024] 15/8/2025	[31/3/2025] (黃泥涌道近香港墳場) 31/8/2025 (黃泥涌道近雅谷大廈電車站)	有關工程(黃泥涌道近香港墳場) 相關工作已於 2025 年 3 月完成。 有關工程(黃泥涌道近雅谷大廈電車站)現正進行中，並預計於 2025 年 8 月底完成。	鄧加月 (2829 5458)	張澍淳 (2231 5618)
HK/23/02402 (3)	增設特別活動道路援衝區	龍和道近會議展覽中心地下	[3/7/2025]	30/9/2025	工程預計於 2025 年 9 月底完成。	黃俊文 (2829 5421)	陳恒志 (2231 5722)
HK/25/00823 (2)	改善行人路及交通標誌工程	交加里近永成大廈	15/7/2025	10/9/2025	工程預計於 2025 年 9 月上旬完成。	黃俊文 (2829 5421)	陳恒志 (2231 5722)
HK/25/00495 (4)	加設道路標記及行人路欄杆工程	清風街近電氣道	15/7/2025	30/8/2025	工程預計於 2025 年 8 月底完成。	陳昆緯 (2829 5425)	陳恒志 (2231 5722)

Date of inspection: 26/06/2024 & 04/07/2024
Location: Wong Nai Chung Road near Amigo Mansion (Tram Stop No.108)
WR/HY/TE/HK/24/00548

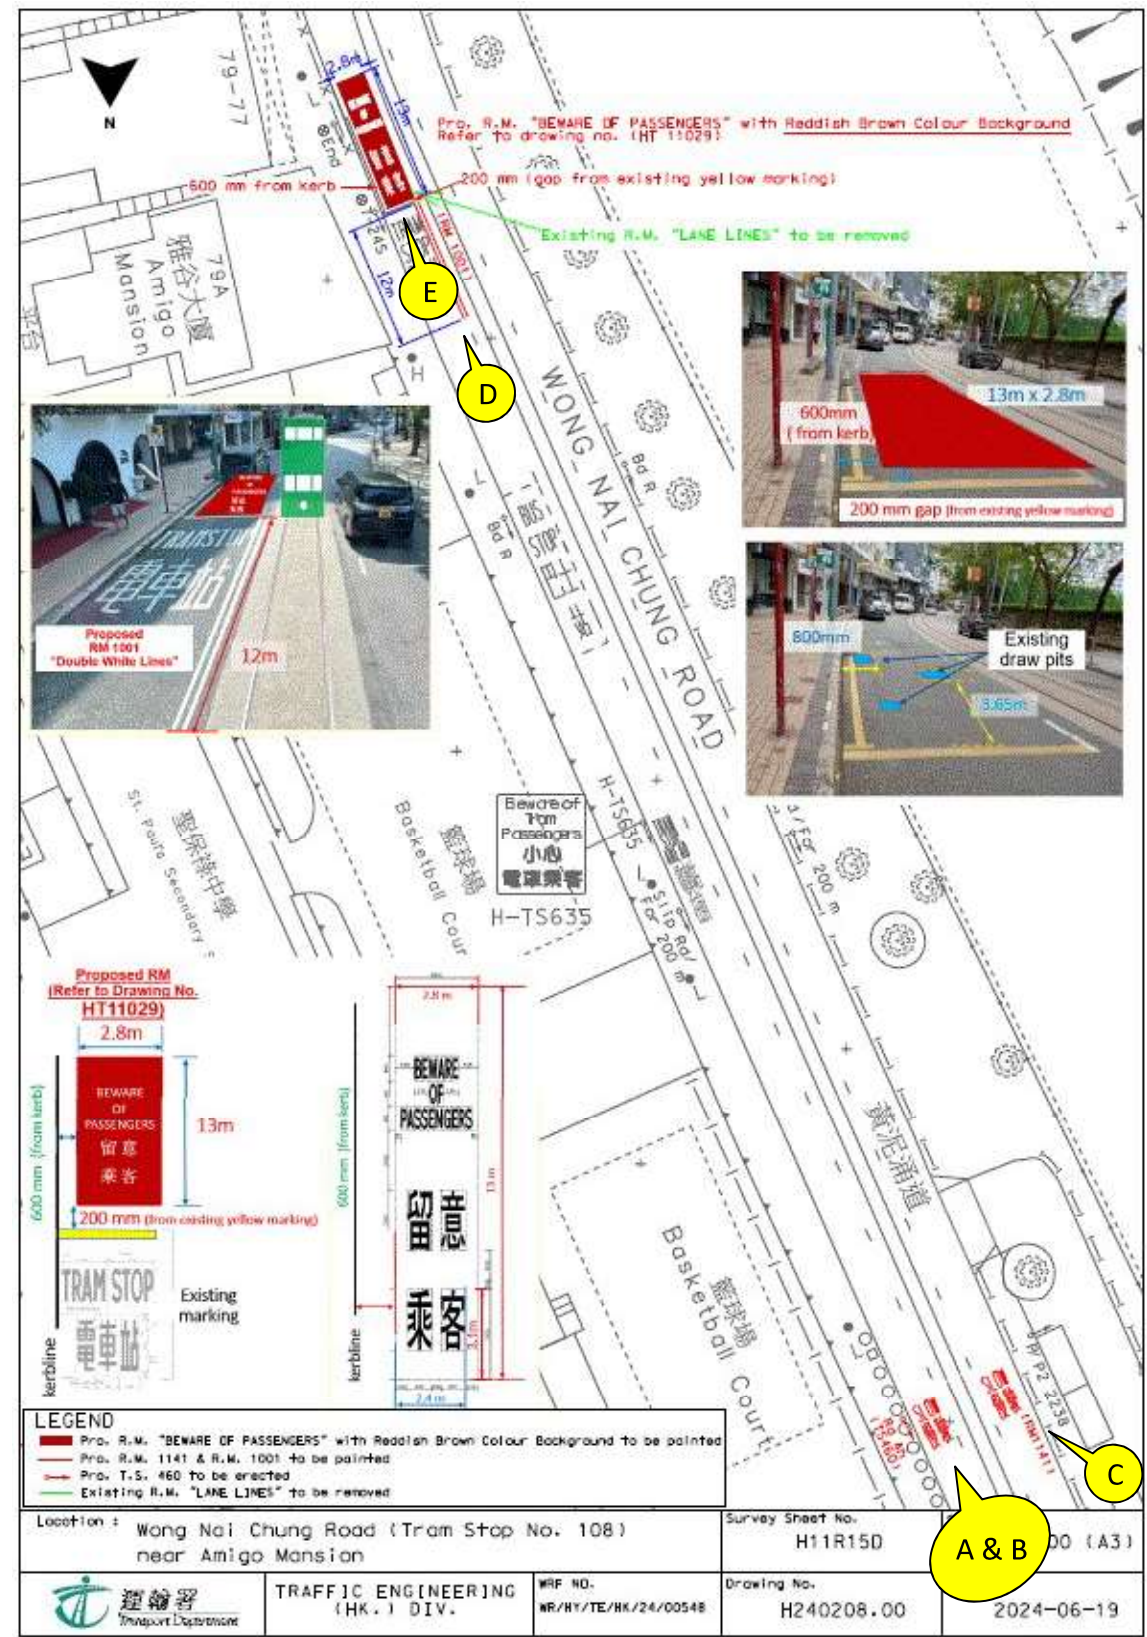

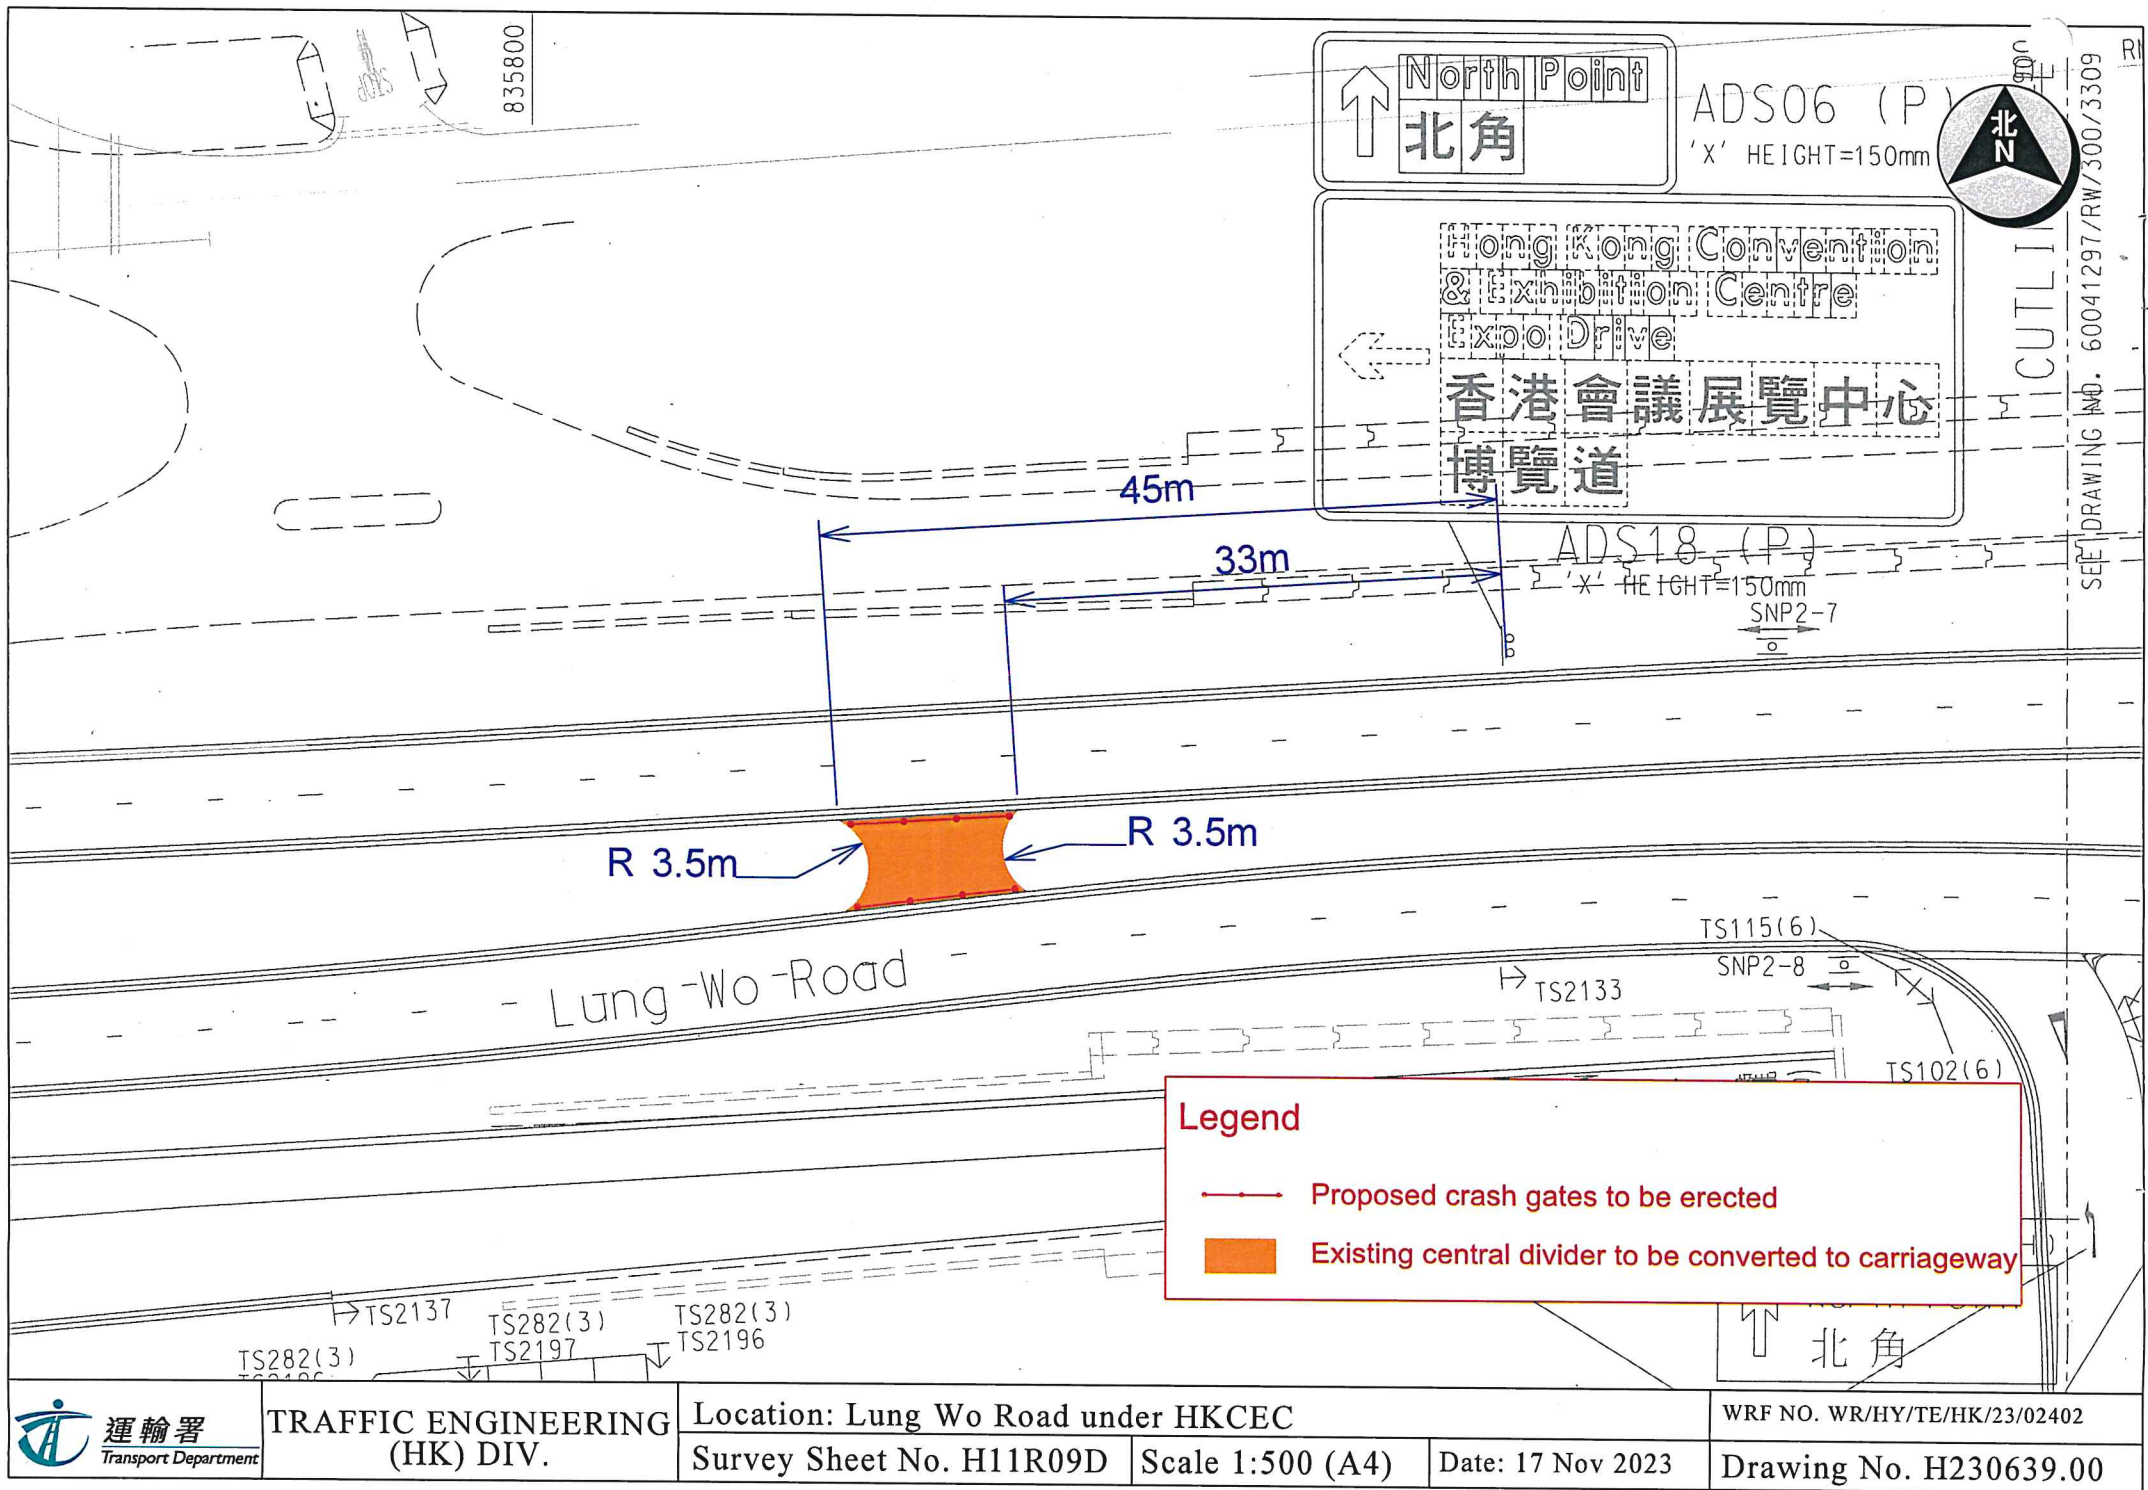



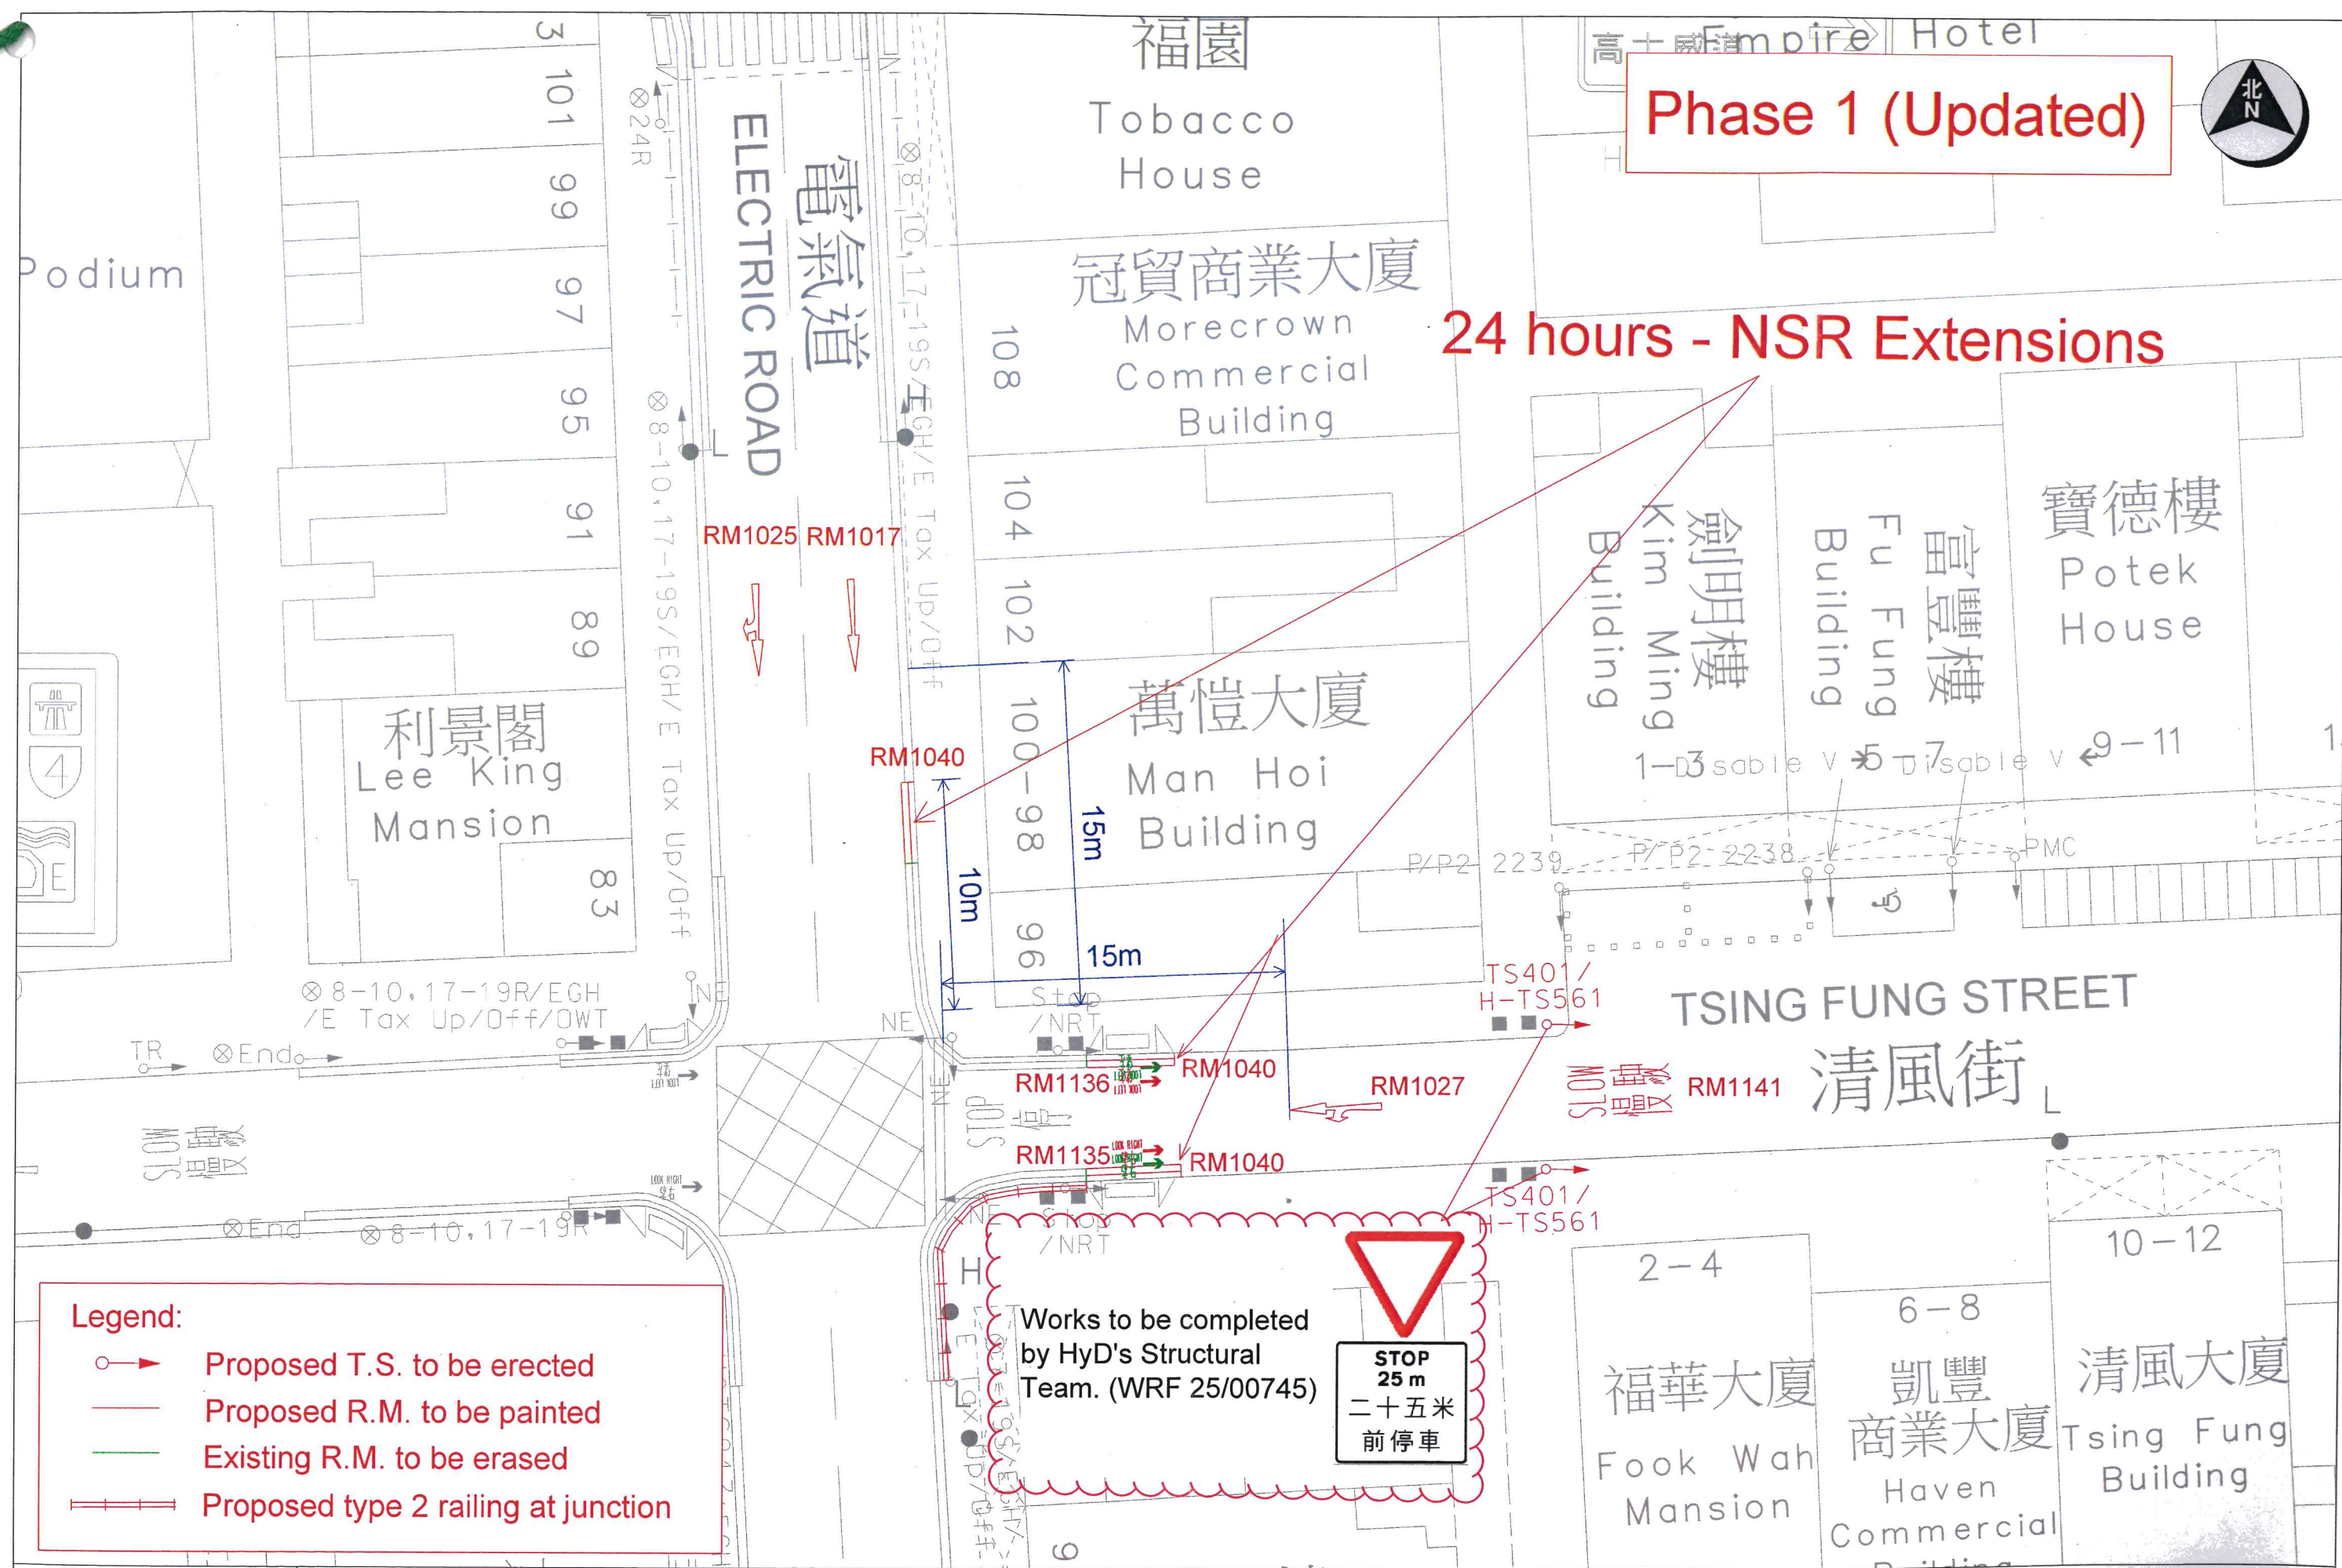

- Legend:**
- ➔ Proposed T.S. to be erected
 - Proposed R.M. to be painted
 - Existing R.M. to be erased
 - Proposed type 2 railing at junction
