灣仔區工程概覽

工務計劃編號及級別	負責部門	工程說明	估計費用〔百萬元〕	工程計劃				備註／工程計劃延誤原因
				開工日期		完成日期		
				上次報告	今次報告	上次報告	今次報告	
		運輸 **道路**						
6100TX 丁	路政署	擴闊近油站之維園道西行線及重置垃圾站工程	18.19	已開始	已開始	12 年 第 3 季	12 年 第 3 季	道路工程會分期進行以配合油站及垃圾站的遷拆，首期已於2010年第3季開始。最後一期的道路工程須待現有垃圾站遷拆後才能進行。現時估計會於2012年第3季完工。
579TH 甲	路政署	中環及灣仔繞道和東區走廊連接路之興建工程	28104.57	已開始	已開始	2017年	2017年	已批出六項工程合約，其中首項工程"供應及置放私人繫泊設備"已於2010年5月31日完工。餘下的兩項工程合約，預計於2012/13年招標。
		運輸 **鐵路**						
6061TR 乙	路政署	沙田至中環線	-	2012 年	2012 年	2020 年	2020 年	沙中線項目已於今年7月15日進行修訂刊憲，以因應地區的發展和實際情況作出技術修訂，減少沙中線在建造期間的影響。主要修訂包括：一）在夏慤道附近的擬議隧道工程；以及二）在沙田區的擬議臨時支援工地的範圍。待政府和港鐵公司於今年內完成與公眾的討論，及研究在可行的情況下因應公眾的建議對沙中線作出適當的修訂後，預計沙中綫會於今年年底作出第二次的修訂刊憲。
		運輸 **道路重建**						
6100TX 丁	路政署	東角道及記利佐治街部分時間行人街道無障礙路面工程	3.00	10 年 第 3 季	10 年 第 3 季	11 年 第 2 季	已完成	工程已於2011年5月31日完成。

灣仔區工程概覽

工務計劃編號及級別	負責部門	工程說明	估計費用〔百萬元〕	工程計劃				備註／工程計劃延誤原因
				開工日期		完成日期		
				上次報告	今次報告	上次報告	今次報告	
		土木工程						
		土地發展						
677CL 甲	土木工程拓展署	灣仔發展計劃第二期工程	4642.70	已開始	已開始	2017 年年中	2017 年年中	首3項工程合約已分別於2009年12月, 2010年1月及2011年1月動工。
		海空交通						
		機場						
67GI 甲	土木工程拓展署	在香港會議展覽中心旁發展政府直升機坪	59.10	已開始	已開始	2011年年底	2011年年底	工程已於2010年1月展開。
		水務供應						
		水務工程						
182WC 甲	水務署	更換及修復水管工程第二階段	38.00	已開始	已開始	11 年 第 4 季	11 年 第 4 季	工程合約編號28/WSD/06 已於2007年6月29日正式展開
		在灣仔區內工程進度如下：						
		譚臣道		已開始	已開始	11年第4季	11年第4季	菲林明道以東水管鋪設進行中，菲林明道以西正申請挖掘准許證。預計11年第3季批出。
		菲林明道		已開始	已開始	11年第4季	11年第4季	工程施工時間受到夜間工作及交通限制，正申請挖掘准許證。預計11年第3季批出。
		麥加力歌街		已開始	已開始	—	—	與市區重建局協調後，將押後該段工程至其他合約。
		春園街		已開始	已開始	—	—	與市區重建局協調後，將押後該段工程至其他合約。
		告士打道		已開始	已開始	11年第4季	11年第4季	工程需重新設計，正申請挖掘准許證。預計11年第3季批出。
		谷柏道		已開始	已開始	11年 第3季	已完成	水管鋪設已完成。
		祈禮士道		已開始	已開始	11年 第3季	已完成	
		白建時道		已開始	已開始	11年 第3季	11年 第3季	水管鋪設已完成。因現水管於1月間爆裂，而新水管亦受損毀，需要維修、重新接駁及清洗。

灣仔區工程概覽

工務計劃編號及級別	負責部門	工程說明	估計費用〔百萬元〕	工程計劃				備註／工程計劃延誤原因
				開工日期		完成日期		
				上次報告	今次報告	上次報告	今次報告	
		柯布連道		已開始	已開始	11年 第4季	11年 第4季	工程進度因密集的地下設施而受影響，需重新設計。
		三角街		已開始	已開始	11年 第4季	11年 第4季	因地下設施密集，需改用無坑隧道模式進行。施工較複雜。
		禮頓道		已開始	已開始	—	—	因臨時交通改道需時磋商，故押後該段工程至其他合約。
		高士威道		已開始	已開始	—	—	
		黃泥涌道		已開始	已開始	11年 第3季	11年 第3季	接駁水管分段進行中。需時確定個別適當駁水位置。
		灣仔道		已開始	已開始	11年 第4季	11年 第4季	因地下設施密集，需改用無坑隧道模式進行。施工較複雜。
		軒尼詩道		已開始	已開始	11年 第4季	11年 第4季	因交通限制，水管需重新設計， 挖掘准許證申請正在進行中。預計11年第3季批出。
		勵德邨道		已開始	已開始	11年 第4季	已完成	水管接駁已完成。
		太原街		已開始	已開始	11年 第4季	11年 第4季	位於行車道(市集)的主喉管已於09年10月6日接駁完成。位於行人路的水管更換工程會，隨後展開。小販攤檔、商舖及行人皆密集，需時協調，方可施工。位於行人路至行車道(市集)的水管接駁工程將會展開。
		交加街		已開始	已開始	11年 第4季	11年 第4季	
		太和街		已開始	已開始	11年 第4季	11年 第4季	接駁水管分段進行中。
		石水渠街		—	—	—	—	工程已交由186WC進行。
		分域街		—	—	—	—	
186WC 甲	水務署	更換及修復水管工程第三階段	347.99	已開始	已開始	13 年 第 3 季	13 年 第 3 季	是項於灣仔區內的工程合約編號為19/WSD/08,並已於2009年4月正式展開。
		工程進度如下：						
		登龍街		已開始	已開始	12 年 第 4 季	12 年 第 4 季	
		摩頓臺		已開始	已開始	11 年 第 3 季	已完成	
		銅鑼灣道 (近聖約翰救傷隊總部)		已開始	已開始	12 年 第 4 季	12 年 第 4 季	
		內告士打道 (近分域街至盧押道)		已開始	已開始	11 年 第 3 季	11 年 第 3 季	
		柯布連道		已開始	已開始	11 年 第 3 季	11 年 第 3 季	水管鋪設現已完成，正進行喉管測試及安排接駁水管。
		軍器廠街		已開始	已開始	13 年 第 3 季	13 年 第 3 季	現正進行試井挖掘工程。
		分域街		已開始	已開始	13 年 第 3 季	13 年 第 3 季	(為大佛口區內的工程)

灣仔區工程概覽

工務計劃編號及級別	負責部門	工程說明	估計費用〔百萬元〕	工程計劃				備註／工程計劃延誤原因
				開工日期		完成日期		
				上次報告	今次報告	上次報告	今次報告	
		皇后大道東 (近金鐘道至船街)		已開始	已開始	12 年 第 3 季	12 年 第 3 季	(為大佛口區內的工程)
		軒尼斯道 (近軍器廠街至盧押道)		已開始	已開始	13 年 第 3 季	13 年 第 3 季	(為大佛口區內的工程)
		駱克道 (近軍器廠街至盧押道)		已開始	已開始	12 年 第 3 季	12 年 第 3 季	(為大佛口區內的工程)
		駱克道 (盧押道至柯布連道)		11 年 第 3 季	11 年 第 3 季	12 年 第 4 季	12 年 第 4 季	
		港灣道		已開始	已開始	12 年 第 1 季	12 年 第 1 季	工程正與"灣仔發展計劃第二期工程 " 於上述地點協調。
		馬師道 (告士打道以北)		已開始	已開始	11 年 第 3 季	12 年 第 1 季	為配合杜老誌道的工程，馬師道的工程時間表有所改動。
		杜老誌道 (告士打道以北)		已開始	已開始	12 年 第 2 季	12 年 第 2 季	已與"灣仔發展計劃第二期工程 " 商討並作出協調。
		杜老誌道 (告士打道至謝斐道)		已開始	已開始	12 年 第 2 季	12 年 第 2 季	
		龍景街		已開始	已開始	11 年 第 3 季	11 年 第 3 季	工程正與"灣仔發展計劃第二期工程 " 商討協調施工安排。
		告士打道 (近城市大廈至新銀集團中心)		已開始	已開始	11 年 第 4 季	11 年 第 4 季	
		告士打道 (近堅拿道至對前的迴旋處)		已開始	已開始	11 年 第 2 季	11 年 第 3 季	工程涉及複雜臨時交通措施，進度有所影響。
		會議道		已開始	已開始	11 年 第 4 季	11 年 第 4 季	已與香港會議展覽中心及鄰近酒店商討施工安排，避免於大型事項進行工程。
		謝斐道 (近杜老誌道至馬師道)		已開始	已開始	11 年 第 3 季	11 年 第 4 季	工程涉及複雜臨時交通措施，正進行交通影響評估及公眾諮詢以便向有關政府部門商討施工安排。
		謝斐道及駱克道(近菲林明道)後巷		已開始	已開始	12 年 第 1 季	11 年 第 3 季	
		謝斐道 (近軍器廠街至盧押道)		11 年 第 2 季	11 年 第 3 季	13 年 第 3 季	13 年 第 3 季	挖掘准許證在7月下旬生效。
		謝斐道 (近盧押道至柯布連道)		已開始	已開始	11 年 第 4 季	11 年 第 4 季	
		盧押道		已開始	已開始	12 年 第 1 季	12 年 第 1 季	
		禮頓道		11 年 第 2季	已開始	12 年 第 3 季	12 年 第 3 季	
		肇輝臺		已開始	已開始	11 年 第 4 季	11 年 第 4 季	已與有關政府部門、學校、住戶、區議員及其他受影響人士商討施工時間表。工程已在2011年7月9日重開。
		畢拉山徑		已開始	已開始	11 年 第 3 季	已完成	
		睦誠道		已開始	已開始	12 年 第 3 季	12 年 第 3 季	一段於睦誠道西面近睦誠徑的水管接駁工程已完成，餘下於睦誠道的工程正安排施工。
		軒德蓀道		已開始	已開始	12 年 第 3 季	12 年 第 3 季	
		白建時道 (近軒德蓀道)		已開始	已開始	12 年 第 3 季	12 年 第 3 季	
		大坑道		已開始	已開始	12 年 第 2 季	12 年 第 2 季	
		大坑道與大坑徑之間的樓梯 (於公理書院旁)		已開始	已開始	11 年 第 2 季	11 年 第 3 季	正進行喉管測試，正安排於學校假期接駁水管。
		福群道		已開始	已開始	11 年 第 4 季	11 年 第 4 季	已與真光中學商討在暑假期間的工程安排。
		大坑徑 (公理書院前)		已開始	已開始	12 年 第 1 季	12 年 第 1 季	水管鋪設現已完成，正進行喉管測試及安排接駁水管。

灣仔區工程概覽

工務計劃編號及級別	負責部門	工程說明	估計費用〔百萬元〕	工程計劃				備註／工程計劃延誤原因
				開工日期		完成日期		
				上次報告	今次報告	上次報告	今次報告	
		春暉臺 (近大坑徑)		已開始	已開始	12 年 第 1 季	12 年 第 1 季	
		布思道		已開始	已開始	11 年 第 2 季	已完成	
		愛群道 (近崇德街)		已開始	已開始	11 年 第 4 季	11 年 第 4 季	渠務署於崇德街進行工程，現正協調水管敷設工程安排。
		摩理臣山道		已開始	已開始	11 年 第 4 季	11 年 第 4 季	
		黃泥涌道(近天主教墳場和香港墳場)		已開始	已開始	12 年 第 1 季	12 年 第 1 季	
		黃泥涌道(介乎藍塘道及禮頓道)		已開始	已開始	13 年 第 3 季	13 年 第 3 季	
		藍塘道 及 載德街		已開始	已開始	12 年 第 3 季	12 年 第 3 季	
		石水渠街		已開始	已開始	12 年 第 2 季	12 年 第 2 季	包括部份由182WC轉交的工程。
		太和街後巷		已開始	已開始	11 年 第 2 季	已完成	
		寶雲道		已開始	已開始	11 年 第 2 季	11 年 第 3 季	水管鋪設現已完成，正進行喉管測試及安排接駁水管。
		司徒拔道 (近英基學校協會)		已開始	已開始	11 年 第 2 季	11 年 第 3 季	正進行喉管測試。正安排於學校假期接駁水管
		司徒拔道 (近聶高信山道)		已開始	已開始	11 年 第 2 季	11 年 第 3 季	正進行喉管測試。正安排於學校假期接駁水管
		司徒拔道 (近眺馬閣)		已開始	已開始	11 年 第 3 季	11 年 第 3 季	正進行喉管測試。正安排於學校假期接駁水管
		維園道		已開始	已開始	11 年 第 4 季	11 年 第 4 季	
		運盛街 (近愛護動物協會)		已開始	已開始	11 年 第 4 季	11 年 第 4 季	與"灣仔發展計第二期工程"緊密聯繫，並作出協調。
		鴻興道 (近海底隧道入口)		已開始	已開始	11 年 第 2 季	已完成	
		加寧街		已開始	已開始	11 年 第 3 季	11 年 第 3 季	
		百德新街介乎告士打道及京士頓街		已開始	已開始	11 年 第 2 季	已完成	
		堅拿道東介乎軒尼詩道及禮頓道 (天橋底)		已開始	已開始	11 年 第 3 季	11 年 第 3 季	水管鋪設現已完成，正進行喉管測試及安排接駁水管。
		堅拿道東介乎軒尼詩道及禮頓道 (行人路)		-	11 年 第 3 季	-	13 年 第 2 季	
		堅拿道西介乎軒尼詩道及禮頓道		已開始	已開始	12 年 第 3 季	12 年 第 3 季	正進行天橋底柱上的水管更換工程。
		寶靈頓道		已開始	已開始	12 年 第 3 季	12 年 第 3 季	
		莊士敦道分介乎軒尼詩道及機利臣街		已開始	已開始	12 年 第 3 季	12 年 第 3 季	
		莊士敦道分介乎軒尼詩道及灣仔道		已開始	已開始	12 年 第 3 季	12 年 第 3 季	
		西行軒尼詩道介乎柯布連道及菲林明道		11 年 第 2 季	已開始	12 年 第 3 季	12 年 第 3 季	
		西行軒尼詩道介乎馬師道及波斯富街		11 年 第 3 季	11 年 第 3 季	13 年 第 3 季	13 年 第 3 季	
		東行軒尼詩道介乎史釗域道及馬師道		11 年 第 3 季	已開始	13 年 第 2 季	13 年 第 2 季	
		東行軒尼詩道介乎馬師道及堅拿道東		11 年 第 2 季	已開始	13 年 第 2 季	13 年 第 2 季	
		皇后大道東 (近船街至灣仔道)		11 年 第 2 季	11 年 第 3 季	12 年 第 4 季	12 年 第 4 季	
		皇后大道東 (灣仔道至司徒拔道)		11 年 第 3 季	11 年 第 3 季	13 年 第 3 季	13 年 第 3 季	
		分域街		11 年 第 3 季	11 年 第 3 季	13 年 第 3 季	13 年 第 3 季	由182WC轉交至186WC。
		天樂里		-	已開始	-	13 年 第 2 季	

灣仔區工程概覽

工務計劃編號及級別	負責部門	工程說明	估計費用〔百萬元〕	工程計劃				備註／工程計劃延誤原因
				開工日期		完成日期		
				上次報告	今次報告	上次報告	今次報告	
		公眾安全 **長遠防治山泥傾瀉計劃**						
5001BX	土木工程拓展署	寶雲道 斜坡編號：11SW-D/C424	3.01	已開始	已開始	11 年 第 2 季	已完成	工程已完成。
5001BX	土木工程拓展署	畢拉山道 斜坡編號：11SW-C/C617	1.54	已開始	已開始	11年 第 3 季	11年 第 3 季	工程進行中。
5001BX	土木工程拓展署	司徒拔道 斜坡編號：11SW-D/C340	3.43	已開始	已開始	11年 第 4 季	已完成	工程已完成。
5001BX	土木工程拓展署	寶雲道 斜坡編號：11SW-D/C1156	1.77	已開始	已開始	11年 第 4 季	11年 第 4 季	工程進行中。
5001BX	土木工程拓展署	寶雲道 斜坡編號：11SW-D/C1153	2.10	已開始	已開始	11年 第 4 季	11年 第 4 季	工程進行中。
5001BX	土木工程拓展署	布力徑 斜坡編號：11SW-D/C1103	0.85	已開始	已開始	11年 第 4 季	11年 第 4 季	工程進行中。
5001BX	土木工程拓展署	布力徑 斜坡編號：11SE-D/CR1104	3.04	已開始	已開始	11年 第 4 季	11年 第 4 季	工程進行中。
5001BX	土木工程拓展署	跑馬地山村臺 斜坡編號：11SW-D/C12	3.62	已開始	已開始	12年 第 1 季	12年 第 1 季	工程進行中。
5001BX	土木工程拓展署	禮賢里 斜坡編號：11SE-A/C 8	1.43	已開始	已開始	12年 第 1 季	12年 第 1 季	工程進行中。
5001BX	土木工程	位於跑馬地金山花園上方天然山坡的風						

灣仔區工程概覽

工務計劃編號及級別	負責部門	工程說明	估計費用〔百萬元〕	工程計劃				備註／工程計劃延誤原因
				開工日期		完成日期		
				上次報告	今次報告	上次報告	今次報告	
	拓展署	險緩減工程	37.30	已開始	已開始	12年 第 2 季	12年 第 2 季	工程進行中。
5001BX	土木工程	藍塘道						
	拓展署	斜坡編號：11SW-D/C182						
		(東南面斜坡工程)	2.10	已開始	已開始	已完成	已完成	為配合渠務工程之東南面斜坡，已於2011年第1季完成。
		(西北面斜坡工程)	1.00	11年 第 2 季	已開始	11年 第 4 季	11年 第 4 季	工程進行中。
5001BX	土木工程	畢拉山道						
	拓展署	斜坡編號：11SE-C/F 128	1.55	11年 第 2 季	已開始	12年 第 1 季	12年 第 1 季	工程進行中。
5001BX	土木工程	畢拉山道						
	拓展署	斜坡編號：11SE-C/F 129	4.46	11年 第 2 季	已開始	12年 第 2 季	12年 第 2 季	工程進行中。
5001BX	土木工程	谷柏道						
	拓展署	斜坡編號：11SE-C/C459	1.60	已開始	已開始	12年 第 1 季	12年 第 1 季	工程進行中。
5001BX	土木工程	聶歌信山道						
	拓展署	斜坡編號：11SE-D/C333	3.14	11年 第 2 季	11年 第 3 季	12年 第 1 季	12年 第 1 季	為配合其它斜坡工程，工程將延至2011年 第 3 季展開。
5001BX	土木工程	寶雲道						
	拓展署	斜坡編號：11SW-D/C 426	2.40	11年 第 2 季	11年 第 3 季	12年 第 3 季	12年 第 2 季	為配合其它斜坡工程，工程將延至2011年 第 3 季展開。
5001BX	土木工程	蓮花宮東街						
	拓展署	斜坡編號：11SE-A/C 764	1.35	11年 第 3 季	已開始	12年 第 1 季	12年 第 1 季	工程進行中。
5001BX	土木工程	堅尼地道						
	拓展署	斜坡編號：11SW-B/CR 218	3.50	11年 第 3 季	12年 第 1 季	12年 第 2 季	12年 第 4 季	為配合其它斜坡工程，工程將延至2012年 第 1 季展開。
5001BX	土木工程	寶雲道						
	拓展署	斜坡編號：11SW-D/CR1168	3.60	11年 第 3 季	11年 第 3 季	12年 第 2 季	12年 第 3 季	工程將展開。
5001BX	土木工程	司徒拔道						
	拓展署	斜坡編號：11SW-D/CR 25	2.50	11年 第 3 季	11年 第 4 季	12年 第 2 季	12年 第 4 季	為配合其它斜坡工程，工程將延至2011年 第 4 季展開。
5001BX	土木工程	睦誠道						

灣仔區工程概覽

工務計劃編號及級別	負責部門	工程說明	估計費用〔百萬元〕	工程計劃				備註／工程計劃延誤原因
				開工日期		完成日期		
				上次報告	今次報告	上次報告	今次報告	
	拓展署	斜坡編號：11SE-C/C 435	4.40	-	11年 第 4 季	-	12年 第 4 季	工程將展開。(新項目)
5001BX	土木工程拓展署	睦誠道 斜坡編號：11SE-C/CR 192	4.30	-	11年 第 4 季	-	12年 第 4 季	工程將展開。(新項目)
5001BX	土木工程拓展署	大坑 利群道 斜坡編號：11SE-A/R 42	1.50	-	11年 第 4 季	-	12年 第 3 季	工程將展開。(新項目)
5001BX	土木工程拓展署	大坑道 斜坡編號：11SW-D/C 1575	2.90	-	11年 第 4 季	-	12年 第 3 季	工程將展開。(新項目)
5001BX	土木工程拓展署	司徒拔道 斜坡編號：11SW-D/C 1162	4.00	11年 第 3 季	11年 第 4 季	12年 第 4 季	12年 第 4 季	為配合其它斜坡工程，工程將延至2011年 第 4 季展開。
5001BX	土木工程拓展署	位於跑馬地鳳輝臺上方天然山坡的風險緩減工程	48.30	11年 第 4 季	11年 第 4 季	14年 第 2 季	14年 第 2 季	工程將展開。
5001BX	土木工程拓展署	位於灣仔堅尼地道上方天然山坡的風險緩減工程	76.29	11年 第 4 季	11年 第 4 季	14年 第 2 季	14年 第 2 季	工程將展開。
5001BX	土木工程拓展署	位於灣仔倚雲閣上方天然山坡的風險緩減工程	148.47	11年 第 4 季	11年 第 4 季	14年 第 2 季	14年 第 2 季	工程將展開。
		環境保護 **污水渠及污水處理**						
103CD 甲	渠務署	港島北部雨水排放系統改善計劃 -- 港島西雨水排放隧道 工程包括一條長約11公里的排水隧道及34個截水引流入口,隧道將以隧道鑽挖機於約100米深的地底岩石層中開鑿和建造。	3000.00	已開始	已開始	12 年 第 1 季	12 年 第 1 季	工程已於2007年第4季展開，並預計於2012年第1季完成。於大坑隧道東面入口工地內的隧道鑽挖工作已全部完成。連接隧道挖掘及餘下的河道建造工程現正進行中。位於灣仔區的進水口建造工程進展順利。進水口分別位於大坑道(2個)、藍塘道(2個)、畢拉山道(2個)、司徒拔道(2個)、箕璉坊、東區濾水廠內、寶雲道(3個)及堅尼地道。連接隧道的挖掘工作亦已於2010年1月底開始分階段進行，位

灣仔區工程概覽

工務計劃編號及級別	負責部門	工程說明	估計費用〔百萬元〕	工程計劃				備註／工程計劃延誤原因
				開工日期		完成日期		
				上次報告	今次報告	上次報告	今次報告	
104CD 甲	渠務署	港島北部雨水排放系統改善計劃 -- 西部下游集水區工程 包括改善於灣仔區及中西區內總長約4.6公里的雨水渠及皇仁書院旁明渠覆蓋工程。於灣仔區範圍內的渠務工程總長約1.6公里。	370.00	已開始	已開始	12 年 第 4 季	12 年 第 4 季	於灣仔區的挖掘工作已完成約 90%，而其中11個進水口之連接隧道的挖掘工作已完成。 工程已於2008年7月初展開。目前正施工的位置包括厚德里、崇德街、摩利臣山道、寶靈頓道、軒尼詩道近堅拿道西、謝斐道、棉花路、利園山道、告士打道、羅素街污水渠部份及皇仁書院旁的明渠覆蓋工程。此外，於立德里及日善街的雨水渠工程，2011年8月動工。
市政 **公眾衞生**								
053CE 丁	建築署	遷移百德新街垃圾收集站	14.80	已開始	已開始	12 年 第 2 季	12 年 第 2 季	工程已於2010年第4季展開，現正進行有關之地基工程。

備註： 有關運輸署長於2010年11月16日灣仔區議會上簡述紓緩銅鑼灣交通情況的七項工程〔包括擴闊禮頓道東行車道（增加一條行車線）、霎東街與堅拿道東路口改善工程 、連道與加路連山道滙合處改善工程、重置波斯富街電車站、局部擴闊霎東街/勿地臣街交界的行人過路處、微調摩利臣山道/堅拿道東/禮頓道路口和增設交通監察攝影機〕，請參閱運輸署/路政署的定期報告。

圖例

工程概覽第6至8頁

- ▲ 規劃中的斜坡
- ● 斜坡工程-正進行中的斜坡
- 規劃中的天然山坡
- 山坡工程-正進行中的天然山坡

工程概覽第8至9頁，工務計劃編號104CD及103CD

- 渠務工程（需開掘路面）
- 渠務工程（不需開掘路面）
- 渠務工程（103CD 施工工地）

工程概覽第2至5頁，工務計劃編號182WC及186WC

- 水務工程（需開掘路面）
- 水務工程（無需開掘路面）
- 現在及未來半年施工的水務工程位置（需開掘路面）
- 現在及未來半年施工的水務工程位置（無需開掘路面）

CR 218
C 426
C 182
C 1162
C 12
CR 25
C 1153
CR 1104
C 1103
C 333
C 1156
CR 1168
C 1575
C 459
C 8
C 764
R 42
CR 192
C 435
F 128
C 617
F 129

現在及未來半年在灣仔區內道路進行的工務工程

31-08-2011

Sketch No. HKI-Z672

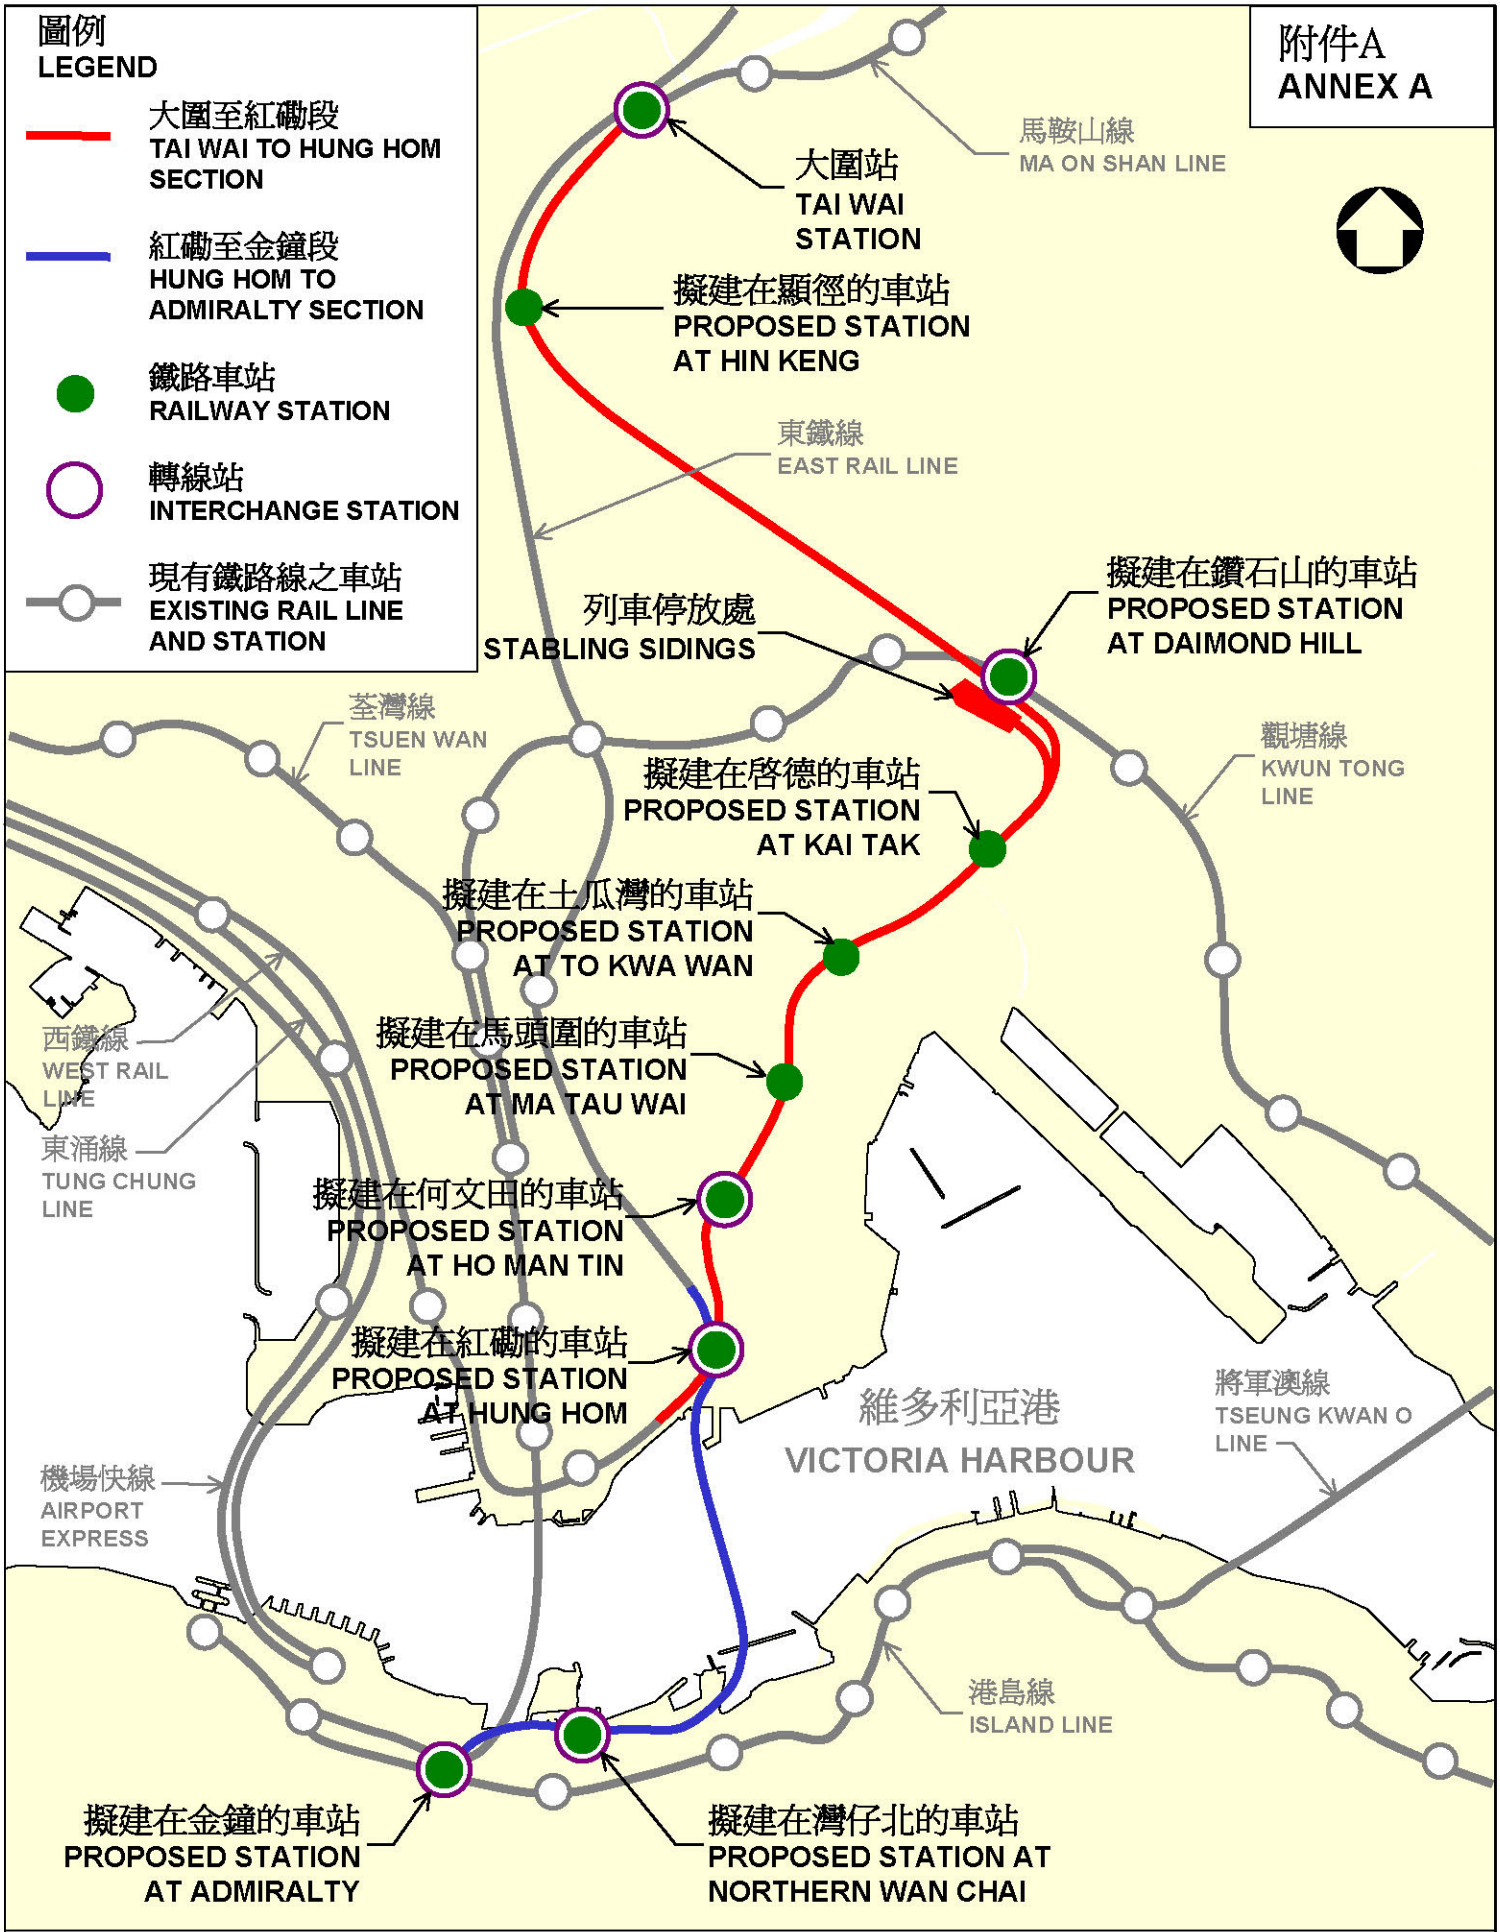

圖則名稱 drawing title

沙田至中環線

SHATIN TO CENTRAL LINK

HRWSCL003-SK0223

A4 210X297
