「中環灣仔繞道和東區走廊連接路（中環灣仔繞道）」工程項目

工程進度 簡報(2015 年 1 月 29 日)

1. 引言

在 2011 年 1 月 27 日舉行的中西區區議會交通及運輸委員會會議上，委員會要求路政署在往後的會議上滙報中西區內中環灣仔繞道工程的最新進展及即將開展的工程摘要。

2 中環灣仔繞道工程(中環交匯處)的進度 (2014 年 8 月至 2015 年 1 月)：

過去六個月進行的主要工程位置圖

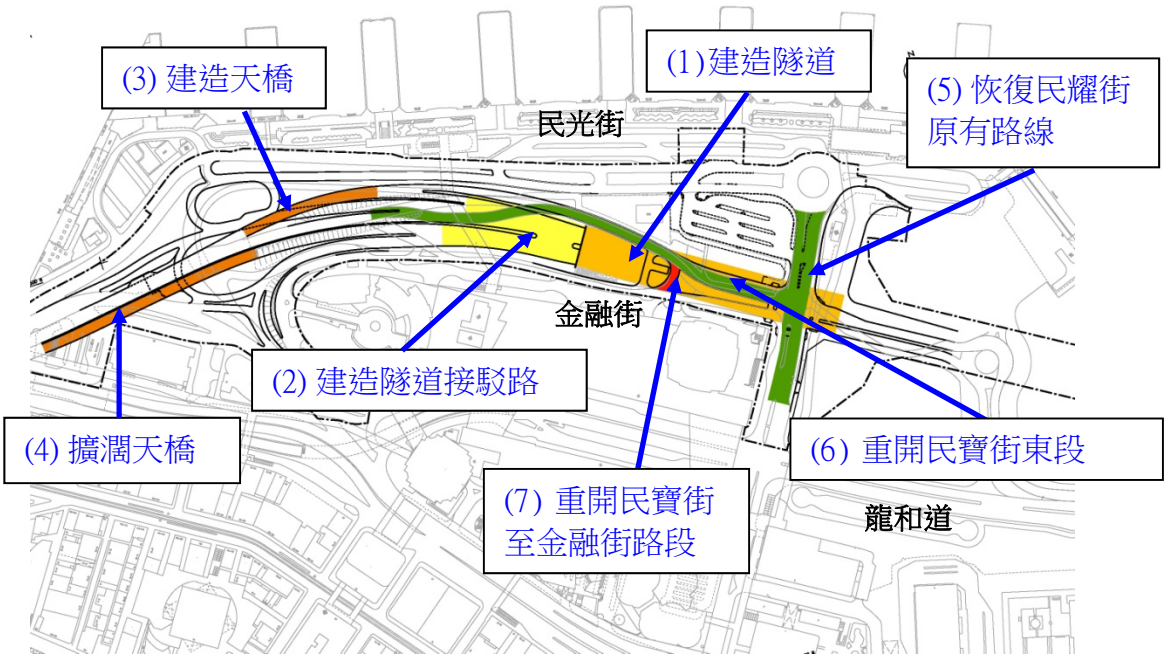

位置	工序	圖片
國際金融中心對出的工地	(1)建造隧道	

位置	工序	圖片
國際金融中心對出的工地	(2)建造隧道接駁路	
四季酒店對出的工地	(3)建造天橋	
民吉街、統一碼頭道	(4) 擴濶天橋	

位置	工序	圖片
民耀街	(5)恢復民耀街原有路線	
民寶街	(6)重開民寶街東段	
國際金融中心對出的工地	(7)重開民寶街至金融街路段	

3. 中環灣仔繞道工程(中環交匯處)未來六個月進行的主要工程 (2015 年 1 月至 2015 年 6 月)：

位置	工序
國際金融中心對出的工地	建造隧道接駁路
四季酒店對出的工地	建造天橋
民吉街、統一碼頭道	擴濶天橋
民耀街	擴濶民耀街及建造耀星街
民光街、民照街及金融街一帶	建造連接隧道西面出入口的地面道路

4. 中環灣仔繞道工程(中環交匯處)未來一年內之臨時交通安排(2015 年 1 月至 2015 年 12 月)

隨着中環交匯處工程合約的進展，現時位於金融街和民寶街一帶的臨時交通安排將會逐步完結，恢復原有的交通安排，詳情如下：

預計日期	交通安排	圖片
2015 年第二季	取消連接民寶街至金融街的臨時路(近四季酒店)〔註一〕	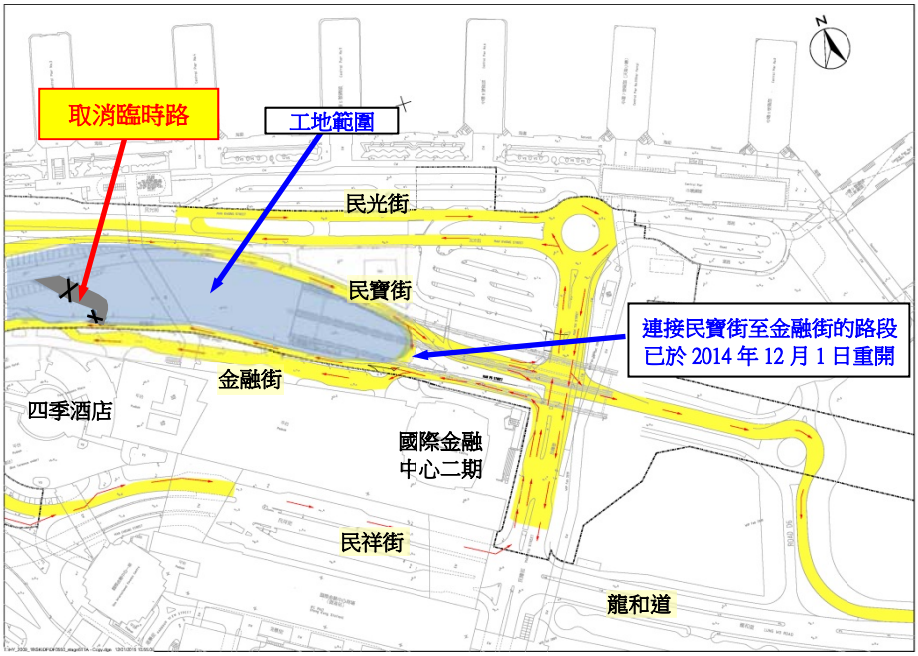

註一 接連民寶街至金融街的路段(近國際金融中心二期)已於 2014 年 12 月 1 日重開。按照現時工程進度，連接民寶街至金融街的臨時路(近四季酒店)預計於 2015 年第二季取消。

5. 中環灣仔繞道工程(隧道啟用工程)

中環灣仔繞道工程項目的最後一個工程合約-隧道啟用工程，已於2014年2月28日開展，現正興建西面通風大樓的結構部分。在未來六個月，該合約承建商會繼續為各種機電系統和設備進行詳細設計，以及於隧道內壁安裝面板支架。

~ 完 ~
