

元朗南第一期發展工地平整及基礎設施工程－合約三 近柏麗豪園一段朗天路南行線的臨時交通改道措施

目的

本文件旨在徵詢元朗區議會交通運輸委員會委員就有關近柏麗豪園一段朗天路南行線臨時交通改道措施的意見。

背景

2. 元朗南新發展區是北部都會區內一個以發展房屋為主的宜居綠色新社區。土木工程拓展署通過「基建先行、創造容量」的規劃方針，於元朗南新發展區第一期工程優化道路網絡，加強元朗南新發展區的對外連接。元朗南新發展區第一期發展工地平整及基礎設施工程已於 2021 年 3 月刊憲，並於 2022 年 8 月展開。

3. 唐人新村交匯處的重建工程為第一期發展中的一個重點道路優化項目。該交匯處位處元朗、天水圍、屏山及元朗南的交匯點，在繁忙時間的交通容量已經接近飽和。儘管工程面臨諸多挑戰，項目團隊正全力推進，爭取於 2028 年完工。待工程完成後，元朗公路以南的車輛將可經新建連接路更直接往返元朗公路，從而改善該交匯處一帶的交通狀況。

臨時交通改道措施

4. 目前，部分位於山下路、朗漢路附近的地基與橋墩的建造工作已經完成，我們接下來將進入橋面施工階段。根據施工計劃，我們預計於 2026 年 7 月至 8 月其中 10 晚為新建的由朗天路南行往元朗公路東行的連接路，進行橋面預製構件的吊裝作業（詳見附件一）。由於涉及大型起重吊運，為確保足夠施工空間以及公眾安全，我們建議實施以下臨時交通改道措施，以配合相關工程：

- 於2026年7月至8月期間，於10個凌晨時段（即午夜1時至早上6時）臨時封閉近柏麗豪園往屯門及山下路方向的朗天路南行線。往上水方向的連接路仍保持原有行車線，不受工程影響。
- 吊裝工作會於凌晨1時30分展開，預計於上午4時30分完成。在上午6時解封道路前，預留1.5小時的緩衝時間。
- 若吊裝工作未能於凌晨2時15分前展開，當晚的吊裝工作將即時取消，相關道路將立即解封。

5. 在道路封閉期間，駕駛人士可使用以下替代路線前往屯門及山下路：

- 由朗天路往屯門 (詳見附件二)
- 由天慈路往屯門 (詳見附件三)
- 由朗天路往山下路 (詳見附件四)
- 由天慈路往山下路 (詳見附件五)

6. 本署已就上述封路安排徵詢運輸署、香港警務處及環境保護署的意見，並將遵從噪音管制及交通管理的相關要求。施工期間將設置臨時交通標誌，並安排現場交通助理員協助疏導交通，以盡量減低對周邊道路網絡的影響。

意見諮詢

7. 請委員就以上臨時交通改道措施提出意見。

土木工程拓展署
2026年4月

元朗區議會 - 交通運輸委員會
有關元朗南第一期合約三 臨時交通改道措施
附件一

封路日期：2026年7月至8月期間其中10晚



受影響路段：朗天路南行線
(近柏麗豪園一段)


封路時間：01:00 – 06:00

工作流程：01:00 – 01:30 封閉道路
01:30 – 04:30 吊裝工作*
04:30 – 06:00 解封道路**

* 如吊裝工作未能於 02:15 展開, 該晚吊裝工作將會即時中止


** 預留1.5 小時的緩衝時間

-  橋面組件 (需臨時封閉一段朗天路南行線以進行吊裝工作)
-  橋面組件 (需臨時封閉一段山下路以進行吊裝工作)

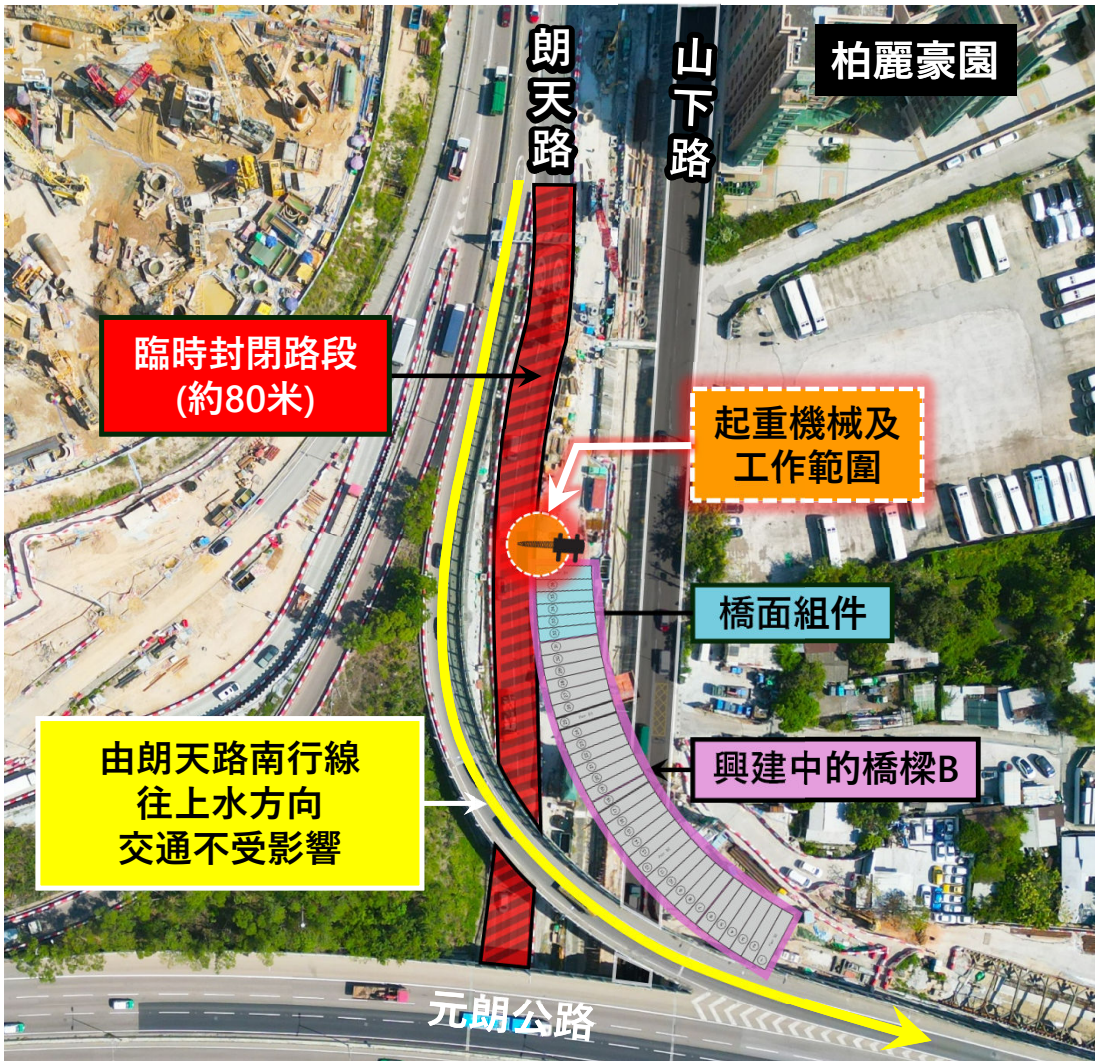


由朗天路往屯門

- ① 朗天路
- ↓
- ② 元朗公路 (東行)
- ↓
- ③ 十八鄉迴旋處
- ↓
- ④ 元朗公路 (西行)
- ↓
- ⑤ 屯門

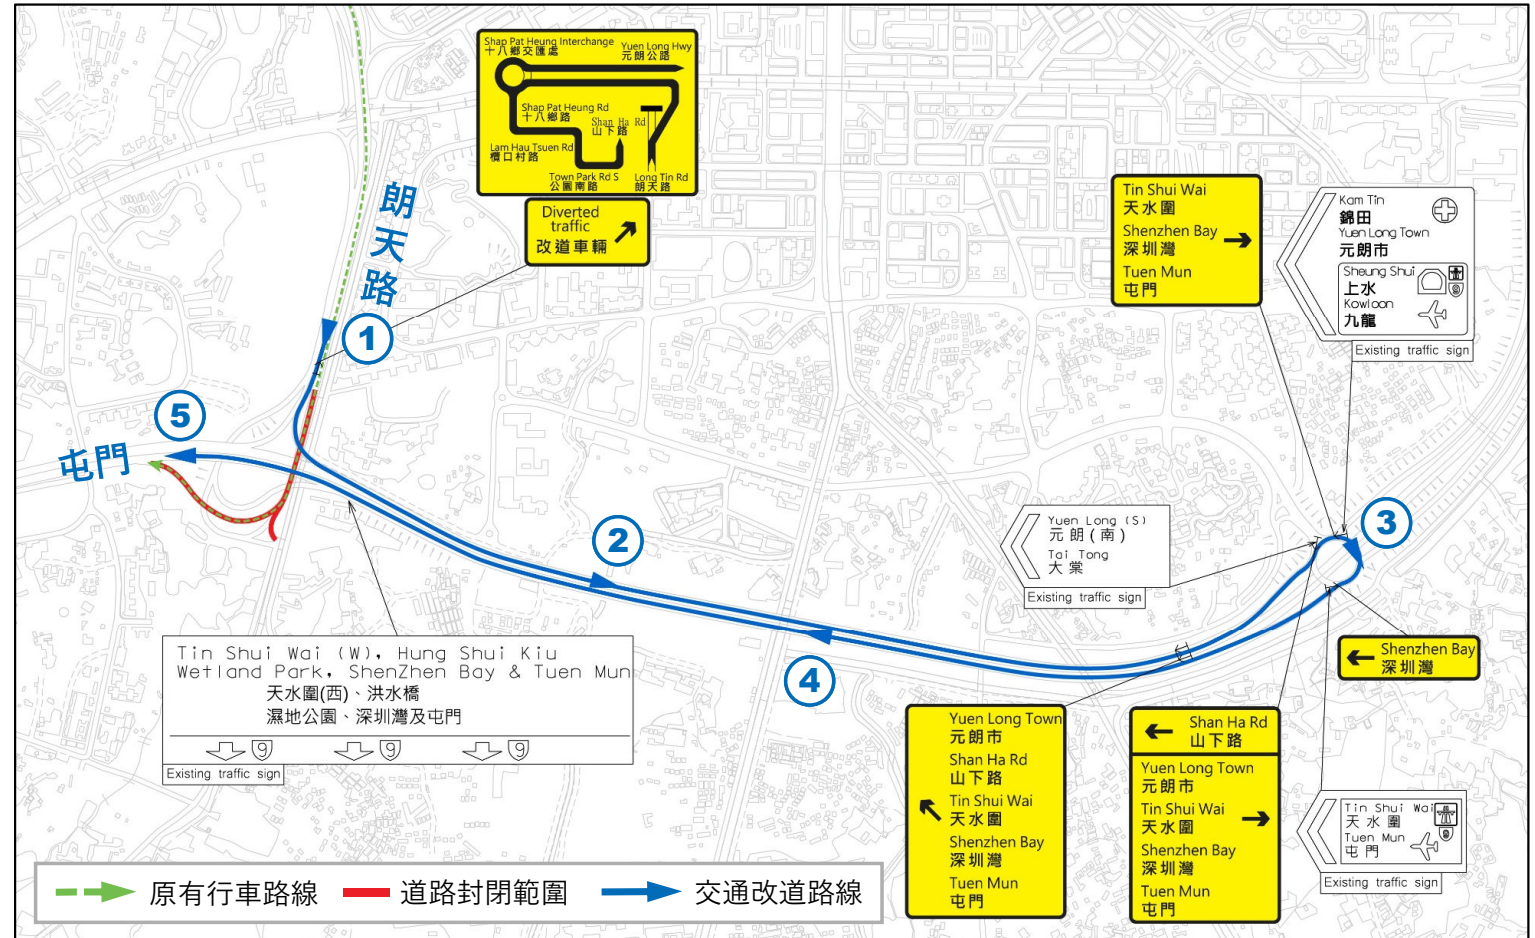


由天慈路往屯門

- ① 天慈路
- ↓
- ② 天福路
- ↓
- ③ 屏廈路
- ↓
- ④ 洪天路
- ↓
- ⑤ 折返元朗公路
(西行)
- ↓
- ⑥ 屯門

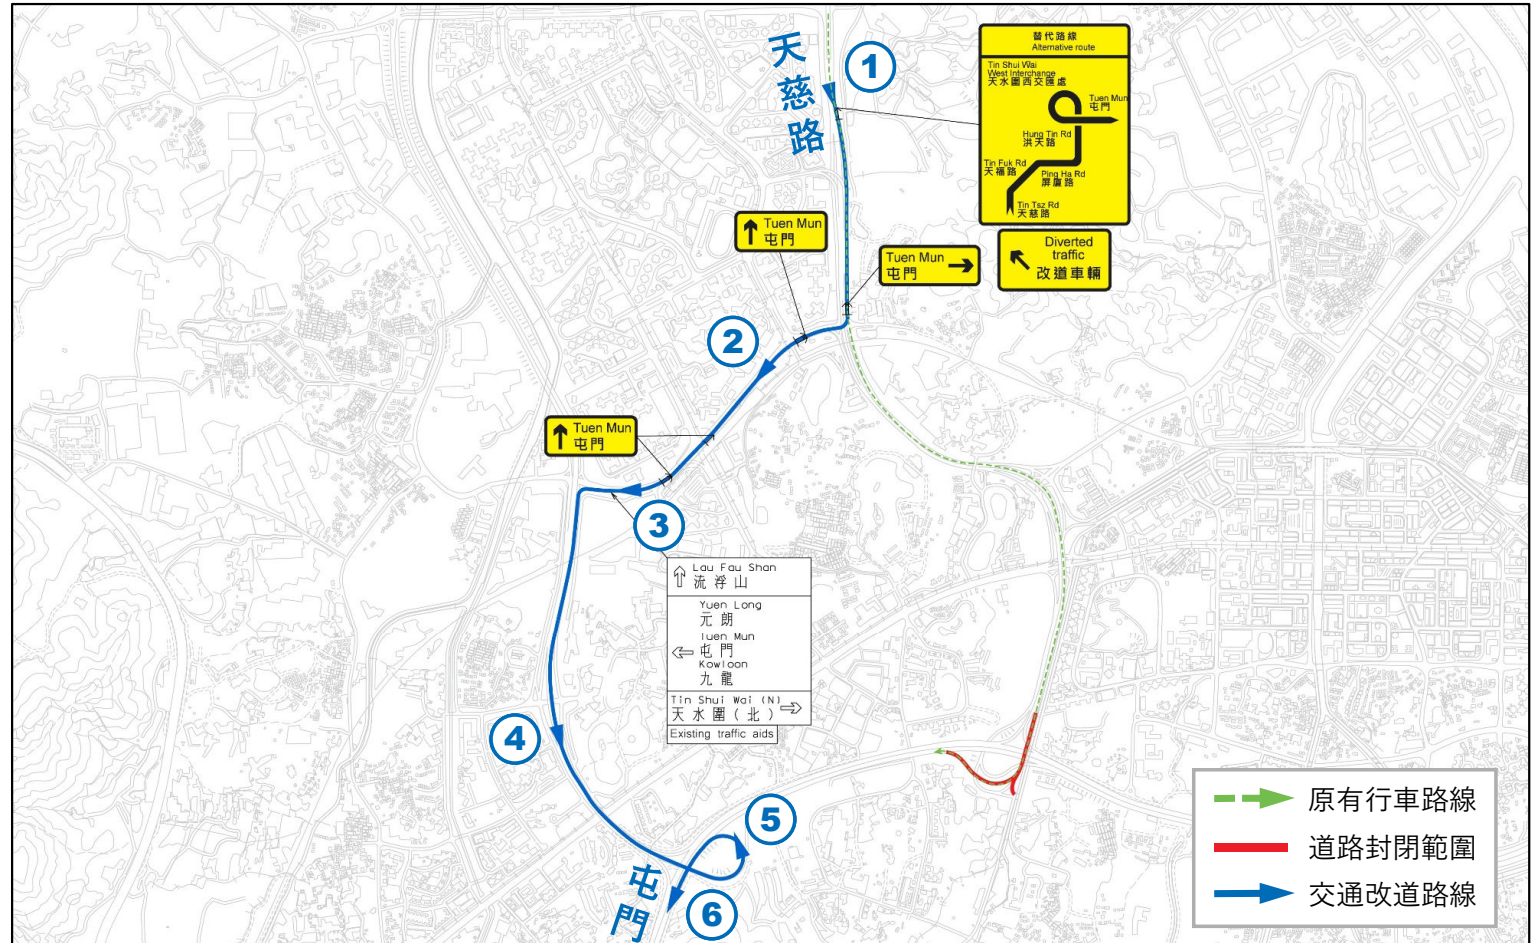

由朗天路往山下路

- ① 朗天路
- ↓
- ② 元朗公路 (東行)
- ↓
- ③ 十八鄉路
- ↓
- ④ 欖口村路
- ↓
- ⑤ 公園南路
- ↓
- ⑥ 山下路

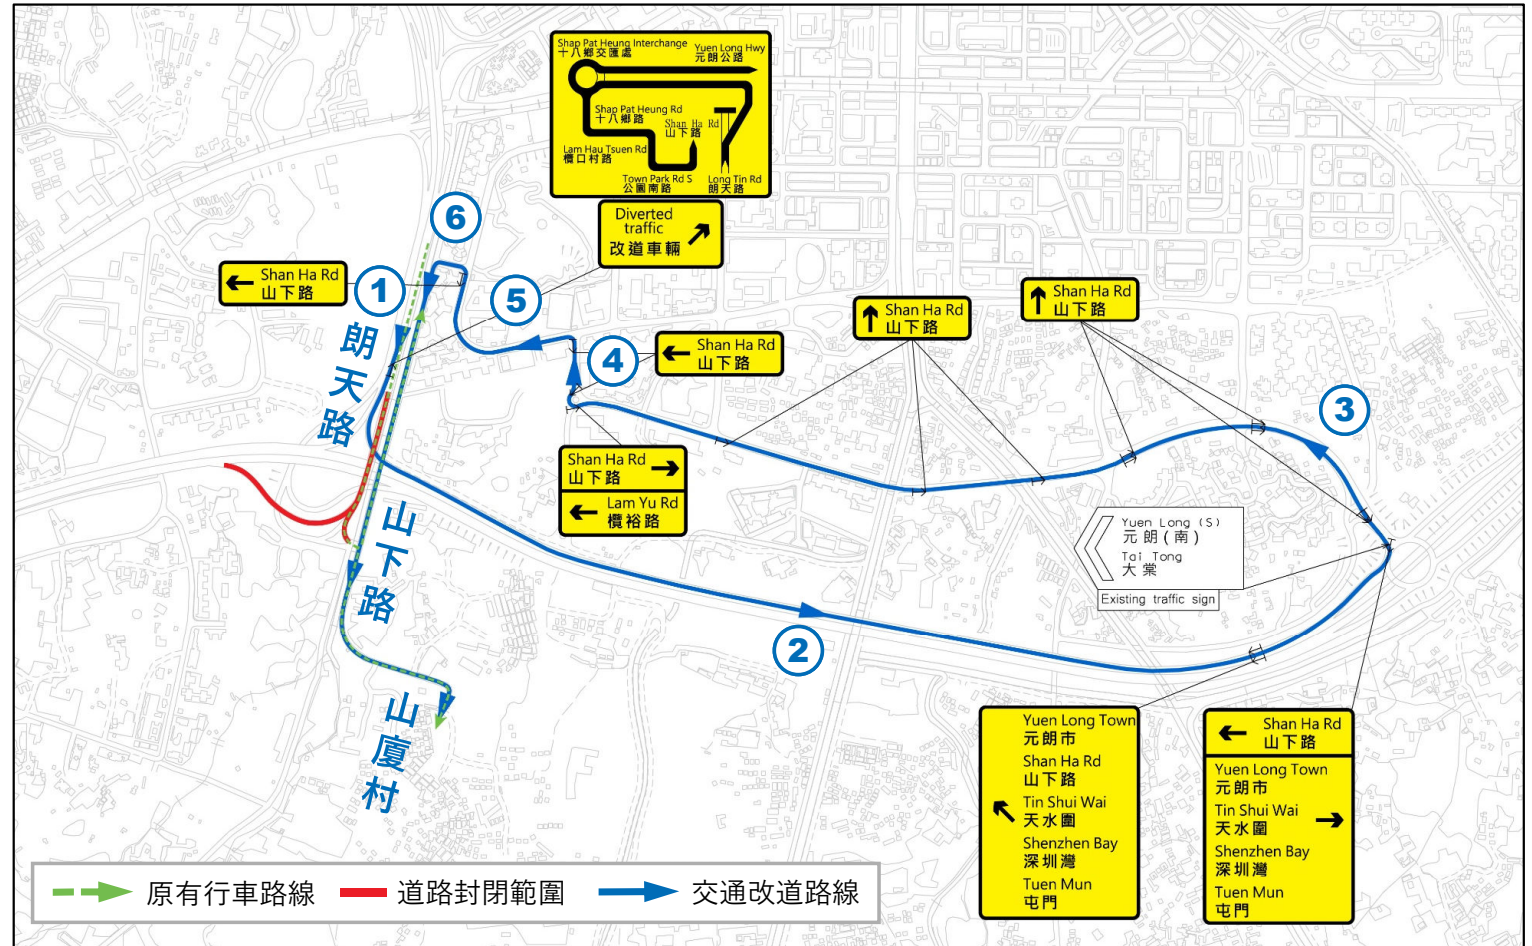

由天慈路往山下路

